

TABELLA 1 ELENCO IMPEGNI E PAGAMENTI I TRANCHE AL 31/12/99

Descrizione	Impegnato mio Lit	Tranche	Tipo Progetto	Quietanzato mio Lit
Indagini geognostiche	29	1997	Banchinamento Molo Sali	29
Escavo canali convenzione con AMAV	3.000	1997	Escavo I fase	3.000
Escavo bacino di evoluzione 4	779	1997	Escavo I fase	779
Fornitura sistema software	113	1997	Escavo I fase	113
Escavo cunetta bacino 4	470	1997	Escavo I fase	470
Convenzione amav smaltimento fanghi	3.111	1997	Escavo I fase	3.111
Riparazione accosto RO-Ro banchina Isonzo	431	1997	Escavo I fase	431
Carotaggi bacini Venezia	131	1997	Escavo I fase	131
Progettazione molo sali	260	1997	Banchinamento Molo Sali	260
Escavo canale Novisso	129	1997	Escavo I fase	129
Escavo da 52W a 196W	1.400	1997	Escavo I fase	1.400
Sistemazione sponda nord canale ind.le sud	1.450	1997	Escavo I fase	1.408
Escavo fondali testata marmi	339	1997	Escavo I fase	339
Escavo 17W - 42W	136	1997	Escavo I fase	136
Indagini geognostiche	6	1997	Banchinamento Molo Sali	6
Ampliamento incarico progett.ne M.Sali	50	1997	Banchinamento Molo Sali	50
Collaudo bacino ev.ne 4 e canale ind.le	3	1997	Escavo I fase	3
Escavo accosti operativi n.7 e 8 di b.na Testat	400	1997	Escavo I fase	-
Completamento Banchinamento M.Sali	16.000	1997	Banchinamento Molo Sali	-
Escavo Bacino 1	1.400	1997	Escavo I fase	-
Escavo Bacino 4	2.300	1997	Escavo I fase	-
Totali	L. 31.937			L. 11.795


TABELLA 2 ELENCO IMPEGNI E PAGAMENTI II TRANCHE AL 31/12/99

Descrizione	Impegnato mio Lit	Tranche	Tipo Progetto	Quietanzato mio Lit
Sistemazione area Molo Sali	L. 88	1998	Sistemazione area Molo Sali	88
Recinzione doganale a Marghera	L. 235	1998	Sistemazione area Molo Sali	235
Sistemazione sponda nord canale Ind.le	L. 5.080	1998	Escavo II fase	4.756
Formazione recinzione punto franco	L. 115	1998	Sistemazione area Molo Sali	103
Carotaggi ed analisi	L. 170	1998	Escavo II fase	170
Manut.ne area ex monopoli	L. 1.500	1998	Sistemazione area Molo Sali	4
Carotaggi ed analisi (maggiori oneri)	L. 63	1998	Escavo II fase	63
Totall	L. 7.251			L. 5.419

SITUAZIONE UTILIZZO FINANZIAMENTO LEGGE 515/96

FINANZIAMENTO A DECORRERE DAL 1998

LA DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI E DEL QUIETANZATO AL 31.12.99 SONO RIPORTATI IN DETTAGLIO NELLA TABELLA 2

TOTALE DISPONIBILITA' ~~28.500~~ mio LitTOTALE IMPEGNATO ~~7.251~~ mio Lit → TOTALE QUIETANZATO AL 31/12/99 5.419 mio Lit~~DISPONIBILITA' RESIDUA AL 31/12/99 21.249~~ mio LitAnalisi del finanziamento al 31/12/99:
disponibilità totale 28.500 mio LitAnalisi dell'impegnato al 31/12/99:
totale pari a 7.251 mio Lit

PAGINA BIANCA

Documento H SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo

Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la
legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 1999

PAGINA BIANCA



Il Presidente

Spett.le
Ministero dei Lavori Pubblici
Magistrato alle Acque
Comitato di indirizzo,
coordinamento e controllo
Riva del vin 19
30100 VENEZIA

Oggetto: Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale

Con riferimento alla Vostra richiesta del 22/12/1999 (rif. 291/GAB) in allegato diamo un riepilogo delle opere eseguite od in via di esecuzione per le quali l'Aeroporto di Venezia ha usufruito dei finanziamenti ottenuti con la legislazione in oggetto.

Forniamo inoltre alcune immagini panoramiche che testimoniano l'avanzamento delle opere in corso.

Distinti saluti.

Giovanni Pellicani

Venezia Tessera, 18 GEN. 2000
Prot. nr. 100/14/Pres/GP/pl

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SCHEDA RIEPILOGATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DI OGNI SINGOLO INTERVENTO INFRASTRUTTURALE

Aeroporto	MARCO POLO DI VENEZIA		
Descrizione lavori	Nuova aerostazione, di complessivi 56.000 mq, comprensivi impianti tecnologici.		
Progetto	Presentazione	25-gen-94	decreto di approvazione 13-set-96
	Importo totale	109.103.570.151	Importo a base d'asta 101.965.953.412
Impresa esecutrice	ATI: Grandi Lavori Fincosit S.p.A./ ABB SAE-Sadelmi S.p.A.		
Procedura di gara	procedura aperta		
Contratto	agg. provvisoria	—	stipula contratto 25-lug-97
Importo contratto	per lavori	76.219.550.175	per lavori in economia —
Consegna lavori	data	21-ago-97	durata contratto in giorni 1644
Propaghe	proroghe	sospensioni	nuova fine contrattuale
concesse (in giorni)	gg 549	—	19-feb-02
Stato dei lavori	in corso	si	ultimati
Stato avanzamento lavori	Importo	% avanz	di cui a carico Concessionaria
(ultimo SAL emesso)	7° S.A.L. al 20 dicembre 1999		
(alla data compil. scheda)	L. 42.636.461.510 48,63%		11.368.756.472 con finanz. CIPE
	L. 42.636.461.510 al 31 dicembre 1999		10.231.880.825 con finanz. Min. Trasporti
			21.035.824.212 L. 139/92 e/o in autofinanziamento
Perizie	decreto n.	del	Importo di cui a carico della Conces.
1a	005	21-gen-99	11.444.006.304 Vedi sopra
2a	012	29-dic-99	12.728.236.065 in autofinanziamento
...	...	...	...
Conto finale	appalto opere		
	penali		
	totale		
Contenzioso			
Collaudo	data	decreto n°	del

data compilazione scheda:

31-dic-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SCHEDA RIEPILOGATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DI OGNI SINGOLO INTERVENTO INFRASTRUTTURALE

Aeroporto	MARCO POLO DI VENEZIA		
Descrizione lavori	Piazzali Aeromobili a servizio della Nuova Aerostazione passeggeri, per complessivi 70.000 mq circa.		
Progetto	Presentazione	###	decreto di approvazione 16-gen-97
	Importo totale	15.530.333.406	Importo a base d'asta 14.790.793.720
Impresa esecutrice	ATI: Pavimental; Grassetto; Viabit; Kopa.		
Procedura di gara	procedura aperta		
Contratto	agg. provvisoria	--	stipula contratto 25-lug-97
Importo contratto	per lavori	14.014.232.239	per lavori in economia --
Consegna lavori	data	21-ago-97	durata contratto in giorni 820
Propoghe	proroghe	sospensioni	nuova fine contrattuale
concesse (in giorni)	gg 430	##	16-apr-00
Stato dei lavori	in corso	si	ultimati
Stato avanzamento lavori	Importo	%a vanz	di cui a carico Conces.
(ultimo SAL emesso)	10° S A L L. 14 193 485 958	al 30 settembre 1999 86,00%	3 972.995 540 con finanz. CIPE 3 575 695 986 con finanz. Min. Trasporti
(alla data compil. scheda)	L. 14 900 000 000	al 31 dicembre 1999	7 351 308 473 L. 139/92 e/o in autofinanziamento
Perizie	decreto n°	del	Importo di cui a carico della Conces.
1a	126	30-dic-98	2.481.276.282 Vedi sopra
2a	...	...	...
...	...	...	...
Conto finale	appalto opere penali totale		
Contenzioso			
Collaudo	data	decreto n°	del

data compilazione scheda

31-dic-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SCHEMA RIEPILOGATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DI OGNI SINGOLO INTERVENTO INFRASTRUTTURALE

Aeroporto	MARCO POLO DI VENEZIA			
Descrizione lavori	Viabilità e Parcheggi, a servizio della Nuova Aerostazione, comprendente la viabilità a raso e il sistema parcheggi in fronte aerostazione			
Progetto	Presentazione: ###		decreto di approvazione: 16-gen-97	
	importo totale 11.874.352.874		importo a base d'asta 11.308.907.499	
Impresa esecutrice	ATI: Grassetto; Pavimentali; Viabit; Kopa.			
Procedura di gara	procedura aperta			
Contratto	agg. provvisoria —		stipula contratto 30-set-97	
Importo contratto	per lavori 8.350.500.000		per lavori in economia —	
Consegna lavori	data 07-ott-97		durata contratto in giorni 924	
Propaghe	proroghe	sospensioni	nuova fine contrattuale	
	concesse (in giorni) 116	89	17-apr-00	
Stato dei lavori	in corso si		ultimati	
Stato avanzamento lavori	Importo % avanz.		di cui a carico Concessionaria	
	4° S A L al 20 dicembre 1999			
	L. 5.772.499.152 59,59%		1.539.202.241 con finanz. CIPE	
			1.385.282.017 con finanz. Min. Trasporti	
(ultimo SAL emesso)				
(alla data compil. scheda)	L. 5.772.499.152 al 31 dicembre 1999		2.848.014.894 L. 139/92 e/o in autofinanziamento	
Perizie	decreto n	del	Importo	di cui a carico della Conces
1a	#	#	#	#
2a				
...				
Conto finale	appalto opere			
	penali			
	totale			
Contenzioso				
Collaudo	data	decreto n°	del	

data compilazione scheda

31-dic-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SCHEDA RIEPILOGATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DI OGNI SINGOLO INTERVENTO INFRASTRUTTURALE

Aeroporto	MARCO POLO DI VENEZIA			
Descrizione lavori	Nuova viabilità a doppio livello, a servizio della Nuova Aerostazione Passeggeri			
Progetto	Presentazione:	29-lug-98	decreto di approvazione:	08-apr-99
	Importo totale	19.562.919.700	Importo a base d'asta	19.562.919.700
Impresa esecutrice	ATI: Grandi Lavori Fincosit S.p.A./ ABB SAE-Sadelmi S.p.A.			
Procedura di gara	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 13 lettera f del D.Lgs. 17/3/95 n° 158			
Contratto	agg. provvisoria	—	stipula contratto	01-giu-99
Importo contratto	per lavori	17.500.000.000	per lavori in economia	—
Consegna lavori	data	23-giu-99	durata contratto in giorni	380
Propoghe concesse (in giorni)	proroghe	#	sospensioni	#
			nuova fine contrattuale	06-lug-00
Stato dei lavori	in corso	si	ultimati	
Stato avanzamento lavori	Importo	%	di cui a carico Concessionaria	
(ultimo SAL emesso)	1° S.A.L.	al 5 novembre 99	L. 2.633.346.682 con finanz. L. 139/92	
(alla data compil. scheda)	L. 1.500.000.000	8,11%	e/o in autofinanziamento	
Perizie	decreto n.	del	Importo	di cui a carico della Conces.
	#	#	#	#
	1a			
	2a	...	...	...
Conto finale	appalto opere penali totale			
Contenzioso				
Collaudo	data	decreto n°	del	

data compilazione scheda:


31-ago-99

PAGINA BIANCA

DIREZIONE LAVORI
NUOVA AEROSTAZIONE
E OPERE ESTERNE

7 RILIEVO FOTOGRAFICO

PAGINA BIANCA

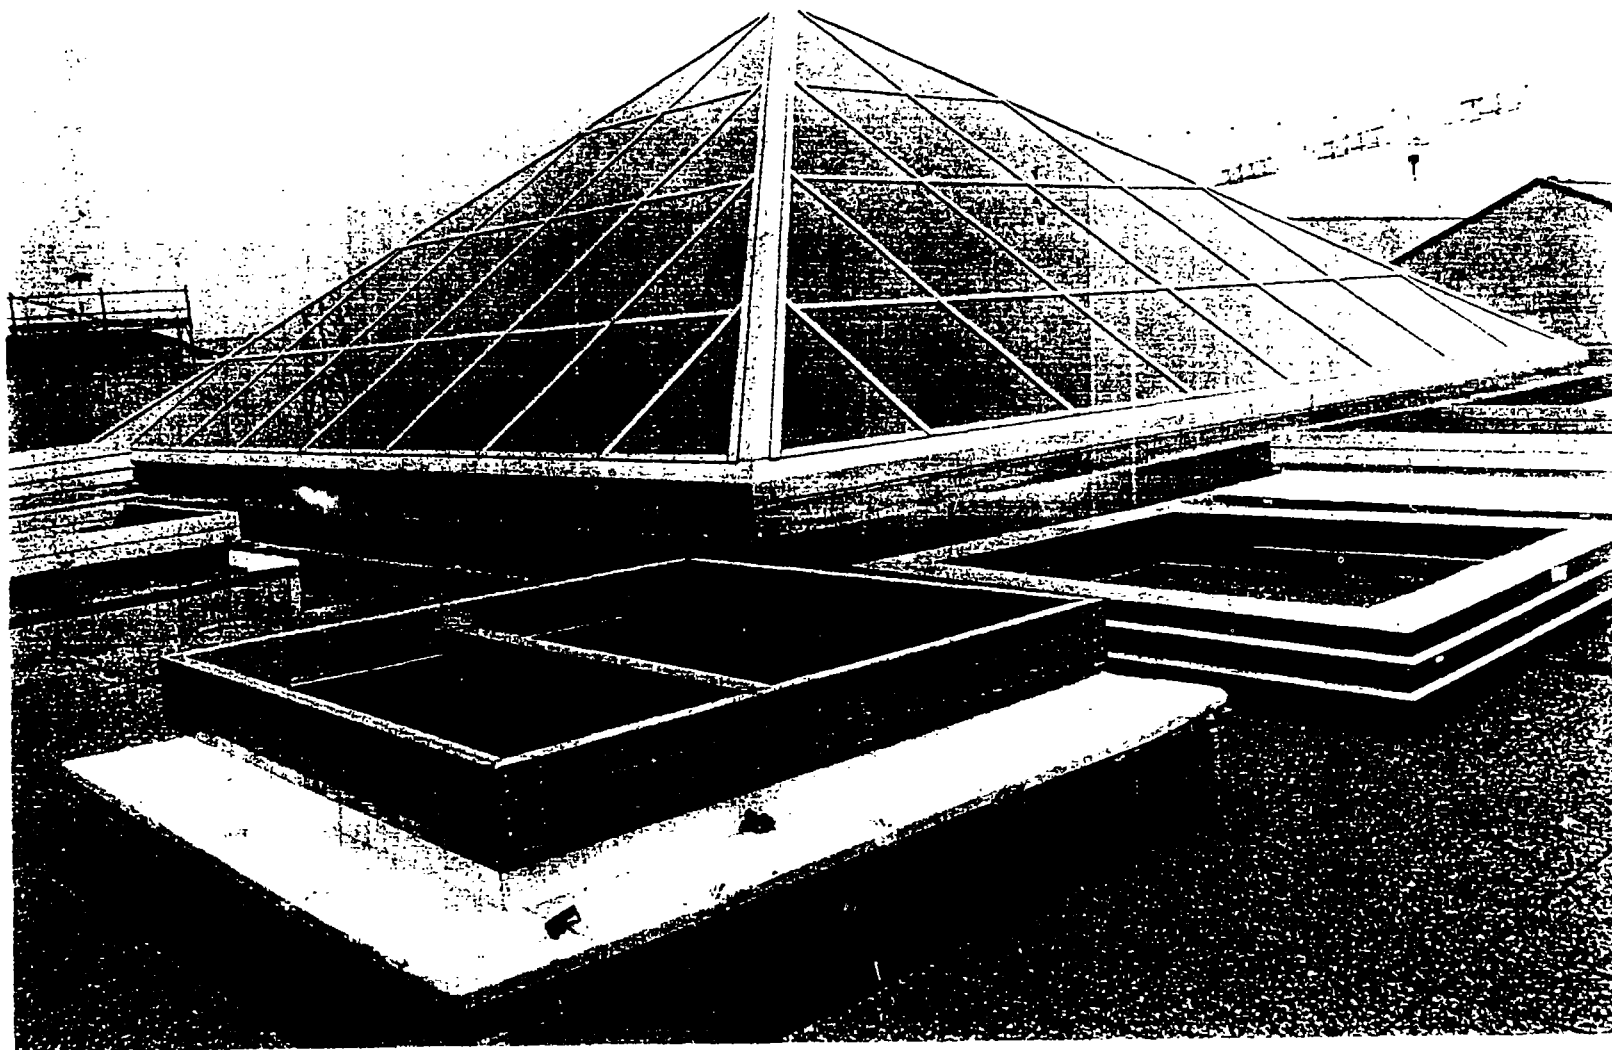

AVE Aeroporto Marco Polo S.p.a.-Nuova Aerostazione - Zona 2 quota +15,98 particolare piramide
I^{li} Grandi Lavori Fincosit S.p.a. - ABB Sae S.p.a.



AVE Aeroporto Marco Polo S.p.a.-Nuova Aerostazione – Zone 3 e 6 particolare colbentazione
Tl: Grandi Lavori Fincosit S.p.a. – ABB Sae S.p.a.
