

PROVINCIA DI VENEZIA						
SITUAZIONE CAPITOLI FINANZIATI CON LEGGE SPECIALE al 18.02.1998						
Uff. Liquidazioni Ferialdi S. - Majerle P. - Scaramella R.						
CAPITOLO	OOGETTO	FINANZIAMENTO	PROGETTI	IMPEGNATO	RESIDUI	PROT.
21.4322.00	ISOLA S.SERVOLO - INTERVENTI FINALIZZATI SALVAGUARDIA VENEZIA ANNO 1988 - L. 67/88 COOP. DI COSTRUZIONI - ABBATT. PIANTE BORDIN F. - SISTEM. PATRIMONIO ARBOREO RESIDUO DA ASSEGNARE IMPORTI LIQUIDATI RESIDUO DA LIQUIDARE	L. 67/88	500.000.000	14.479.675 114.246.080	371.274.245 128.725.755 371.274.245	22727/91 9518/94
21.4426.00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI L. 67/88 - ANNO 1990	L. 67/88	2.400.000.000			
S. SERVOLO PAL. DONA BALBI BENEDETTI S. SERVOLO	ARS IDRAULICA - ASSEGNAZIONE			100.874.800		16493/90
	CO.VE.CO. - OPERE EDILI			32.895.357		22338/87
	ARS IDRAULICA - CONVERSIONE C.T.			5.200.000		1258/91
	ARS IDRAULICA - REVISIONE PREZZI			2.985.355		30966/91
	IDROLUX - MANUT. IMP. ELETTRICO			1.047.200		19035/92
	CO.VE.CO. - REVISIONE PREZZI			5.904.545		8334/92
	VIVAI AL TAGLIAMENTO - SISTEMAZIONE AREE A VERDE			41.138.600		27947/90
	ARS IDRAULICA - OPERE DA IMPIANTISTA			96.720.000		27947/90
	CO.VE.CO.			100.880.000		27947/90
	VIO VALERIO - RESTAURO OPERE ARTISTICHE			202.800.000		27947/90
	PAVEGGIO MAURIZIO - PROGETTAZIONE			23.725.490		27947/90
	SABIEM - IMPIANTO ELEVATORE			56.888.000		27947/90
	FATME SPA - IMPIANTO TELEFONICO			78.992.330		28080/91
	CO.VE.CO. - ASSISTENZA ALLACCIAMENTO SERVIZI			12.874.104		31769/92
	CO.VE.CO. - REVISIONE PREZZI			116.355.010		36560/93
	BORDIN ROMOLO - ASSEGNAZIONE OPERE EDILI			391.000.000		8670/93
	ACCANTONAMENTO FONDO PER INDAGINI			69.000.000		2969/92
	ARS IDRAULICA - IMPIANTO TERMOIDRAULICO			64.666.596		49618/95
	R.G. IMPIANTI-SPOLADOR R. - OPERE DA ELETTRICISTA			143.077.500		49616/95
	ENEL - ALLACCIAMENTO ELETTRICO			744.325		5321/96
	MORETTO LUCIANO - DOTAZIONI TECNOLOGICHE			66.759.000		44044/96
	RIZZO LUIGI - RILIEVI E SERVICE GRAFICO			85.117.725		44044/96

CAPITOLO	OGGETTO	FINANZIAMENTO	PROGETTI	IMPEGNATO	RESIDUI	PROTE
ALGAROTTI	BOATO SNC - OPERE EDILI			257.479.478		4789/92
	MIRANO IMPIANTI - OPERE DA TERMOTECNICO			64.812.280		6092/92
	SPOLADOR R. - OPERE DA ELETTRICISTA			72.297.710		5475/92
	PASTRELLO G. - OPERE DA MARMISTA			13.470.080		18230/92
	VERNA - OPERE RESTAURO LIGNEO			4.191.200		18230/92
	VIO VALERIO - OPERE DA DECORATORE			15.277.600		18230/92
	VIO VALERIO - OPERE DI RESTAURO			28.580.864		32354/92
	SICUREZZA			1.428.000		32354/92
	RESIDUO DA ASSEGNARE				242.816.853	
	IMPORTI LIQUIDATI				2.091.645.089	
	RESIDUO DA LIQUIDARE				308.354.911	
21.4427.00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI L. 67/88	L. 67/88	700.000.000			
	R.G. IMPIANTI - OPERE DI ARREDO FISSO			18.512.000		799/94
	ECOM - IMPIANTO PER HANDICAPPATI			21.814.000		798/94
	SPOLADOR R. - IMP. AUDOFONICI			16.725.900		797/94
	CONSORZIO MARCIANO - LAVORI DA RESTAURATORE			122.720.000		24118/94
	CONSORZIO MARCIANO - SALDO LAVORI			3.800.000		7571/96
	SCHIAVINA-MORAS - OPERE EDILI			344.357.950		54973/95
	R.G. IMPIANTI - SPOLADOR R. - OPERE DA ELETTRICISTA			156.000.000		49616/95
	ENEL - ALLACCIAMENTO ELETTRICO			14.642.050		5321/96
	RESIDUO DA ASSEGNARE				1.428.100	
	IMPORTI LIQUIDATI				695.151.900	
	RESIDUO DA LIQUIDARE				4.848.100	

PROVINCIA DI VENEZIA						
SITUAZIONE CAPITOLI FINANZIATI CON LEGGE SPECIALE al 18.02.1998						
Uff. Liquidazioni Ferialdi S. - Majerle P. - Scaramella R.						
CAPITOLO	OGGETTO	FINANZIAMENTO	PROGETTI	IMPEGNATO		
21.4405.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO S.SERVOLO - L. 139/92	CREDIOP (3.904.475.965)	3.904.475.965			
	SCHIAVINA-MORAS - OPERE EDILI			3.500.000.000		24892/96
	RESIDUO DA ASSEGNARE				404.475.965	
	IMPORTI LIQUIDATI				3.499.999.999	
	RESIDUO DA LIQUIDARE				404.475.966	
21.4405.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO S.SERVOLO - L. 139/92	I.M.I. (25.000.000.000)	5.500.000.000			
	SCHIAVINA-MORAS - OPERE EDILI			3.482.379.821		54973/95
	ARS IDRAULICA - IMP. TERMOIDRAULICO			878.588.229		49618/95
	R.G. IMPIANTI-SPOLADOR - IMP. ELETTRICO			249.150.000		24898/96
	SCHIAVINA-MORAS - OPERE EDILI (SALDO)			42.728.400		24898/96
	ARS IDRAULICA - OPERE DA TERMOTECNICO			243.271.600		24898/96
	ACCANTONAMENTO FONDO OPERE COMPLEMENTARI			208.347.701		24898/96
	ACCANTONAMENTO FONDO 3° E 4° STRALCIO ESECUTIVO			250.000.000		6622/94
	RESIDUO DA ASSEGNARE				145.534.249	
	IMPORTI LIQUIDATI				4.529.938.853	
	RESIDUO DA LIQUIDARE				970.061.147	
21.4418.00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI L. 139/92 - PALAZZO CORNER	I.M.I. (25.000.000.000)	553.000.000			
	DUPLIMATIC ITALIANA			52.000.000		13841/97
	EDILMAR SRL			28.500.000		3152/96
	HIROSS NESITE			14.795.270		3163/96
	PAVAN REMO			29.750.000		12963/93
	TIOZZO G.			35.959.272		3142/96
	ACCANTONAMENTO FONDO PROVE NON DISTRUTTIVE			10.627.809		12958/93
	ACCANTONAMENTO FONDO SERVICE GRAFICO (PARTE)			122.780.700		12959/93
	ACCANTONAMENTO FONDO SERVICE GRAFICO			42.000.000		12960/93
	CREAZZA			67.864.410		12961/93
	CREAZZA			109.579.940		34259/94
	CONTE FRANCESCO			39.142.599		31017/94
	RESIDUO DA ASSEGNARE					
	IMPORTI LIQUIDATI				296.280.236	
	RESIDUO DA LIQUIDARE				256.719.764	

PAGINA BIANCA

PROGRAMMA E STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI


finanziati con

legge 5 febbraio 1992 n.139

legge 20 dicembre 1995 n.539

legge 4 ottobre 1996 n.515

legge 2 ottobre 1997 n.345



pubblicazione per conto, aggiornata al 31 dicembre 1997 a cura del
Settore Coordinamento Legge Speciale

Il presente fascicolo segnala lo stato di avanzamento degli interventi di competenza comunale finanziati con i fondi provenienti dalla legislazione speciale per Venezia e inseriti in programmi approvati con apposite deliberazioni consiliari.

Legenda

Programmato	intervento inserito in un programma approvato con deliberazione consiliare
Impegnato	: importi definiti con deliberazione degli organi competenti (giunta, consiglio comunale). L'impegno può essere assunto solo dopo l'avvenuta assegnazione da parte dello Stato con apposita Legge di spesa e la stipula del mutuo contratto sulla base dei limiti di impegno della annualità relativa
Obbligato	contratti di appalto, di compravendita, graduatorie di contributi approvate, convenzioni con terzi
Speso	: importi erogati - uscite di cassa

Fasi di avanzamento

Progettazione	comprende la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
Istruttoria appalto	comprende i tempi derivanti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici
Lavori in corso	decorrono dalla aggiudicazione alla ditta vincitrice dell'appalto
Lavori ultimati	: considerati dai verbali di ultimazione lavori

Per le voci riferite alle acquisizioni la lettura delle varie fasi va intesa nel modo seguente:

Progettazione	trattativa in corso
Istruttoria appalto	: stima del bene
Lavori in corso	: deliberazione di approvazione della stima
Lavori ultimati	: stipula dal notaio

QUADRO FINANZIARIO

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	656.891	636.025	96,82	538.403	81,96	269.492	41,03
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996	48.000	47.007	97,93	40.469	84,31	13.341	27,79
	1997	96.000	90.122	93,88	57.350	59,74	2.507	2,61
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	365.000	349.569	95,77	277.584	76,05	18.684	5,12
	1998	147.393	129.955	88,17	27.669	18,77	-	-
TOTALE		1.313.284	1.252.678	95,39	941.475	71,69	304.024	23,15


	Annualità	Programmato A
Legge 2 ottobre 1997 n. 345(*)	1998	160.000
	1999	118.000
TOTALE		278.000

(*) Gli importi e le percentuali del quadro finanziario (impegnato - obbligato - speso) e dello stato di avanzamento degli interventi non tengono conto della Legge 2 ottobre 1997 n. 345 in quanto la disponibilità per l'Amministrazione Comunale (limitata alla annualità 1998) è potuta avvenire solo dopo la data della stipula del contratto di mutuo avvenuta il 23 dicembre 1997. Il lungo iter di approvazione della Legge di spesa non ha comunque impedito all'Amministrazione Comunale di anticipare la predisposizione del programma relativo descritto alla fine del fascicolo

importi in milioni

STATO AVANZAMENTO - INTERVENTI

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
88.374	87.020	675.516	448.374
7%	7%	51%	34%

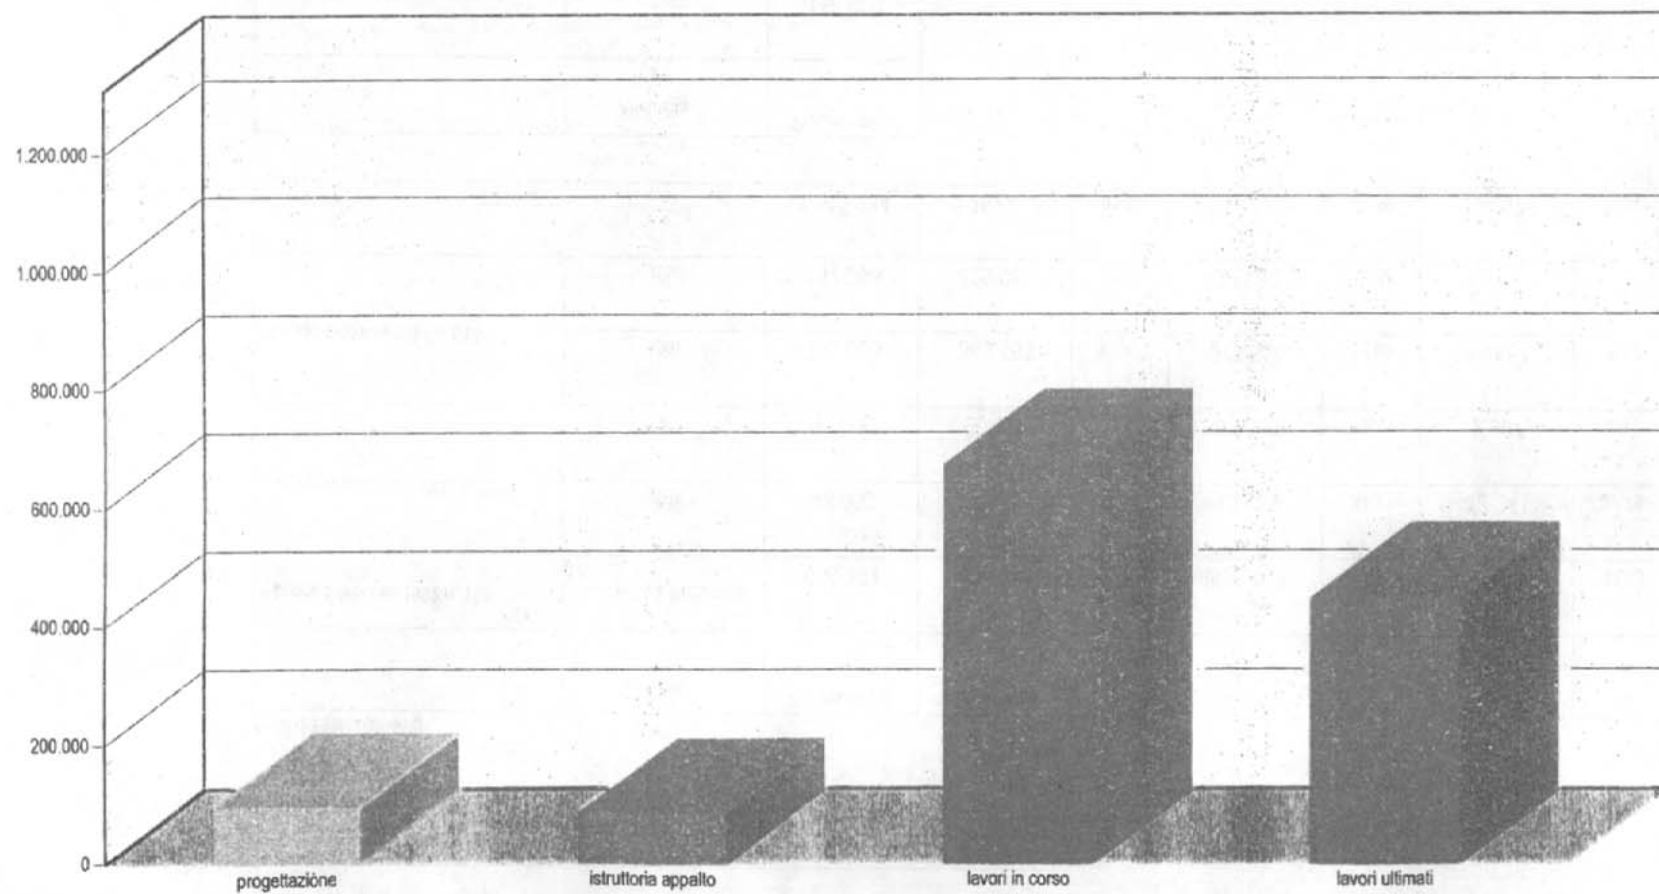

Importi in milioni

Comune di Venezia**QUADRO TEMPORALE MUTUI**

Legge 5 febbraio 1992 n. 139						Legge 20 dicembre 1995 n. 539				Legge 4 ottobre 1996 n. 515				Legge 2 ottobre 1997 n. 345					
Limite di Impegno a carico dello Stato a decorrere dall'anno						Limite di impegno a carico dello Stato a decorrere dall'anno				Limite di impegno a carico dello Stato a decorrere dall'anno				Limite di impegno a carico dello Stato a decorrere dall'anno					
1993		1994		1995		1996		1996		1997		1997		1998		1998		1999	
33		13,71		9,581		8,71		6,118		11,557		35,848		18,255		18,350		13,275	
293,035		136,4		100		100		60		98,2		304,714		166,000		190,000		133,000	
		riserva		riserva		riserva		riserva		riserva		riserva		riserva		riserva		riserva	
125,6		10,8		88		12		75		25		48		12		90		8,2	
274,714		30		147,393		18,607		160,000		30		118,000		15					
Mutuo stipulato il 22/12/1992		Mutuo stipulato il 21/07/1994		Mutuo stipulato il 9/06/1995		Mutuo stipulato il 22/12/1995		Mutuo stipulato il 24/07/1996		Mutuo stipulato il 24/07/1996		Mutuo stipulato il 30/08/1996		Mutuo stipulato il 30/07/1997		Mutuo stipulato il 23/12/1997		Mutuo da contrarre nel secondo semestre del 1998	

La riserva è una cifra prudenziale che viene accantonata e che potrà essere disponibile solo dopo i primi 5 anni dalla stipula di ogni singolo contratto di mutuo. L'ammontare è presunto e dipende dal tasso ufficiale di sconto vigente alla data della verifica e dai relativi piani di erogazione.

Per la sua indeterminatezza e la sua non immediata disponibilità non è stata conteggiata nel programma degli interventi.

importi in miliardi

Progetto integrato rii

Il progetto integrato rii oggetto di apposito accordo di programma ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 139 prende in considerazione gli interventi di scavo e smaltimento dei fanghi, le opere di sistemazione e risanamento della rete fognaria esistente e dei sottoservizi a rete, gli interventi di consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii e le opere per la difesa delle acque alte mediante la realizzazione delle "insule" in quanto opere di manutenzione urbana.

Gli interventi fanno parte di un piano organico generale che investe tutto il centro storico e le Isole per un importo di circa 1.500 miliardi e si sviluppa nell'arco di 23 anni con inizio dal 1994.

I principali obiettivi che si intende perseguire con il piano sono:

- ricambio idraulico;
- disinquinamento delle acque (risanamento igienico-sanitario)
- consolidamento statico delle strutture;
- protezione della città dalle acque medio-alte.

Il Comune di Venezia ha recentemente assegnato tale compito ad una società per azioni denominata *Insula* in cui le partecipazioni sono così suddivise: Comune di Venezia 52%; Italgas 12%; Aspiv 12%; Telecom 12%; Ismes S.p.A. (Enel) 12%.

Con la verifica dello stato di avanzamento dei lavori si sta confermando il trend positivo della attuazione del Piano Programma.

Comune di Venezia

ALCUNI INDICATORI SIGNIFICATIVI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Quantità totali individuate dal Piano

Fango da esportare per l'escavo dei rii	385.000 mc ca.
Muri sponda da consolidare (compresi i privati)	100.000 mc ca.
Numero ponti da risanare	200 ca.

Stato avanzamento

	Progettazione	In corso	Ultimati	Totale	% degli interventi sul totale del Piano
Fango mc	45.000	50.000	61.000	156.000	41%
Muri di sponda ml	8.500	11.500	10.500	30.500	131%
Ponti n.	50	30	22	102	51%

Il tempo previsto per l'esecuzione del Programma Generale è di 23 anni (1994 - 2017).

Gli interventi sono iniziati nel 1994 ed è trascorso il 17% del tempo preventivato per la realizzazione del Programma.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

(Importi in Lit./Mil. a costi costanti)

anno 1998

N°	NOME PROGETTO	IMPORTO LAVORI	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TOT 1998	TOT 1999	TOT 2000	TOT ANNI SUCCESSIVI
INTERVENTI																		
INTERVENTI INTEGRATI (INSULAE) - AREA PUBBLICA																		
1	Santa Maria Formosa - 1ª fase	9.048			1.204			1.204			1.204			1.204	4.817	3.237	0	0
2	Frari - 1ª fase	8.338			1.048			1.048			1.048			1.048	4.192	2.819	0	0
3	Ghetto - 1ª fase	9.381			1.481			1.481			1.481			1.481	5.846	998	0	0
4	Murano-1ª fase(1ª lotto Navagero)	9.092			1.428			1.428			1.428			1.428	5.713	26	0	0
5	S. Giovanni in Bragora - 1ª fase	9.264		388								385	385	385	1.541	4.621	3.101	0
6	Ghetto - 2ª fase (Chiovere)	11.001									457	457	457	457	1.829	5.488	3.684	0
7	S. Stefano - 1ª fase	5.180				50			152						202	4.203	776	0
8	S. Trovaso - 1ª fase	9.627				100			282						382	4.832	4.414	0
9	S. Maria Mater Domini - 1ª fase	5.913											50		50	1.687	4.163	13
10	S. Felice/SS. Apostoli - 1ª fase	9.627													0	382	5.341	3.905
11	S. Martino - 1ª fase	9.627													0	382	5.341	3.905
12	S. Giacomo dell'Orto - 1ª fase	2.228													0	95	2.134	0
13	Burano (Acc. Progr.)	42.241													200	1.404	7.295	33.342
14	Pellestrina -S. P. in Volta 1 - collettore	5.460				202								477	1.155	4.305	0	0
15	Pellestrina - S. P. in Volta 2	19.537													0	2.741	6.485	10.311
16	Pellestrina - Sestiere Scarpa	11.747													348	5.933	5.439	26
17	Tolentini Studi	100		20	20	20	20	20							100	0	0	0
18	Tolentini -Consorzio Venezia Nuova	1.200		67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	733	467	0	0
19	Rialzo pavimentazioni - Primi Interventi	2.236		23	23	23					80	0	0	207	447	1.789	0	0
20	Rialzo pavimentazioni - Altri Interventi	2.256						30	30	30					90	2.166	0	0
21	Altre Insulae - 1ª fase	14.000													0	400	2.288	11.312
22	Altre Insulae - 2ª fase	14.000													0	0	802	13.198
A	TOT. INTERV. INTG. AREA PUBBL. TOTALE GENERALE	211.099	0	488	5.252	462	117	5.807	530	87	5.748	909	1.438	6.825	27.646	47.975	51.260	76.013

INTERVENTI DIFFUSI E VARI

23	S. Michele - Ampliamento	4.486	0	628	COLL	12										640	0	0	0
24	Burano - 1ª fase - 1° Lotto	2.165	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	COLL	6		1.564	0	0	0
25	F.ta Venier	5.199					324	324	324	324	324	324	324	324		2.594	2.806	0	0
26	Interventi diffusi puntuali - Altre tranches	3.225			65								130	130	130	503	1.629	1.093	0
27	Scavi preliminari a umido	2.347		87						84	84	84	84	84		556	1.127	664	0
28	F.ta Rio di S. Croce (Giudecca)	1.848						264	264	264	264	264	264	264		1.845	4	0	0
29	Murano rest. ponti - Ponte ex Vivarini	352			13									113	113	238	114	0	0
30	Murano rest. ponti - Ponte Abate Zanetti/S. Martino	1.361			50								261	261	261	834	527	0	0
31	Ponte Zanol e F.ta S. Mattia (Murano)	1.406					52									52	1.352	4	0
32	Ponte dell'Arsenale	1.173			43										161	204	969	0	0
33	Ponte dell'Accademia	656				0	0	228	0	0	0	228	COLL	4		656	0	0	0
34	Ponte dei Pennini (Castello)	235				0							45	45	45	144	91	0	0
35	Rimessaggio barche	293			11								84	84	84	293	1	0	0
36	Riva Via Candia (Lido)	4.984		147									264	264	264	999	3.406	579	0
37	F.ta Radi/Tiepolo (Murano)	2.638			78								365	365	365	1.173	1.466	0	0
38	F.ta Rio di Ponte Lungo (Giudecca)	2.134											304	304	304	912	1.221	0	0
39	F.ta S. Biagio	3.664													198	108	3.548	8	0
40	F.ta di Rio della Tana	879														0	537	343	0
41	F.ta di S. Chiara	6.731														0	792	5.939	0
42	Canal Grande - Prog. Prelim. e Indiv. Interv.	400		100	100	100	100									400	0	0	0
43	Rialto - 1	3.049						438	438	438	416	416	416	416		2.971	78	0	0
44	Rialto - 2	5.928										145				145	5.543	0	0
45	Altri interventi diffusi e vari	7.105														0	208	6.881	COLL 16
B	TOTALE INTERV. DIFFUSI E VARI	62.256	173	1.138	664	285	667	1.523	1.197	1.291	1.742	2.821	2.882	2.906		16.975	25.308	15.510	16
C	TOTALE INTERVENTI (A+B)	273.355	173	1.631	5.816	740	783	7.330	1.727	1.358	7.488	3.540	4.298	9.730		44.621	73.283	66.770	76.028

PRIVATI EXTRA-INSULAE E O.T.

	Contributi erogati	5.901	0	10	10	10	10	27	27	27	40	84	84	84	421	1.371	1.894	2.216
	Importo lavori sui privati	8.047	0	13	13	13	20	37	37	37	55	115	115	115	574	1.869	2.582	3.021
	Progettazioni e D. L. privati	3.301	0	5	5	5	11	15	15	15	23	47	47	47	236	767	1.059	1.240
D	PRIVATI EXTRA-INSULAE E O.T.	11.349	0	18	18	18	37	52	52	52	78	182	182	182	810	2.636	3.642	4.261

E	TOTALE INTERV. PUBBL. E PRIV.	284.704	173	1.850	5.834	785	820	7.392	1.779	1.410	7.565	3.782	4.459	9.891	45.431	75.919	70.412	80.289
----------	--------------------------------------	----------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ATTIVITA' DI SUPPORTO

F	TOTALE ATTIVITA' DI SUPPORTO	1.400	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	550	550	0
----------	-------------------------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	----------

SISTEMA PER LA MANUTENZIONE URBANA

G	TOTALE SIST. MAN. URB.	4.499	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1.384	1.384	1.384	0
----------	-------------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	----------

H	TOTALE ALTRE ATTIVITA' (F+G)	5.899	115	115	115	115	115	115	115	415	115	115	115	115	1.684	1.934	1.934	0
----------	-------------------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	----------

I	TOTALE GENERALE (E+F+G)	290.603	288	1.765	5.950	880	936	7.408	1.895	1.825	7.881	3.817	4.575	10.007	47.115	77.853	72.346	80.289
----------	--------------------------------	----------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

L	I.V.A.	58.121	58	353	1.180	178	187	1.500	378	385	1.538	783	815	2.001	9.423	15.571	14.469	16.058
----------	---------------	---------------	-----------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------


M	TOTALE I.V.A. COMPRESA	348.723	346	2.118	7.138	1.058	1.123	8.907	2.273	2.190	9.217	4.661	5.400	12.008	56.538	93.424	86.815	96.347
----------	-------------------------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NOTE

- 1) Tutti gli IMPORTI sono al lordo del ribasso d'asta e al netto della remunerazione da contratto
- 2) L'importo lavori è comprensivo dell'anno 1997 per le commesse di cui ai numeri 1,2,3,4 e 23,24
- 3) Gli importi totali per l'anno 2000 e per gli anni successivi, sono relativi solo alle commesse attivate nel triennio di piano.
- 4) Gli importi evidenziati in blu ed in corsivo sono stime

LEGENDA

Indagini preliminari
Progettazione
Approvazione
Appalto
Esecuzione
Collaudo




COLL

INSULA S.p.a. - Società per la manutenzione urbana di Venezia
Dorsoduro n° 2050 - 30123 Venezia
Tel. 041/2724242 - Fax 041/2724244

**PIANO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI INTEGRATI
PER LA MANUTENZIONE DEI RII, IL RISANAMENTO IGIENICO
ED EDILIZIO DI VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE**

AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NEL CENTRO STORICO

PLANIMETRIA INDICATIVA

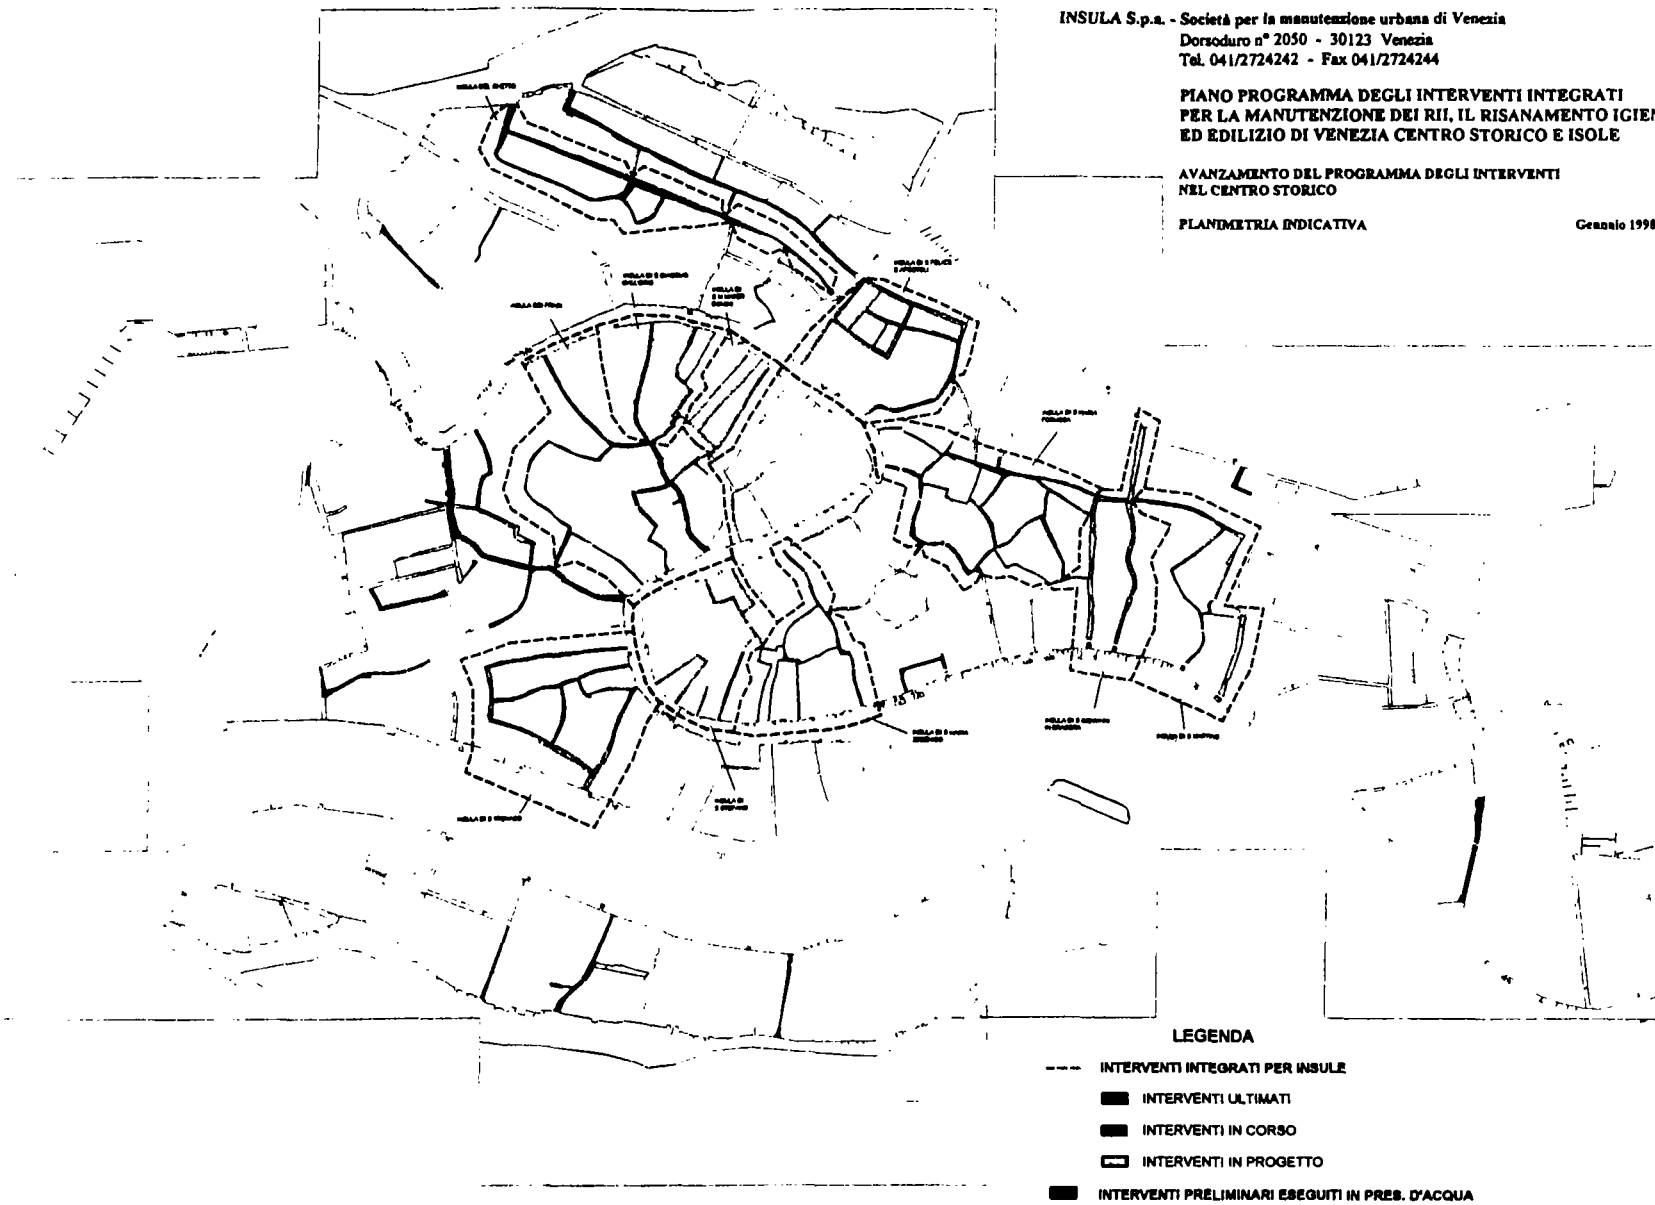Genajo 1998

Comune di Venezia

QUADRO FINANZIARIO - PROGETTO INTEGRATO RII


Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	175.566	164.337	93,60	128.162	73,00	27.572	15,70
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996							
	1997							
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	3.357	2.747	81,83	1.172	34,91		
	1998	27.000	26.520	98,22				
TOTALE (*)		205.923	193.604	94,02	129.334	62,81	27.572	13,39

(*) - L'importo totale è comprensivo del Contributo Regionale

STATO AVANZAMENTO - INTERVENTI Progetto integrato rii

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
32.319	10.000	130.632	27.572
16%	5%	63%	13%

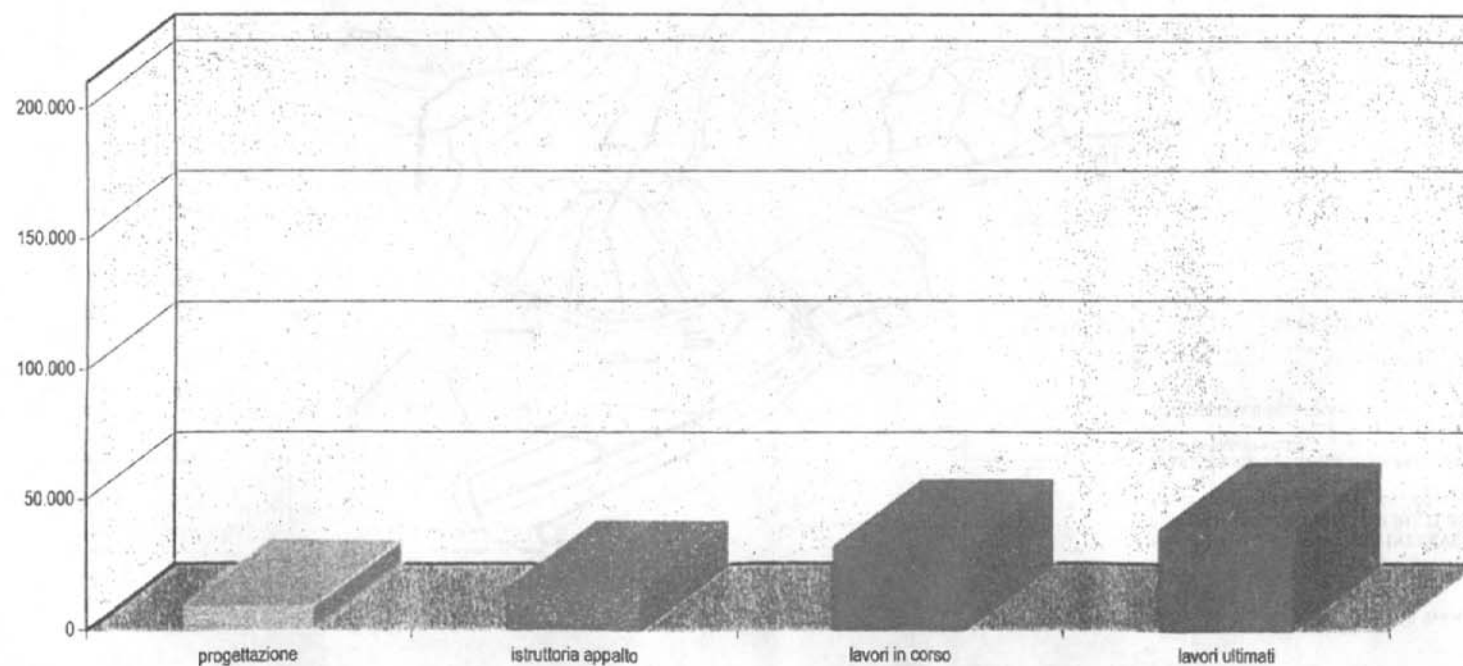

importi in milioni
