

Santa Croce Cà Pesaro 20

Intervento manutentivo, conservativo e messa a norma degli impianti, su edificio di valore storico monumentale.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		7.878

Santa Croce Palazzo Mocenigo 21

Intervento manutentivo, conservativo e messa a norma degli impianti, su edificio di valore storico monumentale.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			554

San Polo Casa Goldoni 22

Intervento manutentivo, conservativo e messa a norma degli impianti, su edificio di valore storico monumentale.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		3.900

Lido Palazzo del Cinema 23

Intervento di manutenzione e messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.702

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.027	1.027	366	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	6.851	6.851	6.791	27
	1998				
TOTALE		7.878	7.878	7.157	27

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	554	554	432	432
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		554	554	432	432

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	3.900	3.657	378	164
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		3.900	3.657	378	164

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.056	1.056	979	979
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	309	309	309	309
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	337	337		
	1998				
TOTALE		1.702	1.702	1.288	1.288

Comune di Venezia

Murano Palazzo Giustiniani 24

Intervento manutentivo, conservativo e messa a norma degli impianti, su edificio di valore storico monumentale. - Museo Vetroio

Progettazione	Istruttoria appalto	Lavori in corso
		3.421

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	921	921	482	144
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.500	2.500	433	
	1998				
TOTALE		3.421	3.421	915	144

QUADRO FINANZIARIO - CULTURA

Comune di Venezia


Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	36.690	36.452	99,35	28.526	77,75	21.244	57,90
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996	1.080	1.080	100,00	1.068	98,89	382	35,37
	1997	8.203	7.703	93,90	7.703	93,90	553	6,74
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	147.534	145.596	98,69	137.035	92,88	2.854	1,93
	1998	31.636	31.636	100,00	22.630	71,53		
TOTALE		225.143	222.467	98,81	196.962	87,48	25.033	11,12

STATO AVANZAMENTO - CULTURA (*)

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
4.006	14.851	165.532	40.754
3%	7%	74%	18%

(*) - tutti gli interventi sono soggetti a vincolo ai sensi della Legge 1089/39

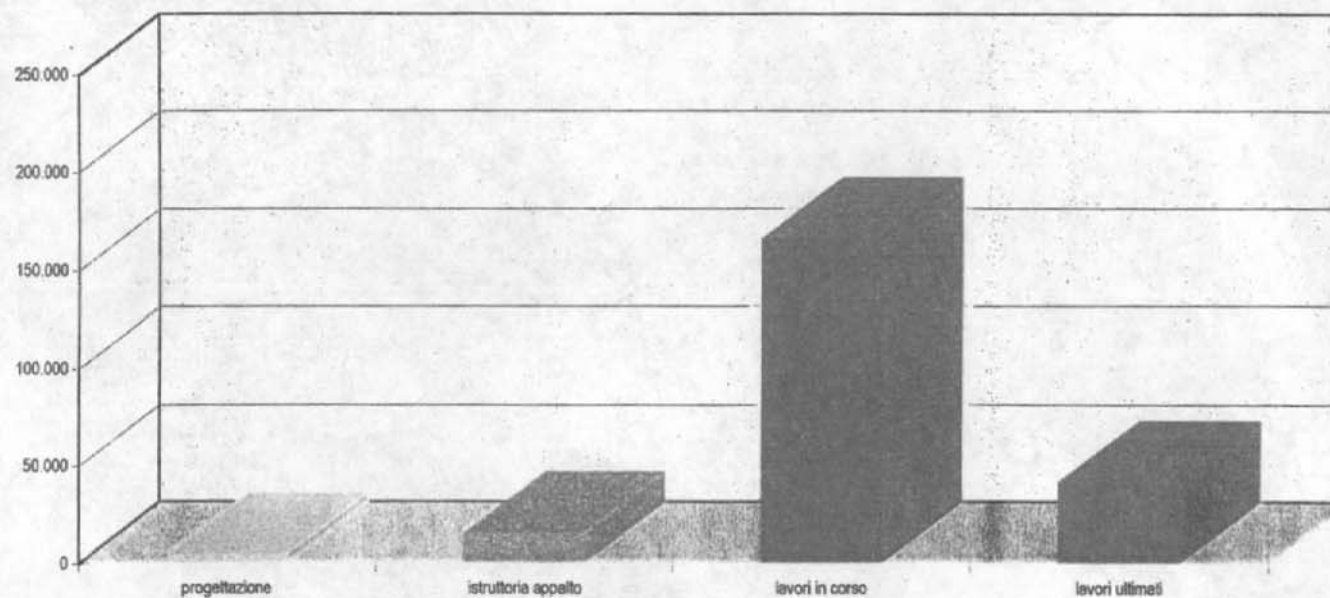

importi in milioni



Castello Ex Convento S. Giovanni-laterano (Ist. Turistico Barbarigo) 1

Intervento manutentivo e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale (legge 1089/39).

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		9.380

Castello Palazzo Barbarigo (Ist. Professionale per il Commercio) 2

Intervento manutentivo e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale (legge 1089/39).

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		2.285

Cannaregio San Girolamo (Istituto d'arte) 5

Intervento manutentivo e messa a norma degli impianti. (EdilVenezia)

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		400

Cannaregio Palazzo Nani (Complesso scolastico Caboto) 5

Intervento di restauro e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale (legge 1089/39).

progettazione	istruttoria appalto
	7.458

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.019	2.019	2.019	439
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	570	570	570	
	1997	6.791	6.791	6.791	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		9.380	9.380	9.380	439

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.285	1.581	1.026	280
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.285	1.581	1.026	280

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	400	400	249	249
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		400	400	249	249

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	500	500	44	44
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	3.580	3.580		
	1997	2.622	2.622		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	756	756		
	1998				
TOTALE		7.458	7.458	44	44

Lido	San Giovanni Bosco	10
------	--------------------	----

Intervento di manutenzione e alle cucine per pluriservizi nelle scuole.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.000

Pellestrina	Scuola Media Loredan	11
-------------	----------------------	----

Nuova edificazione nel sito della precedente scuola media.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			2.656

Murano	Asilo nido Principessa M. Letizia	12
--------	-----------------------------------	----

Restauro manutentivo e messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			658

Burano	Scuola elementare Di Cocco	13
--------	----------------------------	----

Restauro manutentivo e messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			774

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.000	1.000	779	446
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.000	1.000	779	446

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.555	2.555	2.555	2.533
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	111	111		
	1998				
TOTALE		2.666	2.666	2.555	2.533

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	625	625	555	555
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	33	33		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		658	658	555	555

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	774	774	774	681
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		774	774	774	681

Comune di Venezia

Punta Sabbioni	Costruzione aula polivalente	14
----------------	------------------------------	----

Nuova edificazione per uso multidisciplinare.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.224

Manutenzione straordinaria e diffusa (NOP, CEI)	
---	--

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	4.190	6.855	5.587

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.224	1.223	1.214	1.165
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.224	1.223	1.214	1.165

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	9.128	8.727	4.717	3.952
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	100	100	100	86
	1997	3.214	3.125	303	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	4.053	3.869	467	100
	1998	137	137		
TOTALE		16.632	15.958	5.587	4.138

QUADRO FINANZIARIO - SCUOLA


STATO AVANZAMENTO - SCUOLA

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
11.648	18.920	11.909	
27%	45%	28%	

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	20.510	19.404	94,61	13.932	67,93	10.344	50,43
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996	4.250	4.250	100,00	670	15,76	86	2,02
	1997	12.660	12.571	99,30	7.094	56,03		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	4.920	4.736	96,26	467	9,49	100	2,03
	1998	137	137	100,00				
TOTALE		42.477	41.098	96,75	22.163	52,18	10.530	24,79

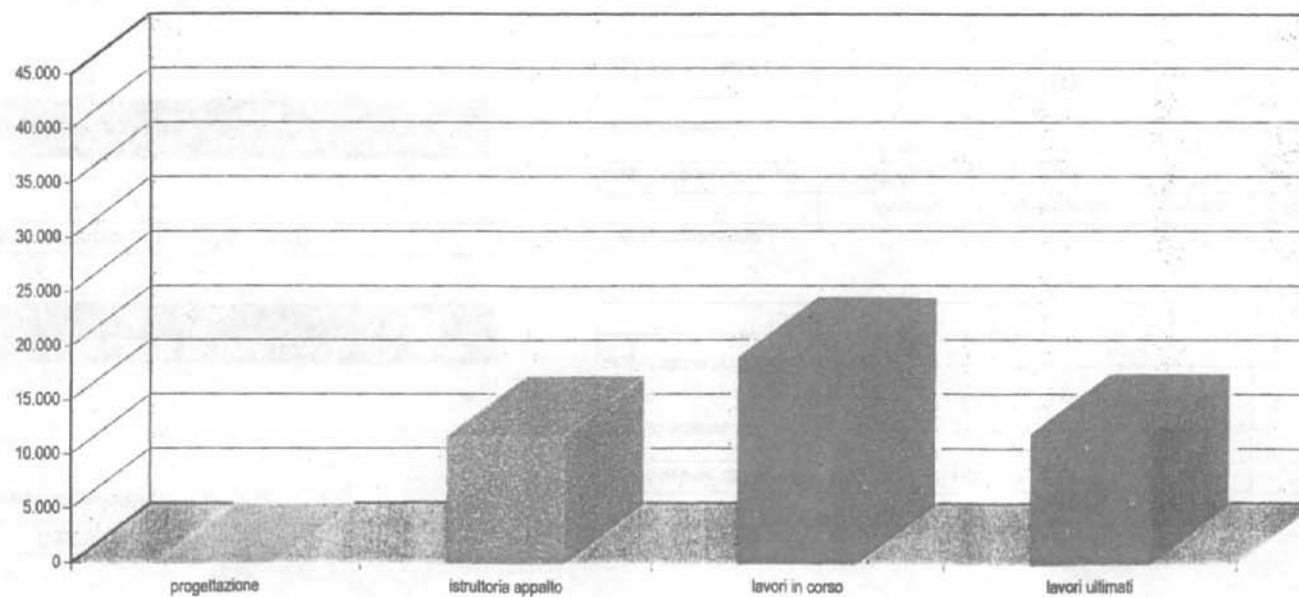

importi in milioni

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Comune di Venezia

Castello Palasport Arsenal

Messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			850

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	850	850	775	598
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		850	850	775	598

Cannaregio Centro Sportivo Sant'Alvise

Nel rispetto delle preesistenti architetture l'intervento prevede la realizzazione di un impianto natatorio, attrezzature sportive varie e di ricreazione.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		2.770	10.126

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	6.602	6.602	6.593	3.359
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	2.598	2.598	2.598	492
	1997	1.322	1.322		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.160	1.160	935	
	1998	1.214	1.214		
TOTALE		12.896	12.896	10.126	3.851

Cannaregio Remiere

Nuova costruzione capannone. Ricovero imbarcazioni.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		3.400

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	800	800	800	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	2.168	2.168	1.991	60
	1997	432	432	432	200
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		3.400	3.400	3.223	260

Cannaregio Opera Pia Coletti

Ristrutturazione impianti sportivi esistenti.

progettazione
1.500

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	1.500	1.500	1.500	
TOTALE		1.500	1.500	1.500	

Giudecca **Complesso Sportivo Sacca San Biagio** 5

Il progetto prevede attrezzature per una pluralità di discipline. Oltre alla piscina già in uso sono previsti ricoveri per imbarcazioni, campi da tennis, bocciodromo e opere di urbanizzazione.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		7.917

Giudecca **Remiere ex CNMOV** 6

Restauro su immobile per ricovero imbarcazioni.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		2.705

Lido **Bocciodromo** 7

Ristrutturazione e messa a norma dell'impianto.

progettazione
88

Lido **Palestra Terre Perse** 8

Manutenzione e messa a norma dell'impianto.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			837

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	5.755	5.755	4.940	311
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	1.000	1.000	1.000	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.162	1.162	1.000	
	1998				
TOTALE		7.917	7.917	6.940	311

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.705	1.705	1.105	81
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	1.000	1.000	429	58
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.705	2.705	1.534	139

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	88	88		
	1998				
TOTALE		88	88		

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	837	837	824	755
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		837	837	824	755

Lido Pattinodromo Quattro Fontane 9

Ristrutturazione e messa a norma dell'impianto.

progettazione	istruttoria appalto
	2.500

Lido Campo da calcio Quattro Fontane 10

Manutenzione e messa a norma dell'impianto.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			600

Lido Campo da calcio e rugby Terre Perse 11

Manutenzione e messa a norma dell'impianto.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		471

Lido Piscina 12

Nuova edificazione di impianto sportivo natatorio.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		7.894

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.500	2.500	6	6
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.500	2.500	6	6

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	600	600	600	590
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		600	600	600	590

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	471			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		471			

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	3.506	3.506	3.506	425
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	4.388	4.388	4.388	
	1998				
TOTALE		7.894	7.894	7.894	425

Pellestrina Centro Sportivo 13

Manutenzione degli impianti esistenti.

progettazione	istruttoria appalto
	1.050

Pellestrina S. Pietro in Volta - Centro polisportivo 14

Realizzazione di un campo da calcio, tennis e palazzetto polifunzionale.

progettazione
1.000

Murano Centro Sportivo San Mattia 15

Intervento di ristrutturazione, manutenzione e messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		2.826

Murano Palestra L. Perjano 16

Intervento di manutenzione e messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.420

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	600	600		
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	225	225		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	225	225		
	1998				
TOTALE		1.050	1.050		

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	1.000	1.000	190	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	3.000	3.000		
TOTALE		4.000	4.000	190	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.715	2.715	2.376	110
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	111	111		
	1998				
TOTALE		2.826	2.826	2.376	110

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.420	1.420	1.246	1.199
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.420	1.420	1.246	1.199

Comune di Venezia

17 Sant'Erasmo Remiere

Nuova costruzione capennone. Ricovero imbarcazioni.

progettazione
1.500

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	1.500			
TOTALE		1.500			

18 Burano Mazzorbo - Palestra

Progetto di nuova edificazione di un palazzetto polifunzionale.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			6.057

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	4.000	4.000	3.632	3.632
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	257	257	200	200
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.800	1.800	1.593	
	1998				
TOTALE		6.057	6.057	5.425	3.832

19 Burano Mazzorbetto - Centro sportivo

Realizzazione di un campo da calcio e strutture polifunzionali.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.286

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.000	1.000		
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	286	266		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.286	1.266		

20 Burano Remiere

Acquisizione immobile per ricovero imbarcazioni.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.252

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	1.252	1.244	1.244	1.244
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.252	1.244	1.244	1.244

Comune di Venezia

Manutenzioni straordinarie e diffuse

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		1.344	3.037

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	3.975	3.975	3.037	2.831
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	75			
	1997	114			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	217			
TOTALE		4.381	3.975	3.037	2.831

QUADRO FINANZIARIO - SPORT


Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	36.865	36.865	100,00	29.440	79,86	13.897	37,70
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996	6.350	6.267	98,69	6.033	95,01	1.996	31,43
	1997	5.850	5.245	89,66	2.051	35,06	258	4,41
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	8.934	8.934	100,00	7.916	88,61		
	1998	7.431	5.714	76,89	1.500	20,19		
TOTALE		65.430	63.025	96,32	46.940	71,74	16.151	24,88

STATO AVANZAMENTO - SPORT

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
7.045	3.550	30.613	24.179
11%	5%	47%	37%

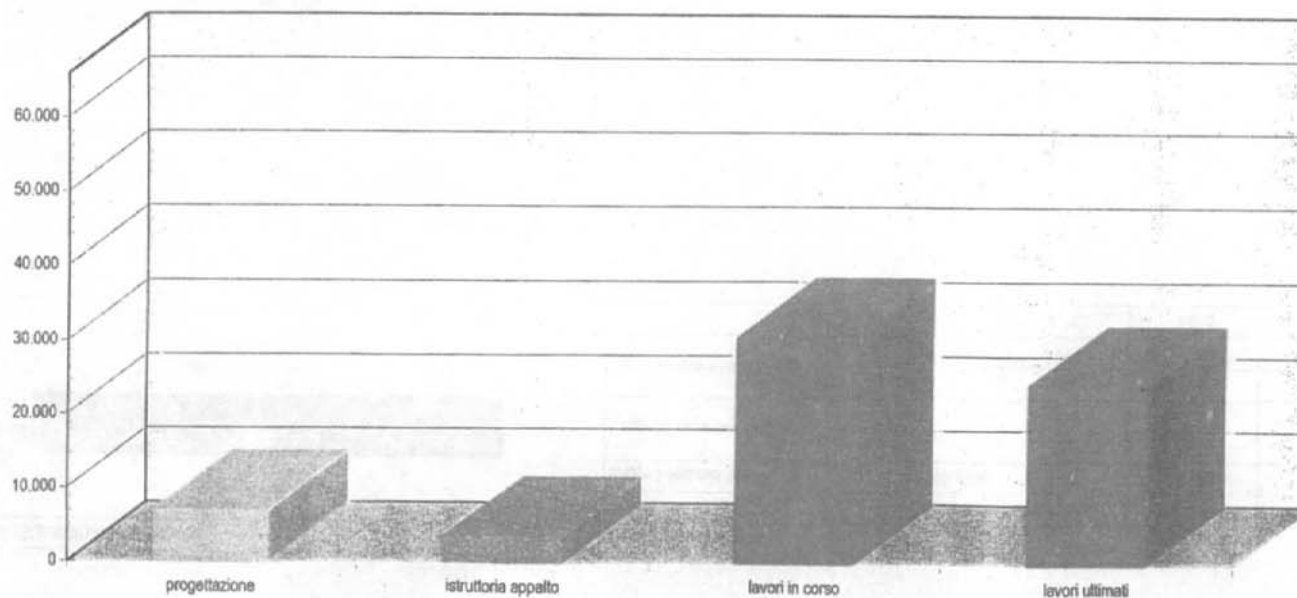

importi in milioni
