


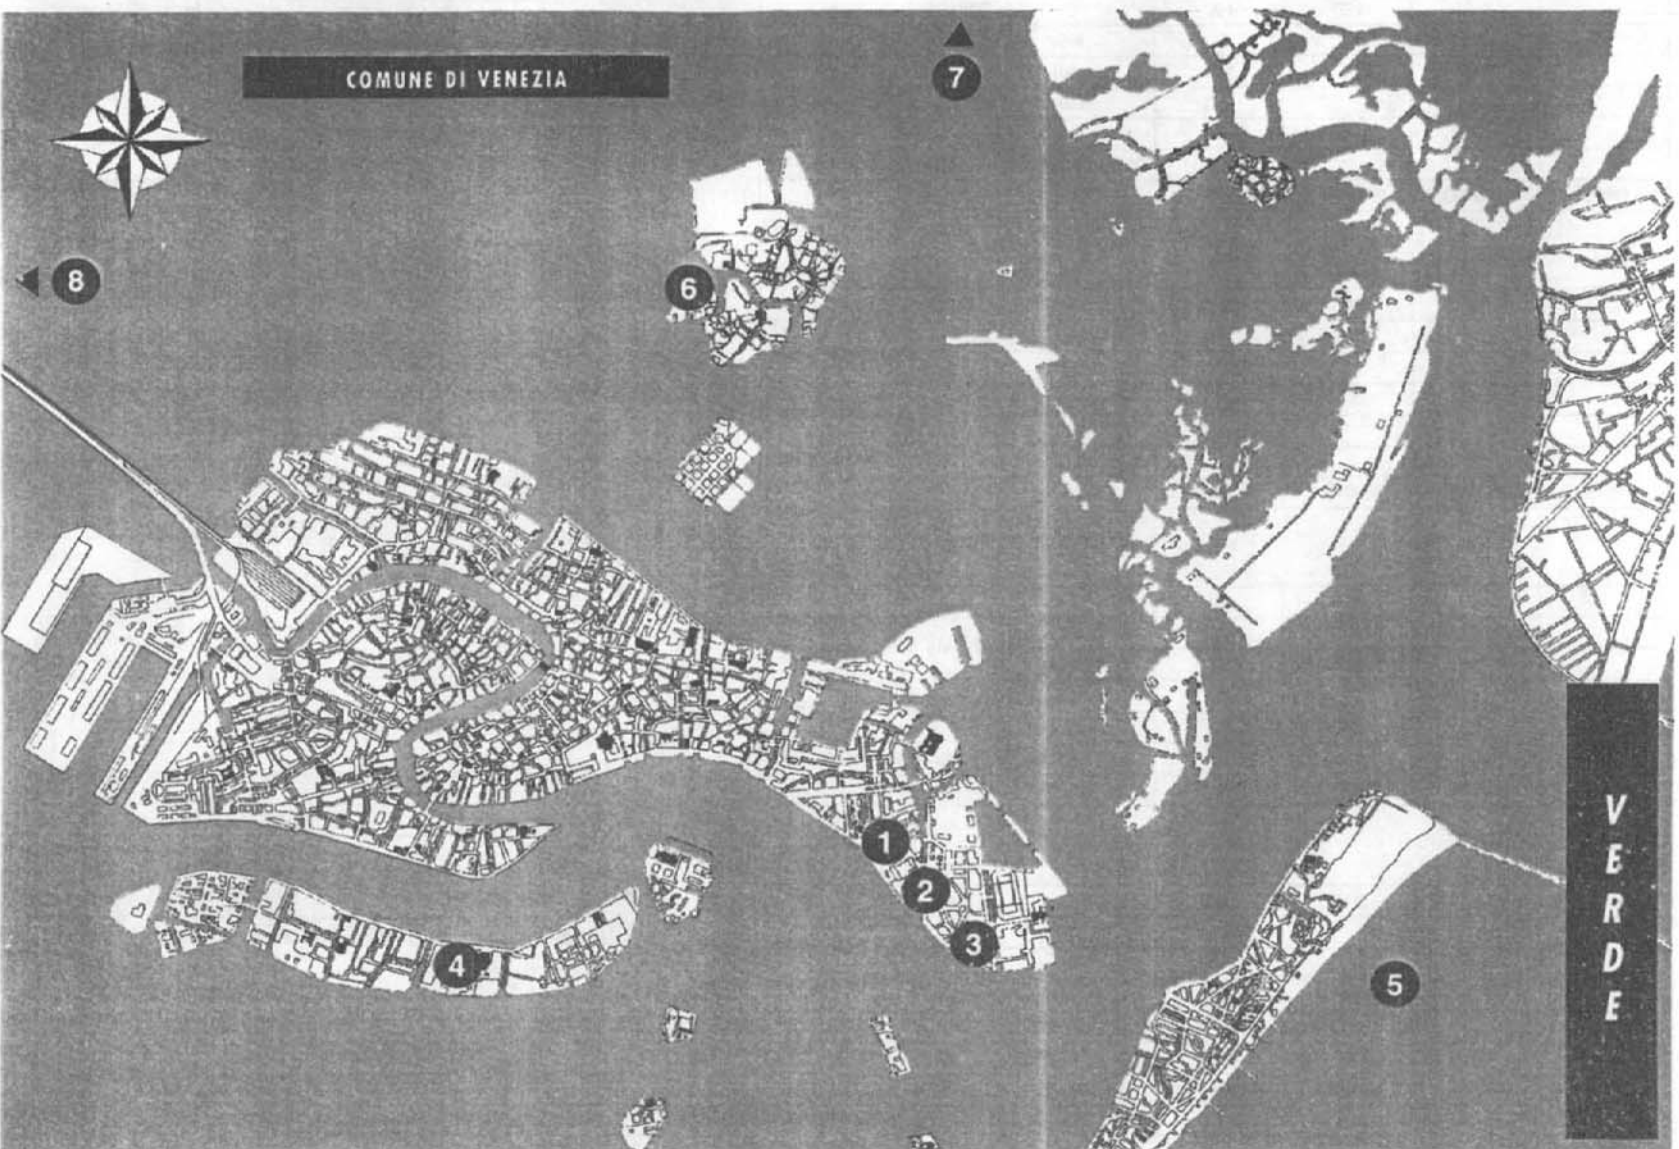

Comune di Venezia

Castello	Giardini	1
----------	----------	---

Il progetto prevede la risistemazione della viabilità interna e delle essenze arboree.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			2.147

Castello	Serra Giardini	2
----------	----------------	---

Intervento di manutenzione e restauro del manufatto risalente alla fine dell'ottocento.

progettazione
780

Sant'Elena	Sant'Elena - Pineta	3
------------	---------------------	---

Il progetto interessa la manutenzione dell'area verde e della viabilità interna.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.088

Giudecca	Parco San Giacomo	4
----------	-------------------	---

Intervento di manutenzione e sistemazione dell'arredo.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		354

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.666	1.666	1.439	1.439
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	481	481	436	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.147	2.147	1.875	1.439

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	83	83		
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	280	280		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	278	278		
	1998	149	149		
TOTALE		790	790		

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	1.088	1.088	959	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.088	1.088	959	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	354	354	310	
	1998				
TOTALE		354	354	310	

Lido **Area ex Luna Park e Planetario** **5**

Intervento di manutenzione dell'area verde e restauro dei manufatti.

progettazione
100

Murano **Area verde PEEP San Donato** **6**

Intervento di manutenzione e di arredo urbano.

progettazione istruttoria appalto
500

Burano **Mazzorbo - Parco** **7**

Intervento di manutenzione e di arredo urbano.

progettazione
492

San Giuliano **Realizzazione Parco San Giuliano** **8**

L'area interessata dal progetto è pari a 700 ettari.
L'articolato progetto, in parte finanziato dalla Comunità Europea (URBAN), prevede la creazione di aree verdi, ricreative, associative e infrastrutture.

progettazione istruttoria appalto lavori in corso
10.751

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	100	100	90	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		100	100	90	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	500	499	499	
	1998				
TOTALE		500	499	499	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	492	492		
	1998				
TOTALE		492	492		

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.951	1.951	1.951	474
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	5.849	5.849	5.849	
	1998	2.951	2.951	2.951	
TOTALE		10.751	10.751	10.751	474

TOTALTE		1981	1982	1983	1984
Legge 4 ottobre 1980 n. 212	1980				
	1981	388	180	18	
Legge 30 dicembre 1982 n. 186	1981	322	322		
	1980				
Legge 2 febbraio 1985 n. 130	1983-1984 1982-1980	854	854	582	582
	gruppi	Programmi	Impedimenti	Opposizioni	Spese

Long de l'enseignement

Continued on page 10

1398	311
1399	312
1400	313
1401	314
1402	315
1403	316
1404	317
1405	318
1406	319
1407	320
1408	321
1409	322
1410	323
1411	324
1412	325
1413	326
1414	327
1415	328
1416	329
1417	330
1418	331
1419	332
1420	333
1421	334
1422	335
1423	336
1424	337
1425	338
1426	339
1427	340
1428	341
1429	342
1430	343
1431	344
1432	345
1433	346
1434	347
1435	348
1436	349
1437	350
1438	351
1439	352
1440	353
1441	354
1442	355
1443	356
1444	357
1445	358
1446	359
1447	360
1448	361
1449	362
1450	363
1451	364
1452	365
1453	366
1454	367
1455	368
1456	369
1457	370
1458	371
1459	372
1460	373
1461	374
1462	375
1463	376
1464	377
1465	378
1466	379
1467	380
1468	381
1469	382
1470	383
1471	384
1472	385
1473	386
1474	387
1475	388
1476	389
1477	390
1478	391
1479	392
1480	393
1481	394
1482	395
1483	396
1484	397
1485	398
1486	399
1487	400
1488	401
1489	402
1490	403
1491	404
1492	405
1493	406
1494	407
1495	408
1496	409
1497	410
1498	411
1499	412

Mantenimento e assistenza straordinaria

QUADRO FINANZIARIO - VERDE


Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	4.524	4.524	100,00	3.685	81,45	2.208	48,81
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996							
	1997	2.304	2.204	95,66	1.485	64,45		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	7.861	7.668	97,54	6.674	84,90		
	1998	3.100	3.100	100,00	2.951	95,19		
TOTALE		17.789	17.496	98,35	14.795	83,17	2.208	12,41


STATO AVANZAMENTO - VERDE

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
1.382	500	13.449	2.458
6%	3%	76%	14%

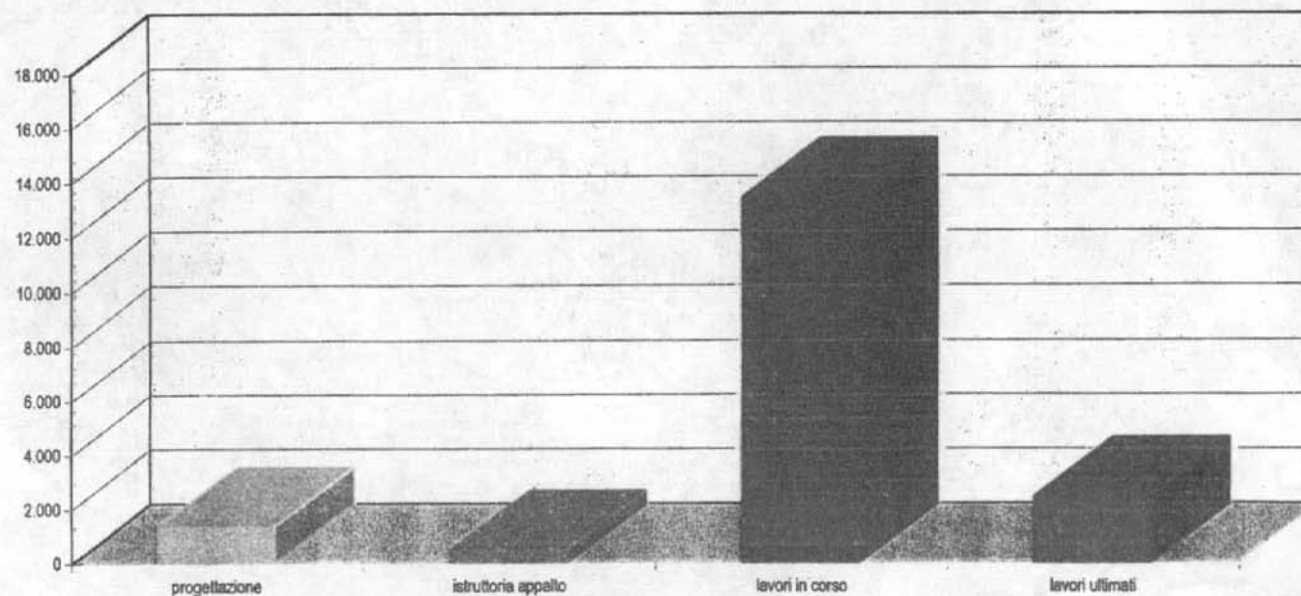

importi in milioni

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

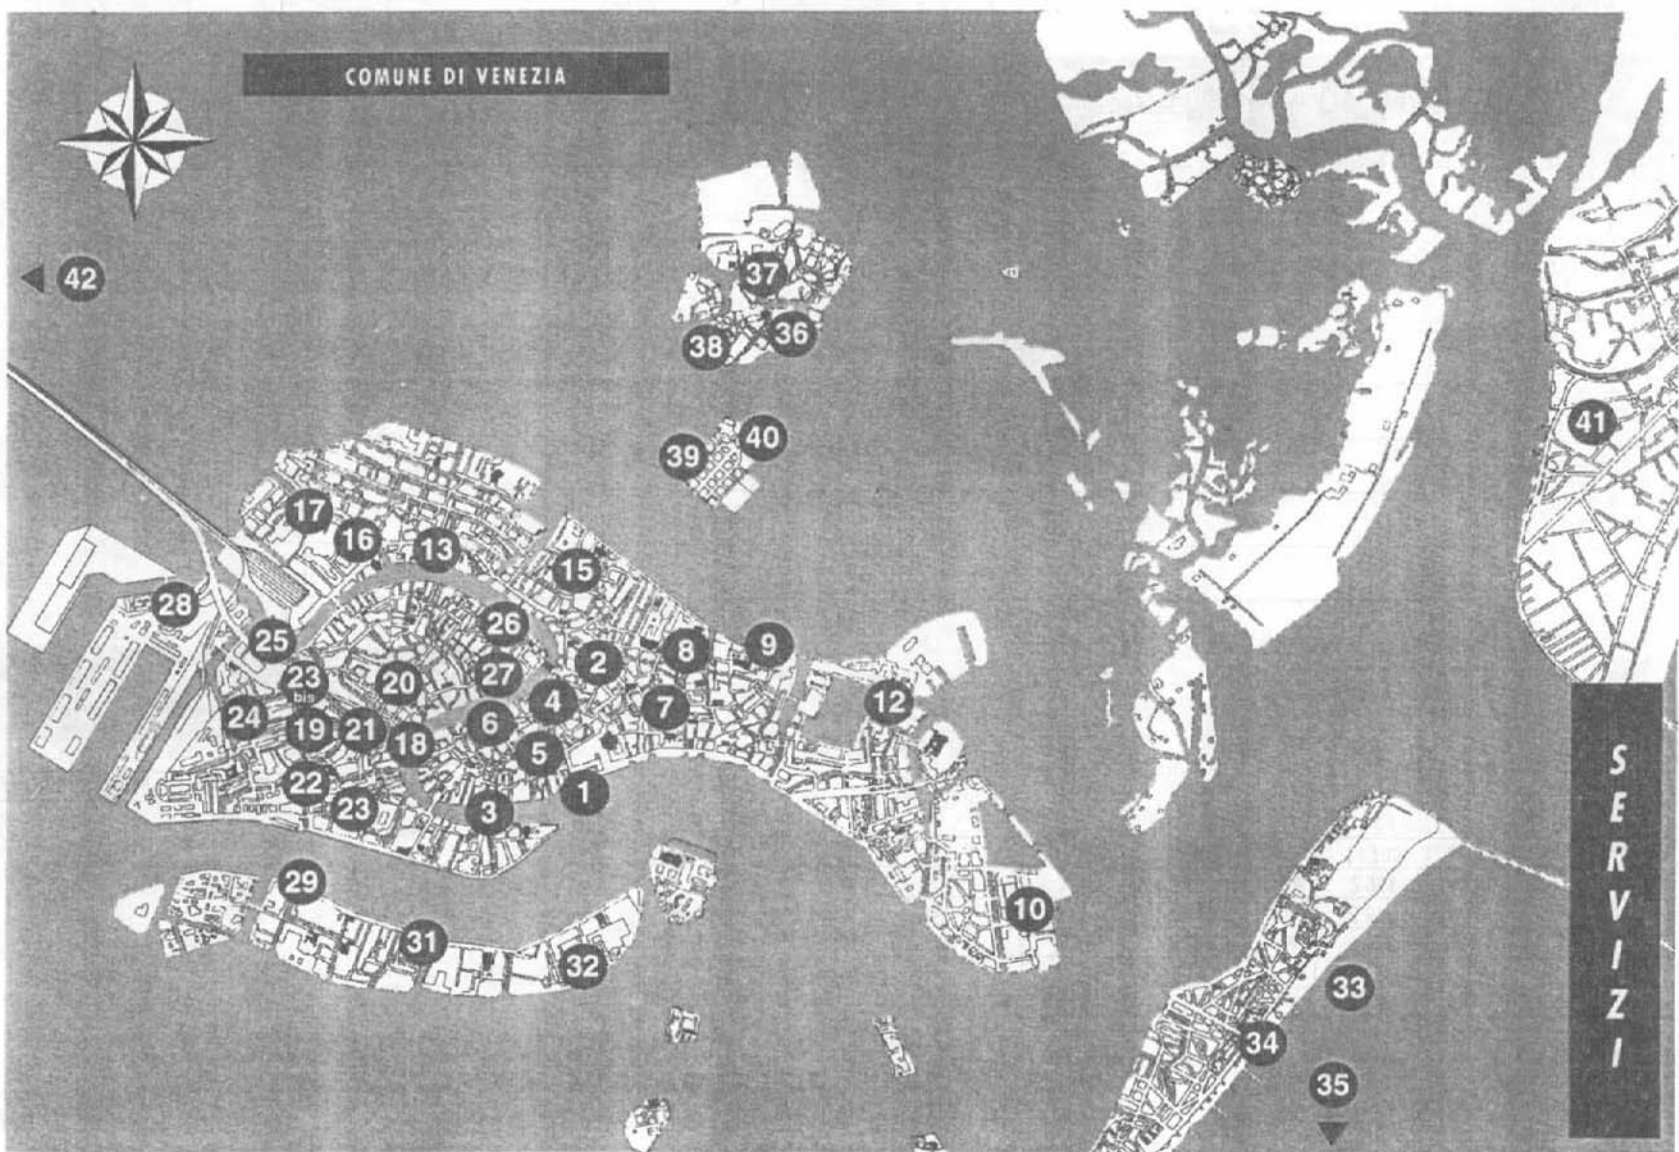

San Marco Cà Giustinian 1

Il progetto prevede un radicale restauro conservativo e messa a norma degli impianti dell'edificio risalente al XV secolo. (legge 1089/39).

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		11.882

San Marco Cà Loredan e Cà Farsetti 2

Interventi di restauro e messa a norma degli impianti sui monumentali palazzi comunali di Cà Loredan e Cà Farsetti, sedi dell'Amministrazione Comunale.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		8.175

San Marco Palazzo Zaguri 3

Il progetto prevede interventi di restauro conservativo e messa a norma degli impianti dell'edificio risalente al XV secolo.

progettazione
950

San Marco Casa Corner 4

Uso uffici immobile vincolato a seguito esercizio diritto di prelazione. L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			4.284

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	3.383	3.383	3.239	1.248
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	6.499	6.489	787	245
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.000	2.000		
	1998				
TOTALE		11.882	11.872	4.026	1.491

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.777	1.777	1.572	1.572
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	500	500	445	
	1997	985	985		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.063	2.063	550	
	1998	850	850		
TOTALE		6.175	6.175	2.567	1.572

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	950	60	55	
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		950	60	55	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	4.284	4.284	4.284	4.284
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		4.284	4.284	4.284	4.284

San Marco Immobile Campo Manin 5

Immobile di 4.562 mq. per uso uffici. L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			15.210

San Marco Immobile Campo San Beneto 6

Uso uffici. L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.750

Castello Palazzo Zorzi 7

Il palazzo risalente agli inizi del XVI secolo è oggetto di una convenzione tra il Comune e l'UNESCO che vi insedierà gli uffici italiani del ROSTE (Regional Office Science Technology Europe). Le cifre si riferiscono ai costi di progettazione.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		600

Castello Palazzo Gradenigo 8

Palazzo monumentale risalente al secolo XVIII. Interessato da lavori di restauro conservativo e messa a norma degli impianti. Sede Centro Elaborazione Dati.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		5.318

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	408	408	408	408
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	14.802	14.802	14.802	14.802
	1998				
TOTALE		15.210	15.210	15.210	15.210

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.750	1.750	1.750	1.750
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.750	1.750	1.750	1.750

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	600	600	600	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		600	600	600	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	4.664	4.664	4.204	582
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	654	654	617	
	1998				
TOTALE		5.318	5.318	4.821	582

Castello Archivio storico 'Celestia' 9

Interventi di restauro conservativo.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.150

Castello Convento Sant'Elena 10

Antico complesso conventuale risalente al XIII secolo, oggetto di restauro conservativo e razionale distribuzione dei volumi interni.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		2.713

Castello Cantiere ACTV 12

Restauro conservativo capannoni all'Arsenale per insediamento cantiere navaie.

progettazione
3.500

Cannaregio Cà Vendramin Calergi 13

Intervento di restauro conservativo del rinascimentale palazzo e di messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		7.297

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	850	850	795	795
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	300			
	1998				
TOTALE		1.150	850	795	795

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	110	110	110	107
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	2.597	2.597	2.439	49
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	6			
TOTALE		2.713	2.707	2.549	156

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	700	700	700	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.800	2.800	2.800	
	1998				
TOTALE		3.500	3.500	3.500	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	5.253	5.253	5.207	571
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	2.044	2.044	2.044	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		7.297	7.297	7.251	571

Cannaregio ex Convento dei Crociferi 15

Il grande complesso conventuale, risalente al XVI secolo, è oggetto di restauro conservativo e di razionale distribuzione dei volumi interni che risultano alterati per l'uso militare al quale furono adibiti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		6.004

Cannaregio Palazzo Manfrin Venier 16

Palazzo costruito nel XVIII secolo oggetto di restauro conservativo e messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		3.375

Cannaregio Palazzo Bonfadini 17

Intervento di ristrutturazione su palazzo settecentesco vincolato (legge 1089/39). Attualmente sede AMAV. Acquisizione chiavi in mano.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			2.384

Dorsoduro Cà Foscari - Sede Università 18

Il restauro conservativo e manutentivo dell'edificio tendente a risolvere i gravi problemi statici della facciata lungo il Canal Grande ed il rio di Cà Foscari (intervento parziale).

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		5.000

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	5.454	5.454	5.454	1.550
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	550	480	480	480
	1998				
TOTALE		6.004	5.934	5.934	2.030

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	3.120	3.120	3.120	113
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	255			
	1998				
TOTALE		3.375	3.120	3.120	113

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.384	2.384	2.374	2.374
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.384	2.384	2.374	2.374

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	5.000	5.000	5.000	
	1998				
TOTALE		5.000	5.000	5.000	

Dorsoduro Immobile Santa Margherita 19

Acquisto immobile uso uffici.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.044

Dorsoduro Caserma Vigili del Fuoco 20

Interventi di restauro.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			950

Dorsoduro Spazio polivalente Rio Novo 21

Ristrutturazione immobile destinato ad usi civili quartierali.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.250

Dorsoduro Palazzo Minotto 22

Restauro conservativo su immobile vincolato ai sensi della legge 1089/39.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		2.590

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.044	1.044	1.044	
	1998				
TOTALE		1.044	1.044	1.044	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	500	500	492	492
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	450	450		
	1998				
TOTALE		950	950	492	492

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.250	1.250	1.090	184
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.250	1.250	1.090	184

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.190	2.190	2.116	44
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	400	400	300	
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.590	2.590	2.416	44

Dorsoduro Locali SERTE 23

Interventi di restauro.
Servizi ai tossicodipendenti gestiti dalle ULSS.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			750

Dorsoduro Cittadella della Giustizia 23 bis

progettazione
3.557

Santa Croce Sede ASPIV 24

La costruzione risale alla metà degli anni '30, è oggetto di restauro manutentivo e messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		4.000

Santa Croce Autorimessa comunale 25

La costruzione risale alla metà degli anni '30, è oggetto di restauro manutentivo e messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		4.000	2.528

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	750	750	750	301
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		750	750	750	301

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	3.557	3.557		
TOTALE		3.557	3.557		

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	4.000	4.000	4.000	1.461
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		4.000	4.000	4.000	1.461

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.528	2.458	2.407	2.164
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.000	2.000	803	
	1998	2.000	2.000		
TOTALE		6.528	6.458	3.210	2.164

San Polo Immobile Pescheria 26

Costruzione moderna in stile gotico veneziano. E' oggetto di restauro manutentivo e messa a norma degli impianti, legato alla più generale sistemazione del mercato di Rialto.

progettazione
400

San Polo Mercato Rialto 27

Il progetto di riordino dell'area rialtina, oltre all'aspetto viario investe l'arredo urbano con l'uniformità dei punti di vendita.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.805

Santa Croce Immobile Mercato Ittico al Tronchetto 28

Interventi di messa a norma.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.032

Giudecca Edifici ex CNMOV - Sede Carabinieri 29

Restauro per nuovo insediamento a seguito trasferimento da Sacca Fisola. La cifra si riferisce ai costi di progettazione.

progettazione
200

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	400			
	1998				
TOTALE		400			

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	305	305	305	24
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.500	1.500		
	1998				
TOTALE		1.805	1.805	305	24

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.032	1.032	946	930
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.032	1.032	946	930

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	200			
	1998				
TOTALE		200			

Giudecca **Immobile ad uso quartierale** **31**

Intervento di manutenzione e messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			270

Giudecca **Villa Herriot (Biblioteca Bettini)** **32**

Intervento di manutenzione e di ristrutturazione.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.073

Lido **Centro Civico** **33**

Intervento di manutenzione e di ristrutturazione.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		3.000	1.425

Lido **Piazzale Bucintoro** **34**

Costruzione di edificio ad uso pubblico, vedesi quota parte intervento "Viabilità".

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.119

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	270	270	194	194
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		270	270	194	194

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	229	229	229	207
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	326	326		
	1998	518	518		
TOTALE		1.073	1.073	229	207

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.437	1.437	1.356	208
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.988	2.988	138	
	1998				
TOTALE		4.425	4.425	1.494	208

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.119	1.119	1.119	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.119	1.119	1.119	

Pellestrina Cinema Perla 35

La struttura è attualmente inagibile.
Il restauro prevede la messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		350

Murano Scuola Maestri Vetrai 'Abate Zanetti' e stazione sperimentale del Vetro 36

Intervento di ristrutturazione.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		7.358

Murano Palazzo da Mula 37

Palazzo tardo gotico, già interessato da restauro conservativo. L'attuale progetto investe aspetti manutentivi e di messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			685

Murano Conterie 38

Intervento di recupero di edifici dismessi a destinazione artigianale.
Progetto comunitario obiettivo 2 aree in declino industriale

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.325

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	350	350		
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		350	350		

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	5.358	5.358	2.929	407
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	2.000	2.000	229	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		7.358	7.358	3.158	407

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	72	72	57	57
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	500	500	500	308
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	113	113	113	
	1998				
TOTALE		685	685	670	365

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.325	1.325	1.325	223
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.325	1.325	1.325	223

Isola San Michele Convento 39

Intervento di restauro conservativo del monumentale complesso conventuale.




Isola San Michele Cimitero 40

Ampliamento dell'Isola - concorso internazionale di idee per la progettazione.



Isole Treportine Manutenzioni straordinarie su immobili convenzionati con il Comune 41



Fusina Immobile terminal 42

Intervento di ristrutturazione su immobile esistente, facente parte del terminal di accesso a Venezia.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso
810		

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	500			
	1998				
TOTALE		500			

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	485	485	485	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	1.515			
TOTALE		2.000	485	485	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.000			
	1998				
TOTALE		1.000			

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	810	810	810	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		810	810	810	
