

Piave **Mercato Ortofrutticolo (fronte canal Salso - via Torino)** 13

Opere di urbanizzazione e messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.500

Marghera **Area PIP Cà Emiliani** 14

Espropri ed opere di urbanizzazione a servizio delle attività produttive.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			2.472

Marghera **Area CIPI Sartori** 15

Acquisizione dell'area destinata ad insediamenti produttivi previsti dal P.R.G. di Marghera.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			13.000

Marghera **Parco Scientifico Tecnologico** 16

Acquisizione degli immobili (superficie scoperta e manufatti).

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			4.230

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.500	1.500	1.135	1.135
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.500	1.500	1.135	1.135

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.408	2.408	2.297	2.297
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	64	64	64	64
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.472	2.472	2.361	2.361

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	13.000	13.000	12.736	12.736
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		13.000	13.000	12.736	12.736

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	3.750	3.750	3.552	3.552
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	480			
	1998				
TOTALE		4.230	3.750	3.552	3.552

Marghera Via F.lli Bandiera 17

Interventi di urbanizzazione.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			2.347

Marghera 43 ettari 18

Acquisizione dell'area destinata ad insediamenti produttivi.
(Integrazione).

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			2.685

Marghera Porto Marghera ex Sirma 19

Piano di Recupero per area ex industriale.

progettazione	istruttoria appalto
	1.940

Fusina Stazione travaso compattazione AMAV 20

Area di interscambio acqua-gomma dei mezzi di trasporto e compattazione dei rifiuti diretti alle discariche o all'inceneritore.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			4.000

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.642	1.500	1.427	1.427
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	705	705	311	311
	1998				
TOTALE		2.347	2.205	1.738	1.738

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.685	2.496	2.424	610
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.685	2.496	2.424	610

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	1.940	1.940		
TOTALE		1.940	1.940		

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	4.000	4.000		
	1998				
TOTALE		4.000	4.000		

'Marghera Promozione' S.p.A.

Partecipazione azionaria del Comune di Venezia nella Società di sviluppo e promozione del polo industriale.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			125

Opere urbanizzazioni portuali

Accordo di programma: Comune - Autorità portuale

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		5.000

Thetis

Partecipazione azionaria del Comune di Venezia nella Società per le tecnologie del mare.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			100

Acquisizioni ed urbanizzazioni varie

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
1.997			144

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	125	125	125	125
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		125	125	125	125

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	5.000	5.000	5.000	93
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		5.000	5.000	5.000	93

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	100	100	100	100
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		100	100	100	100

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	364	364	124	124
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	20	20	14	14
	1998	1.757			
TOTALE		2.141	384	138	138

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.450	1.450	1.450	1.410
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	500	500	500	
	1998	55	55	55	
TOTALE		2.005	2.005	2.005	1.410

Varie lett. d) art. 6 Legge 790/84 (studi e ricerche, imprevisti, ecc...)

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		595	1.410

QUADRO FINANZIARIO

lettera d) - art 6 - Legge 798/84
Insediamenti produttivi - Varie


STATO AVANZAMENTO - INTERVENTI lett. d)

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
9.167	16.685	32.371	38.938
9%	17%	33%	40%

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	67.456	62.742	93,01	45.093	66,85	33.909	50,27
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	2.000	2.000	100,00	2.000	100,00	489	24,45
	1997	5.000	5.000	100,00	5.000	100,00	93	1,86
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	14.705	13.055	88,78	2.555	17,38	397	2,70
	1998	8.000	5.743	71,79	55	0,69		
TOTALE		97.161	88.540	91,13	54.703	56,30	34.888	35,91

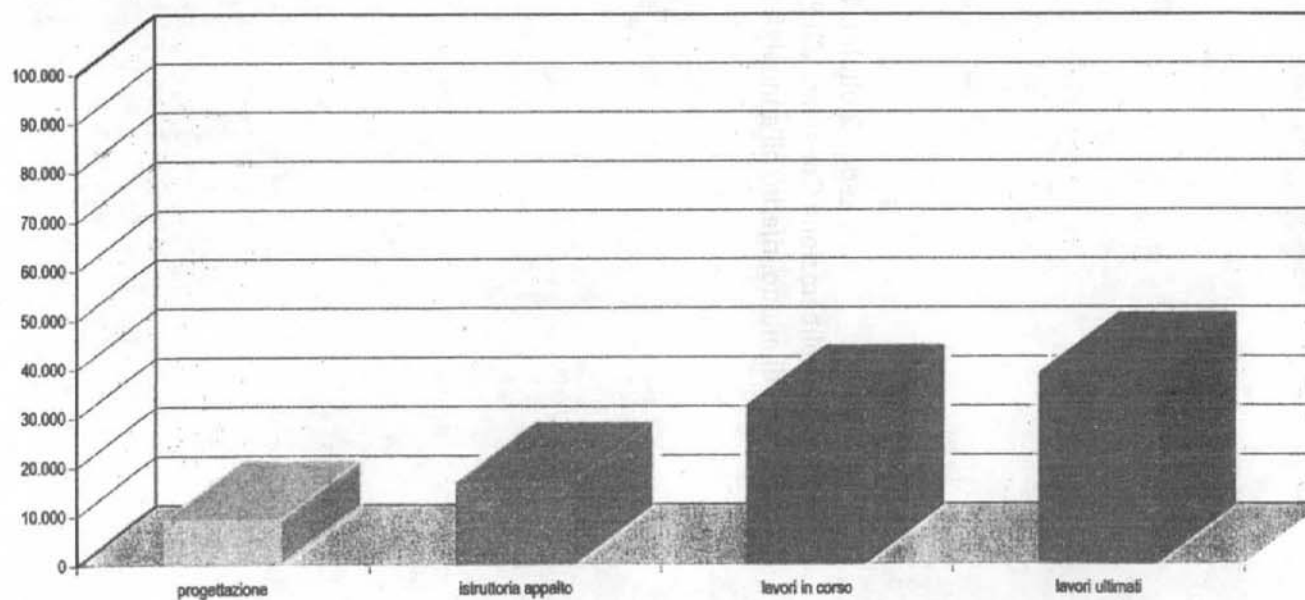

importi in milioni

Comune di Venezia

Legge 2 ottobre 1997 n. 345

Deliberazione Consiliare del 22 settembre 1997 n. 228

Contratto di mutuo, riferito all'annualità 1998, stipulato il 23 dicembre 1997

Comune di Venezia

Interventi	Totale finanziamenti	Legge 2 ottobre 1997 n. 345			
		1998	riserva	1999	riserva
lett. a) - art. 6 L. 798/84	121.700	71.000		50.700	
lett. b) - art. 6 L. 798/84	8.000	8.000			
lett. c) - art. 6 L. 798/84	45.300	25.000		20.300	
lett. d) - art. 6 L. 798/84	33.000	21.000		12.000	
progetto integrato ri - art.5 L. 139/92	70.000	35.000		35.000	
Totale	278.000	160.000	30	118.000	15

		Programmato	
		1998	1999
lett. a) - art. 6 L. 798/84			
San Marco	Restauro Museo Correr e Procuratie		3.000
San Marco	Palazzo Pesaro degli Orfei (Museo Fortuny)		5.800
Cannaregio	Complesso ex Penitenti (EdilVenezia)	18.500	
Cannaregio	Scuola Grande della Misericordia		16.000
San Marco	Restauro Ca' Loredan e Ca' Farsetti		6.000
Murano	Conterie (C.E.R. Regione)	7.500	
Murano	Realizzazione Stazione Sperimentale del Vetro e Scuola Maestri Vetrai 'Abate Zanetti'		1.500
	Manutenzione straordinaria e diffusa e acquisizione di immobili patrimonio residenziale	5.000	8.700
Dorsoduro	Incarico professionale progettazione definitiva ed esecutiva per la Cittadella della Giustizia		4.700
	Acquisizioni immobili	5.000	5.000
Tronchetto	Acquisto porzione isola	35.000	
Totale		71.000	50.700

lett. b) - art. 6 L. 798/84			
Murano	Opere di urbanizzazione Conterie (progetto comunitario RETEX)	5.000	
Murano	Opere di urbanizzazione Isola Certosa (progetto comunitario Obiettivo 2)	3.000	
Totale		8.000	

		Programmato	
		1998	1999
'lett. c) - art. 6 L. 798/84 e lett. d) - art. 2 L. 360/91			
	Contributi al patrimonio immobiliare privato in conto capitale ed in conto interessi per il restauro, acquisto prima casa di abitazione, indirizzati a residenti, giovani coppie, sfrattati, artigiani.	25.000	20.300

lett. d) - art. 6 L. 798/84			
Murano	Sacca Serenella		2.000
Porto Marghera	Acquisto porzione area ex Sirma (progetto comunitario Obiettivo 2)	3.000	
Marghera	Urbanizzazione dei 43 ettari (progetto comunitario Obiettivo 2)	3.000	
Via Torino	Opere di urbanizz. laboratori Università asse P.S.T.(Prog.Comun.KONVER)	10.000	10.000
	Attività portuali - Opere di urbanizzazione (accordo di programma)	5.000	
Totale		21.000	12.000

progetto integrato rli - art.5 L. 139/92			
	Piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio di Venezia	35.000	35.000

**CITTÀ DI CHIOGGIA**

PROVINCIA DI VENEZIA

Corso del Popolo n. 1193 - 30015 CHIOGGIA

SEGRETERIA DEL SINDACO

Prot.n. 5380

li, 28/01/1998

OGGETTO: Stato di attuazione degli interventi.

All'Ing. FELICE SETARO

Presidente del Magistrato

alle Acque di

VENEZIA

In riscontro alla nota pari oggetto del 19/12/1997 si trasmette in allegato un quadro riassuntivo al 31/12/1997 relativo ai finanziamenti e del loro utilizzo attribuiti al Comune di Chioggia in forza della Legge 798/84 e dei successivi provvedimenti di rifinanziamento della medesima.



IL SINDACO

Mott. Fortunato Guarnieri

COMUNE DI CHIOGGIA

STANZIAMENTI LEGGI: 798/84 - 910/86 - 67/88 - 360/91 - 139/92 - 539/95 - 515/96 - 345/97;

LEGGE	ESERCIZI DI RIF.	STANZIAMENTO	EROGATO	DA EROGARE	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	MANDATI EMESSI
L. 798/84	1984-1985-1986	20.250.000.000	20.250.000.000	*****	20.229.774.038	20.225.962	
L. 910/86	1987-1988-1989	25.500.000.000	25.500.000.000	*****	24.939.925.969	560.074.031	
L. 67/88	88/90/91/92/94	11.976.900.000	11.976.900.000	*****	10.986.709.843	990.190.157	
TOTALI LEX 798 - 910 - 67		57.726.900.000	57.726.900.000	*****	56.156.409.850	1.570.490.150	42.799.966.124
L. 360/91	1991	4.350.000.000	4.350.000.000	*****	4.349.596.092	403.908	3.131.070.578
L. 139/92 - 1°	ANNO 1993	32.497.892.295	32.497.892.295	*****	32.497.892.295	*****	17.033.790.415
L. 139/92 - 2°	ANNO 1994	12.656.329.974	12.656.329.974		12.656.329.974	*****	7.024.722.027
L. 139/92 - 3°	ANNO 1995	11.945.619.875	11.945.619.875		11.945.619.875	*****	958.860.970
L. 139/92 - 4°	ANNO 1996	12.000.000.000	784.704.554	11.215.295.446	12.000.000.000	*****	784.704.554
TOTALI LEX 139/92		69.099.842.144	57.884.546.698	11.215.295.446	69.099.842.144	*****	25.802.077.966
L. 539/95 - 1°	ANNO 1996	10.000.000.000	*****	10.000.000.000	10.000.000.000	*****	*****
L. 539/95 - 2°	ANNO 1997	18.000.000.000	*****	18.000.000.000	18.000.000.000	*****	*****
TOTALI LEX 539/95		28.000.000.000	*****	28.000.000.000	28.000.000.000	*****	*****
L. 515/96 - 1°	ANNO 1997	58.000.000.000	1.397.447.093	56.602.552.907	58.000.000.000	*****	306.000.000
L. 515/96 - 2°	ANNO 1998	32.000.000.000		32.000.000.000			
TOTALI LEX 515/96		90.000.000.000	1.397.447.093	88.602.552.907	58.000.000.000	*****	306.000.000
L. 345/97 - 1°	1998	19.000.000.000		19.000.000.000			

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
Divisione Servizi Tecnici
LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Senato della Repubblica

- 251 -

Camera dei deputati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESE
	LEGGE 67/88 - Fondi Ministeriali	25.000.000.000			
1	S. Sebastiano - Restauro e adeguamento funzionale		2.500.000.000	2.338.528.877	2.195.000.000
2	S. Margherita - Restauro e adeguamento funzionale		3.000.000.000	2.975.800.000	2.855.000.000
3	Ca' Garzoni e Moro - Ristrutt. e adeg. norme sicurezza e prev. incendi		3.000.000.000	2.717.135.000	2.883.000.000
4	Ca' Foscari - Ristrutturazione e adeguamento funzionale		574.000.000	574.000.000	491.000.000
5	S. Marta - Ristrutturazione e adeguam. funzionale dei laborat. chimici		5.400.000.000	5.394.448.889	4.898.000.000
6	Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		4.900.000.000	4.891.173.981	239.000.000
7	Palazzo Neri Mocenigo - Restauro e adeguamento funzionale		1.524.000.000	1.523.920.000	144.000.000
8	Ca' Cappello - Restauro e adeguamento funzionale		500.000.000	500.000.000	485.000.000
9	Wolf Ferrari - Restauro e adeguamento funzionale		500.000.000	500.000.000	500.000.000
10	Celestia - Ristrutturazione e adeguamento funzionale		1.102.000.000	1.101.282.140	1.066.000.000
11	Restauro e adeguamento funzionale di S. Giobbe e altri edifici		2.000.000.000	2.000.000.000	1.564.000.000
	TOTALE		25.000.000.000	24.514.286.887	16.598.000.000



IL COORDINATORE GENERALE
DIRETTORE DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Antonio O. CASCIO

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
Divisione Servizi Tecnici
LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 139/92	34.835.929.049			
mutuo I.M.I.	25.347.333.394			
1 Informatizzazione Ateneo e delle Biblioteche		6.931.727.227	6.931.727.227	4.899.033.919
2 S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		6.163.082.928	6.163.082.928	6.163.082.929
3 Zattere - acquisto SCI		10.260.000.000	10.260.000.000	9.877.800.000
4 Opere varie manutenz. straordinaria		2.345.043.328	2.345.043.328	2.344.508.422
5 Ca' Zorza - acquisto 3° piano		647.478.910	647.478.910	647.478.910
mutuo B.N.L.	9.488.595.656			
1 S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		1.780.547.068	1.780.547.068	1.780.547.088
2 Ca' Bembo - acquisto		2.905.860.880	2.905.860.880	2.905.860.880
3 Zattere - acquisto Star Gas 1		2.500.880.759	2.500.880.759	2.500.880.759
4 Zattere - acquisto Star Gas 2		2.301.308.950	2.301.308.950	2.301.308.950
TOTALE		34.835.929.049	34.835.929.049	33.220.498.835



IL COORDINATORE GENERALE
DIRETTORE DEI SERVIZI TECNICI
Dott. Ing. Antonino LO CASCIO

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
Divisione Servizi Tecnici
LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 539/95	17.080.000.000			
mutuo CREDIOP	8.728.000.000			
1 S.Globbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		5.838.912.432	5.838.912.432	4.283.392.461
2 S.Globbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		308.100.832	308.100.832	
3 Via Torino - Manutenzione e adeguamento funzionale del capannone		1.586.310.330	1.586.310.330	
4 S.Marta testro G.Poli - restauro e adeguamento funzionale		22.780.685	22.780.685	
5 Ca' Garzoni e Moro - Ristrutt. e adeg. norme sicurezza e prev. incendi		1.123.395.721	1.123.395.721	1.123.395.721
6 S.Marta fabbr. "C" - restauro e adeguamento funzionale		72.500.000	72.500.000	72.500.000
mutuo INTERBANCA	8.362.000.000			
1 S.Globbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		3.779.088.040	3.779.088.040	
2 S. Globbe Poste - restauro e adeguamento funzionale		1.000.000.000		
3 Ca Garzoni Aula - restauro e adeguamento funzionale		1.000.000.000		
4 S.Marta fabbr. "C" - restauro e adeguamento funzionale		421.500.000	421.500.000	421.500.000
5 Opere varie manutenz. straor.		2.181.411.860	2.181.411.860	1.843.000.000
TOTALE		17.080.000.000	15.090.000.000	7.723.788.182



IL COORDINATORE GENERALE
DIRETTORE DIVISIONE SERVIZI TECNICI
Dott. Ing. Antonino LO CASCIO

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
Divisione Servizi Tecnici
LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESE
LEGGE 515/96	32.800.000.000			
mutuo MEDIO CREDITO	21.800.000.000			
1 S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		14.100.000.000	14.100.000.000	
2 Zattere Capannone		5.000.000.000	5.000.000.000	186.134.853
3 Attuazione D.Lgs 626/84		2.500.000.000	2.500.000.000	37.870.521
mutuo CREDIOP	11.000.000.000			
1 S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		10.000.000.000	10.000.000.000	
2 Zattere Capannone		1.000.000.000	1.000.000.000	
TOTALE		32.800.000.000	32.800.000.000	223.805.174



LEGGE 67/88 - Fondi Ministeriali

- 1) **SAN SEBASTIANO** - Fino ad ora sono stati realizzati vari interventi suddivisi in più stralci per il restauro della sede Universitaria, l'adeguamento del muro di confine, porzioni del I°, II°, III° e V° stralcio, acquisto di ascensori, sistemazione degli spazi esterni e della cabina Enel. I lavori sono stati tutti eseguiti.
- 2) **S. MARGHERITA** - Fino ad ora con questi fondi sono stati in parte eseguiti i lavori di adeguamento funzionale della sede Universitaria. I predetti lavori sono stati completati.
- 3) **CA' GARZONI E MORO** - Gli interventi edilizi finanziati in parte con questa legge sono stati ultimati. Si prevede di chiudere il cantiere dopo gli ultimi lavori al giardino interno entro marzo '98.
- 4) **CA' FOSCARI** - L'importo è servito per finanziare la progettazione (circa 200.000.000.) e con i rimanenti sono state avviate le indagini geognostiche e conoscitive del palazzo. La parte edilizia è stata eseguita.
- 5) **S. MARTA** - Fino ad ora sono stati eseguiti alcuni interventi di cui il principale è l'adeguamento funzionale del fabbricato "C" per il quale è stata impegnata la somma di Lire 5.020.000.000. (finanziamento parziale) il cui intervento è stato eseguito.
- 6) **CALLE DEI GUARDIANI** - Fino ad ora sono stati eseguiti vari interventi tra i quali parte della sistemazione della sede del custode per L. 57.000.000 circa e la sistemazione degli scoperti per un importo di L. 65.000.000 circa.
Il resto della somma è stato impegnato per realizzare il risanamento di alcuni capannoni da adibire a palestra polivalente. Quest'ultimo lavoro è stato appaltato in data 28.10.1996 e le opere sono attualmente in corso.
- 7) **PALAZZO NANI MOCENIGO** - Ad eccezione alcuni interventi condominiali e di riparazione del tetto per L. 144.000.000., il rimanente è stato impegnato per il restauro architettonico e funzionale del palazzo che recentemente ha avuto il benestare della Salvaguardia, ed attualmente è in corso la predisposizione dei progetti esecutivi per provvedere alle operazioni di appalto.
- 8) **CA' CAPPELLO** - Sono stati eseguiti due stralci esecutivi di intervento
- 9) **WOLF FERRARI** - L'intervento è stato completato nel 1991.
- 10) **CELESTIA** - L'intervento è stato completato nel 1993.
- 11) **S. GIOBBE ED ALTRI EDIFICI** - Il finanziamento fa parte del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla fase "A", I° stralcio del complesso universitario. Le opere che competono sono state eseguite completamente.



IL COORDINATORE GENERALE
DIRETTORE DIVISIONE SERVIZI TECNICI
Dott. Ing. Antonino LO CASCIO

LEGGE 139/92

Mutuo IMI

1) INFORMATIZZAZIONE ATENEO E BIBLIOTECHE - Fino ad ora sono stati eseguiti due grossi interventi che riguardano: il primo la conversione su nastro magnetico dei cataloghi delle biblioteche per un importo di L. 2.200.000.000. ed il secondo la realizzazione della rete informatica di Ateneo e l'acquisto delle relative apparecchiature per l'importo di L. 3.000.000.000. Si prevede di destinare la somma rimanente al il finanziamento delle opere di restauro e adeguamento funzionale della fase "A" di S. Giobbe.

2) S. GIOBBE fase "A" - Quota parte del finanziamento relativo del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla fase "A" I° stralcio. Lavori completamente eseguiti.

3) ZATTERE Acquisto Sci - E' stato effettuato un acquisto "chiavi in mano" di un edificio sito alle Zattere dove è stato insediato il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Europei e Postcoloniali. I lavori sono stati eseguiti ed ultimati nel novembre '95. (Superficie mq 1436)

4) OPERE VARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Sono stati eseguiti vari interventi di natura manutentoria e di completamento di alcune opere di restauro e ristrutturazione già avviati e finanziati con altre leggi, con particolare riferimento ai seguenti interventi:

- parte dell'imbrigliamento della sede centrale di Ca' Foscari
- realizzazione di alcuni serramenti nella sede di S. Marta
- porzione del restauro ed adeguamento funzionale della sede di Ca' Cappello
- porzione del restauro e adeguamento funzionale del Fabbricato "C" di S. Marta.

5) CA' DALLA ZORZA Acquisto 3° piano - Acquisto di alcuni locali posizionati al terzo piano da destinare all'uso istituzionale dell'Università.

Mutuo BNL

1) S. GIOBBE fase "A" - Quota parte del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla Fase "A" I° stralcio di S. Giobbe.. Importo completamente utilizzato.

2) CA' BEMBO acquisto - E' stato acquistato un immobile che era concesso in Comodato dalla Cassa di Risparmio di Venezia. L'operazione è stata conclusa nel 1996. (Superficie mq 2107)

3) ZATTERE Acquisto Star Gas 1 - Sono stati acquistati i locali. (Superficie mq 404)

4) ZATTERE Acquisto Star Gas 2 - Sono stati acquistati i locali (Superficie mq 386)

