

Castello **Ex Convento S. Giovanni Laterano (Ist. Barbarigo)****1**

Intervento manutentivo e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale (legge 1089/39).

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	2.600		9.129

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
* Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	2.021	2.019	2.017	1.448
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	7.108	7.108	7.108	4.904
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998	2.600	2.600		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		11.729	11.727	9.125	6.352

Castello **Palazzo Barbarigo (Ist. Profess. per il Commercio)****2**

Intervento manutentivo e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale (legge 1089/39).

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				2.254	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.254	1.581	1.026	286
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.254	1.581	1.026	286

Cannaregio **San Girolamo (Istituto d'arte)****3**

Intervento manutentivo e messa a norma degli impianti. (Edi Venezia)

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati		
	2.069				
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	569	569	418	249
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	1.500	1.500	1.500	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.069	2.069	1.918	249

Cannaregio Palazzo Nani (Complesso scolastico Caboto)

4

Intervento di restauro e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale (legge 1089/39).

	progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati
				2.201

Lido San Giovanni Bosco

5

Intervento di manutenzione e alle cucine per pluriservizi nelle scuole.

		progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
						943
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-'95-'96	943	943	923	882	
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98					
	1998					
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999					
TOTALE		943	943	923	882	

Pellestrina Scuola Media Loredan

6

Nuova edificazione nel sito della precedente scuola media.

		progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati
					3.016
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 136	1993-94-'95-'96	2.905	2.905	2.593	2.593
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	111	111	111	59
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		3.016	3.016	2.704	2.652

Murano Asilo Nido Principessa M. Letizia

7

Restauro manutentivo e messa a norma degli impianti.

		progettazione	istruttorie appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					658
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	625	625	578	578
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	33	33	32	32
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		658	658	610	610

Burano Scuola Elementare di Cocco

8

Restauro manutentivo e messa a norma degli impianti.

		progettazione	istruttorie appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					774
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	774	774	774	764
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		774	774	774	764

Punta Sabbioni Costruzione Aula Polivalente

9

Nuova edificazione per uso multidisciplinare.

		progettazione	istruttorie appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					1.224
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.224	1.223	1.223	1.178
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.224	1.223	1.223	1.178

Manutenzione straordinaria e diffusa e messa a norma

progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	11.468	13.162


	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	8.917	8.550	8.134	4.432
Legge 20 dicembre 1995 n. 536	1996-'97	2.007	1.918	1.893	562
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	4.199	4.164	3.135	2.393
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	3.365	3.365		
	1999	6.142	6.142		
TOTALE		24.630	24.139	13.162	7.387

QUADRO FINANZIARIO - SCUOLA


	Annuale	Programmato	Impegnato	%	Obbligato	%	Speso	%
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	20.732	19.689	94,97%	18.186	87,72%	12.910	62,27%
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	11.593	11.504	99,23%	11.217	96,76%	5.958	51,39%
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	5.066	5.031	99,31%	4.002	79,00%	2.492	49,19%
	1998	5.965	5.965	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	6.142	6.142	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTALE	49.498	48.331	97,84%	33.405	67,49%	21.360	43,15%

STATO AVANZAMENTO - SCUOLA

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	4.660	13.722	31.107
	9%	28%	63%

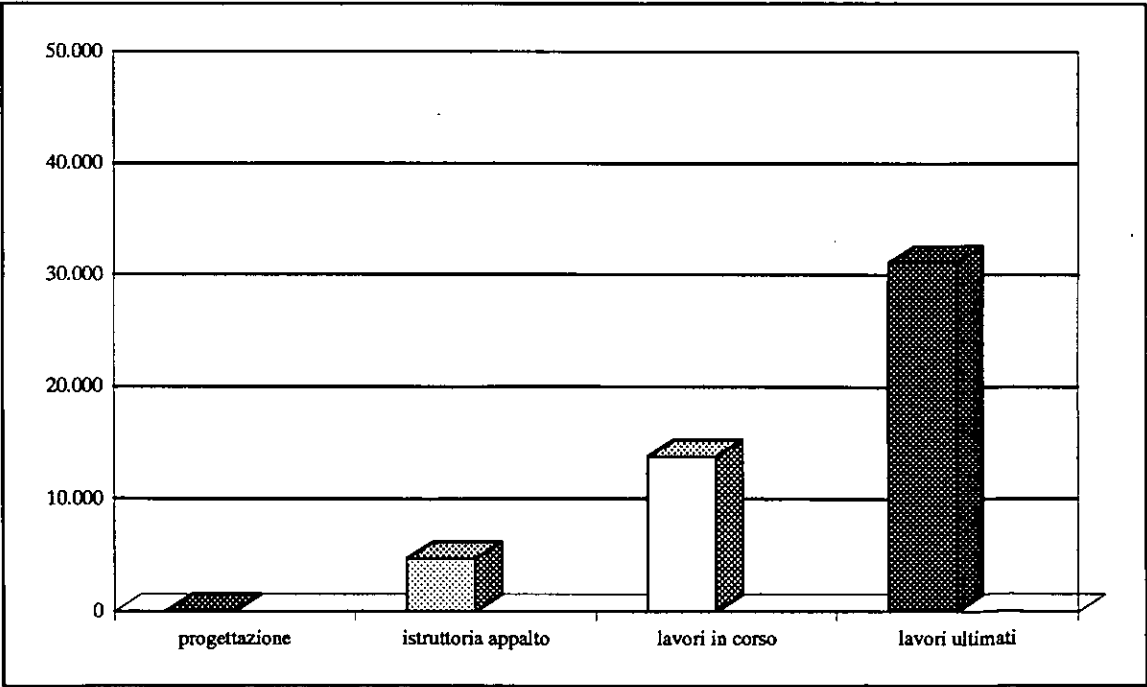

(in milioni di lire)

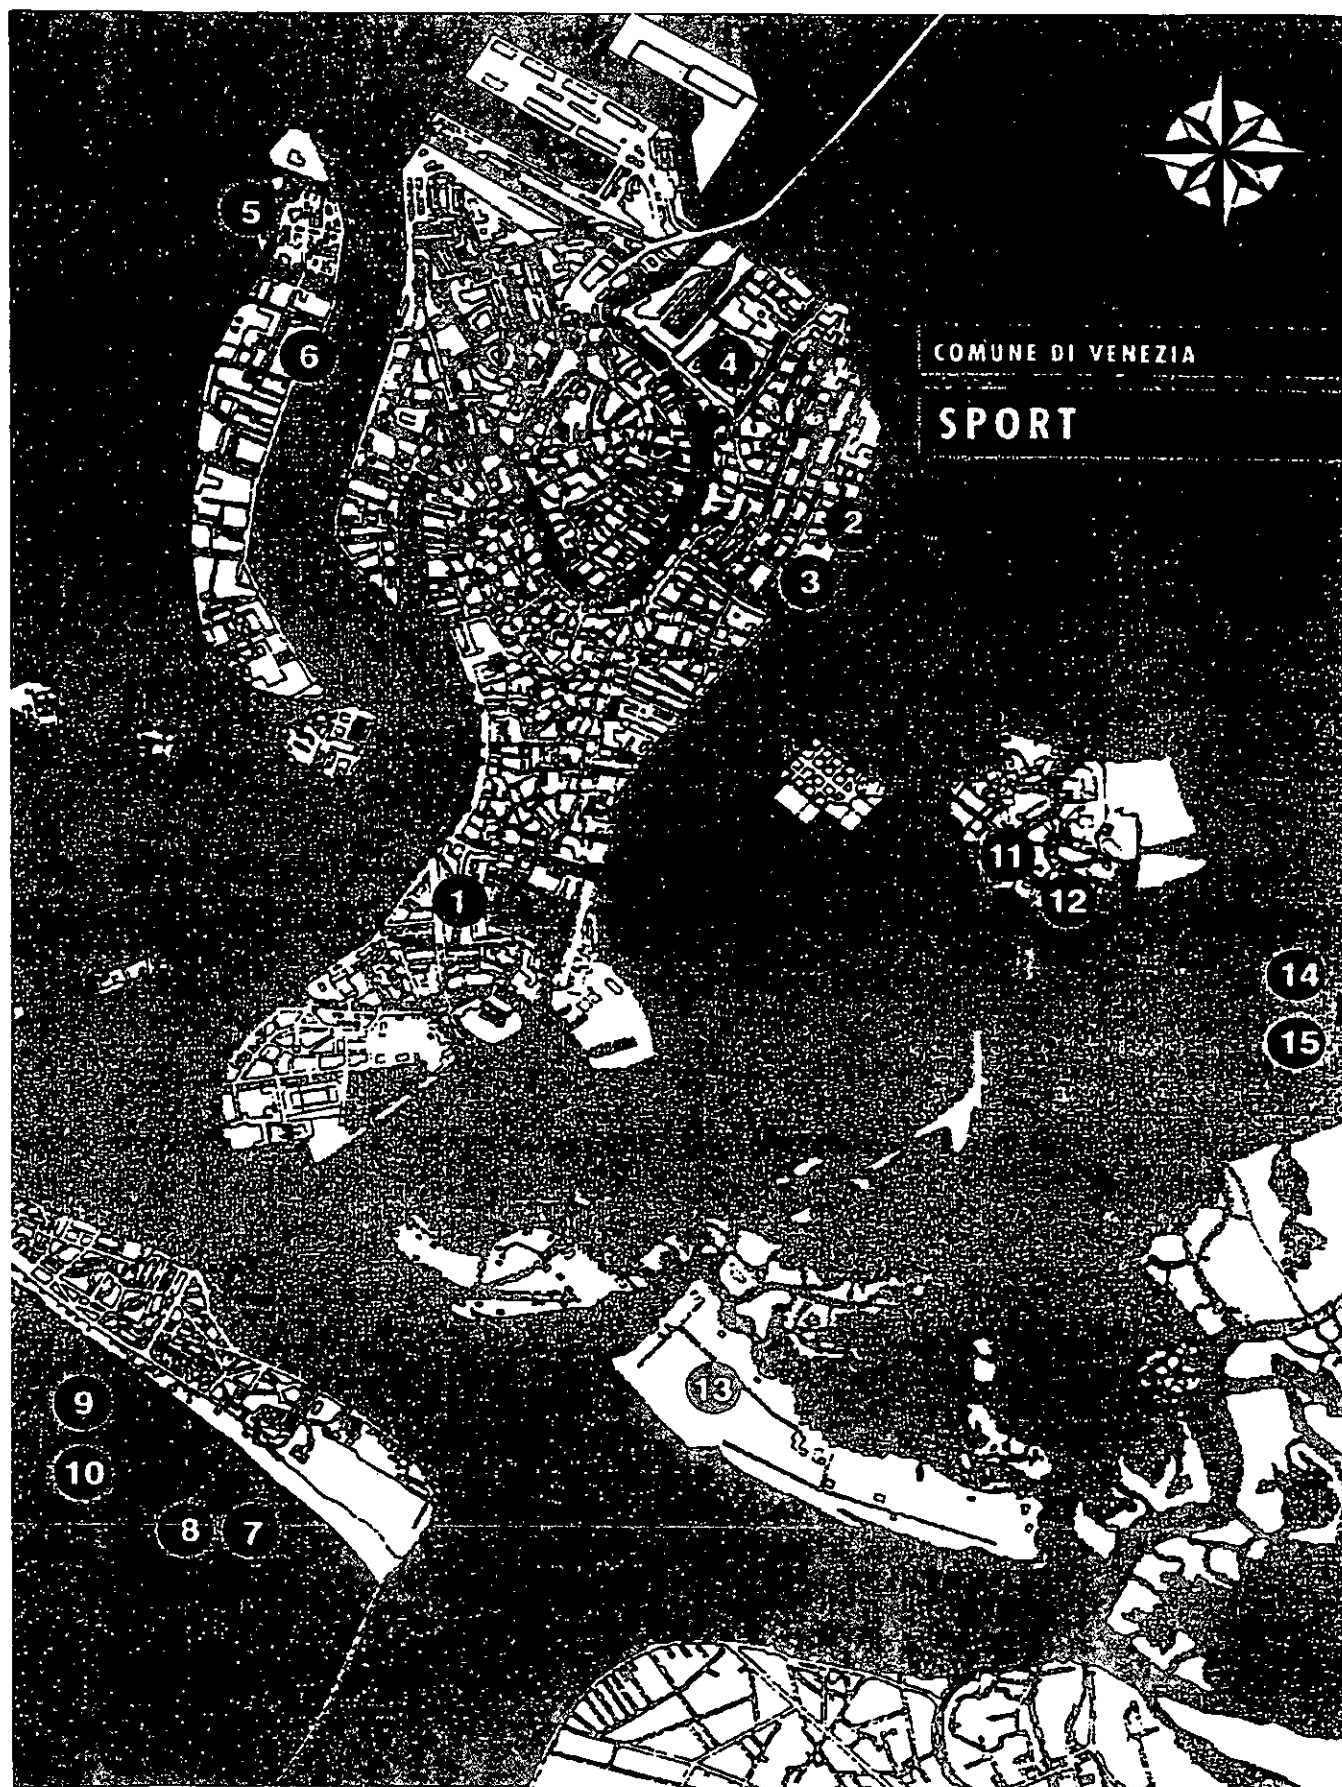

Castello Palasport G.B. Gianquinto

1

Messa a norma degli impianti.

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				850
Legge	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato
5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	850	850	775
20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97			
4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98			
2 ottobre 1997 n. 345	1998			
	1999			
TOTALE		850	850	775

Cannaregio Centro Sportivo Sant'Alvise

2

Nel rispetto delle preesistenti architetture l'intervento prevede la realizzazione di un impianto natatorio, attrezzature sportive varie e di ricreazione.

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			2.491	10.405
Legge	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato
5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	6.602	6.602	6.602
20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	3.920	3.920	3.676
4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	2.374	2.374	2.047
2 ottobre 1997 n. 345	1998			
	1999			
TOTALE		12.896	12.896	12.325

Cannaregio Remiere - Sant'Alvise

3

Nuova costruzione capannone. Ricovero imbarcazioni.

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			3.400	
Legge	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato
5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	800	800	800
20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	2.600	2.600	2.423
4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98			
2 ottobre 1997 n. 345	1998			
	1999			
TOTALE		3.400	3.400	3.223

Cannaregio Centro sportivo Opera Pia Coletti

4

Ristrutturazione impianti sportivi esistenti.

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso		lavori ultimati
		1.500			
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	1.500	1.500	1.500	
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.500	1.500	1.500	0

Giudecca Complesso Sportivo Sacca San Biagio

5

Il progetto prevede attrezzature per una pluralità di discipline. Oltre alla piscina già in uso sono previsti ricoveri per imbarcazioni, campi da tennis, bocciodromo e opere di urbanizzazione.

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			5.487	2.432

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	5.757	5.757	4.940	2.432
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	1.000	1.000	1.000	0
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	1.162	1.162	1.000	0
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		7.919	7.919	6.940	2.432

Giudecca Remiere ex CNMOV

6

Restauro su immobile per ricovero imbarcazioni.

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati	
			2.990		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.990	1.990	1.990	1.081
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	1.000	1.000	1.000	301
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.990	2.990	2.990	1.382

Lido Patinodromo Quattro Fontane

7

Ristrutturazione e messa a norma dell'impianto.

		progettazione istruttoria appello		lavori in corso	lavori ultimati
				2.500	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.500	2.500	2.199	1.095
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.500	2.500	2.199	1.095

Lido Piscina

8

Nuova edificazione di impianto sportivo natatorio.

	progettazione	istruzione	appello	lavori in corso	lavori ultimati
				9.894	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	3.506	3.506	3.506	3.219
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	4.388	4.388	4.388	2.285
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	2.000	2.000	2.000	
	1999				
TOTALE		9.894	9.894	9.894	5.504

Pellestrina Centro Sportivo

9

A completamento dell'impianto sportivo opere murarie ed affini, verde ed impiantistiche.

	progettazione istruttoria appello	lavori in corso	lavori ultimati		
			1.050		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	600	600	600	600
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	225	225	225	176
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	225	225	225	
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.050	1.050	1.050	776

Pellestrina	S. Pietro in Volta - Centro polisportivo	10
-------------	--	----

Realizzazione di un campo da calcio, tennis e palazzetto polifunzionale.

	progettazione	istruzioni appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	4.000			
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96			
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	1.000	1.000	190
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	3.000	3.000	
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998			
	1999			
TOTALE		4.000	4.000	190

Murano	Centro Sportivo San Mattia	11
--------	----------------------------	----

Intervento di ristrutturazione, manutenzione e messa a norma degli impianti.

	progettazione	istruzioni appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	2.826			
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	2.715	2.715	2.376
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	111	111	105
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998			94
	1999			
TOTALE		2.826	2.826	2.481

Murano	Palestra L. Perziano	12
--------	----------------------	----

Intervento di manutenzione e messa a norma degli impianti.

	progettazione	istruzioni appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	1.420			
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	1.420	1.420	1.378
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998			
	1999			
TOTALE		1.420	1.420	1.378

Sant'Erasmo

Remiere

13

Nuova costruzione capannoni. Ricovero imbarcazioni.

		progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati
		1.800			
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	1.500	1.500		
	1998	300	300		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.800	1.800	0	0

Burano

Mazzorbo - Palestra

14

Progetto di nuova edificazione di un palazzetto polifunzionale.

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati		
			6.057		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	4.000	4.000	3.632	3.632
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	257	257	200	200
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	1.800	1.800	1.620	1.620
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		6.057	6.057	5.452	5.452

Burano

Mazzorbo - Centro sportivo

15

Realizzazione di un campo da calcio e strutture polifunzionali

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati	
			1.286		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	1.000	1.000		
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	286	266		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.286	1.266	0	0

Manutenzione straordinaria e diffusa


		progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				3.661	4.523
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	5.412	5.412	4.708	4.442
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	660	591	143	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	303	117	81	81
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	1.809	1.809		
	1999				
TOTALE		8.184	7.929	4.932	4.523

QUADRO FINANZIARIO - SPORT


	Annuale	Programmato	Impegnato	%	Obbligato	%	Speso	%
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	37.152	37.152	100,00%	33.506	90,19%	28.222	75,96%
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	10.948	10.859	99,19%	8.857	80,90%	3.827	34,96%
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	16.363	16.177	98,86%	10.966	67,02%	5.213	31,86%
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	4.109	4.109	100,00%	2.000	48,67%	0	0,00%
	1999	0	0		0		0	
TOTALE		68.572	68.297	99,60%	55.329	80,69%	37.262	54,34%

STATO AVANZAMENTO - SPORT

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
7.600		31.709	19.563
11%		46%	28%

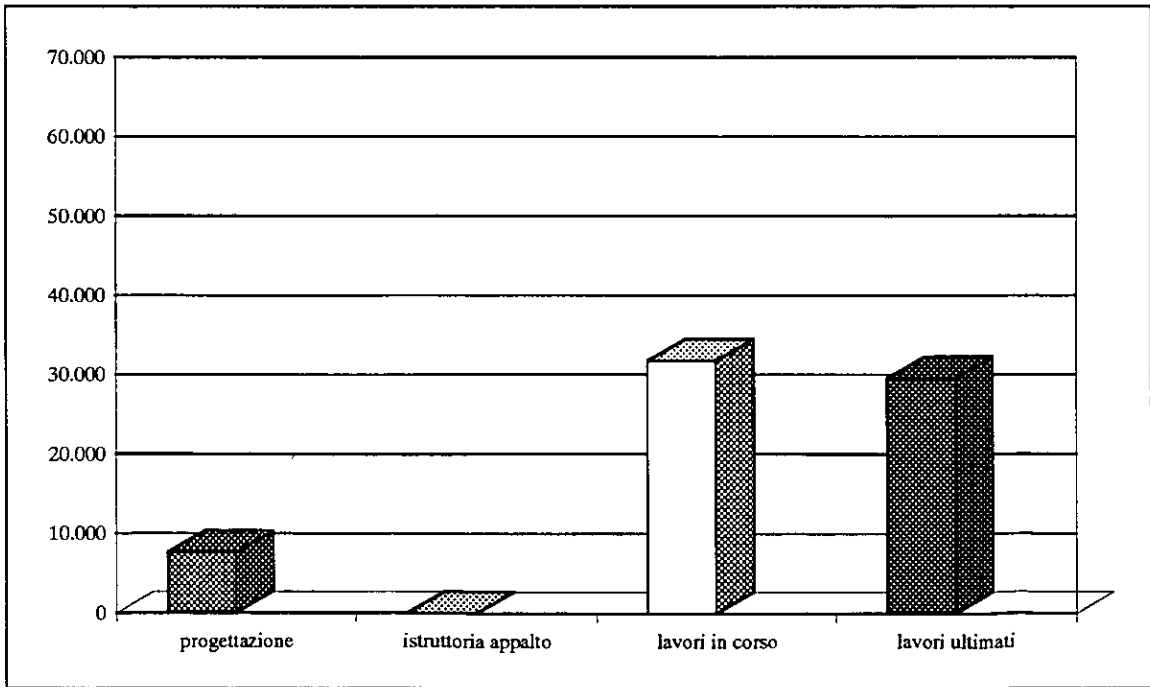

(importi in milioni)

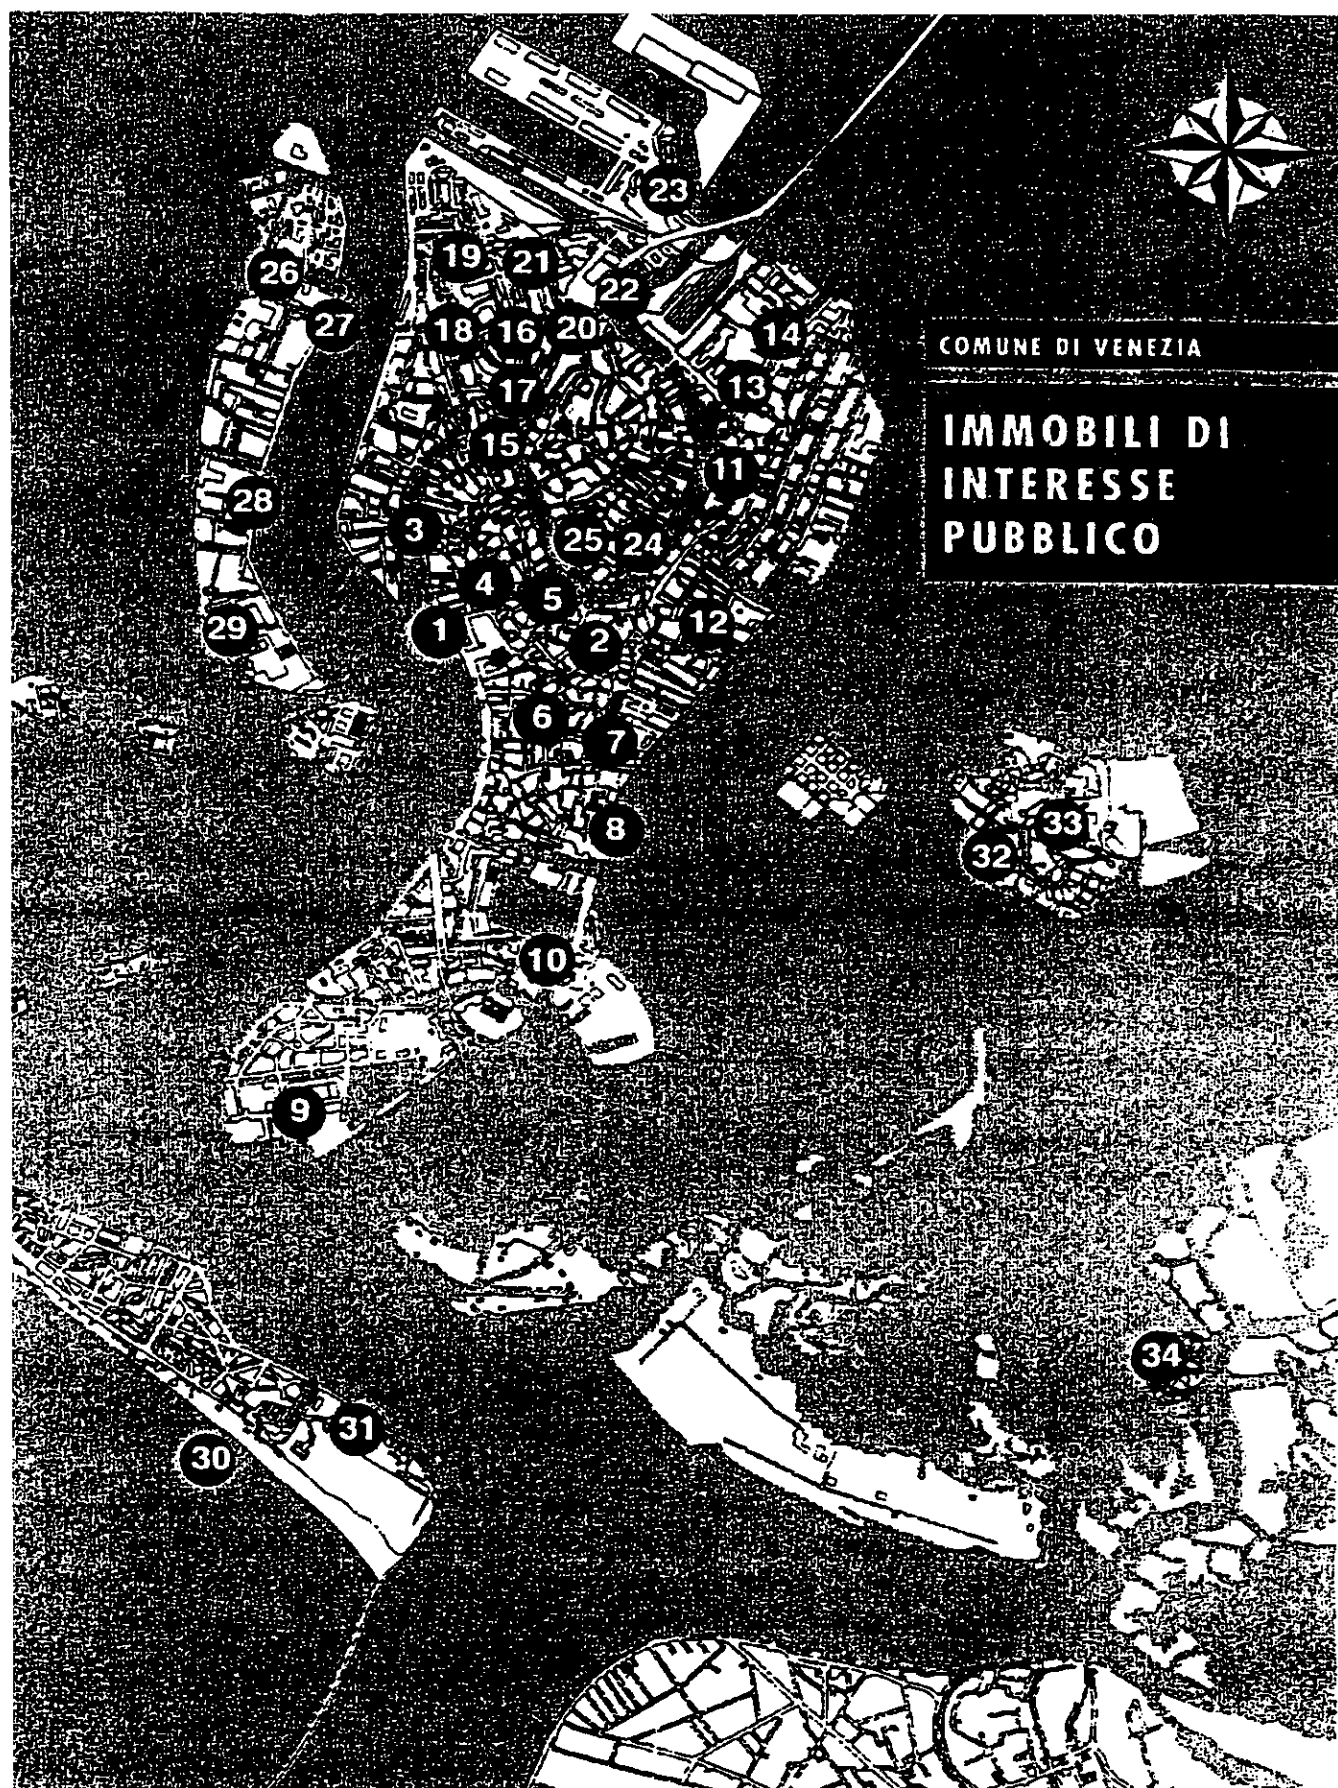

San Marco Cà Giustinian

1

Il progetto prevede un radicale restauro conservativo e messa a norme degli impianti dell'edificio risalente al XV secolo vincolato ai sensi della legge 1089/39.

		progettazione	istruttorie	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					12.332	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	3.480	3.480	3.327	3.222	
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	6.752	1.432	1.019	1.019	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	2.100	100			
	1998					
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999					
TOTALE		12.332	5.012	4.346	4.241	

San Marco Cà Loredan e Cà Farsetti

2

Interventi di restauro e messa a norme degli impianti sui monumentali palazzi comunali di Cà Loredan e Cà Farsetti, sedi dell'Amministrazione Comunale

		progettazione	istruttorie	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					11.000	7.861
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.777	1.777	1.672	1.622	
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	1.485	1.485	1.048	1.030	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	5.506	4.758	1.474	505	
	1998	6.093	6.093	309		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	5.000	5.000			
TOTALE		19.861	19.113	4.503	3.157	

San Marco Palazzo Zaguri

3

Il progetto prevede interventi di restauro conservativo e messa a norme degli impianti dell'edificio risalente al XV secolo

		progettazione	istruttorie	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
						950
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96					
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	950	121	55	45	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98					
	1998					
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999					
TOTALE		950	121	55	45	

San Marco **Immobile Campo Manin**
4

Immobile di 4.562 mq. per uso uffici. La cifra di 15.220 corrisponde ai costi di acquisto, mentre 11.640 milioni corrispondono ai costi di restauro.

		progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati
		11.640			15.220
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	408	408	408	408
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	14.802	14.802	14.802	14.802
	1998	150	10	10	10
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	11.500			
TOTALE		26.860	15.220	15.220	15.220

San Marco **Casa Corner**
5

Uso uffici immobile vincolato a seguito esercizio diritto di prelazione. L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

		progettazione	istruzione appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					6.034
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	6.034	6.034	6.034	6.034
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		6.034	6.034	6.034	6.034

Castello **Palazzo Zorzi**
6

Il palazzo risalente agli inizi del XVI secolo è oggetto di una convenzione tra il Comune e l'UNESCO che vi insedierà gli uffici italiani del ROSTE (Regional Office Science Technology Europe).

		progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati
				2.600	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	600	600	600	
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998	2.000	2.000	2.000	1.531
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.600	2.600	2.600	1.531
