

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Gozzi -Tommaseo - Castello

4

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
dicembre 2001Adeguamenti tecnico funzionali e messa a
norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999				
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	2.819	2.819		
	2000				
Totale		2.819	2.819		



Istituto d'arte San Girolamo - Cannaregio

5

Intervento
in progettazionePrevisione fine lavori
dicembre 2001Adeguamenti tecnico funzionali e messa a
norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
		2.262	2.262	2.111	509



Palazzo Priuli - Scuola Media F. Morosini - S. Croce

6

Intervento
in progettazionePrevisione fine lavori
giugno 2001Palazzo della fine del XVI secolo, pare sul
disegno di J. Sansovino.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999				
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	1.273	1.273		
	2000				
Totale		1.273	1.273		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Papadopoli - Asilo Nido - S.Croce

7

Intervento
in progettazione

Previsione fine lavori
1° trimestre 2001

Edificio dei primi del secolo
L'intervento prevede la messa a norma degli
impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.200	2.200		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		2.200	2.200		



Scuola Elementare Michiel - Dorsoduro

8

Intervento
in progettazione

Previsione fine lavori
dicembre 2000

Adeguaamenti tecnico funzionali e messa a
norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
		1.563	1.563	1.563	190



Asilo Nido Gabbiano - Giudecca

9

Intervento
in progettazione

Previsione fine lavori
giugno 2001

Adeguaamenti tecnico funzionali e messa a
norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999				
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	634	634		
	2000				
Totale		634	634		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Scuola Materna S. Francesco - Giudecca

10

Intervento
in progettazionePrevisione fine lavori
giugno 2001Adeguamenti tecnico funzionali e messa a
norma degli impianti

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999				
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	1.174	1.174		
	2000				
Totale		1.174	1.174		



Scuola Elementare Duca D'Aosta - Giudecca

11

Intervento
in progettazionePrevisione fine lavori
dicembre 2001Adeguamenti tecnico funzionali e messa a
norma degli impianti

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999				
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	2.350	2.350		
	2000	2.550	2.550		
Totale		4.900	4.900		



Scuola Pisani/Orseolo - Lido

12

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
giugno 2000Ristrutturazione generale dell'edificio per la
messa in sicurezza sia per quanto riguarda la
parte statica che le vie di esodo con il ricavo di
una nuova scala di sicurezza e l'abbattimento
delle barriere architettoniche. Tali lavori
comprendono tra l'altro l'installazione
dell'ascensore e relative rampe di accesso

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5.052	5.052	5.052	42

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scuola Media Loredan - Pellestrina **13**Intervento
concluso

Realizzazione di un nuovo complesso scolastico come sede della scuola media dell'isola, in sostituzione del vecchio che sorgeva nella stessa area. La struttura, che comprende 15 aule normali, 6 speciali, aule insegnati, uffici, un ambulatorio, un auditorium, una biblioteca, una mensa, grazie alla organizzazione degli spazi, potrà diventare un centro di aggregazione sociale aperto all'esterno

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3 016	3 016	3 016	2 703

Manutenzione straordinaria e diffusa e messa a norma

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
fine 2000

Manutenzione e messa a norma degli impianti su tutto il patrimonio di edilizia scolastica comunale. Di questi 1.250 sono destinati al restauro del nuovo Asilo Nido ex scuola Tiepolo a Castello


	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		26 534	26 534	24 934	14 926
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	850	850		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000	1 450	400		
Totale		28 834	27 784	24 934	14 926

TotaleScuola

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		54 128	53 458	51 137	28 668
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	3 050	3 050		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	8 250	8 250		
	2000	4 000	2 950		
Totale		69 428	67 708	51 137	28 668


XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Numero interventi in progettazione	Numero interventi in corso	Numero interventi conclusi
7	5	2

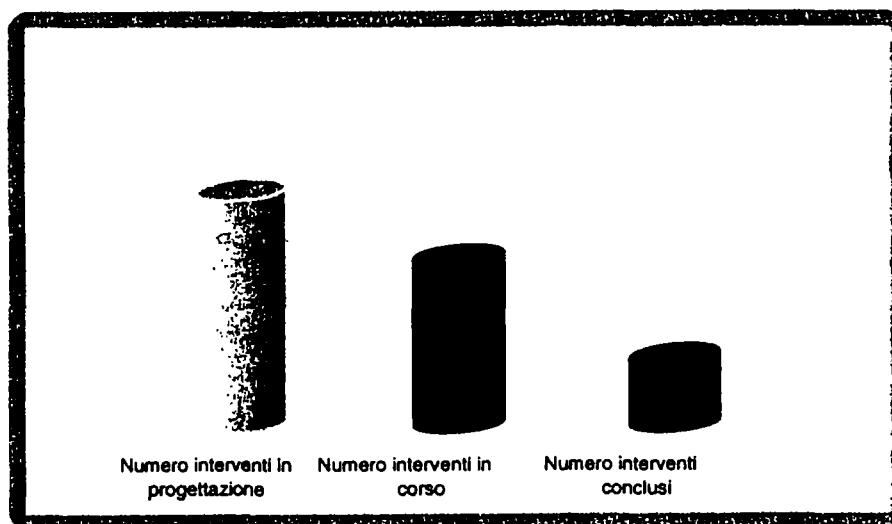


PAGINA BIANCA

SPORT

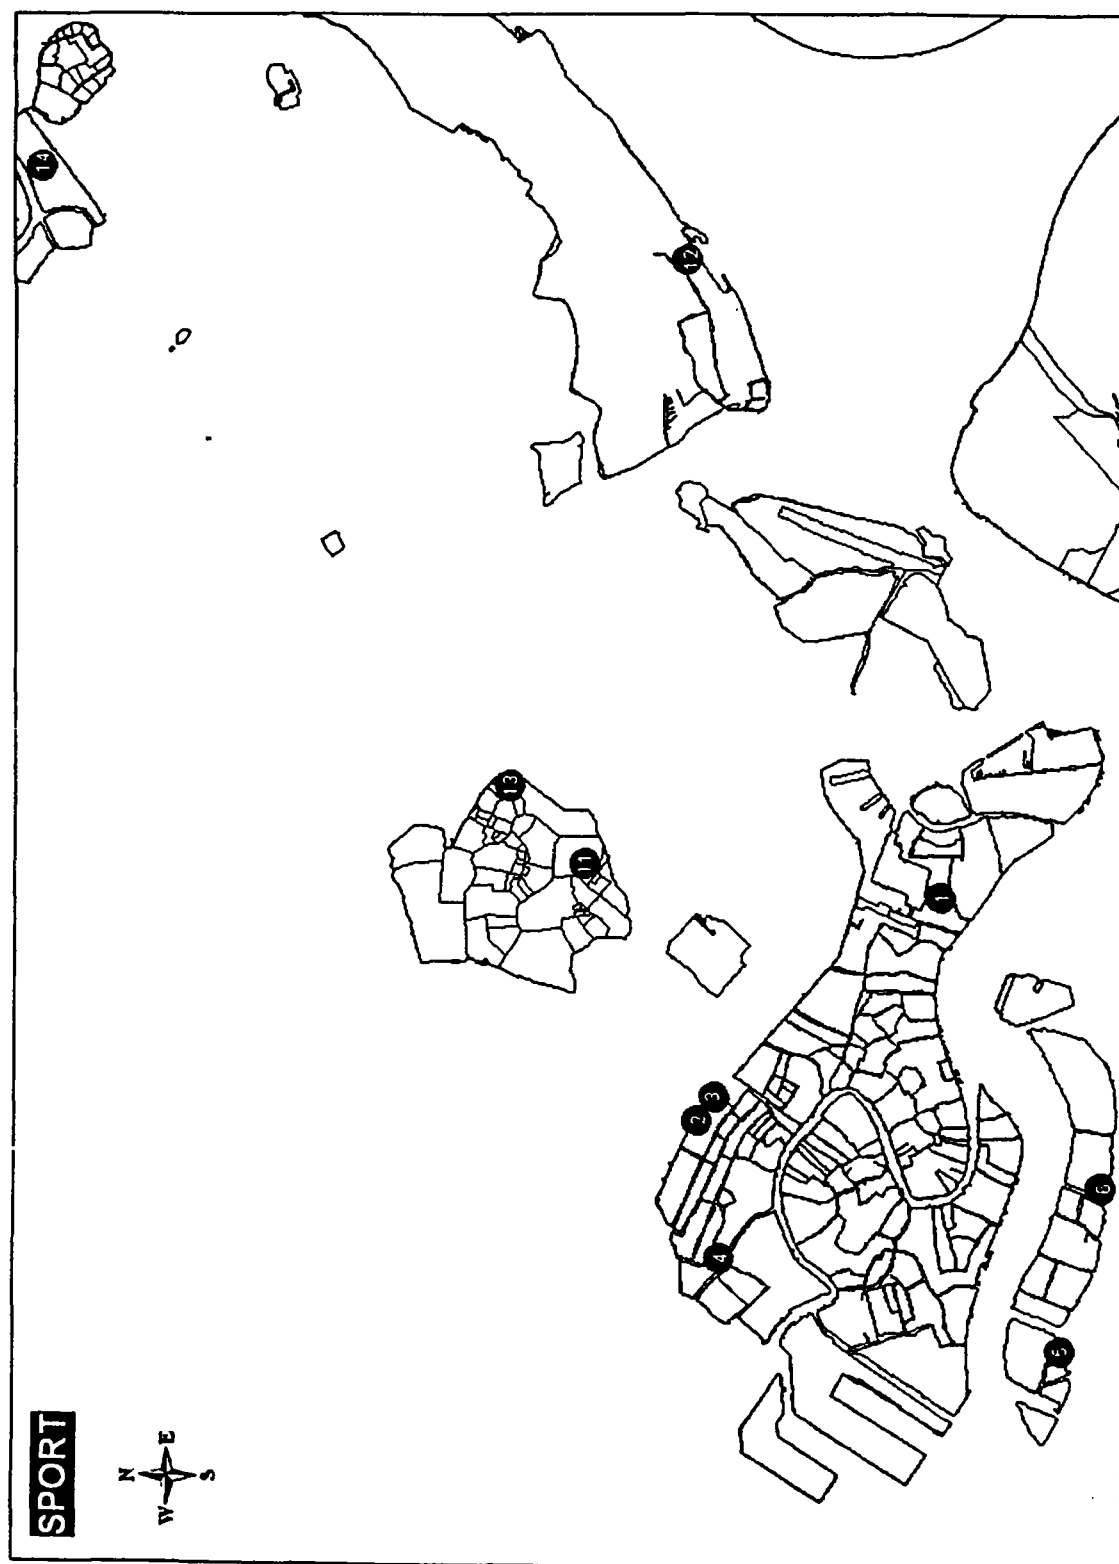

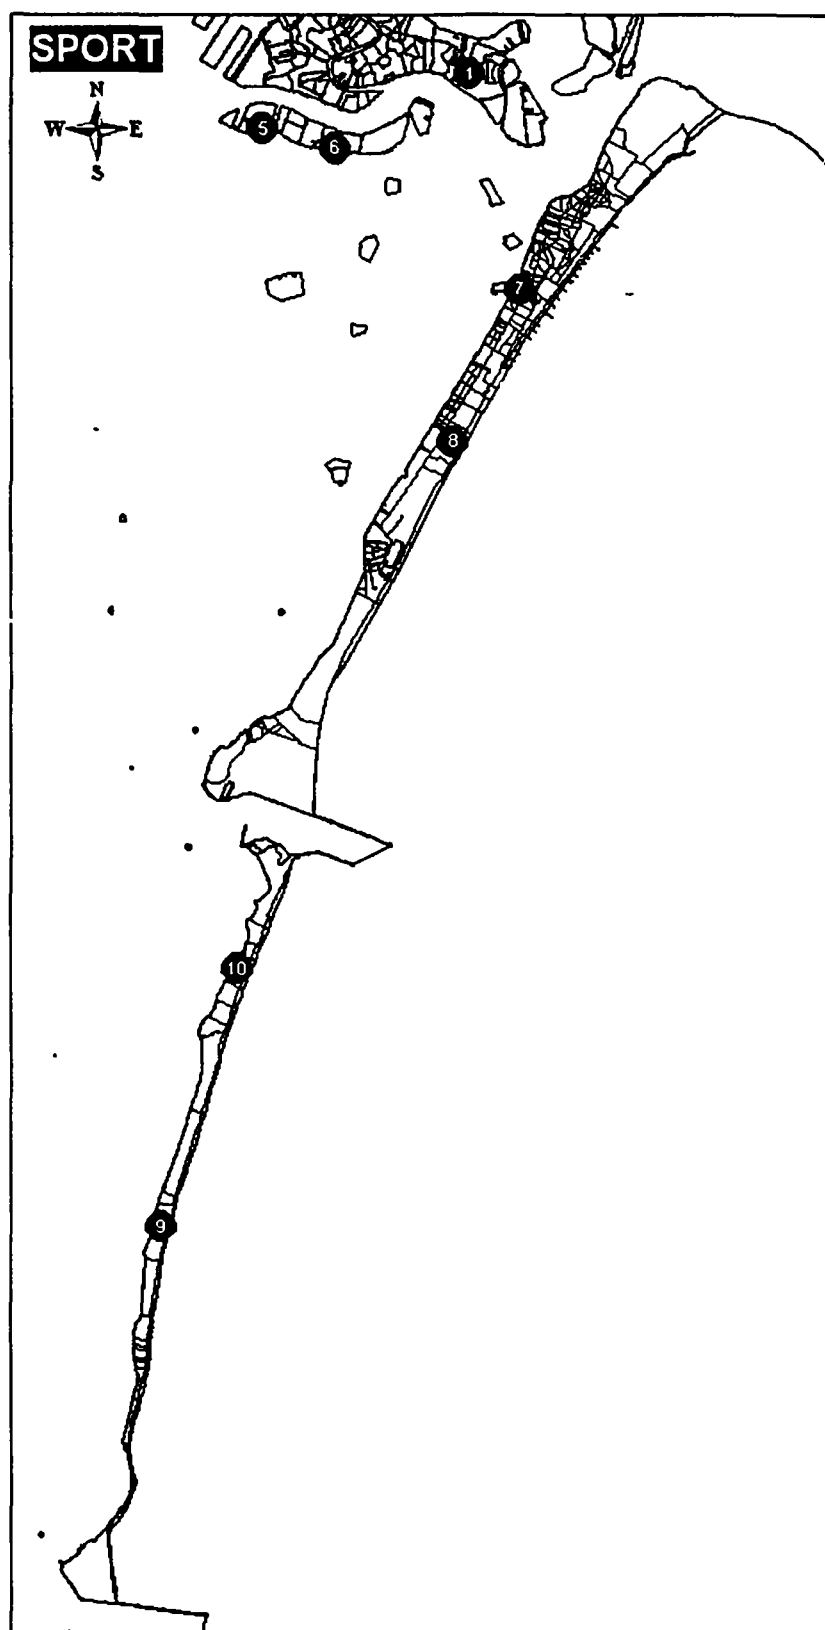

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Palasport G.B. Gianquinto - Castello 1

Intervento
concluso

Il progetto prevede la messa a norma degli impianti del palazzetto di E. Capuzzo e G. Cocco (sorto su un'area già occupata da ottocentesche attrezzature di servizio all'arsenale).

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		850	850	800	605



Centro Sportivo Sant'Alvise - Cannaregio 2

Intervento
concluso

L'intervento prevede il recupero dei sei capannoni dell'ex CIGA, realizzati nella seconda metà dell'Ottocento, su una vasta area (4 241 mq) che si affaccia sulla laguna nord. Il recupero del complesso, nel rispetto delle strutture storiche, permetterà la realizzazione di: un nucleo per le attività natatorie costituito da due piscine di (da 25 m. e da 6X10 m. per i bambini); un campo per la pallacanestro con 268 posti a sedere; tre palestre attrezzate (minibasket, scherma, parete per arrampicata, bocciodromo, ginnastica); infine un campo per la pallacanestro scoperto.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		12 896	12.896	12.767	11 288
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.100	1.100		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		13 996	13 996	12 767	11 288



Remiere - Sant'Alvise - Cannaregio 3

Intervento
in corso

Previsione fine lavori
1° semestre 2000

Realizzazione di un capannone per il ricovero delle imbarcazioni delle Associazioni Remiere.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3 400	3 400	3 400	1.289

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI




Centro sportivo Opera Pia Coletti - Cannaregio

4

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
2° semestre 2000

La ristrutturazione del vecchio impianto sportivo, concesso in gestione al Consiglio di Quartiere, doterà il quartiere di un campo da calcetto e un grande spazio chiuso che diventerà sala polivalente.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.500	1.500	1.500	449
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	32	32		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		1.532	1.532	1.500	449



Complesso Sportivo Sacca San Biagio - Giudecca

5

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
giugno 2000

La sacca S. Biagio (interamente proprietà del Comune) è un complesso di tre isole di recente formazione poste nell'estremità ovest dell'isola della Giudecca. Nell'isola centrale è in funzione dal 1985 la piscina comunale coperta. Il progetto prevede l'inserimento di nuovi impianti sportivi nell'isola centrale: un centro per il tennis, un bocciodromo coperto, una vasta area verde. Nell'isola di levante è in stato di totale degrado è previsto l'insediamento di attrezzature sportive legate agli sport d'acqua e al tempo libero (pontili, strutture per il ricovero delle barche, etc.).

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		7.919	7.919	7.873	2.939



Remiere ex CNOMV - Giudecca

6

Intervento
concluso

Restauro e risanamento di manufatti da destinare a ricovero e rimessaggio barche. I capannoni fanno parte del complesso degli ex Cantieri Navali e Officine Meccaniche Veneziane di proprietà comunale. Il progetto prevede la demolizione degli edifici impropri addossati alla struttura originale, la ottimizzazione della capacità ricettiva dei contenitori mediante sistemi di meccanizzazione della movimentazione dei natanti, riorganizzazione degli spazi liberi per attività integrative, servizi a queste attività connessi.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2.990	2.990	2.990	1.953

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Pattinodromo Quattro Fontane - Lido

7

Intervento
concluso

Costruito nel '62 è composto da due piste per il pattinaggio, dall'edificio adibito a servizi e spogliatoi e da una tribuna per il pubblico. Il progetto al fine di superare le attuali carenze strutturali e funzionali, prevede: la demolizione delle piste e la realizzazione al loro posto un anello di 175 metri con all'interno un campo polivalente per il pattinaggio artistico e per l'hockey (sede sociale dell'Hockey Club di Venezia); la sistemazione degli spogliatoi e servizi; il completamento della tribuna (650 posti); la costruzione della rete fognaria e degli altri impianti (termico, elettrico,

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2 693	2 693	2 693	1 551



Nuova Piscina - Lido

8

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
1° trimestre 2000

Realizzazione di un nuovo impianto natatorio con una vasca da 25 m. (sei corsie). L'impianto sarà dotato di due tribune laterali che potranno ospitare trecento spettatori. È prevista inoltre una palestra di 14x10 m. dotata di servizi e spogliatoi autonomi. La struttura è completata dai locali per la sauna, i servizi per il natatore, il pronto soccorso e gli impianti tecnologici. La costruzione è predisposta per un futuro ampliamento con altri impianti sportivi. Il bacino di utenza è stato calcolato in 50.000 persone.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		9 894	9 894	9 894	8 773



Centro Sportivo - Pellestrina


9

Intervento
concluso

Il progetto prevede il restauro delle strutture esistenti, rifacimento del manto del campo da calcio, sistemazione del campo di allenamento e delle aree a verde, adeguamento degli impianti, e il completamento dell'impianto con una pista polivalente, un campo per la pallacanestro e la pallavolo, due campi da bocce, e con locali per il pronto soccorso.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.172	1.172	1 160	1.050

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Centro polisportivo - San Pietro in Volta 10

Intervento
in progettazionePrevisione fine lavori
giugno 2001

L'intervento mira alla nsistemazione dell'impianto esistente. Il progetto prevede: il rifacimento del campo da calcio con due nuove tribune di cui una coperta insenta nel nuovo palazzetto (800 posti ca.); la realizzazione di due campi da tennis con fondo sintetico (gli unici sull'isola) ed illuminazione notturna e un campo da calcetto anch'esso sintetico; la costruzione di un palazzetto per il basket, pallamano, calcetto, pallavolo (600 ca. posti a sedere). Quest'ultima struttura comprenderà gli spazi ed i servizi di supporto alle attività sportive praticate sia all'aperto che al coperto

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5 000	5 000	190	105
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.500	1.500		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		6 500	6.500	190	105



Centro Sportivo San Mattia - Murano 11

Intervento
concluso

L'impianto, attivo e notevolmente frequentato, è fortemente degradato e non a norma con le recenti disposizioni nel campo della sicurezza e dell'igiene. La nsistemazione prevede una serie di interventi volti alla riorganizzazione spaziale, alla sistemazione dei due campi da calcio e della pista di atletica, al recupero degli spogliatoi e dei servizi sottotribuna, all'adeguamento degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento della accessibilità attraverso la realizzazione di un ponte e una nuova strada.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2 826	2.826	2 820	2.703



Remiere - Sant'Erasmo 12

Intervento
in progettazionePrevisione fine lavori
dicembre 2000

Realizzazione di un nuova fabbricato da destinare a ricovero imbarcazioni per lo sviluppo di attività remiere.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.793	330	300	80

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Palestra L. Perziano - Murano **13**Intervento
concluso

L'intervento prevede l'adeguamento
normativo di prevenzione incendi e sicurezza
per l'esercizio degli impianti sportivi.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.420	1.420	1.379	1.334

Nuova Palestra - Mazzorbo **14**Intervento
concluso

Il progetto prevede la ristrutturazione del
campo da calcio esistente palestra (300 posti)
e la realizzazione a suo lato di una nuova
palestra (300 posti) per il basket, e pallavolo
omologata per le partite ufficiali, un campo da
tennis e i servizi a queste attrezzature
connessi (quattro spogliatoi, una sala riunioni,
bar e servizi).

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6.057	6.057	6.057	5.472

Manutenzione straordinaria e diffusa

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
fine 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		9.297	8.917	7.710	5.794
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	968	968		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		10.265	9.885	7.710	5.794

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Totale Sport

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		69 707	67.864	61 533	45 385
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	3.600	3.600		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale	-	73 307	71.464	61.533	45 385

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero interventi in progettazione	Numero interventi in corso	Numero interventi conclusi
2	5	8

