


QUADRO RIASSUNTIVO STATO AVANZAMENTO INTERVENTI

Numero interventi in progettazione	Numero interventi in corso	Numero interventi conclusi
9	19	9

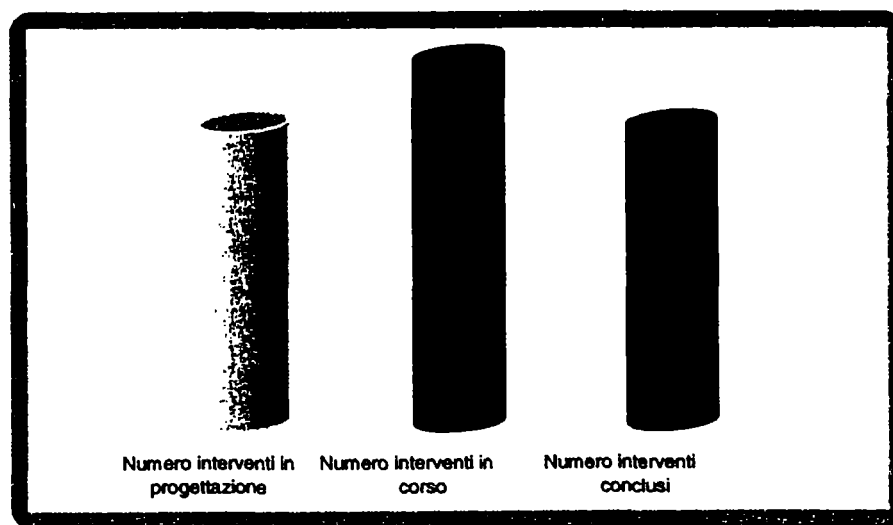

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Varie


Intervento
in corso

Previsione fine lavori
fine 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		17.492	17.492	16.240	13.414
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.885	419		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		20.377	17.911	16.240	13.414

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		858.656	843.145	781.215	433.812
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	148.854	135.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	12.750	12.750		
	2000	8.500	2.950		
Totale		1.028.760	993.845	781.215	433.812

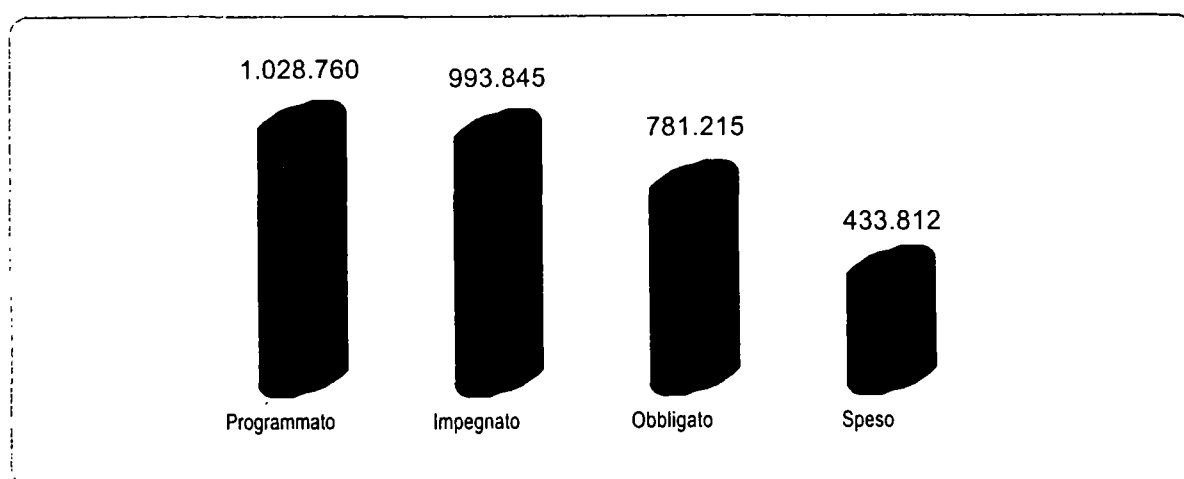



PAGINA BIANCA

Opere di Urbanizzazione

lett. b) art. 6 L. 798/84

... per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione dei ponti, canali e fondamenta.....

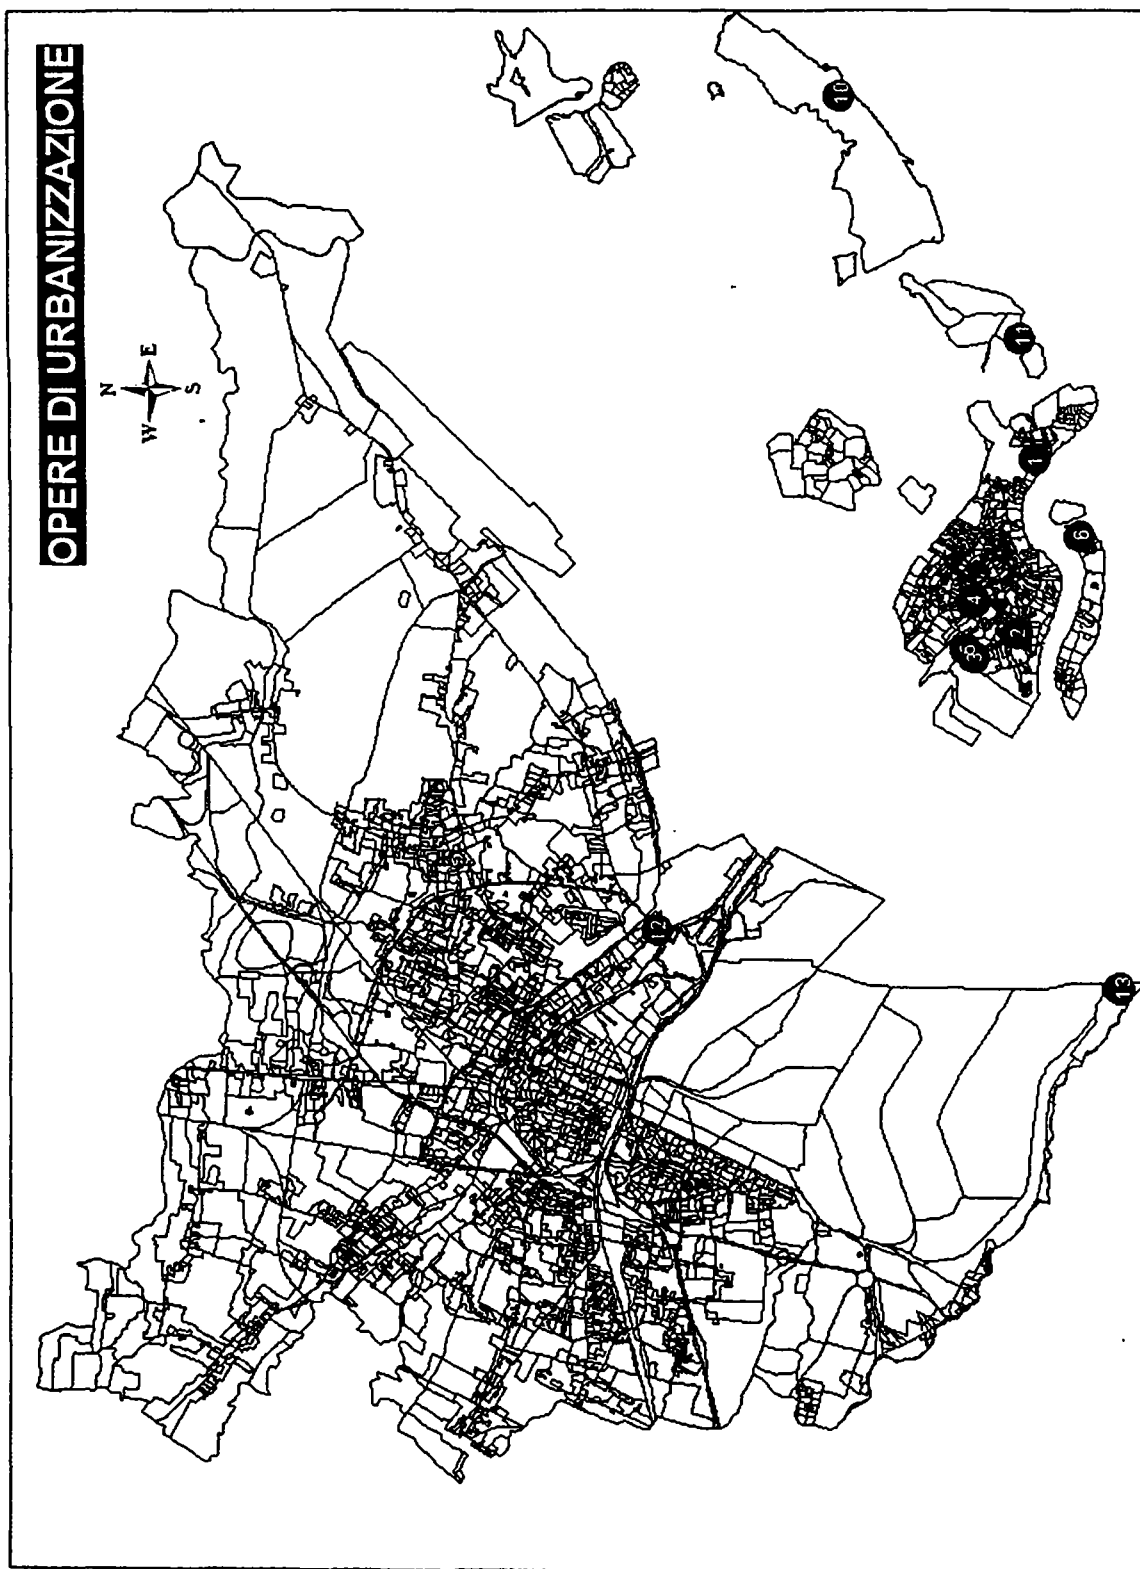

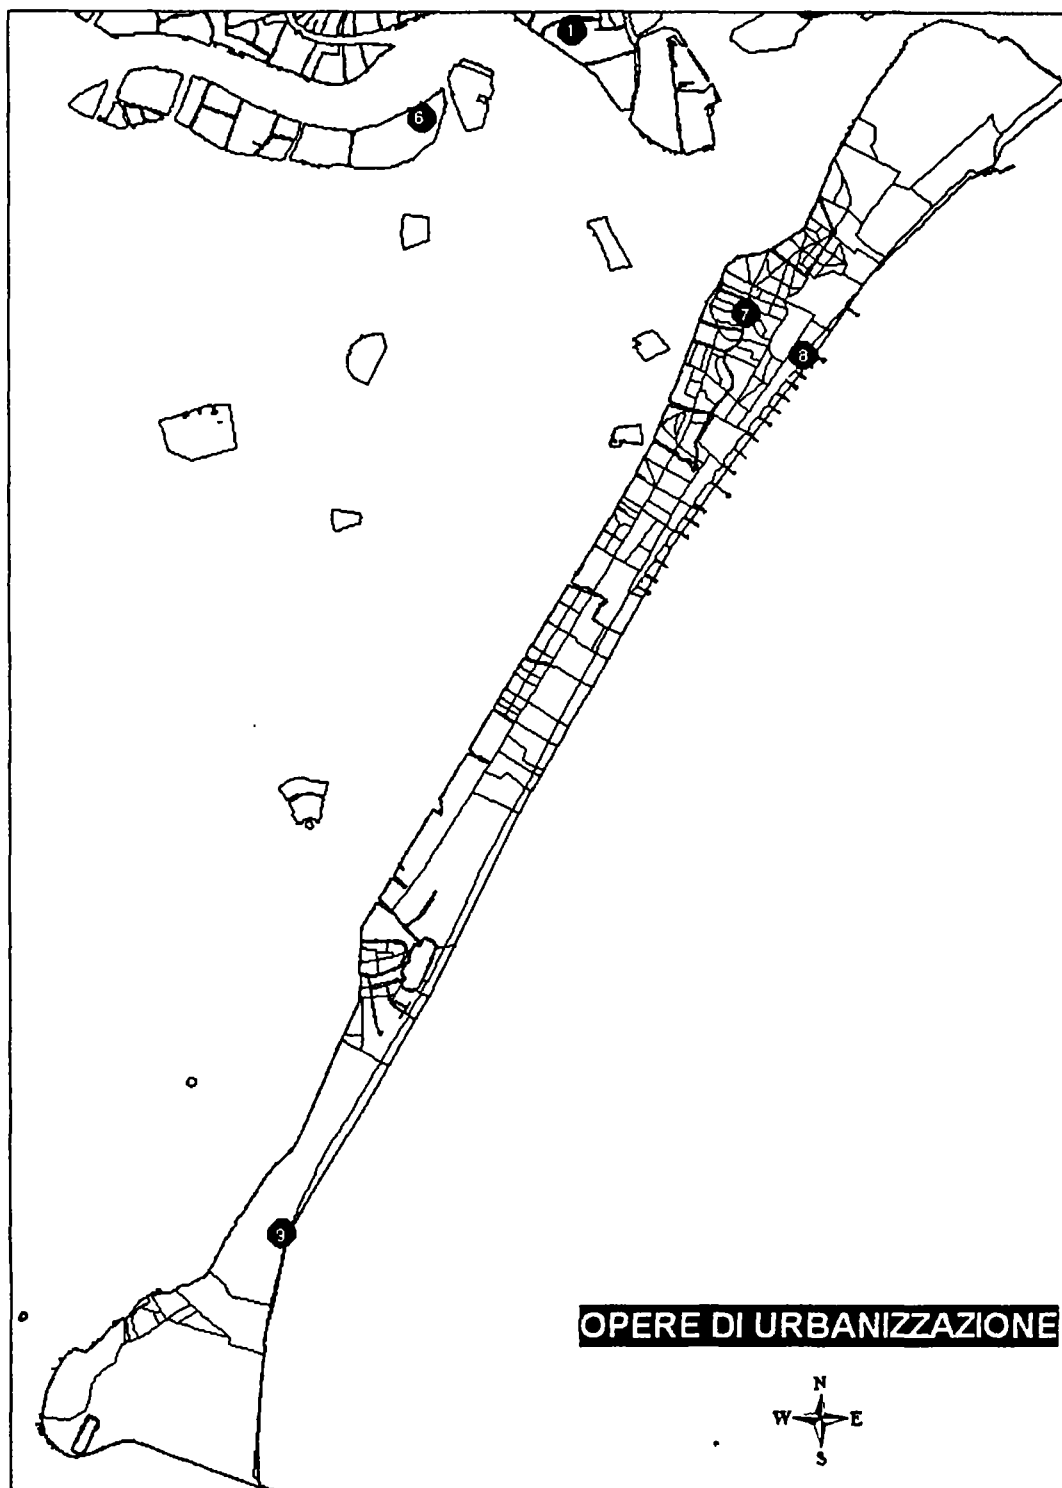

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Intervento
concluso

Via Garibaldi - Castello

1

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		4.746	4.746	4.691	4.595

Realizzata mediante la copertura parziale del no di castello, nel 1807, da G.Selva al fine di creare un collegamento pedonale con i Giardini, è estranea per dimensioni all'ambiente veneziano (larga 15 metri in media, lunga 360). Il progetto vuole recuperare il valore e il senso della proposta ottocentesca di rifunzionalizzazione del tracciato come spina dorsale di un sistema di infrastrutture per l'area di Castello. Il totale rifacimento della pavimentazione si avvale dell'uso di materiali ripresi dalla tradizione costruttiva veneziana: pietra d'istria, masegni e salizzoni di trachite grigia.


Intervento
concluso

Campo Santa Margherita - Dorsoduro

2

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.341	1.341	1.341	1.278

Ancora oggi popolare luogo di mercato e centro di vita, il campo, tra i maggiori della città, è cinto da una cortina di interessanti edifici anche trecenteschi. Al centro si eleva isolato l'edificio ex scuola dei Varoteni un tempo prospiciente il no, interrato nel 1863, che delimitava il lato sud del campo. L'ultimo intervento consistente fu eseguito negli anni '70 quando furono inserite alberature. L'intervento proposto si colloca nell'ambito del mantenimento dell'assetto formale del campo e prevede interventi di recupero e restauro dei manufatti e il rifacimento della pavimentazione.

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
inizio 2000

Piazzale Roma - Santa Croce

3

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2.923	2.255	1.400	678

Terminal di tutti i servizi automobilistici pubblici che collegano Venezia con le città di terraferma fu aperto a seguito della costruzione del ponte translagunare nel 1931. Il progetto di riordino ha lo scopo di razionalizzare il piazzale per rendere più funzionale la circolazione e garantire una maggior sicurezza ai pedoni. La superficie di 18.000 mq verrà suddivisa per separare la sosta e la circolazione del traffico privato da quello pubblico a cui sarà dedicata la maggior parte del piazzale.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Campo S. Giacomo dell'Orio - S. Croce

4

Intervento
concluso

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.100	1.100	1.000	892

Parzialmente alberato è articolato in tre spazi differenti disegnati dalla particolare posizione della chiesa (XIII sec.) che con la parte absidale diviene l'elemento predominante dello spazio. Si affacciano sul Campo importanti edifici sei-settecenteschi e tre vere e proprie da pozzo. Per la mancanza di manutenzione il campo si trova in condizioni di degrado. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria della pavimentazione, per migliorarne la fruizione, nonché la salvaguardia della alberature presenti, riqualificandone la funzione di polo aggregativo che nel passato, il campo, ha sempre avuto.



IV ponte sul Canal Grande - Santa Croce - Cannaregio

5

Intervento
in progettazionePrevisione fine lavori
dicembre 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	7.440	7.440		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		7.440	7.440		

Il ponte dovrebbe collegare le due rive, tra P.le Roma, e la fondamenta di S. Lucia a ridosso della stazione ferroviaria. L'obiettivo è quello di rendere accessibile ai passeggeri giunti in ferrovia tutte le infrastrutture di trasporto di P.le Roma, trasformato in questo nuovo assetto in nodo di interscambio veloce. Inoltre si inscena come elemento di riqualificazione e rivitalizzazione dell'intera area ovest della città, in un piano che coinvolge la ferrovia, P.le Roma, il Tronchetto e la Mantova. Il ponte verrà realizzato su progetto dell'arch. Calatrava.



Urbanizzazioni Campo Marte (convenzione ATER) - Giudecca

6

Intervento
in progettazionePrevisione fine lavori
dicembre 2002

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.000	2.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		2.000	2.000		

Opere di urbanizzazione per la realizzazione di un intervento localizzato nella parte est dell'isola della Giudecca. È prevista la demolizione di un quartiere di edilizia economica popolare costruito nel 1921 e la ricostruzione di nuovi edifici residenziali pubblici, con il ricavo di 56 nuovi alloggi.


XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Intervento
concluso

Via Lepanto - Lido 7

È una delle vie centrali del Lido che collega il Gran Viale con la zona del Casinò, snodandosi lungo un canale interno. Il tratto interessato dal progetto è quello più vicino al Gran Viale. Si propone la riqualificazione dell'ambiente urbano attraverso la pedonalizzazione e una serie di interventi di rinnovo dell'arredo urbano tali da creare uno spazio di aggregazione.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2.763	2.763	2.700	2.237

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
giugno 2000

Piazzale Bucintoro "ex Blue Moon" - Lido 8

È il punto di incrocio tra il lungomare e il perpendicolare Gran Viale che, dopo aver attraversato il Lido, unisce la laguna al mare. Nel luogo del progetto era stato costruito il primo stabilimento balneare pubblico. Diventato fatiscente venne dimesso. Il progetto prevede di rendere evidente il punto di arrivo al mare collocandovi un padiglione su due livelli che costituisce una piazza semicircolare, il luogo di incontro del lungomare. Il sistema è completato da un corpo edificato con terrazze gradonate che verranno destinate ad attività commerciali e ricettive.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		8.651	8.651	8.586	2.409

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
dicembre 2000

Viabilità Lido

Il sistema viario (pedonale, ciclabile, carrabile) è sottoposto ad un progetto di riordino della circolazione e a lavori di manutenzione dei sedimi e arredi urbani secondo quanto stabilito dal Piano Urbano del Traffico.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		28.111	26.111	14.318	5.495
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	300	300		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		28.411	26.411	14.318	5.495

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Centro Soggiorno Morosini - Lido **9**Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
giugno 2000

Realizzazione dell'impianto fognario.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.400	1.400	1.400	

Interventi vari di urbanizzazione - Pellestrina

Intervento
conclusoInterventi di manutenzione e rifacimento della
rete viaria.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2.593	2.593	2.420	1.351

Piano Particolareggiato PEEP - Sant'Erasmo **10**Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
giugno 2000

L'intervento di nuova edificazione è sito in un'area di espansione edilizia regolata da Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica attuativo del PRG vigente. L'area interessata dal progetto è nei pressi del minuscolo accentramento nei pressi della chiesa. L'edificio in oggetto è composto da 10 alloggi di varie dimensioni e tipologie (4 alloggi a schiera ed un blocco da 6 alloggi).

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3.146	3.146	224	224

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Isola Certosa

11

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
dicembre 1999

Posta di fronte a Sant'Elena, già sede nel XII secolo di un convento dedicato a S. Andrea, prende il nome dai Certosini che vi si insediarono nel 1424. Dopo la soppressione napoleonica dell'ordine il complesso fu distrutto. In seguito divenne polveriera e fu occupato da militari fino al 1968. Oggi è la più estesa tra le isole abbandonate della laguna caratterizzata da una fitissima vegetazione. Il progetto destina l'isola a parco. I lavori consistono in opere di bonifica ambientale, ristrutturazione dei capannoni nei quali insediare attività legate alla manutenzione di imbarcazioni, alla ristrutturazione di un edificio come Centro Servizi per gli utenti, dotato di foresteria.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		7 810	7.810	7 224	2 384
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	653	653		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		8 463	8 463	7 224	2.384



Realizzazione Parco San Giuliano - Terraferma

12

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
dicembre 2004

Il progetto coinvolge un'area di circa 700 ettari di terra e acqua comprendente la penisola di S. Giuliano, Forte Marghera, l'area dei Pili e la gronda lagunare fino a Passo Campalto, il canale Osellino fino al centro di Mestre. L'obiettivo è la riqualificazione ambientale e la bonifica dell'area al fine di renderla accessibile e fruibile e fare del parco una cerniera verde tra la realtà urbana di Mestre e quella di Venezia. Il Parco viene diviso in comparti territoriali, area ricreativa, area di recupero e protezione ambientale, ecc. con vari poli di attività, tutte le parti sono connesse con il Centro Storico e le zone circostanti da una rete viaria e ciclopedonale.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		31 295	31.295	31 281	3 709



Terminal di Fusina - Terraferma

13

Intervento
in progettazione

Previsione fine lavori

È, con Tessera e Punta Sabbioni, uno dei nodi del sistema di interscambio terra - acqua. La realizzazione del terminal risponde alla scelta strategica di riorganizzare il sistema di accesso alla città storica rafforzando e valorizzando il rapporto con la terraferma, ma differenziando i flussi e privilegiando i percorsi acquei. Il terminal di Fusina prevede la concentrazione di circa 1/3 del flusso turistico intercettando gli arrivi da sud e da ovest che attraverso il Canale della Giudecca arriveranno rapidamente al cuore della città insulare. L'intervento prevede 1.500 parcheggi a raso, 350 coperti, 150 per autocomere, darsena per vaporette e approdo per mezzi privati.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3 272	1.772	1 435	883

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Realizzazione strutture traffico acqueo

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
febbraio 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3.878	3.858	2.467	2.467
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.500	301		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999 2000				
Totale		5.378	4.159	2.467	2.467



Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
dicembre 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		296	296	47	47
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.500	1.500		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999 2000				
Totale		1.796	1.796	47	47

Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, istituito nel 1980, ha raggiunto, in questi ultimi anni, un elevato livello di specializzazione nell'archiviazione ed elaborazione dei parametri meteorologici del Mare Adriatico. Questo ha consentito di realizzare e rendere operativi alcuni modelli statistici di alta affidabilità con i quali si sono potuti realizzare nuovi sistemi per l'informazione e la segnalazione dei fenomeni di inondazione della città di Venezia (sistema di risponditori automatici su 60 linee, sistema di segnalazione a mezzo sirene, sistema di avvisi ai residenti ed operatori economici veneziani, ecc.)

ASPIV - Manutenzione rete idrica

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
dicembre 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.000	2.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999 2000				
Totale		2.000	2.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rete antincendio Venezia centro storico

Intervento
in progettazioneQuota parte di un finanziamento di un
progetto che si articola in più anni.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5.000	5.000		

Manutenzione straordinaria e diffusa su opere di urbanizzazione varie

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
fine 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		32.843	29.768	23.632	15.324
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	4.368	4.368		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		37.211	34.136	23.632	15.324

Manutenzione verde pubblico

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
fine 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6.195	6.195	4.530	3.998
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.982	2.982		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		9.177	9.177	4.530	3.998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Adeguamento, manutenzione impianti di illuminazione pubblica

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
dicembre 1999

Appalto decennale

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		10.681	10.681	9.539	9.200
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	5.000	5.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		15.681	15.681	9.539	9.200

Infrastrutture e opere di urbanizzazione centri urbani insulari

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
dicembre 2001

Accordi di programma tra Stato e Regione sui territori di:

- Malamocco 5 mld;
- Pellestrina 5 mld;
- Sant'Erasmo 4 mld;
- Burano 6,3 mld.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		20.300	20.300	20.300	13

Varie

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
1° trimestre 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3.785	3.769	3.574	3.070
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.156	527		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		4.941	4.296	3.574	3.070

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Totale Opere di Urbanizzazione

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		182.129	174.850	142.109	60.254
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	28.899	27.071		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale	-	211.028	201.921	142.109	60.254

