

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONFERENZE DI SERVIZI						
N.	Codice			Oggetto	Data	Esito
1	C	09	02/1	Riqualificazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica). Sistemazione del Parco della Caffarella	29/01/98	Approvato
2	D	08	03	Progetto nodo Piazza Rovere	29/01/98	Approvato
3	A	05	01/1	S.Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane.(Risanamento parco)	30/01/98	Approvato
4	A	05	01/2	S.Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane.(Parcheggi)	30/01/98	Approvato
5	A	05	01/3	S.Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane.(Manutenzione straord. Padiglioni direz.)	30/01/98	Approvato
6	A	05	01/4	S.Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane.(Manutenzione ordin. cappella e 3 padiglioni)	30/01/98	Approvato
7	A	05	01/5	S.Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane.(Ristrutturazione 5 padiglioni))	30/01/98	Approvato
8	A	05	02	Ex Colonia marina Vittorio Emanuele III	03/02/98	Approvato
9	D	14	06	Potenziamento S.P. Settecamini	19/02/98	Approvato
10	D	14	08	Prolungamento S.P. Settecamini	19/02/98	Approvato
11	E	02	03	Complesso ospedaliero S. Eugenio Realizzazione dipartimento emergenza accettazione (1° stralcio funzionale)	20/02/98	Rinviata
12	C	01	10	Piazze S. Pietro in Vincoli, S.Prassede.... Riqualificazione ambientale, risagomatura strade, ripristino selciati.	23/02/98	Approvato
13	C	03	01	Ristrutturazione sede stradale via Giubbonari.	26/02/98	Approvato
14	C	03	02	Ristrutturazione Piazza della Minerva	26/02/98	Approvato
15	C	04	15	Riqualificazione Appia Antica.	27/02/98	Approvato
16	C	01	12	Percorso "C" autobus turistici .	04/03/98	Approvato con prescrizioni.
17	C	01	13	Percorso "D" autobus turistici .	04/03/98	Approvato
18	C	12	04/2	Villa Doria Pamphily. Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini di villa Vecchia.	13/03/98	Approvato
19	C	01	22/1	Villa Doria Pamphily. Restauro Casale di Giovio	16/03/98	Approvato
20	C	01	22/2	Villa Doria Pamphily. Restauro e allestimento museale Cascina Falsetti.	16/03/98	Approvato
21	A	01	06	Comunità alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione immobile a Vigne Nuove	26/03/98	Approvato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22	C	12	04/1	Villa Doria Pamphily. Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del teatro.	09/04/98	Approvato
23	B	19	56	Abbazia Montecassino - area esterna	15/04/98	
24	D	08	03	Parcheggio del Gianicolo e viabilità	15/04/98	Approvato
25	C	11	04	Area archeologica del Celio	16/04/98	Approvato
26	E	02	02	Ospedale S. Giovanni	16/04/98	Approvato
27	D	09	01	Infrastrutture area stazione Tiburtina	23/04/98	Rinviata
28	E	02	03	Ospedale S. Eugenio	30/04/98	Approvato
29	E	01	01	Automezzi e attrezzature per il territorio comunale	04/05/98	Approvato
30	C	01	24	Restauro e recupero Villino Corsini	05/05/98	Approvato
31	C	01	26	Riqualficazione area Teatro Marcello	07/05/98	Approvato
32	E	01	11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Sede di zona via Gomenizza	11/05/98	Approvato
33	E	01	13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Sede di zona via Giolitti	11/05/98	Approvato
34	E	01	15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Sede di zona Arco di Travertino	11/05/98	Approvato
35	E	01	17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Sede di zona via Bellami	11/05/98	Approvato
36	E	01	18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Area intermedia attrezzata	11/05/98	Approvato
37	E	01	25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Sede di zona Tor di Quinto	11/05/98	Approvato
38	E	01	26	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Potenz. Area intermedia via Campoboardio	11/05/98	Approvato
39	C	11	06	Parco del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Tertesa di Calcutta	15/05/98	Approvato
40	D	18	02/2	Riqualficazione e potenziamento Ferrovia Roma Nord	19/05/98	Parere sospeso per PRG
41	B	01	01	Area del grande Campidoglio	22/05/98	Approvato
42	E	01	08	Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali	25/05/98	Approvato
43	B	02	01.3	Area archeologica Fori Imperiali. Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.	28/05/98	Sospesa
44	C	11	03	Parco del Celio. Restauro ex palestra dei vigili.	28/05/98	Sospesa
45	D	18	02/2	Ferrovie Concesse. Potenziamento linea Roma Nord.	02/06/98	Rinviata
46	E	02	04	Ospedale G.B. Grassi di Ostia	04/06/98	Approvato
47	F	01	02	Cinema Castello - Centro servizi stampa	05/06/98	Rinviata
48	B	04	01	Palazzo delle Esposizioni - Progetto restauro ed adeg. Funzion. e Tecnolog.	09/06/98	Approvato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

49	C	03	04	Area pedonale del Colosseo	09/06/98	Approvato
50	C	11	01.1	Parco del Celio - Via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali. restauro e manut.	09/06/98	Approvato
51	C	11	01.2	Parco del Celio - Sistemazione dei percorsi pedonali e carrabili, integrazione illuminazione e nuovi impianti.	09/06/98	Approvato
52	C	11	07	Lavori di restauro del Pulpito di S. Domenico	09/06/98	Approvato
53	C	13	01.1	Lavori di restauro dei Casali Mellini nel Parco di Monte Mario.	09/06/98	Rinviata
54	B	02	01.1	Area archeologica Fori Imperiali. Allestimento del Museo dei Fori Imper. e Mercati Traianei	16/06/98	Sospesa
55	C	01	25	Villa Doria Pamphili - Recupero e restauro Arco dei quattro Venti	16/06/98	Approvato
56	C	12	03	Villa Doria Pamphili. Bonifica e recupero vegetazione della Valle dei Daini.	17/06/98	Approvato
57	E	01	24	Sedi di zona e aree intermedie(Roma). Realizzazione area intermedia attrezzata Via Acquafredda (1° LOTTO)	17/06/98	Rinviata
58	E	01	28	Nuovo stabilimento AMA a Roma Nord (1° LOTTO)	17/06/98	Approvato
59	E	01	29	Nuovo stabilimento AMA a Roma Sud (1° LOTTO)	17/06/98	Approvato
60	C	19	01/b	Risanamento e trattamento acque. Sistemazione idraulica fosso Acqua Mariana	25/06/98	Rinviata
61	D	19	04	Nodo di scambio Valle Aurelia	25/06/98	Approvato
62	C	13	01/1	Parco di Monte Mario - Recupero dei Casali Mellini	26/06/98	Approvato
63	F	01	02	Sala stampa - Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	03/07/98	
64	E	03	02/4	Lavori di straordinaria manutenzione restauro e adeguamento impianti di porzione del fabbricato "ex Istituto Luce"	13/07/98	Sospesa
65	A	01	21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro di servizi socio-sanitari. Recupero edilizio ex Convento S. Bartolomeo all'Isola.	23/07/98	Approvato
66	E	02	02/3	Ospedale S. Giovanni. Restauro Ospedale antico	27/07/98	Approvato
67	E	01	22/1	Ristrutturazione Area Intermedia Attrezzata Via Sannio	28/07/98	Approvato
68	E	01	30	Servizi igienici pubblici. Realizzazione e ristrutturazione attrezzature igieniche fisse.	28/07/98	Rinviato
69	C	09	02/2	Riqualificazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica). Restauro manufatti storici.	29/07/98	Approvato
70	D	18	02/2	Riqualificazione e potenziamento Ferrovia Roma Nord	30/07/98	Approvato
71	E	03	02/1	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative dell'edificio sito in viale Trastevere 18 - Roma	26/08/98	Approvato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

72	E	03	02/2	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative dell'edificio sito in via Ferruccio 9 - Roma	26/08/98	Approvato
73	E	03	02/3	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative dell'edificio sito in viale Togliatti 987 - Roma	26/08/98	Approvato
74	E	03	02/5	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative dell'edificio sito in via della Consolazione 4 - Roma	26/08/98	Approvato
75	C	01	21/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche	03/09/98	Approvato
76	C	01	23	Villa Doria Pamphilj (Roma) : restauro arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro.	03/09/98	Approvato
77	E	03	02/4	Lavori di straordinaria manutenzione restauro e adeguamento impianti di porzione del fabbricato "ex Istituto Luce"	10/09/98	Approvato
78	C	13	1/2	Parco di Monte Mario e Casali Mellini - Monte Mario : consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	14/09/98	Approvato
79	C	02	1.1	Area della Basilica di S.Pietro in Vaticano. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture e rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza.	15/09/98	Sospesa
80	C	02	2.2	Area della Basilica di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture e rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza.	15/09/98	Sospesa
81	C	02	3.1	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture e rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza.	15/09/98	Sospesa
82	C	01	18/1	Villa Borghese Portico dei leoni ecc.	18/09/98	Approvato
83	C	01	18/2	Villa Borghese propilei egizi ecc.	19/09/98	Approvato
84	C	04	04	Area Castel Gandolfo Potenziamento infrastrut. Fermata la villetta	21/09/98	Approvato
85	C	07	01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis-Catacombe di S. Marcellino. Sistemazione delle aree a verde.	24/09/98	Approvato
86	C	08	01/2	Restauro del Parco di Villa Borghese	28/09/98	Rinviata
87	E	01	30	Servizi igienici pubblici. Realizzazione e ristrutturazione attrezzature igieniche fisse.	12/10/98	Approvato
88	C	02	04	Itinerari giubiliari e storici. Contributo alla manutenzione delle sedi stradali.	15/10/98	Approvato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

89	C	11	05	Recupero dell'area di S.Gregorio al Celio recupero delle aree a verde di S.Gregorio al Celio, ex antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	23/10/98	Approvato
90				Croce Rossa	27/10/98	Propedeutica Approvato
91	C	06	01	Giardini di S. Giovanni e Via Carlo Felice (Roma). Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	28/10/98	Approvato
92	D	18	04	Stazione Termini	03/11/98	Approvato
93	C	01	21/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) : sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati.	13/11/98	Approvato
94				Tor Vergata	20/11/98	Propedeutica Approvato
95	C	02	05	Intervento di adeguamento dei parcheggi a disposizione delle catacombe aperte al pubblico in Roma.	23/11/98	Approvato
96	A	01	29	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia per famiglie disagiate	25/11/98	Approvato
97	C	05	1.1	Giardini di Castel S. Angelo - Lavori di recupero infrastr. e vegetaz.: giardini dei bastioni	16/12/98	Rinviato
98	C	05	1.2	Giardini di Castel S. Angelo - Lavori di recupero fossato	16/12/98	Rinviato
99	B	20	02	Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Piccolomini	21/12/98	Approvato

2.5 I rapporti tra la Santa Sede e lo Stato Italiano

Il comma 13, art.1, della legge n. 651/96 prevede che : *“I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, delle modalità di attuazione degli interventi”*.

Nella stesura iniziale del Piano (settembre 1996), l'unica opera prevista nel territorio dello Stato Città del Vaticano e parzialmente finanziata dallo Stato Italiano, era quella relativa al “Parcheggio in area Gianicolo”(D.08.02).

Lo scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la realizzazione dell'opera suddetta è avvenuto tra il 3 ed il 19 dicembre 1997.

Dal carteggio, emerge che:

- la Santa Sede, per la costruzione del parcheggio nell'area di sua proprietà in zona extraterritoriale, intende avvalersi dei diritti di cui al 2° comma dell'art.16 del Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929, diritti che conferiscono alla Santa Sede di dare ai suddetti immobili l'assetto che crede, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali e comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la chiesa cattolica;
- ad avvenuta realizzazione dell'opera la Santa Sede procederà alla sospensione del privilegio per quanto attiene all'uso del manufatto in ragione della sua destinazione a parcheggio, al quale verrà applicata la normativa e la giurisdizione italiana;
- sul costo totale del progetto, previsto in 85 miliardi di lire italiane, il Governo della Repubblica darà un contributo di 40 miliardi di lire ai sensi della legge 651/96 e della deliberazione n.7/97 del 4 giugno 1997 della Commissione per Roma Capitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le interconnessioni del parcheggio con il sistema di viabilità esterno sono a carico dello Stato italiano; le relative opere saranno realizzate dal Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio;
- l'affidamento dei lavori è regolato dall'ordinamento giuridico della Santa Sede, ma nel contratto di appalto è stato convenuto, in linea di massima, un rinvio alla normativa italiana in materia;
- in tema di accesso e di facilitazioni di agibilità di area il Comune di Roma provvederà a garantire un'appropriata disciplina della sosta nelle aree circostanti ed a mantenere in perpetuo, gratuitamente, l'uso del suolo pubblico per le uscite sia pedonali che veicolari.

Il Governo della Repubblica Italiana si è impegnato a corrispondere il relativo finanziamento direttamente alla Santa Sede in tre soluzioni e precisamente:

- il 50% alla comunicazione di avvenuto inizio lavori;
- il 40 % alla notifica dell'avvenuta utilizzazione dell'80% del primo acconto;
- il 10% su certificazione dell'avvenuto completamento dell'intervento.

Il 15 luglio 1998 è poi intervenuto un ulteriore scambio di note tra la Santa Sede ed il Governo della Repubblica Italiana, in ordine alla realizzazione dei lavori concernenti le Basiliche patriarcali di S. Paolo fuori le Mura, S. Giovanni in Laterano e S. Maria Maggiore.

In particolare, con tale scambio di note si è convenuto che, l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori saranno disciplinati dall'ordinamento giuridico vaticano, assoggettandone la realizzazione al rispetto della normativa italiana in materia di impiantistica e di sicurezza sotto ogni profilo, oltre che di abbattimento delle barriere architettoniche.

La Santa Sede si è inoltre impegnata a realizzare le opere nel rispetto dei termini indicati nel Piano.

Per ciò che concerne le modalità di erogazione dei finanziamenti, sono stati ribaditi gli impegni già assunti in merito, con il precedente scambio di note, relativo al Parcheggio in area Gianicolo.

3 Il Piano a fine 1998

3.1 Sintesi del Piano e sue variazioni

Anche in ragione della complessità di molti degli interventi facenti parte del Piano, quest'ultimo ha subito, nel corso del 1998, numerose modifiche ed integrazioni ispirate sia, come si è già detto, alla volontà di rendere tale atto programmatico sempre più aderente alle effettive esigenze emergenti in ordine alla celebrazione dell'evento giubilare, sia alla necessità di garantire la conclusione e la "piena funzionalità" delle opere, delle forniture e dei servizi, in una data utile ad affrontare i fabbisogni relativi all'afflusso dei pellegrini e dei visitatori a Roma e nella Regione Lazio.

Le variazioni fin qui apportate configurano, pertanto, le attuali caratteristiche che assume il Piano e ne individuano lo stato di definizione programmatica al 31 dicembre del 1998 (vedi Allegato 1).

Il Piano, a tale data, consta di 754 interventi complessivi, riconducibili ad 81 sotto-settori o ambiti complementari di azione, riferiti ai già ricordati sei settori di intervento in cui, ab origine, è stato articolato il Piano stesso e segnatamente: sociale ed accoglienza; beni culturali; manutenzione, arredo urbano e patrimonio ambientale; accessibilità e mobilità nell'area metropolitana; sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione; informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento

Il valore complessivo del Piano in termini di investimento è pari a circa Lit. 3.652,4 miliardi di lire (pari a 1.875 milioni di Euro). Il costo complessivo del Piano è coperto per 3.500 miliardi di lire (1.807 milioni di Euro) attraverso il finanziamento pubblico statale derivante dalla Legge 651/96 e per 181 miliardi (93,5 milioni di Euro) - corrispondenti a meno del 5% del costo totale del Piano - da altre fonti di finanziamento sempre pubbliche o di Enti ecclesiastici.

Per quanto attiene all'articolazione del Piano per soggetti beneficiari raggruppati per tipologia, il più alto numero di interventi, pari a 278, riguarda le amministrazioni comunali del Lazio (incluso il Comune di Roma), per un importo totale di finanziamento pari a 851,9 miliardi di lire (439,8 milioni di Euro) seguite dalle amministrazioni ed aziende centrali (inclusa FS S.p.A.) con 257 interventi pari a un finanziamento di 1.034,8 miliardi di lire (534,2 milioni di Euro). Altri soggetti locali hanno in carico la realizzazione di 157 interventi per 1.194,8 miliardi di lire (616,8 milioni di Euro) e 62 interventi sono ripartiti fra amministrazione regionale del Lazio

ed amministrazioni provinciali per un importo del finanziamento di 389,9 miliardi di lire (201,3 milioni di Euro). (Tab. 1 e Tav. 1)

La residuale cifra di 28,6 miliardi di lire (12, 4 milioni di Euro) è riferita, in quanto a 12,7 miliardi alla creazione di un fondo per fare fronte alla eventuale corresponsione di premi di accelerazione previsti negli atti di gara e nei relativi contratti, in favore degli esecutori di interventi compresi nel Piano, che ultimino i lavori in anticipo rispetto ai tempi contrattuali, sia per far fronte alle maggiori occorrenze dovute a varianti o ad accordi bonari; in quanto a 15,9 miliardi circa, a somme già trasferite, per progettazioni o altre occorrenze, ad interventi poi definanziati.

Tab. 1 - Sintesi degli interventi inseriti nel Piano al 31/12/1998

Tipologie di soggetti beneficiari	Interventi (N°)	Finanziamenti (miliardi di lire)	Cofinanziamenti (miliardi di lire)	Totale costo interventi (miliardi di lire)
Amministrazioni ed aziende centrali	257	1.034,8	51,3	1.086,1
Amministrazione regionale e provinciale	62	389,9	10,8	400,7
Amministrazioni comunali	278	851,9	14,8	866,7
Altri soggetti	157	1.194,8	104,1	1.298,9
Totale	754	3.471,4	181,0	3.652,4,8
Altro (1)	-	28,6	-	
		3.500,0		

(1) Tale voce include le somme già erogate per interventi poi definanziati ed il "fondo" accantonato per eventuali premi di incentivazione

Fonte: URCGE, 1999

Analizzando in dettaglio l'articolazione degli interventi fra i principali soggetti beneficiari (Tab. 2), si osserva che il 27,3% degli interventi (per un ammontare, però, del 9,1% dei finanziamenti) attiene alle iniziative di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, promosse e realizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Naturalmente i soggetti che per localizzazione sono maggiormente coinvolti nella preparazione e gestione dell'evento giubilare, vale a dire il Comune di Roma e le aziende ad esso collegate, risultano essere le più impegnate nella realizzazione, oltre che nella programmazione del Piano.

Difatti, il Comune di Roma e le aziende ad esso collegate risultano le amministrazioni ed i soggetti procedenti per la realizzazione di 210 interventi, pari al 27,8% del totale e con un importo complessivo pari al 40,6% dei finanziamenti messi a disposizione dallo Stato Italiano per il Giubileo nel Lazio.

Data la diversità degli ambiti di competenza, delle scelte di natura programmatica e delle modalità operative che contraddistinguono i soggetti coinvolti nella realizzazione del Piano, si osserva che quest'ultimo è articolato in un insieme di interventi assai differenziati per dimensione ed i cui costi di realizzazione si discostano anche significativamente dal costo medio per intervento.

A fronte di una media di circa 5,1 miliardi di lire per iniziativa, gli interventi realizzati dal Comune di Roma sono quelli che si avvicinano maggiormente a tale dato, mentre l'importo medio è ampiamente superato dagli interventi promossi o in corso di realizzazione a cura delle amministrazioni ed aziende centrali (ad esclusione del Ministero per i beni le attività culturali i cui interventi sono contraddistinti da un costo medio particolarmente basso), nonché da quelli relativi alla Regione Lazio ed alle aziende collegate al Comune di Roma, che presentano valori rispettivi superiori ai 10 miliardi per intervento.

La dimensione dell'intervento, in termini di complessità realizzativa e di costo, ha inciso fortemente sulla concreta attuazione del programma. Se infatti si confronta il valore medio degli interventi per ente attuatore e la percentuale degli stessi avviati ed in fase di realizzazione, si evidenzia un rapporto di avanzamento inversamente proporzionale alla dimensione di ciascun intervento.

Tab. 2 - Piano degli interventi relativi al Giubileo nel Lazio per principali categorie di beneficiari (situazione al 31/12/1998)

Soggetti beneficiari	Interventi		Finanziamento		Costo complessivo degli interventi		Costo medio per intervento milioni di lire
	n°	%	miliardi di lire	%	miliardi di lire	%	
Ministero per i beni e le attività culturali	206	27,3	317,3	9,1	364,3	9,4	1.768
Altre amministrazioni ed aziende centrali	51	6,8	717,5	20,7	721,7	23,8	14.15
Regione Lazio	16	2,1	214,2	6,2	218,8	5,6	13.678
Amministrazioni provinciali	46	6,1	175,7	5,0	181,9	4,7	3.954
Comune di Roma	139	18,4	697,3	20,1	723,6	18,6	5.206
Aziende del Comune di Roma	71	9,4	727,6	20,5	769,4	19,8	10.836
Altre amministrazioni comunali	139	18,4	154,6	4,4	168,4	4,3	1.211
Enti religiosi	36	4,8	95,8	2,8	142,6	3,7	3.961
Altri soggetti	50	6,6	371,4	10,7	386,9	10,0	7.738
Totale	754	100,0	3.471,4	100,0	3.652,4	100,0	5.148

Fonte: URCGE, 1999

A fronte infatti di 51 interventi programmati dalle amministrazioni centrali, il cui valore è di circa 3 volte superiore alla media, ne risultano in fase di realizzazione 21 con una quota del 41,1%, inferiore al valore medio dell'intero Piano. Tale andamento trova conferma sia per ciò che concerne gli interventi di competenza della Regione Lazio, che per quelli attuati dalle aziende del Comune di Roma, o comunque ad esso collegate (Tab. 3).

Tab. 3- Rapporto tra costo medio degli interventi ed avanzamento nella realizzazione

		Costo medio degli interventi		Stato di avanzamento degli interventi		
		Miliardi di lire	N. indice valore medio =100	Programmati	In fase di realizzazione (2)	
				n.	n.	% su interventi programmati
1)	Ministeri ed aziende centrali (1)	14,1	276	51	21	41,1
2)	Regione Lazio	13,7	267	16	6	37,5
3)	Aziende del Comune di Roma	10,4	204	57	13	22,8
4)	Altri soggetti	8,5	167	64	29	45,3
5)	Comune di Roma	5,2	101	139	63	45,3
	Valore medio	5,1	100	754 (3)	507 (3)	67,2
6)	Amministrazioni provinciali	4,0	77	46	31	67,4
7)	Enti religiosi	4,0	77	36	23	63,9
8)	Ministero beni e attività culturali	1,8	34	206	202	98,0
9)	Altre amministrazioni comunali	1,2	24	139	118	84,9

(1) Escluso Ministero per i beni e le attività culturali

(2) Situazione al 31.12.1998

(3) Numero totale interventi

Fonte: URCGE, 1999

All'estremo opposto si colloca il Ministero per i beni e le attività culturali, con un valore per intervento inferiore al 34% del valore medio, ed un tasso di attuazione pari al 98%. Si può pertanto concludere che, in termini di attuazione, per i ristretti tempi di programmazione e di progettazione degli stessi, alla fine del 1998, risultano in avanzata realizzazione le attività previste da amministrazioni fortemente strutturate, con impegni relativamente circoscritti e di piccola dimensione.

Il Piano è articolato in una serie di obiettivi differenziati per tipologie. Si è già rilevato come una parte assai significativa di questi riguarda la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

Complessivamente a questa categoria appartengono 352 interventi sui complessivi 754, con un finanziamento accordato pari al 16,1% del totale (Tab. 4).

La quota di interventi in fase di realizzazione per questa categoria è pari all'85,8% (302 su 352 programmati). In termini di incidenza sul finanziamento complessivo il settore a maggiore assorbimento di risorse riguarda la accessibilità e la mobilità cui sono

destinati 1.372,4 miliardi di lire (pari a 708,5 milioni di Euro) e corrispondenti al 39,5% del finanziamento complessivo; si tratta di 63 interventi, dei quali risultano in fase di realizzazione 37 (pari al 58,7% del complesso).

Tab. 4 - Settori e sotto-settori di intervento (al 31/12/1998)

Settori	Sotto-settori	Interven- ti	Finanziamento accordato		Costo complessivo		Quota di cofinanz- iamento	Interventi in realizzazione	
	n.	n.	milioni	%	milioni	%	%	n.	%
A. Sociale e Accoglienza	7	85	300.342	8,7	323.469	8,9	7,1	59	69,41
B. Beni culturali	17	352	557.320	16,1	607.971	16,6	8,3	312	88,64
C. Manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale	18	136	571.217	16,5	572.217	15,7	0,2	62	45,59
D. Accessibilità e mobilità nell'Area Metropolitana	18	63	1.372.361	39,5	1.417.281	38,8	3,2	37	58,73
E. Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione	7	104	489.717	14,1	551.117	15,1	11,1	32	30,77
F. Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	3	14	180.359	5,2	180.359	4,9	0,0	5	35,71
Totale	70	754	3.471.407	100,0	3.562.415	100,0	5,0	507	67,2

Fonte: URCGE 1999

Di particolare rilievo, sia per numerosità che per impegno finanziario, sono gli interventi destinati alla manutenzione, alla rete urbana ed alla tutela dell'ambiente: 136 interventi che assorbono il 16,5% dei finanziamenti complessivi.

La realizzazione di questi progetti risulta particolarmente complessa e per tale ragione quelli in corso di realizzazione coprono il 37,5% del totale (51 sui 136 programmati).

Uno dei settori strategicamente più importanti per il Piano, attiene l'accoglienza ed il "sociale", vale a dire quell'insieme di interventi finalizzati alle categorie disagiate; in tale settore al quale afferiscono 85 progetti per una quota dell'8,7% del finanziamento totale. Gran parte di questi progetti sono in corso di realizzazione e la quota in attuazione si attesta attorno alla media generale.

Di particolare importanza sono i programmi relativi ai servizi speciali (sicurezza, sanità, ecc.) ed alla formazione delle figure professionali che saranno maggiormente

coinvolte nella gestione quotidiana dell'evento giubilare; il settore di cui fanno parte (E) concentra 104 progetti ed il 14% circa delle risorse complessive messe a disposizione, ma che vede una relativamente bassa capacità di spesa ed attuazione, visto che poco meno di 1/3 degli interventi sono stati attivati ed avviati.

Nel settore, infine, dell'informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento, da effettuarsi soprattutto attraverso sistemi informatici, sono previsti 14 interventi, cui è destinato il 5,2% delle risorse.

Per quanto riguarda la localizzazione degli interventi è, naturalmente, la città di Roma a concentrare su se stessa la gran parte delle necessità di supporto all'accoglienza dei flussi di pellegrinaggio che troveranno nella capitale il terminale dei diversi itinerari, in parte interessanti anche altre aree territoriali del nostro Paese (Tab. 5).

Tab. 5- Ripartizione degli interventi per localizzazione

Localizzazione	Numero		Finanziamento		Costo totale		Quota % cofinanz iamento	Interventi in fase di realizzazione	
	n.	%	milioni	%	milioni	%	%	n.	%
Comune di Roma	499	66,2	2.578.005	74,3	2.732.934	74,8	5,7	308	61,72
Altri Comuni della Prov. di Roma	141	18,7	540.258	15,6	548.786	15,0	1,6	116	82,27
Totale Prov. Roma	640	84,9	3.118.262	89,8	3.281.720	89,8	5,0	424	66,25
Prov. di Frosinone	29	3,8	40.503	1,2	42.930	1,2	5,7	27	93,10
Prov. di Latina	32	4,2	36.434	1,0	41.649	1,1	12,5	20	62,50
Prov. di Rieti	20	2,7	41.336	1,2	45.239	1,2	8,6	18	90,00
Prov. di Viterbo	17	2,3	33.698	1,0	35.054	1,0	3,9	16	94,12
Senza riferimento territoriale	16	2,1	201.173	5,8	205.823	5,6	2,3	2	12,50
	754	100,0	3.471.407	100,0	3.652.415	100,0	5,0	507	67,20

Fonte: URCGE 1999

All'interno del territorio del Comune di Roma sono, infatti, concentrati 499 interventi su 754, per un importo complessivo di finanziamenti accordati di 2.578 miliardi di lire (pari a 1.330,9 milioni di Euro) ed una concentrazione del 74,3% di tutte le risorse disponibili. Nella città di Roma sono, attualmente, in fase di realizzazione 308 interventi dei 499 anzidetti, pari al 61,7%.

Anche gli altri comuni della provincia di Roma e, quindi, parte dell'hinterland metropolitano della città, sono interessati agli interventi per un ulteriore finanziamento di 540,3 miliardi di lire (pari a 278,9 milioni di Euro). In complesso nella provincia di Roma sono concentrati l'84,9% degli interventi e l'89,8% dei finanziamenti accordati.

Dei 507 interventi in fase di realizzazione 424 sono localizzati nella Provincia di Roma dove, quindi, la preparazione del Giubileo risulta in avanzata fase attuazione

Equilibrata appare inoltre la situazione programmatica ed attuativa in ordine alle altre provincie della Regione Lazio, sia come numero di interventi che come entità di finanziamenti attribuiti.

Per quanto attiene la struttura finanziaria del Piano si è già detto che esso è praticamente a totale carico del finanziamento statale, essendo la quota di cofinanziamento pari al 5% dell'importo globale del Piano stesso (Tab. 6).

Tale dato percentuale è comunque il frutto di una realtà assai differenziata che vede solo pochi soggetti impegnati con quote di cofinanziamento significative e comunque non superiori ad un terzo dell'investimento globale. E' questo il caso degli Enti religiosi e dell'azienda del Comune di Roma AMA.

Per ciò che concerne i dati relativi ai Comuni delle provincie del Lazio o delle provincie stesse, esclusa quella di Roma, va ricordato che la presenza di una percentuale di cofinanziamento superiore alla media è dovuta al fatto che per gli interventi afferenti il sotto-settore A.07 "Completamento della rete degli ostelli e dei campeggi nella città metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo" era previsto, fin dalla prima stesura del Piano, un finanziamento pari al 75% del costo di realizzazione.

Negli altri casi la quota di cofinanziamento supera di poco il valore medio o è del tutto assente.

Tab. 6- Soggetti beneficiari con quote di cofinanziamento superiori al 5% del costo complessivo degli interventi.

Soggetto beneficiario	Quota di cofinanziamento % sul costo dell'intervento
Enti religiosi	32,8
AMA	30,0
Comuni della Provincia di Rieti	14,1
Ministero per i beni e le attività culturali	12,9
Provincia di Latina	11,9
Comuni della Provincia di Latina	11,8
Comuni della Provincia di Frosinone	8,2
Aziende sanitarie	7,5
Comuni della Provincia di Roma	6,3
Valore medio	5,0

Fonte: URCGE 1999

Per una più completa descrizione dell'attuale configurazione del Piano e del suo stato di attuazione, si riportano di seguito, una tavola analitica ed alcuni grafici illustrativi dei dati precedentemente riportate.


**PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI AL GIUBILEO NEL LAZIO
(LEGGE 651/96)**

TAVOLA 1

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER SOGGETTO BENEFICIARIO

Soggetto beneficiario	NUMERO		FINANZ. ACCORDATO		COSTO INTERVENTI		QUOTA % DI COFINANZ.	INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE	
		%	milioni	%	milioni	%		numero	%
AMMINISTRAZIONI CENTRALI									
Min. BB. CC. AA.	206	27,3	317.320	9,1	364.320	10,0	12,9	202	98,06
Min. Interni	25	3,3	130.426	3,8	130.426	3,6	0,0	8	32,00
Min. LL. PP.	5	0,7	132.200	3,8	132.200	3,6	0,0	4	80,00
altri Ministeri	13	1,7	37.546	1,1	37.546	1,0	0,0	2	15,38
ANAS	3	0,4	127.295	3,7	131.565	3,6	3,2	3	100,00
FS	5	0,7	290.022	8,4	290.022	7,9	0,0	4	80,00
Totale Amm. Centrali	257	34,1	1.034.808	29,8	1.086.079	29,7	4,7	223	86,77
AMM. REGIONALE E PROVINCIALE									
Regione Lazio	16	2,1	214.194	6,2	218.844	6,0	2,1	6	37,50
Provincia di Roma	35	4,6	97.971	2,8	100.149	2,7	2,2	25	71,43
Provincia di Frosinone	3	0,4	19.537	0,6	19.912	0,5	1,9	2	66,67
Provincia di Latina	5	0,7	22.132	0,6	25.132	0,7	11,9	3	60,00
Provincia di Rieti	1	0,1	17.500	0,5	17.500	0,5	0,0	0	0,00
Provincia di Viterbo	2	0,3	18.566	0,5	19.177	0,5	3,2	1	50,00
Totale Amm. Regionale e Provinc.	62	8,2	389.900	11,2	400.714	11,0	2,7	37	59,68
AMM. COMUNALI									
Roma	139	18,4	697.285	20,1	698.285	19,1	0,1	63	45,32
altri Comuni in Prov di Roma	66	8,8	93.788	2,7	100.138	2,7	6,3	56	84,85
Comuni in Prov. di Frosinone	18	2,4	17.262	0,5	18.814	0,5	8,2	18	100,00
Comuni in Prov. di Latina	26	3,4	13.340	0,4	15.121	0,4	11,8	16	61,54
Comuni in Prov. di Rieti	19	2,5	23.836	0,7	27.739	0,8	14,1	18	94,74
Comuni in Prov. di Viterbo	10	1,3	6.394	0,2	6.644	0,2	3,8	10	100,00
Totale Amm. Comunali	278	36,9	851.906	24,5	866.741	23,7	1,7	181	65,11
ALTRI SOGGETTI									
Istituzioni sanitarie	29	3,8	184.115	5,3	199.115	5,5	7,5	20	68,97
Agenzia Romana Giubileo	14	1,9	174.423	5,0	174.423	4,8	0,0	4	28,57
AMA	36	4,8	97.394	2,8	139.144	3,8	30,0	6	16,67
STA	5	0,7	50.276	1,4	50.276	1,4	0,0	1	20,00
ACEA	4	0,5	10.677	0,3	10.677	0,3	0,0	0	0,00
ATAC-COTRAL	12	1,6	394.865	11,4	394.865	10,8	0,0	6	50,00
Istituzioni culturali	7	0,9	47.161	1,4	47.161	1,3	0,0	1	14,29
Enti religiosi	36	4,8	95.809	2,8	142.551	3,9	32,8	23	63,89
altri beneficiari	14	1,9	140.074	4,0	140.670	3,9	0,4	5	35,71
Totale altri soggetti	157	20,8	1.194.793	34,4	1.298.881	35,6	8,0	66	42,04
TOTALE	754	100,0	3.471.407	100,0	3.652.415	100,0	5,0	507	67,24

NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SOGGETTO BENEFICIARIO
(L. 651/96)

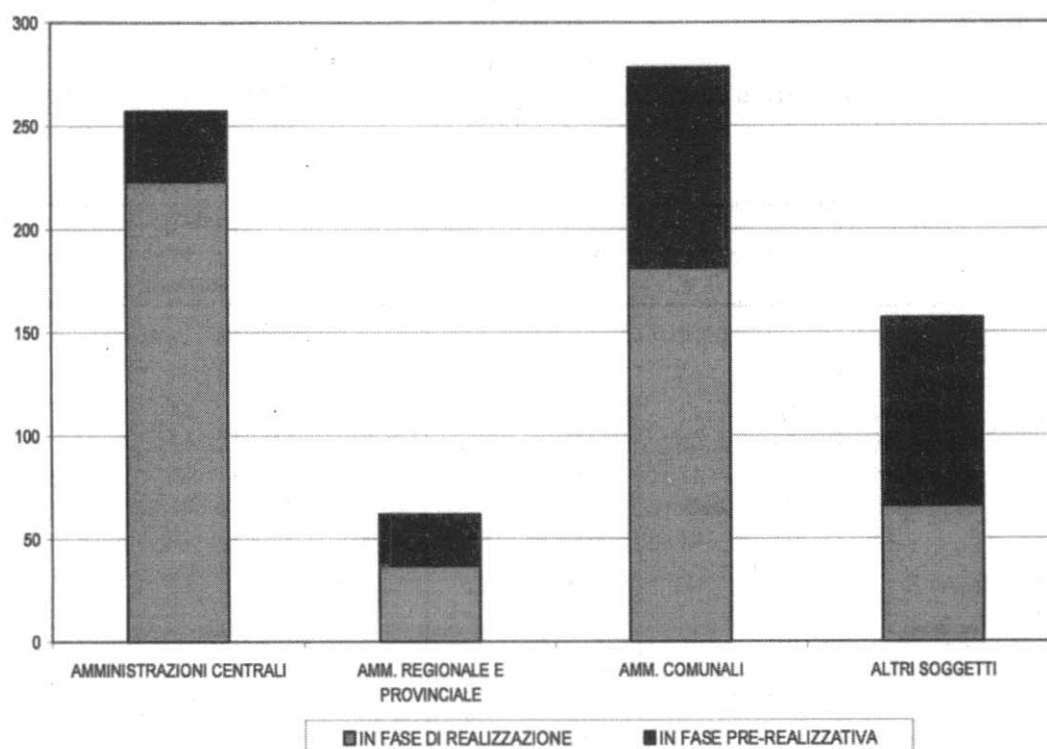

FINANZIAMENTI ACCORDATI PER SOGGETTO BENEFICIARIO
(L. 651/96)

