

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CIX-ter**
n. 5

R E L A Z I O N E

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITÀ AL DI FUORI DEL LAZIO

(al 30 settembre 2000)

(articolo 2, comma 14, legge 7 agosto 1997, n. 270)

*Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato
per Roma Capitale e Giubileo 2000*

(NESI)

Trasmessa alla Presidenza il 1° dicembre 2000

PAGINA BIANCA

INDICE

1. SINTESI DELLE RELAZIONI PRECEDENTI	Pag.	5
La prima relazione trimestrale	»	7
La seconda relazione trimestrale	»	8
La terza relazione (30 settembre 1999-31 dicembre 1999)	»	8
La quarta relazione trimestrale (1° gennaio 2000-30 marzo 2000)	»	9
2. LA QUINTA RELAZIONE (1° APRILE 2000-30 SETTEMBRE 2000)	»	11
La quinta relazione (1° aprile 2000-30 settembre 2000)	»	13
3. PARTE TERZA - LA GESTIONE FINANZIARIA	»	17
Situazione finanziaria del Piano aggiornata al 30 giugno 2000	»	19
Situazione finanziaria del Piano aggiornata al 30 settembre 2000	»	27
Situazione finanziaria per singolo intervento (aggiornata al 30 settembre 2000)	»	35
4. APPENDICE	»	103
D.M. del 28 agosto 2000	»	105
Deliberazione n. 1 del 19 aprile 2000	»	106
Deliberazione n. 2 del 21 luglio 2000	»	108
Deliberazione n. 3 del 1° agosto 2000	»	126

PAGINA BIANCA

1. SINTESI DELLE RELAZIONI PRECEDENTI

PAGINA BIANCA

La prima relazione trimestrale

Con la Prima Relazione al Parlamento, si è dato conto, in ossequio alle disposizioni dell'art. 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997 n. 270, delle attività svolte al 31.12.1998 dalle istituzioni di governo, dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, dagli enti regionali e locali. Tali organismi hanno partecipato, nei termini e nei modi indicati dalla Legge 270, ad una efficace realizzazione del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio e delle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le determinazioni e gli indirizzi inerenti la gestione del Piano stesso, così come recepiti nei relativi decreti del Ministro delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

In particolare nella prima parte della Relazione sono stati riportati i contenuti e gli aspetti giuridici della Legge 7 agosto 1997 n° 270, le modalità attraverso cui sono stati individuati i criteri di selezione degli interventi da inserire nel Piano (Decreto Ministeriale n. 115 del 17 settembre 1997); nonché la strumentazione approntata da parte dell'Ufficio di Roma Capitale e Grandi Eventi per quanto attiene la modulistica, il sistema informativo, il sistema di proiezione territoriale degli interventi, gli strumenti di comunicazione ed il sistema di monitoraggio.

Nella seconda parte della Relazione sono state invece poste in evidenza procedure e metodologie adottate per l'elaborazione del Piano, di cui vengono presentate dettagliatamente le caratteristiche.

Infine nell'ultimo paragrafo della Relazione è stato riportato lo stato di avanzamento degli interventi inseriti nel Piano e la situazione dei flussi finanziari al 31.12.1998.

La prima Relazione al Parlamento ha dato conto in maniera completa e diffusa, delle diverse attività svolte sia per la attuazione della Legge n. 270 che per l'avvio operativo degli interventi.

Il Piano fu, infatti, adottato dalla Commissione il 28 marzo 1998 e definitivamente approvato con D.M. 21 aprile 1998. In soli sette mesi (dall'agosto 1997 al marzo 1998) sono state approntate le procedure per la selezione delle richieste di finanziamento, diffuse le strumentazioni necessarie alla presentazione delle domande, effettuata l'istruttoria sulle circa 7.000 richieste pervenute e definito il Piano.

La precedente Relazione fornisce al Parlamento lo stato di avanzamento degli interventi compresi a quella data: 1.115 interventi per un investimento complessivo di 3.673 miliardi di lire di cui 1.955 miliardi di lire finanziati dallo Stato.

Il ritardo nell'avvio delle impegnative operazioni di monitoraggio non ha privato, tuttavia, la Prima Relazione al Parlamento di un quadro complessivo e per singolo intervento dello stato di attuazione, effettuato direttamente dall'Ufficio che ha surrogato funzioni previste per il soggetto monitore, il cui incarico è stato definitivamente approvato successivamente al periodo di riferimento.

La seconda relazione trimestrale

Il lasso di tempo intercorso a far data dall'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, avvenuta con D.M. in data 21 aprile 1998, ha consentito alla Commissione di modificare ed integrare il Piano stesso al fine di renderlo sempre più congruente con le finalità e con le esigenze emergenti in relazione alla celebrazione del Giubileo del 2000.

La seconda relazione trimestrale è stata strutturata in cinque sezioni ed un'Appendice nella quale sono raccolti i principali provvedimenti assunti in attuazione della legge stessa.

La prima parte — dopo una breve sintesi della Relazione precedente — è stata dedicata ai lavori della Commissione ed alle diverse sedute attraverso le quali sono state deliberate le successive riprogrammazioni del Piano.

Un capitolo a sé stante è stato dedicato alla gestione finanziaria del Piano, fotografando la situazione alla scadenza dei primi tre trimestri del 1999. La terza parte è stata dedicata allo stato di attuazione degli interventi al 30 settembre 1999, attraverso una serie di grafici e tabelle suddivisi per Regioni e per singoli interventi. La quarta parte riguarda gli strumenti di controllo del Piano ed i soggetti ad esso deputati; l'ultima sezione è dedicata all'aggiornamento dei lavori della "task force" per la comunicazione presso la Presidenza del Consiglio.

La necessità di riferire al Parlamento sulla base di dati certificati dallo specifico servizio di monitoraggio ha suggerito di riunire le prime tre Relazioni Trimestrali per il 1999 in un unico Rapporto al fine di una più completa visione dello stato di avanzamento del Piano.

Per quanto riguarda l'impiego delle risorse pubbliche rese disponibili dalla legge 270/97 pari a 2.000 miliardi, al 3° trimestre risultavano attivati programmi per 1.446,1 miliardi di lire pari al 72,3%, mentre le risorse trasferite rappresentavano, con 937,8 miliardi di lire, il 46,9% del fondo disponibile.

In termini di opere fisiche e servizi al 30 settembre 1999 risultavano in fase di realizzazione o completati complessivamente l'82,3% degli interventi (96 ultimati e 843 in fase di realizzazione su 1.128). In termini di finanziamento pubblico l'ammontare reso operativo è pari al 94,3%, mentre sull'investimento totale la quota attivata è dell'85,3%.

La terza relazione (30 settembre 1999 – 31 dicembre 1999)

La terza relazione ha preso in esame il periodo dal 30 settembre 1999 al 31 dicembre 1999. Nel corso di tale trimestre la Commissione ex art. 2 legge 270/1997 si è riunita una volta, in data 28 ottobre 1999.

Nel corso dell'ultimo trimestre 1999 la Commissione medesima ha proseguito nell'azione di modifica ed integrazione del Piano, per renderlo più aderente alle necessità emergenti dall'aggiornamento dei programmi delle varie Amministrazioni o degli altri soggetti beneficiari dei finanziamenti, in ordine all'accertamento della concreta fattibilità di talune opere, anche per sopravvenute esigenze, non previste in precedenza. L'attività di rimodulazione del Piano, soprattutto per ciò che concerne il finanziamento di nuove iniziative o l'integrazione finanziaria di interventi già presenti nel Piano, è stata possibile grazie alle risorse finanziarie rese disponibili sia dai definanziamenti parziali o totali di taluni interventi, sia dai ribassi d'asta intervenuti a seguito

dell'aggiudicazione dei lavori o forniture.

La quarta relazione trimestrale (1 gennaio 2000 – 30 marzo 2000)

Nel corso del primo trimestre del 2000 non vi sono state riunioni della Commissione ex art. 2 legge 270/1997.

Nella quarta Relazione Trimestrale al Parlamento, pertanto, oltre a fornire una sintesi del contenuto delle precedenti Relazioni ed un riepilogo dell'ultimo rapporto del soggetto Monitore, è stato offerto un quadro della situazione finanziaria aggiornato al 30.03.2000.

In tale periodo, inoltre, è intervenuto il D.P.C.M. del 19.01.2000, con il quale è stato decretato che: "I termini di cui alla lett. d), dell'art. 1, co. 4, della legge n. 270/1997 relativi agli interventi inclusi nel Piano di cui alla medesima legge, sono differiti al 31 dicembre 1999."

PAGINA BIANCA

2. LA QUINTA RELAZIONE (1° APRILE 2000-30 SETTEMBRE 2000)

PAGINA BIANCA

La quinta relazione (1° aprile 2000 – 30 settembre 2000)

La quinta relazione prende in esame il periodo dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2000. Nel corso di tale semestre la Commissione ex lege n. 270/1997, si è riunita tre volte: in data 19.04.2000, 21.07.2000 e 01.08.2000.

Nelle succitate riunioni, la Commissione ha deliberato alcune modifiche al Piano degli interventi per il Giubileo. In particolare, quelle assentite nella riunione del 19.04.2000 si sostanziano:

- nell'approvazione dei criteri per il definanziamento degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio per il Grande Giubileo del 2000, così come definiti dalla Commissione di cui all'articolo 2, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nella seduta del 19 aprile 2000, con deliberazione n.1/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante;
- nell'assegnazione ai soggetti beneficiari che non hanno ancora provveduto alla rendicontazione delle somme utilizzate alla data del 31 dicembre 1999, di una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, per far pervenire comunicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori e per trasmettere la rendicontazione riferita alla data del 31 dicembre 1999;
- nella previsione del definanziamento per gli interventi i cui soggetti beneficiari non provvederanno agli adempimenti di cui al precedente punto 1, con riserva di determinazione della rispettiva misura all'esito dei compiuti accertamenti;
- nella individuazione, a fini applicativi ed orientativi, delle seguenti fattispecie sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore:
 1. condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;
 2. sopravvenienze archeologiche ed artistiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;
 3. rinvenimento di ordigni bellici;
 4. il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;
 5. il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 28 ottobre 1999.
- 6. a fini applicativi ed orientativi, sono state considerate non sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente

apprezzate all'atto della progettazione, al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi;

7. nella previsione, per quegli interventi presenti nel piano con una quota di cofinanziamento, di un definanziamento pro-quota, ovvero operato in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita.

Le modifiche al piano assentite nella seduta del 21.07.2000, si sostanziano nelle seguenti:

- nell'esclusione dal definanziamento delle forniture, qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31 gennaio 2000;
- nell'approvazione dei termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A;
- nel definanziamento, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano e nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata degli interventi di cui all'ALLEGATO B;
- nella previsione - ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494 - che i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo;
- nella presa d'atto della rinuncia alla realizzazione presentata dai soggetti titolari degli interventi di cui all'ALLEGATO C;
- nel mancato accoglimento delle richieste di inserimento di nuovi interventi;
- nell'integrazione degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano con la seguente statuizione: per gli interventi non ultimati entro la data del 31 dicembre 1999, per i quali sia stato disposto il definanziamento parziale, il soggetto beneficiario, in sede di richiesta di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento rideterminato al netto del definanziamento, è tenuto ad inoltrare all'Ufficio l'autocertificazione circa la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo, ovvero l'intervenuta fissazione di una posta nel proprio bilancio per garantire la funzionalità, anche parziale, dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico..

Le modifiche al piano assentite nella seduta del 01.08.2000, si sostanziano, infine, nelle seguenti:

- nell'approvazione di termini suppletivi di ultimazione dei lavori indicati a fianco di ciascun intervento di cui all'ALLEGATO A;
- nel definanziamento, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'ALLEGATO B;
- nella statuizione, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, in base alla quale i soggetti beneficiari di cui

all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo;

- nella presa d'atto delle economie di stanziamento dichiarate dai rispettivi soggetti beneficiari per gli interventi di cui all'ALLEGATO C, per un complessivo ammontare di L. 1.514.633.673;
- nell'approvazione delle reintegrazioni di finanziamento, relativamente agli interventi indicati nell'ALLEGATO D, nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi, per un importo complessivo di L. 907.168.728;
- nell'accoglimento della richiesta del termine suppletivo di agosto 2000 per l'ultimazione dei lavori di sistemazione delle aree di sosta e ristoro in località Arenella, in Napoli, rubricato con codice 2770;
- nell'accoglimento della richiesta di disaggregazione dell'intervento relativo ai lavori di sistemazione delle aree di sosta e ristoro in località Arenella, in Napoli, rubricato con codice 2770, in due lotti funzionali, e si dispone che il 1° lotto viene rubricato con codice 2770/A, a fronte di una quota di finanziamento ex lege n.270/1997 di lire 614.750.000, di una quota di cofinanziamento di lire 75.250.000, per un costo stimato complessivamente in lire 800.000.000; mentre il 2° lotto viene rubricato con codice 2770/B, per un costo stimato di lire 4.934.750.000 a totale copertura finanziaria con risorse non statali;
- nel mancato accoglimento delle richieste di inserimento di nuovi interventi.

PAGINA BIANCA

3. PARTE TERZA - LA GESTIONE FINANZIARIA

PAGINA BIANCA

Situazione finanziaria del Piano aggiornata al 30 giugno 2000

Le occorrenze finanziarie per la copertura degli oneri recati dalla legge 270/97, valutate in complessive £. 2.000 miliardi, sono state direttamente stanziati in Bilancio sul capitolo 7902 dello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del successivo trasferimento ai singoli soggetti beneficiari.

Gli stanziamenti statali hanno consentito, attraverso la priorità accordata agli interventi che esprimevano una quota di cofinanziamento, la mobilitazione di ulteriori fonti finanziarie per £. 1.702 miliardi, permettendo l'inserimento nel Piano, ai fini della realizzazione, di opere per un importo complessivo pari a £. 3.566 miliardi.

Di tale stanziamento, £. 1.200 miliardi sono stati stanziati nell'esercizio finanziario 1998, 600 miliardi nell'esercizio finanziario 1999 e 200 miliardi sul bilancio annuale di competenza relativo all'anno 2000.

Come già ricordato, il Piano è stato soggetto ad alcune rimodulazioni a seguito delle quali sono state ridotte le assegnazioni finanziarie degli interventi attivati per un importo corrispondente al ribasso d'asta registrato all'atto dell'aggiudicazione. Con le somme resesi così disponibili sono stati finanziati altri interventi originariamente non inclusi nel Piano. Sono stati inoltre inseriti nel Piano, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della legge n. 270/1997, gli interventi relativi alla costruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, con le corrispondenti assegnazioni finanziarie.


La Commissione di cui al 1° comma dell'art. 2 della citata legge 270/97, ha, quindi, provveduto ad emanare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano con modalità già definite per l'attuazione del Piano per il Giubileo ex lege n. 651/96 dalla competente Commissione.

I suddetti indirizzi disciplinano i pagamenti così suddivisi:

- anticipazione del 10% per la progettazione, gli studi e le indagini;
- anticipazione del 50% dell'ammontare dell'impegno;
- anticipazione fino alla concorrenza del 90% dell'impegno;
- saldo.

Inoltre, con DM dell'1.6.1999 la Commissione ha modificato ed integrato gli Indirizzi di attuazione finanziaria individuando e meglio specificando la documentazione da allegare alle istanze di erogazione finanziaria, con particolare riferimento alla erogazione fino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato ed alla liquidazione del saldo.

Al fine di poter evadere il gran numero di richieste di erogazione finanziaria pervenute e meglio rappresentate dal grafico di seguito riportato:

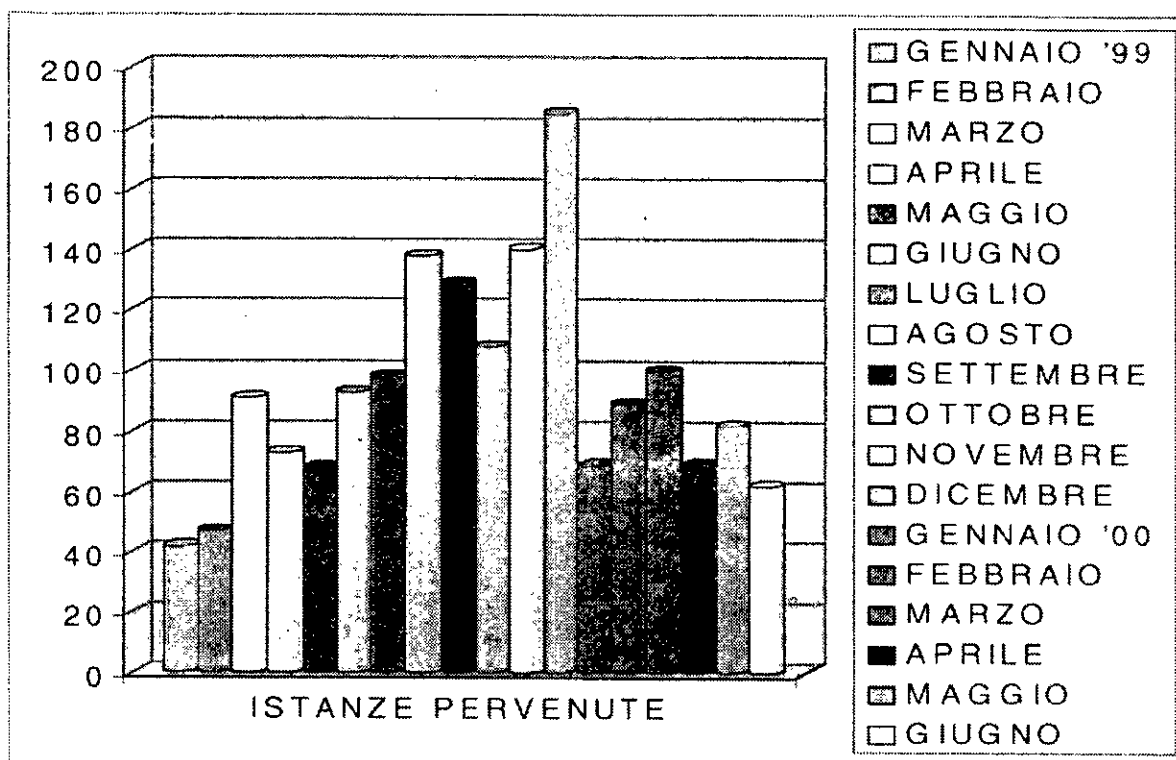

L'Ufficio ha istituito una procedura che prevede le seguenti principali fasi lavorative:

A) Esame preliminare delle istanze pervenute : una volta pervenute al Servizio Finanziario, dopo essere state protocollate, le richieste di erogazione vengono esaminate e classificate. Tale controllo tende soprattutto ad accertare la congruità degli importi richiesti in relazione ai dati economici del Piano evidenziando eventuali anomalie e provvedendo, ove necessario, a comunicare le stesse ai Soggetti beneficiari;

B) Inserimento delle istanze nella banca dati: una volta esaminate e classificate le istanze vengono registrate in una banca dati appositamente predisposta al fine di consentire il controllo delle pratiche lungo tutte le fasi di lavorazione. Dai tabulati infatti è possibile rilevare, tra l'altro, la data di arrivo dell'istanza, il nome del funzionario tecnico al quale è stato assegnato l'intervento, la relativa data di assegnazione e così via fino alla data di trasmissione del decreto all'Ufficio Centrale di Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo sistema di analisi e successivo inserimento in banca dati ha permesso di:

- tenere sotto controllo mese per mese la totalità delle istanze pervenute;
- individuare al momento dell'arrivo eventuali anomalie, carenze e urgenze al fine di un tempestivo intervento;
- poter fornire notizie in tempo reale circa lo stato della pratica ai Soggetti beneficiari;
- ottimizzare i tempi di lavorazione.

C) Istruttoria tecnica amministrativa : l'Ufficio, nonostante le note carenze di organico, ha istituito un gruppo di lavoro costituito dai funzionari tecnici in servizio, che, pur mantenendo le funzioni di loro normale competenza, hanno esaminato le varie istanze e redatto le apposite istruttorie tecniche amministrative propedeutiche alla stesura dei decreti di pagamento.

Dette istruttorie consistono:

- 1) nell'esaminare le richieste di erogazione finanziaria unitamente alla congruità e completezza della documentazione prevista dagli indirizzi di attuazione finanziaria. Detto esame non può prescindere da un'analisi dell'intervento nel suo complesso che consideri tutte le eventuali varianti apportate assentite o assentibili dall'Ufficio e le rimodulazioni di Piano che lo riguardano;
- 2) nel comunicare ai soggetti beneficiari eventuali carenze ed anomalie e guidare gli stessi nella risoluzione di eventuali problematiche;
- 3) nel fornire tutti i dati necessari alla successiva fase di decretazione del pagamento.

D) Decretazione: redazione del decreto di impegno e/o pagamento in base alle istruttorie tecniche amministrative ed alla necessaria ricostruzione storica dell'intervento dall'inserimento nel Piano, individuando nel percorso eventuali peculiarità delle quali tener conto nella stesura del decreto. Compito dei funzionari amministrativi addetti a questa fase lavorativa è inoltre quello di interpretazione delle istruttorie e traduzione delle stesse in decreti redatti secondo la normativa di riferimento;

E) Registrazione degli impegni e delle erogazioni : una volta trasmesso il Decreto all'Ufficio Centrale di Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i relativi importi vengono registrati in un apposito tabulato finanziario che consente di avere l'esatta situazione sia relativa ad ogni singolo intervento che nella sua globalità;


Ad appesantire e rallentare il lavoro dell'Ufficio hanno concorso vari fattori:

- 1) la difficile applicazione della normativa di attuazione finanziaria che, come già evidenziato, è stata più volte integrata e modificata;
- 2) la presenza di molti soggetti beneficiari privati o pubblici di piccole dimensioni, non abituati ad affrontare problematiche inerenti le procedure tecniche amministrative pubbliche (parrocchie, piccoli comuni ecc.). Questo ha comportato soprattutto una notevole difficoltà nel completare la documentazione necessaria che ha costretto i funzionari tecnici a contattare più volte ogni soggetto beneficiario sia telefonicamente che a mezzo fax e dare loro continue ed approfondite spiegazioni;
- 3) l'istituzione del mandato informatico che attualmente consente una maggiore velocità di erogazione dei pagamenti ma che nel corso dell'anno ha comportato un rallentamento dovuto ai normali tempi di perfezionamento della nuova procedura;
- 4) la concentrazione delle richieste di erogazione per tutto l'arco dell'anno da parte della totalità dei soggetti beneficiari;
- 5) le perizie di variante con le conseguenti modifiche dei quadri tecnici economici che hanno comportato la necessità di una verifica di congruità rispetto ai precedenti ;

- 6) le modifiche di piano quali per esempio le integrazioni finanziarie e le disaggregazioni. Le prime hanno comportato la necessità di provvedere ad ulteriori pagamenti o, in alcuni casi, hanno reso l'istruttoria più complessa;
- 7) l'avvicinarsi della scadenza dei termini prorogati con la legge n. 494/99 al 31.12.1999 che ha reso necessaria un supplemento di istruttoria atta a verificare la credibile ultimazione degli interventi oggetto di erogazione finanziaria entro i termini suddetti.

Seguendo le procedure indicate nei cennati indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano al 31 marzo 2000, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha attivato finanziamenti attraverso l'emanazione a favore dei relativi soggetti beneficiari di n. 1.128 decreti di impegno per £. 1.539 miliardi e di n. 1.682 titoli di pagamento per complessive £. 1.241 miliardi.

Per meglio rappresentare quanto sopra indicato, si è predisposto un apposito grafico di seguito riportato:

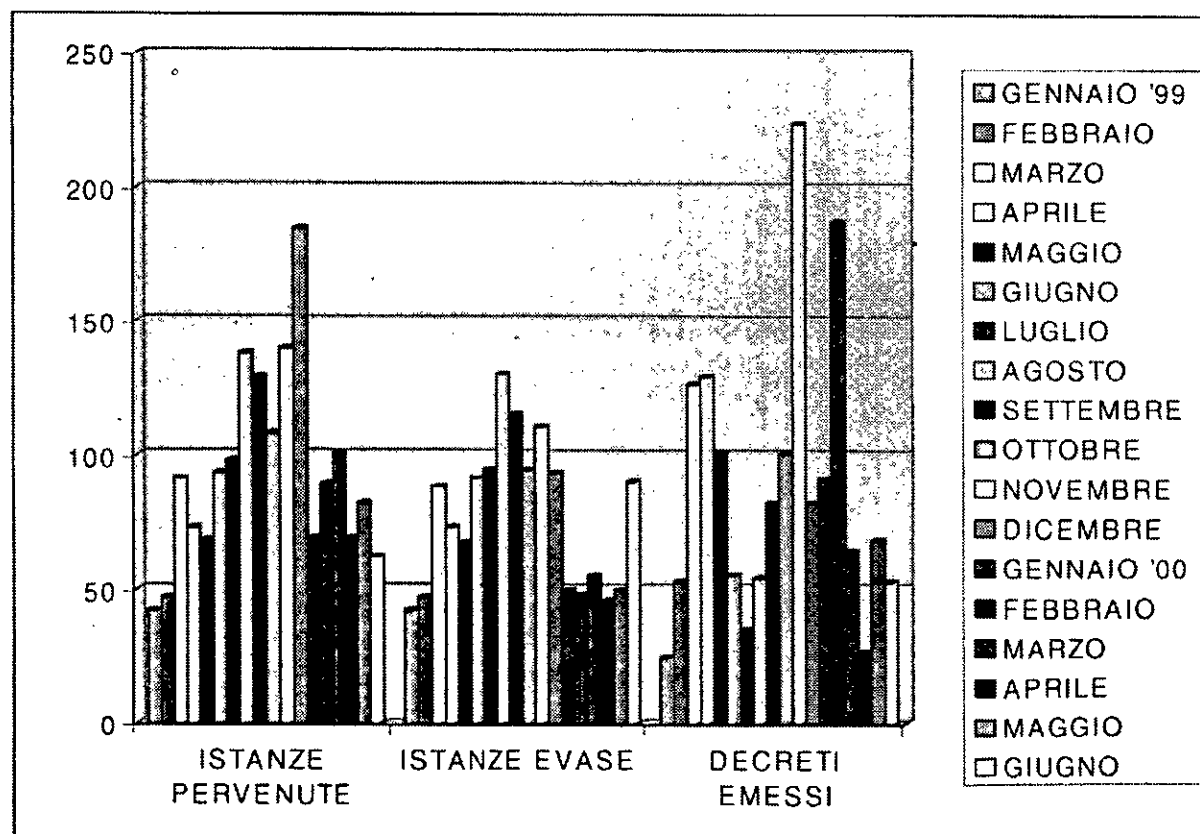

Sono state inoltre trasferite, con variazioni compensative di bilancio, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge del 7 agosto 1997, n. 270, risorse finanziarie ammontanti a £. 209,702 miliardi nello Stato di previsione dei seguenti Ministeri:

Ministero per le Attività Culturali:	193.394.600.000
Ministero degli Interni:	11.670.000.000
Ministero delle Finanze:	1.100.000.000
Ministero dei Trasporti:	860.000.000
Ministero di Grazia e Giustizia:	1.577.000.000
TOTALE:	209.701.600.000

Vengono di seguito riportate le tabelle relative alla situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31.03.1999, al 30.06.1999, al 30.09.1999, al 31.12.1999 ed al 31.03.2000.

TAV. I (situazione finanziaria al 31 marzo 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	677.439.078.398
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	857.399.078.398
Pagamenti	362.190.046.665
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	542.150.049.665

TAV. II (situazione finanziaria al 30 giugno 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.079.380.955.691
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.281.977.955.691
Pagamenti	582.397.763.915
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	784.994.763.915

TAV. III (situazione finanziaria al 30 settembre 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.446.125.278.632
Pagamenti	734.533.939.986
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	937.770.939.986

TAV. IV (situazione finanziaria al 31 dicembre 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.447.125.278.632
Pagamenti	1.021.868.392.042
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.226.105.392.042

TAV. V (situazione finanziaria al 31 marzo 2000) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.539.484.392.199
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.743.721.392.199
Pagamenti	1.241.243.265.249
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.445.480.265.249

TAV. V (situazione finanziaria al 30 giugno 2000) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.570.897.571.096
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.780.599.171.096
Pagamenti	1.317.870.365.550
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.527.571.965.550

Situazione finanziaria del Piano aggiornata al 30 settembre 2000

Le occorrenze finanziarie per la copertura degli oneri recati dalla legge 270/97, valutate in complessive £. 2.000 miliardi, sono state direttamente stanziati in Bilancio sul capitolo 7902 dello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del successivo trasferimento ai singoli soggetti beneficiari.

Gli stanziamenti statali hanno consentito, attraverso la priorità accordata agli interventi che esprimevano una quota di cofinanziamento, la mobilitazione di ulteriori fonti finanziarie per £. 1.702 miliardi, permettendo l'inserimento nel Piano, ai fini della realizzazione, di opere per un importo complessivo pari a £. 3.566 miliardi.

Di tale stanziamento, £. 1.200 miliardi sono stati stanziati nell'esercizio finanziario 1998, 600 miliardi nell'esercizio finanziario 1999 e 200 miliardi sul bilancio annuale di competenza relativo all'anno 2000.

Come già ricordato, il Piano è stato soggetto ad alcune rimodulazioni a seguito delle quali sono state ridotte le assegnazioni finanziarie degli interventi attivati per un importo corrispondente al ribasso d'asta registrato all'atto dell'aggiudicazione. Con le somme rese così disponibili sono stati finanziati altri interventi originariamente non inclusi nel Piano. Sono stati inoltre inseriti nel Piano, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della legge n. 270/1997, gli interventi relativi alla costruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, con le corrispondenti assegnazioni finanziarie.


La Commissione di cui al 1° comma dell'art. 2 della citata legge 270/97, ha, quindi, provveduto ad emanare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano con modalità già definite per l'attuazione del Piano per il Giubileo ex lege n. 651/96 dalla competente Commissione.

I suddetti indirizzi disciplinano i pagamenti così suddivisi:

- anticipazione del 10% per la progettazione, gli studi e le indagini;
- anticipazione del 50% dell'ammontare dell'impegno;
- anticipazione fino alla concorrenza del 90% dell'impegno;
- saldo.

Inoltre, con DM dell'1.6.1999 la Commissione ha modificato ed integrato gli indirizzi di attuazione finanziaria individuando e meglio specificando la documentazione da allegare alle istanze di erogazione finanziaria, con particolare riferimento alla erogazione fino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato ed alla liquidazione del saldo.

Al fine di poter evadere il gran numero di richieste di erogazione finanziaria pervenute e meglio rappresentate dal grafico di seguito riportato:

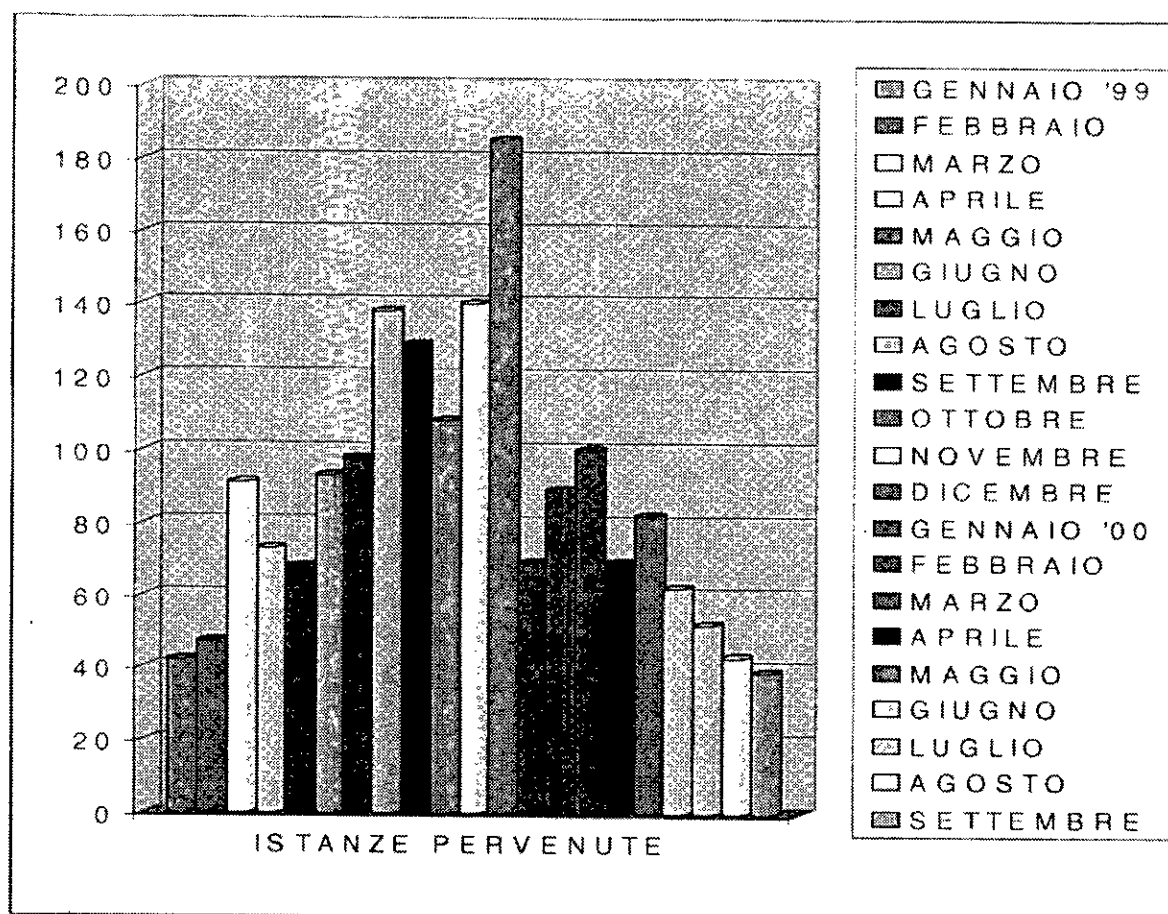

L'Ufficio ha istituito una procedura che prevede le seguenti principali fasi lavorative:

A) Esame preliminare delle istanze pervenute : una volta pervenute al Servizio Finanziario, dopo essere state protocollate, le richieste di erogazione vengono esaminate e classificate. Tale controllo tende soprattutto ad accertare la congruità degli importi richiesti in relazione ai dati economici del Piano evidenziando eventuali anomalie e provvedendo, ove necessario, a comunicare le stesse ai Soggetti beneficiari;

B) Inserimento delle istanze nella banca dati: una volta esaminate e classificate le istanze vengono registrate in una banca dati appositamente predisposta al fine di consentire il controllo delle pratiche lungo tutte le fasi di lavorazione. Dai tabulati infatti è possibile rilevare, tra l'altro, la data di arrivo dell'istanza, il nome del funzionario tecnico al quale è stato assegnato l'intervento, la relativa data di assegnazione e così via fino alla data di trasmissione del decreto all'Ufficio Centrale di Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo sistema di analisi e successivo inserimento in banca dati ha permesso di:

- tenere sotto controllo mese per mese la totalità delle istanze pervenute;
- individuare al momento dell'arrivo eventuali anomalie, carenze e urgenze al fine di un tempestivo intervento;
- poter fornire notizie in tempo reale circa lo stato della pratica ai Soggetti beneficiari;
- ottimizzare i tempi di lavorazione.

C) Istruttoria tecnica amministrativa : l'Ufficio, nonostante le note carenze di organico, ha istituito un gruppo di lavoro costituito dai funzionari tecnici in servizio, che, pur mantenendo le funzioni di loro normale competenza, hanno esaminato le varie istanze e redatto le apposite istruttorie tecniche amministrative propedeutiche alla stesura dei decreti di pagamento.

Dette istruttorie consistono:

- 4) nell'esaminare le richieste di erogazione finanziaria unitamente alla congruità e completezza della documentazione prevista dagli indirizzi di attuazione finanziaria. Detto esame non può prescindere da un'analisi dell'intervento nel suo complesso che consideri tutte le eventuali varianti apportate assentite o assentibili dall'Ufficio e le rimodulazioni di Piano che lo riguardano;
- 5) nel comunicare ai soggetti beneficiari eventuali carenze ed anomalie e guidare gli stessi nella risoluzione di eventuali problematiche;
- 6) nel fornire tutti i dati necessari alla successiva fase di decretazione del pagamento.

D) Decretazione: redazione del decreto di impegno e/o pagamento in base alle istruttorie tecniche amministrative ed alla necessaria ricostruzione storica dell'intervento dall'inserimento nel Piano, individuando nel percorso eventuali peculiarità delle quali tener conto nella stesura del decreto. Compito dei funzionari amministrativi addetti a questa fase lavorativa è inoltre quello di interpretazione delle istruttorie e traduzione delle stesse in decreti redatti secondo la normativa di riferimento;

E) Registrazione degli impegni e delle erogazioni : una volta trasmesso il Decreto all'Ufficio Centrale di Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i relativi importi vengono registrati in un apposito tabulato finanziario che consente di avere l'esatta situazione sia relativa ad ogni singolo intervento che nella sua globalità;

Ad appesantire e rallentare il lavoro dell'Ufficio hanno concorso vari fattori:


- 8) la difficile applicazione della normativa di attuazione finanziaria che, come già evidenziato, è stata più volte integrata e modificata;
- 9) la presenza di molti soggetti beneficiari privati o pubblici di piccole dimensioni, non abituati ad affrontare problematiche inerenti le procedure tecniche amministrative pubbliche (parrocchie, piccoli comuni ecc.): Questo ha comportato soprattutto una notevole difficoltà nel completare la documentazione necessaria che ha costretto i funzionari tecnici a contattare più volte ogni soggetto beneficiario sia telefonicamente che a mezzo fax e dare loro continue ed approfondite spiegazioni;
- 10) l'istituzione del mandato informatico che attualmente consente una maggiore velocità di erogazione dei pagamenti ma che nel corso dell'anno ha comportato un rallentamento dovuto ai normali tempi di perfezionamento della nuova procedura;
- 11) la concentrazione delle richieste di erogazione per tutto l'arco dell'anno da parte della totalità dei soggetti beneficiari;
- 12) le perizie di variante con le conseguenti modifiche dei quadri tecnici economici che hanno comportato la necessità di una verifica di congruità rispetto ai precedenti ;

13) le modifiche di piano quali per esempio le integrazioni finanziarie e le disaggregazioni. Le prime hanno comportato la necessità di provvedere ad ulteriori pagamenti o, in alcuni casi, hanno reso l'istruttoria più complessa;

14) l'avvicinarsi della scadenza dei termini prorogati con la legge n. 494/99 al 31.12.1999 che ha reso necessaria un supplemento di istruttoria atta a verificare la credibile ultimazione degli interventi oggetto di erogazione finanziaria entro i termini suddetti.

Seguendo le procedure indicate nei cennati indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano al 31 marzo 2000, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha attivato finanziamenti attraverso l'emanazione a favore dei relativi soggetti beneficiari di n. 1.128 decreti di impegno per £. 1.539 miliardi e di n. 1.682 titoli di pagamento per complessive £. 1.241 miliardi.

Per meglio rappresentare quanto sopra indicato, si è predisposto un apposito grafico di seguito riportato:

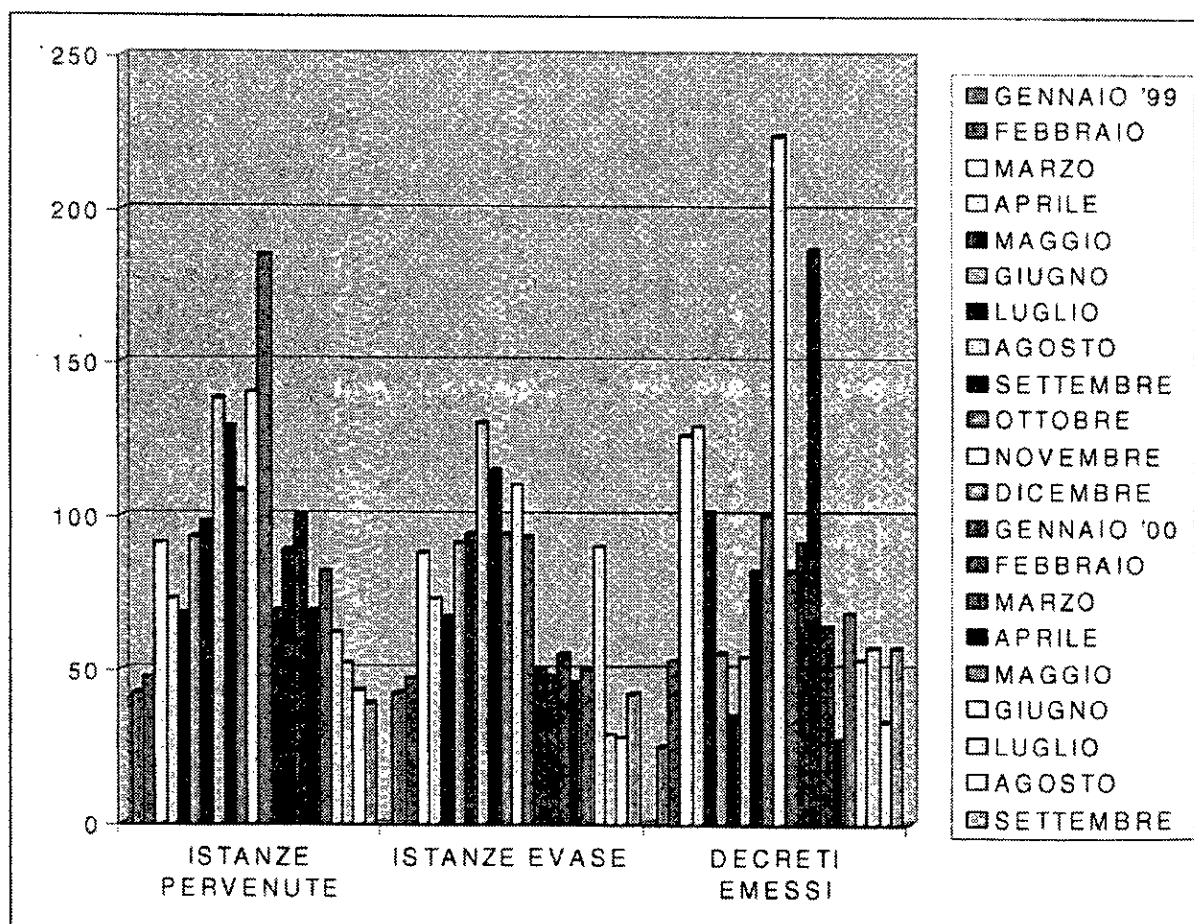

Sono state inoltre trasferite, con variazioni compensative di bilancio, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge del 7 agosto 1997, n. 270, risorse finanziarie ammontanti a £. 209.702 miliardi nello Stato di previsione dei seguenti Ministeri:

Ministero per le Attività Culturali:	193.394.600.000
Ministero degli Interni:	12.770.000.000
Ministero delle Finanze:	1.100.000.000
Ministero dei Trasporti:	860.000.000
Ministero di Grazia e Giustizia:	1.577.000.000
TOTALE:	209.701.600.000

Vengono di seguito riportate le tabelle relative alla situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31.03.1999, al 30.06.1999, al 30.09.1999, al 31.12.1999 ed al 31.03.2000.

TAV. I (situazione finanziaria al 31 marzo 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	677.439.078.398
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	857.399.078.398
Pagamenti	362.190.046.665
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	542.150.049.665

TAV. II (situazione finanziaria al 30 giugno 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.079.380.955.691
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.281.977.955.691
Pagamenti	582.397.763.915
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	784.994.763.915

TAV. III (situazione finanziaria al 30 settembre 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.446.125.278.632
Pagamenti	734.533.939.986
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	937.770.939.986

TAV. IV (situazione finanziaria al 31 dicembre 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.447.125.278.632
Pagamenti	1.021.868.392.042
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.226.105.392.042

TAV. V (situazione finanziaria al 31 marzo 2000) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.539.484.392.199
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.743.721.392.199
Pagamenti	1.241.243.265.249
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.445.480.265.249

TAV. VI (situazione finanziaria al 30 giugno 2000)(importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.570.897.571.096
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.780.599.171.096
Pagamenti	1.317.870.365.550
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.527.571.965.550

TAV. VII (situazione finanziaria al 30 settembre 2000) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.596.595.547.918
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.806.297.147.918
Pagamenti	1.395.100.458.981
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.604.802.058

Situazione finanziaria per singolo intervento (aggiornata al 30.09.2000)

PAGINA BIANCA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CODICE AREA INTERVENTO	CODICE AREA LOCALIZZAZIONE	TITOLO INTERVENTO	OGGETTO INTERVENTO	COSTO TOTALE IN LIRE	COPRIMENTO ATTIVITA'	COSTO IN VALUTA TECNICA		LAVORI DI PRELAVORO DI BASE		COPRIMENTO ATTIVITA'	ACCUMULATIVE AMMORTIZZAMENTO DOLO 15/10			
						COSTO IN VALUTA TECNICA	COSTO IN VALUTA TECNICA	LAVORI DI PRELAVORO DI BASE	LAVORI DI PRELAVORO DI BASE					
41M	AA-53-ED-1	Impresa	REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI RISTRUTTURAZIONE DELLA MANIFATTURA DELLA SOCIETA' S.p.A. DI VIA ROMA 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	1.534.000.000	1.534.000.000	10.000.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000
42M	AA-53-ED-1	Impresa	REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI RISTRUTTURAZIONE DELLA MANIFATTURA DELLA SOCIETA' S.p.A. DI VIA ROMA 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	1.534.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000
43M	AA-53-ED-1	Impresa	REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI RISTRUTTURAZIONE DELLA MANIFATTURA DELLA SOCIETA' S.p.A. DI VIA ROMA 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610,											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PAGINA BIANCA

4. APPENDICE

PAGINA BIANCA

D.M. del 28.08.2000

Rep.n. 268/RC

Criteri per il definanziamento degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n.1/2000, adottata in data 19 aprile 2000 dalla Commissione ex lege 7 agosto 1997, n.270;

VISTO il parere, repertorio n.986, espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 6 luglio 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n.270/1997, sulla deliberazione n.1/2000, adottata in data 19 aprile 2000 dalla Commissione ex lege 7 agosto 1997, n.270;

RITENUTO di accogliere il suddetto parere e, pertanto, di integrare il punto 3 della deliberazione n.1/2000 del 19 aprile 2000 prevedendo tra le fattispecie sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore anche le sopravvenienze artistiche;

DECRETA

Sono approvati i criteri per il definanziamento degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio per il Grande Giubileo del 2000, così come definiti dalla Commissione di cui all'articolo 2, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nella seduta del 19 aprile 2000, con deliberazione n.1/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

Al punto 3 della suddetta deliberazione n.1/2000, dopo le parole "sopravvenienze archeologiche", sono aggiunte le seguenti: "e artistiche".

IL MINISTRO

Deliberazione n. 1 del 19.04.2000

La Commissione ex lege n. 270/1997

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. DAGL/20LL.PP/96, in data 10 dicembre 1999, relativa alle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento degli interventi dei piani di cui alla legge n. 651/1996 ed alla legge n. 270/1997;

VISTA la legge 16 dicembre 1999, n. 494;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ordine:

agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio medesimo circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel piano;

RITENUTO di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore;

CONSIDERATO che l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione dei lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione dei lavori laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;

PRESO atto che taluni soggetti beneficiari, nonostante i reiterati solleciti esperiti, non hanno ancora provveduto a comunicare lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere ed a presentare la richiesta rendicontazione delle somme utilizzate al 31 dicembre 1999;

RITENUTO di assegnare a tali soggetti beneficiari una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, statuendo fin d'ora che la perdurante inerzia oltre tale data, costituirà presupposto di per sé comprovante la non avvenuta ultimazione dei lavori, cui conseguirà il definanziamento degli interventi di rispettiva titolarità, con riserva di determinarne la misura all'esito dei compiuti accertamenti;

RITENUTO, fermo restando l'obiettivo di assicurare la realizzazione degli interventi in tempi compatibili con il sostanziale perseguimento delle finalità giubilari, di considerare, in via esemplificativa, sufficienti a comprovare la forza maggiore le seguenti fattispecie:

- *condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;*
- *sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;*
- *rinvenimento di ordigni bellici;*
- *il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;*
- *il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 28 ottobre 1999;*

RITENUTO, viceversa, di considerare, in via esemplificativa, non sufficienti a comprovare la forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione ed al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi;

RITENUTO di disporre i definanziamenti ex articolo 4, comma 2, della legge n. 270/1997, stabilendo che, laddove nel piano figuri una quota di cofinanziamento, il definanziamento venga operato pro-quota, ovvero in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita;

DELIBERA

Ai soggetti beneficiari che non hanno ancora provveduto alla rendicontazione delle somme utilizzate alla data del 31 dicembre 1999, è assegnata una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, per far pervenire comunicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori e per trasmettere la rendicontazione riferita alla data del 31 dicembre 1999.

Gli interventi per i quali i relativi soggetti beneficiari non provvederanno agli adempimenti di cui al precedente punto 1, saranno definanziati, con riserva di determinazione della rispettiva misura all'esito dei compiuti accerchiamenti.

A fini applicativi ed orientativi, sono considerate sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le seguenti fattispecie:

- *condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;*
- *sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;*
- *rinvenimento di ordigni bellici;*
- *il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;*
- *il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 28 ottobre 1999.*

A fini applicativi ed orientativi, sono considerate non sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione, al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi.

Laddove nel piano figuri una quota di cofinanziamento, il definanziamento verrà operato pro-quota, ovvero in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita.

Il Segretario

Il Presidente

Deliberazione n. 2 del 21.07.2000

La Commissione ex lege n. 270/1997

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. DAGL/20LL.PP./96, in data 10 dicembre 1999, relativa alle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento degli interventi dei piani di cui alla legge n. 651/1996 ed alla legge n. 270/1997;

VISTA la legge 16 dicembre 1999, n. 494;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ordine:

agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio medesimo circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel piano;

RITENUTO di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo sia riconducibile al caso fortuito o alla causa di forza maggiore;

CONSIDERATO che l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione dei lavori e, ove questa non fosse intervenuta, la rendicontazione sullo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione, la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione dei lavori laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o alla causa di forza maggiore;

RITENUTO, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

RITENUTO, altresì, di non definanziare le forniture, qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31 gennaio 2000;

RITENUTO, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e sulla base delle relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito;

RITENUTO, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e sulla base delle relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex articolo 4, comma 2, della legge n. 270/1997 - per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito - il definanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO B, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L. 41.149.865.759, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'articolo 3, comma 4, della legge n. 270/1997;

RITENUTO, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate, operando anche con risorse finanziarie proprie;

RITENUTO di prendere atto della rinuncia alla realizzazione presentata dai soggetti titolari degli interventi di cui all'ALLEGATO C, per i motivi a fianco di ciascuno di essi indicati, e di operare il conseguente definanziamento per un complessivo ammontare di L. 3.303.067.810;

CONSIDERATO che, per effetto delle succitate ricognizioni e dei suindicati definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa Commissione:

disponibilità precedenti L. 338.905.908

definanziamenti ex art.4, comma 2, legge n. 270/1997 L. 41.149.865.759

rinunce L. 3.233.000.000

per un complessivo ammontare di L. 44.721.771.667

RITENUTO di non assentire le richieste di inserimento nel Piano di nuovi interventi trattandosi di proposte che comportano l'attivazione di cantieri nel corso dello svolgimento delle celebrazioni giubilari;

CONSIDERATO che gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano, prevedono l'erogazione dei finanziamenti per tranches;

CONSIDERATO che per l'erogazione del saldo (10% trattenuto in garanzia), in particolare, è prevista la preventiva acquisizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, oltre che della documentazione probante l'effettivo utilizzo delle risorse trasferite;

CONSIDERATO che, la legge finanziaria 2000 limita la disponibilità di utilizzo delle somme recuperate in entrata nel Bilancio dello Stato ad una percentuale del 5%, rinviando l'utilizzo delle restanti riassegnazioni in conto entrata, all'esercizio 2001, così riducendo la possibilità di disporre, come contributi di parte corrente, delle somme originariamente stanziare in conto capitale e definanziate;

CONSIDERATO che, per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1999, nelle more delle determinazioni della Commissione in ordine all'eventuale definanziamento, l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha proceduto, per correttezza, ed in via cautelativa, al trasferimento delle risorse, prendendo a riferimento l'importo delle somme effettivamente utilizzate e rendicontate, in luogo dello stanziamento originariamente assentito, al fine di evitare -ove fosse disposto il definanziamento- la diseconomia temporale, conseguente alla attivazione delle procedure di recupero al pertinente capitolo delle somme eventualmente trasferite in eccedenza;

RITENUTO di convalidare la suddetta procedura adottata dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi;

RITENUTO, altresì, di dover indicare la documentazione che, in luogo del certificato di collaudo, deve essere acquisita, dall'Ufficio, in sede di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento, rideterminato in sede di definanziamento dell'intervento che, in quanto incompiuto, non può essere collaudato;

RITENUTO, pertanto, anche in base alle disposizioni dell'art. 7, c.2, della legge n. 494/1999, di acquisire, al fine di evitare il rischio di danno erariale, l'autocertificazione del soggetto beneficiario circa la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo o la fissazione di una posta in bilancio per garantire la funzionalità anche parziale dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico.

All'unanimità

DELIBERA

Non sono definanziate le forniture, qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31 gennaio 2000.

Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A.

Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'ALLEGATO B:

Ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

Si prende atto della rinuncia alla realizzazione presentata dai soggetti titolari degli interventi di cui all'ALLEGATO C.

Non sono accolte le richieste di inserimento di nuovi interventi.

Restano nella disponibilità della Commissione L. 44.721.771.667.

Gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano sono integrati con la seguente statuizione: per gli interventi non ultimati entro la data del 31 dicembre 1999, per i quali sia stato disposto il definanziamento parziale, il soggetto beneficiario, in sede di richiesta di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento rideterminato al netto del definanziamento, è tenuto ad inoltrare all'Ufficio l'autocertificazione circa la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo, ovvero l'intervenuta fissazione di una posta nel proprio bilancio per garantire la funzionalità, anche parziale, dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico.

Il Segretario

Il Presidente

Allegato A

Termini suppletivi degli interventi

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
260	CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI FORMAZIONE	SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLA VITTORIA	luglio	Avverse condizioni meteo, dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Protezione Civile.
330	RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'ALA EST DEL CONVENTO DI SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA	PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASSIONISTI	settembre	Avverse condizioni meteo, richiesta dichiarazione di stato d'emergenza.
346	OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE GLI INGRESSI AL SANTUARIO CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASSIONISTI	settembre	Avverse condizioni meteo, richiesta dichiarazione di stato d'emergenza.
484	INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SISSUL	COMUNE DI AQUILEIA	febbraio	Soppravvenienze archeologiche
489	CONVENTO DI SANTA CROCE IN FOSSABANDA INTERVENTO DI RESTAURO E RUTILIZZO AD USO RICETTIVO ALBERGHIERO E AD USO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI	COMUNE DI PISA	aprile	Provvedimento giurisdizionale.
610	RECUPERO DELL'EDIFICIO DEL MONASTICO DELLA BASILICA DI S. ANDREA A FINI RICETTIVI E DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI VERCELLI	settembre	Soppravvenienze archeologiche
650	FABBRICA DEL PALAZZO RESTAURO PER RIAPERTURA AL PUBBLICO DI ITINERARI INTERNI ED ESTERNI AL PALAZZO DUCALE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI LUCCA	maggio	Provvedimento giurisdizionale.
890	CASA DI ACCOGLIENZA PER IL CLERO	PROVINCIA DI FOGGIA DEI F.F.M.M. CAPPUCCINI VEDASI	settembre	Sorpresa geologica.
904	PARCHEGGIO MULTIPIANO NORD OVEST	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	aprile	Sorpresa geologica.
951	IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABBAZIA DI POMPOSA	COMUNE DI CODIGORO	aprile	Avverse condizioni meteo.
981	CENTRO D'ACCOGLIENZA PELLEGRINI PER GIOVANI E ANZIANI	IST. PROV. PER L'INFANZIA S.MARIA	maggio	Soppravvenuti impedimenti all'accessibilità nell'area di cantiere.
1023	COMPLESSO BASILICA MADONNA DELLE GRAZIE RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO CON ALLESTIMENTO SALA DEL PELLEGRINO E MUSEO DELL'OPERA	COMUNE DI BENEVENTO	marzo	Soppravvenienze archeologiche
1111	CENTRO ACCOGLIENZA VISITATORI DI PADRE PIO E PER SERVIZI RELIGIOSI	PROV. FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCCINI	marzo	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
1121	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI	COMUNE DI CATTOLICA	marzo	Soppravvenienze archeologiche

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
1124	CENTRO ACCOGLIENZA TORRI	COMUNE DI ARCUGNANO	marzo	Avverse condizioni meteo.
1125	CENTRO ACCOGLIENZA S. AGOSTINO	COMUNE DI ARCUGNANO	febbraio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
1179	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI TURISTICI	REGIONE CAMPANIA	marzo	Rapina della fornitura del materiale informatico.
1195	BASILICA DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI PROGETTO DI MANUTENZIONE E RESTAURO	SANTUARIO DELLA BEATA S. M. VERGINE	giugno	Provvedimento giurisdizionale.
1201	RESTAURO E RISANAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO E DEGLI ANNESSI FABBRICATI DELL'EX STALLONE	SANTUARIO DELLA BEATA S.M. VERGINE	maggio	Provvedimento giurisdizionale.
1375/A	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO CON SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO SAGRESTIA E CENTRO ASSISTENZA CON COPERTURA ALTARE ESTERNO E RISTRUTTURAZIONE DEI PORTICI - COMPLETAMENTO	ENTE SANTUARIO S. COSIMO	febbraio	Soppravvenienze archeologiche
1425	CENTRO RICETTIVO NELL'EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	COMUNE DI FIVIZZANO	febbraio	Evento alluvionale e soppravvenienze archeologiche
1496	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI PAOLA	agosto	Soppravvenienze storico-archeologiche
1537	RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	COMUNE DI FUCECCHIO	settembre	Avverse condizioni meteo.
1666	PERCORSO PEDONALE TURISTICO RELIGIOSO DEVOZIONALE DA MONDOVI' PIAZZA AL SANTUARIO DI VICOFORTE	COMUNE DI VICOFORTE	settembre	Avverse condizioni meteo.
1709	RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI ESISTENTI E DI PROPRIETA' DELL'ENTE RICHIEDENTE	PARROCCHIA DI S. EGIDIO	settembre	Prolungata sospensione dei lavori per avversità atmosferiche ed impedimenti sopravvenuti nell'accessibilità alle aree di cantiere.
1852	RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE ANTICHE CUMBESSIAS DELLA BASILICA DI SAN GAVINO	COMUNE DI PORTO TORRES	marzo	Soppravvenienze archeologiche
1912	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SAN MATTEO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	PROV. S. MICHELE ARCANGELO DEI FRATI M.	aprile	Provvedimento giurisdizionale.
2006	LA CASA DEL PELLEGRINO RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PER OSPITALITA' POVERA	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARC.	aprile	Soppravvenienze archeologiche.
2111	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	COMUNE DI CONFLENTI	aprile	Avverse condizioni meteo e per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
2114	INTERVENTI PER LA BASILICA DELLA MADONNA DELLA CATENA	COMUNE DI DIPIGNANO	marzo	Avverse condizioni meteo.
2123	AREA URBANA ATTREZZATA PER SOSTA PARCHEGGIO E SERVIZIO NAVETTE PER E DAL SANTUARIO	COMUNE DI SAN SOSTI	settembre	Avverse condizioni meteo e contenzioso, pendente, nell'espropriazione delle aree.
2131	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PASTORALE DI ACCOGLIENZA ANCHE PER DISABILI CON RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UNO STABILE DISMESSO EX CENTRO UNIA	SANTUARIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE TORRE DI RUOGIERO	aprile	Questioni afferenti la bonifica dell'ambiente (amianto) nonché avverse condizioni meteo.
2296	SAN GABRIELE 2000 RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' NELL'AMBITO DELL'AREA URBANA DEL SANTUARIO DI SAN GABRIELE	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	settembre	Frana di un tratto di strada in località adiacente il cantiere.
2337	RECUPERO FABBRICATO DEI PELLEGRINI CON SISTEMAZIONE DELLE AREE ACCESSORIE E DI PERTINENZA DEL SANTUARIO	DIOC. DI SAN MARCO ARGENTANO	maggio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
2440	RECUPERO DI VILLA SFORZESCA	COMUNE DI CASTELL'AZZARA	settembre	Soppravvenienze archeologiche
2520	I LUOGHI DELLO SPIRITO E DELLA NATURA PARCO ECOLOGICO ATTREZZATO	CURIA VESCOVILE MELFI RAPOLLA VENOSA	febbraio	Avverse condizioni meteo.
2578	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SCAVI DELL'AULA SETTENTRIONALE DELLA BASILICA PATRIARCALE	ARCIDIOCESI DI GORIZIA	settembre	Soppravvenienze archeologiche
2609	CENTRO DI ACCOGLIENZA GLI ANGELI DI PADRE PIO	PROV. FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCCINI	aprile	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
2662	RECUPERO E RIUSO DELLA EX FATTORIA MARCHESI INCISA DELLA ROCCHETTA	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROCCHETTA TANARO	agosto	Avverse condizioni meteo.
2777	MUSEO DIOCESANO DELLA SPEZIA	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	marzo	Stato di emergenza dichiarato dalla Protezione Civile.
2839	ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	COMUNE DI CAGLIARI	settembre	Soppravvenienze archeologiche
2847/B	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VIA FOSSARIO	ENTE PARROCCHIA DI S. CECILIA	settembre	Esepletamento delle sopravvenute prescrizioni operate dalla Soprintendenza.
2864	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL CONVENTO DELLA CHIESA E DEL BOSCO DI MARIA SS. DI STIGNANO CON CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI	PROV. DI S. MICHELE ARCANGELO FRATI MINORI	aprile	Sorprese geologiche.
2875	RICETTIVITA' E SERVIZI PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA PER ANZIANI CASA DI RIPOSO AI SS. GIOVANNI E PAOLO A VENEZIA	I.R.E. ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE	settembre	Soprapvenuti impedimenti nell'accessibilità all'area di cantiere per revoca di servizi di passaggio.

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
2909	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA ROCCA VESCOVILE DI BERTINORO A FINI DI RESIDENZE GIUBILARI	DIOCESI FORLÌ BERTINORO	aprile	Avverse condizioni meteo.
2918	RESTAURO DELLA CRIPTA DI S. GIOVANNI IN CONCA	SOPRINTENDENZA A. DELLA LOMBARDIA	marzo	Sopravvenienze archeologiche
2949	RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ CULTURALI PER TURISMO D'ARTE E RELIGIOSO CONNESSE CON IL COMPLESSO MONASTICO BENEDETTINO MEDIEVALE DI S. M. ASSUNTA	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	febbraio	Consentire l'installazione dell'impianto di allarme già disponibile a più d'opera.
3131	RECUPERO DELL'EX CONVENTO SAN FRANCESCO PER PRESIDIO TURISTICO RELIGIOSO E CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IL GIUBILEO DEL 2000	COMUNE DI VENAFRO	marzo	Rinvenimento di beni artistici.
3152	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CORTILE INTERNO ED EDIFICI LIMITROFI	SANTUARIO SANTA MARIA DI PICCIANO	settembre	Provvedimento giudiziario.
3163	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BASILICA DI S. MARIA DI COLLEMACCIO	SOPRINTENDENZA B.A.A.S. PER L'ABRUZZO	settembre	Avverse condizioni meteo.
3175	CENTRO DI ACCOGLIENZA GIOVANNI PAOLO II PER GIOVANI PELLEGRINI D'ITALIA E D'EUROPA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	marzo	Provvedimento di somma urgenza dovuto a frana del fronte di scavo.
3185	RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO S. PASQUALE	CONGR. SUORE SERVE DEI POVERI	marzo	Consentire l'installazione delle forniture a più d'opera.
3339	RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI LAPIDEI DELLA CHIESA E DEL CAMPANILE CONSOLIDAMENTO PULITURA E RESTAURO DEGLI AFFRESCHI NELL'AREA PRESBITERIALE	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO	febbraio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
3370	RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	CONVENTO DI PIETRALBA	febbraio	Avverse condizioni meteo.
3371	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO AD OSTELLO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	CONVENTO DI PIETRALBA	febbraio	Avverse condizioni meteo.
3372	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE ED AUTOBUS	CONVENTO DI PIETRALBA	marzo	Avverse condizioni meteo.
3564	PARCHEGGIO SCAMBIATORE E SVINCOLO DI RACCORDO IN LOCALITÀ SAN LORENZO A GREVE	COMUNE DI FIRENZE	marzo	Provvedimento giurisdizionale e per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
3697	RECUPERO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO AL NOCE	COLLEGIO ANTONIANO DELLE MISSIONI ESTERE DEI FRATI	marzo	Rinvenimento di sepolture e per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
3714	OSTELLO DELLA GIOVENTÙ NELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA	COMUNE DI VERONA	marzo	Sopravvenienze archeologiche

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
3902	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI RISTORAZIONE PRESIDIO SANITARIO	COMUNE DI GINOSA	settembre	Soppravvenienze archeologiche
4019	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3° ED ULTIMO LOTTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ROSETO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO RELIGIOSO ROSETO	PROVINCIA NAPOLETANA DEI FRATI CAPPUCCINI	febbraio	Dichiarazione dello stato di calamità naturale da parte della Protezione Civile.
4310	PARCHEGGIO ATTREZZATO DI SCAMBIO SERVIZI DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA STAZIONE AUTOLINEE EXTRAURBANE	COMUNE DI FIRENZE	maggio	Ritrovamento di ordigno bellico.
4574	CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA PIEVE DI S. STEFANO DI SORANO	PARROCCHIA DI S. STEFANO DI FILATTIERA	maggio	Soppravvenienze archeologiche
4592	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX SEMINARIO DELLE AREE DELL' EPISCOPIO A FINE RICETTIVE RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE	DIOCESI DI MELFI	gennaio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
4739	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DI SOSTA E DELLA ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO ED AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAN CERBONE E MASSA MARITTIMA	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	settembre	Sospensione dei lavori disposta dal Ministero BBAA. E CC., nelle more dell'apposizione del vincolo paesaggistico.
4976	REALIZZAZIONE DI UN PRONTO SOCCORSO E DI UN'AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA DENOMINATA ORTO DELLA MADONNA.	COMUNE DI VIGGIANO	settembre	Sorpresa geologica.
5083	RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO X E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	settembre	Avverse condizioni meteo.
5174	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO TRASFERIMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI	COMUNE DI LIVORNO	marzo	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
5175	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SERVIZI DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI LIVORNO	gennaio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
5219	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RIUSO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ANCHE ALLO SCOPO D'INCREMENTARE LA RICETTIVITA' E RELATIVI SERVIZI A BASSO COSTO	DIOCESI DI NAPOLI	luglio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
5326	RESTAURO ADEGUAMENTO PER DEPOSITO E RASSEGNA BENI CULTURALI DELLA DIOCESI DI PARMA	DIOCESI DI PARMA	aprile	Soppravvenienze archeologiche
5599	ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E RECUPERO DI LOCALI DISMESSI	COMUNITA' PADRI BENEDETTINI	febbraio	Avverse condizioni meteo.
6000	CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI VIA FRANCIGENA LUNGO IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI PONTE C. BATTISTI SUL FIUME MAGRA	COMUNE DI PONTREMOLI	aprile	Evento alluvionale e conseguente dichiarazione di stato di emergenza da parte della Protezione Civile.
6122	SISTEMAZIONE SPAZIO URBANO ESTERNO DELL'AREA EX GASOMETRO	COMUNE DI FIRENZE	febbraio	Soppravvenute disposizioni realizzative da parte della Soprintendenza.

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
6173	COMPLETAMENTO DI STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA OSTELLO CON RIUSO DELLE DIPENDENZE DI PALAZZO GIORGI	COMUNE DI SANTA SOFA	maggio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
6192	ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE DI VILLA ROSPIGLIOSI	DIOCESI DI PISTOIA	febbraio	Completamento delle opere di adeguamento antincendio.
6352	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO MECCANIZZATO COMPOSTO DA TRATTI PEDONALI E COPPIE DI ASCENSORI DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DI PIAZZA MATTEOTTI	COMUNE DI ASSISI	luglio	Soppravvenienze archeologiche
6387	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI S. AGOSTINO IN CASCIA	FONDO EDIFICI DI CULTO	febbraio	Rinvenimento di beni artistici.
6407	PERCORSI PEDONALI PROTETTI	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	gennaio	Motivi di ordine pubblico.
6409/B	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO (II° LOTTO)	COMUNE DI NORCIA	aprile	Provvedimento giudiziario.
6442/B	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E RIQUALIFICAZIONE DELLA CINTA MURARIA E VIARIA AL RIDOSSO DEL CENTRO STORICO - VIABILITA' DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI	COMUNE DI NORCIA	febbraio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
6442/C	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E RIQUALIFICAZIONE DELLA CINTA MURARIA E VIARIA AL RIDOSSO DEL CENTRO STORICO - REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI NORCIA	maggio	Soppravvenienze archeologiche
6446	SISTEMAZIONE FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO E DEL PIAZZALE ANTISTANTE	CONFR. SS. SACRAMENTO	settembre	Rinvenimento di beni artistici.
6490	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA CHIESA DI SAN MICHELE	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	gennaio	Avverse condizioni meteo.
6538	RECUPERO FUNZIONALE AI FINI CENTRO DI SOSTE RISTORO INFORMAZIONE DI UN'ALA DELL'EX CONVENTO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI	COMUNE DI PESARO	aprile	Provvedimento di autotutela dell'Amministrazione precedente.
6615	OSTELLO PLAN DI MASSIANO E ANNESSO PARCO PUBBLICO	COMUNE DI PERUGIA	marzo	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
6705	AREA EX IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSO LA SOSTA E LA MOBILITA'	COMUNE DI MONTEFALCO	marzo	Calamità naturale dichiarata dalla Protezione Civile.
6718	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA E DEL PORTICO DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA	DIOCESI DI TERM. NARNI AMELIA	marzo	Soppravvenienze archeologiche
6898	SISTEMAZIONE DI AREA URBANA DI SOSTA E RISTORO. TERMINAL BUS E VERDE ATTREZZATO DEL PIAZZALE E DEI SAGRATI DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO	COMUNE DI CASCIA	marzo	Avverse condizioni meteo e conseguente dichiarazione dello stato di calamità da parte della Protezione Civile.

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Proroga concessa	Motivazioni
6997	RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DELL'ABBZIA DI SANT'EUTIZIO E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE A SERVIZIO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI PRECI	marzo	Eventi sismici e rinvenimenti archeologici.
7036	LA TORRE DEL BORGO	COMUNE DI GIOVE	febbraio	Avverse condizioni meteo.
7084	SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN LOCALITA' CASALI DI VALLO	COMUNE DI VALLO DI NERA	marzo	Avverse condizioni meteo e conseguente dichiarazione dello stato di calamità da parte della Protezione Civile.
7560	SISTEMAZIONE DI AREE ATTEZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' PIRROTTA	CASA RELIGIOSA DEI CHIERICI REGOLARI	settembre	Sorpresa geologica.
11028/B 1	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA BIBLIOTECA ANTONIANA E DELLE TORRI CAMPANARIE	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	febbraio	Consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
11028/B 2	RECUPERO E REVISIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLE FALDE IN COTTO DEL COMPLESSO CONVENTUALE; ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SEGNALETICA INFORMATIVA DI SICUREZZA; LAVORI DI	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	marzo	Soppravvenienze archeologiche

Allegato B
Definanziamenti

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Importo definanziamento
186	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	MIN. TRASP. - NAVIGAZIONE D. G. A. C.	860.000.000
272	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI SPIRITUALITA' S. ANNA	ARCIDIOCESI DI MATERA IRSINA	1.917.622.515
352	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO DI SANT'ANTONIO ABATE, DOTAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI E REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	COMUNE DI TORRALBA	8.322.037
461	COMPLETAMENTO DEL COSTRUIENDO OSTELLO PER LA GIOVENTU'	COMUNE DI VARALLO SESIA	206.604.139
462	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA ATTUALMENTE ADIBITA A BUS TERMINAL	COMUNE DI VARALLO SESIA	86.261.450
477	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL MUSEO NAZIONALE IN VIA CURIEL ANGOLO VIA JULIA AUGUSTA	COMUNE DI AQUILEIA	290.000.000
479	INTERVENTI RIGUARDANTI L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MOBILITA' DEI DISABILI E L'ACCESSIBILITA' ALLA BASILICA ED ALLE PRINCIPALI METE RELIGIOSE ARCHEOLOGICHE E TURISTICHE	COMUNE DI AQUILEIA	77.697.082
713	PARCHEGGIO DELL'ABBZIA DI PRAGLIA	COMUNE DI TEOLO	3.186.053
899	STRUTTURA ACCOGLIENZA POZZO CAVO	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	264.544.805
905	ARREDO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIALE CAPPUCCINI	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	132.594.448
953	LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PARCHEGGI E DELLA VIABILITA' DI RACCORDO A SERVIZIO DI POMPOSA	COMUNE DI CODIGORO	800.144.332

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Importo * definanziamento
1018	RESTAURO DEL CONVENTO DI S. PASQUALE CON RELATIVA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA	COMUNE DI BENEVENTO	2.794.202.752
1197	SISTEMA INNOVATIVO DI TRASPORTO ECOCOMPATIBILE CON NAVETTE ALIMENTATE A METANO	COMUNE DI POMPEI	5.950.000.000
1268/B	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX VILLA BADOGLIO - 2° STRALCIO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	718.265.075
1339	RECUPERO DELL'EX CARCERE MANDAMENTALE (GIA' CARCERE REALE) AD USO DI OSTELLO	COMUNE DI NOTO	67.327.604
1378/A	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' S. COSIMO ALLA MACCHIA	ENTE SANTUARIO S. COSIMO	3.635.509.618
1728	RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE D'ACCESSO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO CON INTERVENTI ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA	COMUNE DI VICENZA	585.677.812
1740	RISTRUTTURAZIONE BARCHESSA DEL PALAZZO BRUSAROSCO	COMUNE DI VICENZA	575.015.989
2094	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA	COMUNE DI MOTTOLA	92.953.149
2120	RIQUALIFICAZIONE DEL SANTUARIO DI POLSI E CON AREE DI PERTINENZA E RELATIVO ACCESSO	COMUNE DI SAN LUCA	450.000.000
2235	RESTAURO CATTEDRALE	COMUNE DI ALOHERO	2.501.168.549
2280	INSTALLAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO	COMUNE DI PRATO	75.000.000

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Importo definanziamento
2569	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA IN MAMA AD USO OSTELLO E SERVIZI	PARROCCHIA DI SANTA TERESA D'AVILA	117.895.855
2570	INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA BETANIA	ARCIDIOCESI DI NAPOLI	255.642.720
2775	MUSEO DIOCESANO DI SARZANA NELL' ORATORIO DELLA MISERICORDIA	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	331.164.885
2842	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI CAGLIARI	296.882.740
2847/A	RESTAURO CATTEDRALE E LOCALI ADIACENTI	ENTE DIOCESI CATTEDRALE DI CAGLIARI	2.549.475.919
2847/C	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VICO DUOMO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI	541.727.653
2977	COLLEGAMENTO NAVETTA TESSERA VENEZIA VIA ACQUA ACCESSIBILE AI DISABILI	ACTV AZIENDA CONS. TRASPORTI VENEZIANO	398.880.000
2980	RISTRUTTURAZIONE APPRODO DI PUNTA SABBIONI	ACTV AZIENDA CONS. TRASPORTI VENEZIANO	97.760.000
3338	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL CONVENTO DI S. LEUCIO DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZI	COMUNE DI MONTORO INFERIORE	377.031.818
3417	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA STRUTTURA RICETTIVA VILLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	CONGR. SUORE MISS. DI GESU' ETERNO	173.367.938
3524	AREE URBANE ED EXTRAURBANE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO NAVETTE	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	49.612.800

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Importo definanziamento
3725	RECUPERO DELL'EX ISTITUTO LA MADONNINA MONTENERO	CONGR. FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	59.142.857
3747	INTERVENTI PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA' NELLE CHIESE FIORENTINE DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESISTENTI	COMUNE DI FIRENZE	348.464.437
4254	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA FORMAZIONE MORALE E RELIGIOSA	SEM. VESCOVILE DI CALTANISSETTA	760.037.904
4383	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIALE SAN CARLO ALL'ARENA COMPRESO NELL'ITINERARIO L'APPIA ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	PROV. NAPOLETANA PADRI SCOLOPI	37.274.924
4530	RECUPERO DELLA CRIPTA MEDIOEVALE PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI	MONASTERO SANTA GIUSTINA	11.239.520
4539	AMPLIAMENTO DELL'OPERA PIA LORENZO SCILLITANI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA PER FAVORIRE GLI ACCESSI E LA MOBILITA' DEI DISABILI	OPERA PIA LORENZO SCILLITANI	450.800.694
4817	MUSEO DELL'ARCIDIOCESI E DEL TESORO DI AQUILEA	COMUNE DI GORIZIA	682.669.895
4961	STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E RELATIVI SERVIZI LUNGO IL CAMMINO DEL ROSARIO DI PADRE PIO	COMUNE DI PIETRELCINA	286.695.471
5172	ITINERARIO MARIANO LA PIAZZA DEL SANTUARIO LE SUPERFICI E L'ARREDO	COMUNE DI LIVORNO	118.008.734
5176	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON ATTREZZATURE PER IL TRASFERIMENTO DELLA SOSTA	COMUNE DI LIVORNO	38.433.250
5464	RECUPERO DI LOCALI SOTTOTETTO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA	CONGR. REL. ISTIT. SUORE FRANCESCAINE	49.616.201

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Importo definanziamento
5670	RIUTILIZZO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	COMUNE DI NAPOLI	4.035.607.614
5815	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	FERROVIE DELLO STATO	1.125.000.000
5816	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	FERROVIE DELLO STATO	1.905.600.000
5918	EMERGENZA SANITARIA	REGIONE TOSCANA	25.128.303
5949	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL' ABBAZIA DI S. EGIDIO, DEI LOCALI ANNESSI E SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI	DIOCESI DI BERGAMO	33.112.704
6101	MUSEI COMUNALI DI S. MARIA NOVELLA E DI S. SPIRITO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED IMPIANTISTICA PER LA SICUREZZA	COMUNE DI FIRENZE	814.173.468
6239	REALIZZAZIONE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI	OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI	468.250.187 673.559.338
6376	COMPLETAMENTO EDIFICIO EX F.A.F.	COMUNE DI LORETO	673.559.338
6606/A	PARCHEGGIO INTERMODALE PONTE SAN GIOVANNI - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	COMUNE DI PERUGIA	426.405.505
6611	SISTEMAZIONE DEL CASSERO DI PORTA S. ANGELO	COMUNE DI PERUGIA	18.025.129
6821	COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO POLIVALENTE (ALLEGATO PIANO GENERALE ACCOGLIENZA)	COMUNE DI LORETO	171.942.476

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Importo definanziamento
7404	PROGETTO PER UN SISTEMA INFORMATIVO DI SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI BENI DI CARATTERE RELIGIOSO E CULTURALE FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA ED ALL'ORIENTAMENTO DEI VISITATORI PREVISTI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DEL 2000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ASCOLI PICENO	132.698.945
7465	SOSTA PULLMAN BANCHINA PORTUALE	COMUNE DI ANCONA	991.129.314
TOTALE			~~41.149.865.759~~

40.944.556.608

INAIL 2000 PROT. 7508		INAIL IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	0	28.743.000.000	28.743.000.000	28.743.000.000	Rinuncia per impossibilità del proponente di rispettare i tempi di consegna
6020							
INAIL 2000 PROT. 7764		INAIL IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	0	9.990.000.000	9.990.000.000	9.990.000.000	Rinuncia per impossibilità di stipula del contratto di compravendita
6049							
INAIL 2000 PROT. 7669		INAIL IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	0	12.120.000.000	12.120.000.000	12.120.000.000	Rinuncia per impossibilità di ottenere idonee concessioni edilizie
6060							
RECUPERO VOLUMI EX CAVA TORGIOVANETTO		INERTICAVE S.N.C.	0	14.840.000.000	14.840.000.000	14.840.000.000	Rinuncia all'intervento a causa ritardo delle autorizzazioni urbanistiche
7053							
			3.233.000.000	75.261.000.000	78.494.000.000	3.233.000.000	0

Deliberazione n. 3 del 1.08.2000

La Commissione ex lege n. 270/1997

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997, 17 marzo 1998 e 28 luglio 2000 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. DAGL/20LL.PP./96, in data 10 dicembre 1999, relativa alle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento degli interventi dei piani di cui alla legge n. 651/1996 ed alla legge n. 270/1997;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);

VISTA la legge 16 dicembre 1999, n. 494;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ordine:

agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio medesimo circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel piano;

RITENUTO di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo sia riconducibile al caso fortuito o alla causa di forza maggiore;

CONSIDERATO che l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione dei lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione, la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione dei lavori laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o alla causa di forza maggiore;

RITENUTO, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

RITENUTO, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e sulla base delle relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito;

RITENUTO, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e sulla base delle relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex articolo 4, comma 2, della legge n. 270/1997 - per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito - il definanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO B, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L.6.064.975.092, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'articolo 3, comma 4, della legge n. 270/1997;

RITENUTO, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate, operando anche con risorse finanziarie proprie;

PRESO atto delle economie di stanziamento dichiarate dai rispettivi soggetti beneficiari per gli interventi di cui all'ALLEGATO C, per un complessivo ammontare di L. 1.514.633.673, che restano nella disponibilità di questa Commissione;

CONSIDERATO che, per effetto delle succitate ricognizioni e dei suindicati definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa Commissione:

<i>disponibilità precedenti</i>	<i>L. 44.516.462.516</i>
<i>definanziamenti ex art. 4, comma 2, legge n. 270/1997</i>	<i>L. 6.064.975.092</i>
<i>economie di stanziamento</i>	<i>L. 1.514.633.673</i>
<i>per un complessivo ammontare di</i>	<i>L. 52.096.071.281</i>

RITENUTO di accogliere —in sede di riesame— le richieste di reintegrazione finanziaria, relativamente agli interventi indicati nell'ALLEGATO D, nella misura e per le motivazioni indicate a fianco di ciascuno di essi, per un importo complessivo di L. 907.168.728;

CONSIDERATO che la legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000) ha disposto —come indicato nella Tabella E concernente le variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte— la riduzione di lire 40 miliardi della competenza del fondo ex lege n. 270/1997;

RITENUTO, pertanto, di dovere decurtare dalla massa finanziaria astrattamente disponibile anche a seguito dei disposti definanziamenti, la suddetta somma di L. 40 miliardi;

CONSIDERATO che, per effetto delle suddette ricognizioni, restano nella effettiva disponibilità della Commissione L. 11.188.902.553;

RITENUTO, al fine di consentire l'utilizzo delle somme assegnate dalla Regione Campania, di assentire la richiesta del termine suppletivo di agosto 2000 per l'ultimazione dei lavori di sistemazione delle aree di sosta e ristoro in località Arenella, in Napoli, rubricato con codice 2770;

RITENUTO di assentire la richiesta di disaggregazione di tale intervento, in due lotti funzionali, al fine di consentire una distinta attuazione del lotto finanziato con fondi non statali, disponendo che il 1° lotto sia rubricato con codice 2770/A, a fronte di una quota di finanziamento ex lege n. 270/1997 di lire 614.750.000, di una quota di cofinanziamento di lire 75.250.000, per un costo stimato complessivamente in lire 800.000.000; e che il 2° lotto sia rubricato con codice 2770/B, per un costo stimato di lire 4.934.750.000 a totale copertura finanziaria con risorse non statali;

RITENUTO di non assentire le richieste di inserimento nel Piano di nuovi interventi trattandosi di proposte che comportano l'attivazione di cantieri nel corso dello svolgimento delle celebrazioni giubilari;

All'unanimità

DELIBERA

Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori indicati a fianco di ciascun intervento di cui all'ALLEGATO A.

Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'ALLEGATO B.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

Si prende atto delle economie di stanziamento dichiarate dai rispettivi soggetti beneficiari per gli interventi di cui all'ALLEGATO C, per un complessivo ammontare di L. 1.514.633.673.

Sono assentite le reintegrazioni di finanziamento, relativamente agli interventi indicati nell'ALLEGATO D, nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi, per un importo complessivo di L. 907.168.728.

E' assentita la richiesta del termine suppletivo di agosto 2000 per l'ultimazione dei lavori di sistemazione delle aree di sosta e ristoro in località Arenella, in Napoli, rubricato con codice 2770.

E' assentita la richiesta di disaggregazione dell'intervento relativo ai lavori di sistemazione delle aree di sosta e ristoro in località Arenella, in Napoli, rubricato con codice 2770, in due lotti funzionali, e si dispone che il 1° lotto viene rubricato con codice 2770/A, a fronte di una quota di finanziamento ex lege n. 270/1997 di lire 614.750.000, di una quota di cofinanziamento di lire 75.250.000, per un costo stimato complessivamente in lire 800.000.000; mentre il 2° lotto viene rubricato con codice 2770/B, per un costo stimato di lire 4.934.750.000 a totale copertura finanziaria con risorse non statali.

Non sono accolte le richieste di inserimento di nuovi interventi.

Restano nella disponibilità della Commissione L. 11.188.902.553.

Il Segretario

Il Presidente

Allegato A

Termini suppletivi

Codice URGCE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Termini suppletivi	Motivazioni
1059	LAVORI DI RESTAURO ED ADATTAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CONEGLIANO	settembre	Per sopravvenienze archeologiche.
1968	RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO E ARTISTICO DELL'ABBAZIA CISTERCENSE DI S.M.ASSUNTA DI RIVALTA SCRIVIA	PARROCCHIA S. M. ASSUNTA ABBAZIA CISTERCENSE	settembre	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
2055	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI A NAPOLI E PROVINCIA - COMPLESSO MONUMENTALE DELLE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI NAPOLI E PROV.	settembre	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
2128	COMPLETAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	settembre	Per avverse condizioni meteo.
2558	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX CASCINA S. PIETRO GIA' GRANCIA DEI MONACI BENEDETTINI DI S.PIETRO	COMUNE DI ORIO LITTA	marzo	Per consentire i lavori di consolidamento a carico del bilancio comunale.
3060	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI SPAZI LITURGICI PER LA FRUIZIONE DEI PELLEGRINI CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA SAGRESTIA VECCHIA SANTA CATERINA DELLA NOTTE CAPPELLA DEL MANTO	COMUNE DI SIENA	aprile	Per sopravvenienze archeologiche ed artistiche.
3638	INPOPOINT PASSEPARTOUT 2000 - SISTEMA DI NODI INFORMATIVI DEDICATI AI DISABILI PER L'ACCOGLIENZA, LA GUIDA AL TERRITORIO E LA CONOSCENZA DEI SUOI BENI CULTURALI	COMUNE DI NAPOLI	dicembre	Per consentire la gestione del servizio di accoglienza e guida ai percorsi giubiliari.
3684	RIADATTAMENTO DEL FABBRICATO DEL DISMESSO C. D. U. E TRASFORMAZIONE IN RICETTIVITA' ESCLUSIVAMENTE PER PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA O SENSORIALE	ENTE PARROCCHIA S. FELICITA	settembre	Per avverse condizioni meteo, Decreto di stato di emergenza emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
3731	CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' NELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI	COMUNE DI TARANTO	giugno	Per ritrovamenti archeologici.
4104	RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO	PROVINCIA DI L'AQUILA	luglio	Per avverse condizioni meteo.
4303	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO RICETTIVITA' PER OSTELLO	PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE	agosto	Per avverse condizioni meteo.

Allegato A

Termini suppletivi

Codice URCOE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Termini suppletivi	Motivazioni
4304	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' MONTE CARMINE A SERVIZIO DEL SANTUARIO	PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE	marzo	Per avverse condizioni meteo.
4381	RECUPERO AMBIENTALE E RIPRISTINO DI LOCALI DI ALTO VALORE STORICO E RELIGIOSO DA INSERIRE NEL TOUR GRUBILARE DEGLI AVVENIMENTI LITURGICI LEGATI AL GIRO DELLE GROTTI E DEGLI ORATORI	ENTE CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	luglio	Per sopravvenienze archeologiche, storiche ed architettoniche.
4576	RISTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE IMPRESEZIONATE O SOTTOUTILIZZATE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ADIACENTI PER LA SOSTA RISTORO INFORMAZIONI E PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI INTERMODALI	COMUNITA' MONTANA PELIGNA ZONA F	settembre	Per avverse condizioni meteo.
4632	ITINERARI D'ARTE E RELIGIOSITA' NEL FRIULI VENEZIA GIULIA	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. FRIULI V.G.	dicembre	Per consentire la gestione dei servizi informativi.
4915	PALAZZO REALE CENTRO DI COORDINAMENTO GIUBILEO 2000 CAGLIARI CENTRO SERVIZI ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CAGLIARI	settembre	Per avverse condizioni meteo.
5497	RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI S. CATERINA	IRPEA IST. RIUN. PADOVANI DI EDUCAZIONE	gennaio	Per sopravvenienze archeologiche.
5502	ESPERIENZA FRANCESCA NA NEL GIUBILEO	FAMIGLIA DEI DISCEPOLI IST. REL.	aprile	Per consentire la nuova fornitura degli arredi, andati distrutti durante il trasporto.
5673	OSPEDALE DEL BIGALLO PER ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI STRUTTURA RICETTIVA E DIDATTICO MUSEALE	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	settembre	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
5759	RESTAURO CONSERVATIVO ORATORIO DI SANT'ALBINO	COMUNE DI MORTARA	settembre	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
6101	MUSEI COMUNALI DI S. MARIA NOVELLA E DI S. SPIRITO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED IMPIANTISTICA PER LA SICUREZZA	COMUNE DI FIRENZE	marzo	Per sopravvenienze artistiche.
6413	RECUPERO DEL COMPLESSO DI VILLA SGARIGLIA COME ALBERGO PENSIONE 1/2 STELLE	COMUNE DI ASCOLI PICENO	settembre	Per consentire l'utilizzo dell'incremento di cofinanziamento approvato dalla Commissione alla fine del 1999.

Allegato A

Termini suppletivi

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Termini suppletivi	Motivazioni
7143	SISTEMI DI DIFFUSIONE CULTURALI E RELIGIOSI	COMUNE DI FOLIGNO	dicembre	Per consentire la gestione dei servizi di accoglienza.
7347	RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CATTEDRALE DI SAN LORENZO	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DELL' UMBRIA	marzo	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
7603	RECUPERO DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DEL GESU' A FINI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI VIOGIANO	settembre	Per avverse condizioni meteo e per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
11080	SISTEMAZIONE E ARREDO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CATTEDRALE DI CONCORDIA SAGITTARIA AREA SUD	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	febbraio	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.
11243	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEGLI ANGELI	PARROCCHIA S. NICOLA DI BARI	aprile	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive di cui al D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale alla fine del 1999.
13058	REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S. MARIA DI CASTELLO	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	settembre	Per consentire l'utilizzo delle risorse aggiuntive attribuite dalla Commissione alla fine del 1999.

Allegato B Definanziamenti

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Somma defanziata
399	RESTAURO DEL CORPO COSTITUENTE L'INGRESSO ALLA PESCHERIA DUCALE COMPRENDENTE UN ALLOGGIO PER CUSTODI	6 A DIR. NE GENIO MILIT. ACCAD. DI MODENA	241.141.732
415	STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI INFORMAZIONE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MANOPPELLO	21.910.743
1463	RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI IN LOC. CHIARAVALLE DELLA COLOMBA RIUSO DELL'EX DORMITORIO DEI MONACI DELL'ABBZIA CISTERCENSE A SPAZIO MUSEALE LEGATO ALLA RICETTIVITA'	MINISTERO DELLE FINANZE DIP. TERRITORIO	354.095.984
2357	RIUTILIZZO DI UN'ALA DISMESSA DELL'EX MONASTERO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI DA ADIBIRE CASA PER FERIE CON ANNESSA SALA	OPERA PIA CARMELA TRIGONA DI GERACI	157.101.340
2396	ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE IN LOCALITA' CASA CASARINI DI ROMAGNESE	COMUNE DI ROMAGNESE	529.650.000
2764	ADATTAMENTO DELL'ISTITUTO SCUOLE PIE ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO COMPRESO NELL'ITINERARIO L'APPIA ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	PROV. NAPOLETANA PADRI SCOLAPI	153.520.061
2978	RISTRUTTURAZIONE APPRODI DI FUSINA E ZATTERE	ACTV AZIENDA CONS. TRASPORTI VENEZIANO	300.933.962
3090	REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DELL'ARTE SACRA NEL NORD SARDEGNA	PROVINCIA DI SASSARI	1.722.510.507
3157	RESTAURO CONVENTO SAN MATTEO CON ADEGUAMENTO PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN PROSSIMITA' DI TRACCIATO ORIGINALE DELLA VIA FRANCIGENA	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	32.377.353
3505	POTENZIAMENTO FUNZIONALE DEI BENI CULTURALI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DI SALERNO	56.772.000
3997	CASA DI ACCOGLIENZA PELLEGRINI DISABILI BREDA	PIA FONDAZIONE V. S. BREDA	558.117.667

Allegato B
Definanziamenti

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Somma definanziata
4827	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TELEMATICO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI A SERVIZIO DEI PELLEGRINI	REGIONE AUTONOMA FRIULI V. G.	64.080.029
5827	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	FERROVIE DELLO STATO	431.300.000
5837	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	FERROVIE DELLO STATO	1.293.000.000
6909	SISTEMA DI SEGNALETICA STRADALE RIVOLTO ALLA INFORMAZIONE DEI VISITATORI SUGLI ITINERARI GIUBILARI E SULLE METE DI CARATTERE RELIGIOSO NEL TERRITORIO DELLE MARCHE	REGIONE MARCHE	16.971.047
7402	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO EX CARTIERA PAPALE PER L'ACCOGLIMENTO DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DEI PELLEGRINI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE A. P.	131.492.667
TOTALE			6.064.975.092

Allegato C
Economie di stanziamento

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Economie di stanziamento
3638	INFOPOINT PASSEPARTOUT 2000 - SISTEMA DI NODI INFORMATIVI DEDICATI AI DISABILI PER L'ACCOGLIENZA, LA GUIDA AL TERRITORIO E LA CONOSCENZA DEI SUOI BENI CULTURALI	COMUNE DI NAPOLI	408.926.147
6366	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SANTUARIO DI MONGIOVINO	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DELL'UMBRIA	143.286.085
7257	RESTAURO DELLA CHIESA MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO	COMUNE DI MONTELUPONE	34.637.423
11080	SISTEMAZIONE E ARREDO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CATTEDRALE DI CONCORDIA SAGITTARIA AREA SUD	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	927.784.018
TOTALE			1.514.633.673

Allegato D
Reintegrazioni Finanziarie

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Motivazioni	Reintegrazione finanziaria
3731	CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' NELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI	COMUNE DI TARANTO	A seguito di più puntuale individuazione del ribasso d'asta.	151.015.110
6101	MUSEI COMUNALI DI S. MARIA NOVELLA E DI S. SPIRITO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED IMPIANTISTICA PER LA SICUREZZA	COMUNE DI FIRENZE	Per consentire, in coerenza con il termine suppletivo indicato nell'allegato A, l'utilizzo delle risorse precedentemente assegnate.	756.153.618
			TOTALE	907.168.728
