


Comune di Venezia

Interventi finalizzati alla acquisizione ed al restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento.

Tra essi va rilevato il peso che assumono gli interventi relativi:

- alla residenza che, unitamente ai contributi al patrimonio immobiliare privato di cui alla successiva lettera c) della Legge 798/84 ed altri provvedimenti integrativi di carattere normativo e finanziario, si propongono di contrastare e invertire il fenomeno dell'esodo;
- alla cultura che garantiscono la riorganizzazione culturale ed economica del sistema museale della città;
- alla ricostruzione del Teatro la Fenice.

lettera a), art. 6 - Legge 29 novembre 1984 n. 798.

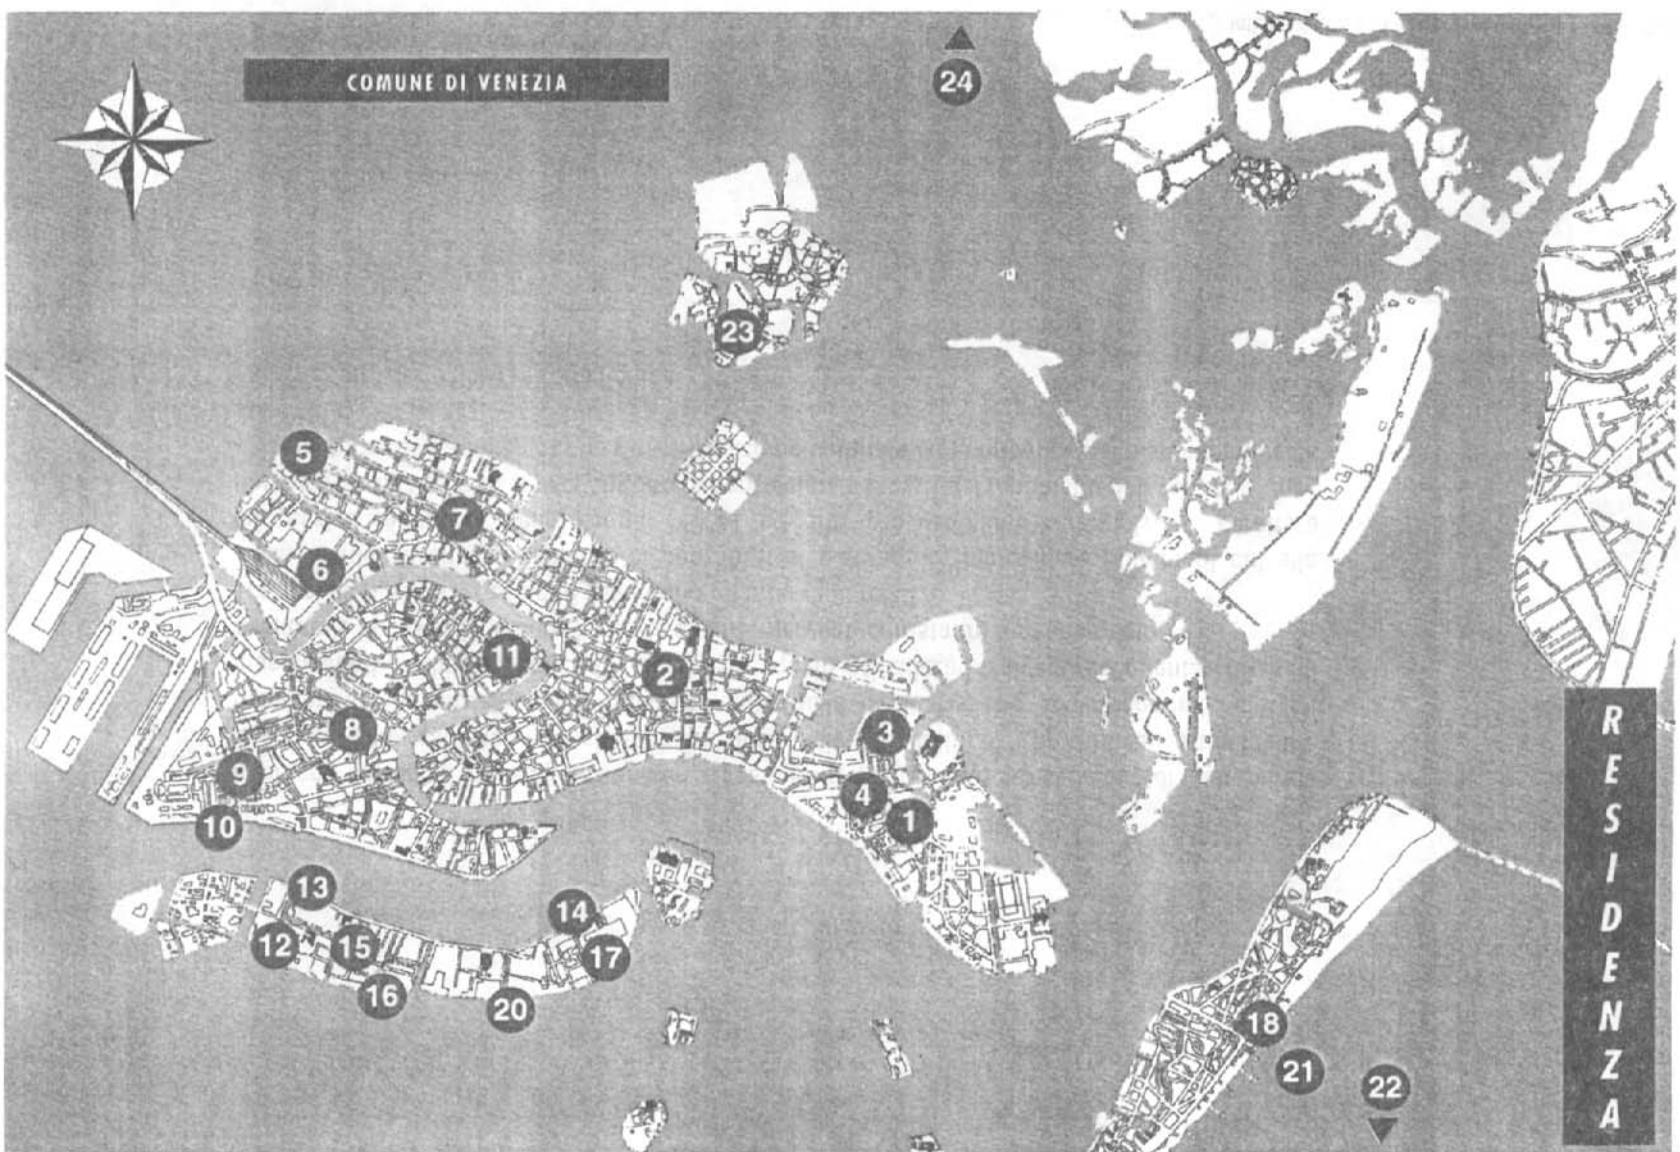

Comune di Venezia

Castello Ex Convento Sant'Anna 1

L'intervento prevede il restauro conservativo e la ristrutturazione di un complesso di valore storico monumentale (legge 1089/39).
Si ricavano complessivamente 106 alloggi e servizi civili.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso (*)
		7.007

(*) alla cifra corrispondente ai lavori in corso vanno aggiunti circa 4 miliardi di competenza regionale

Castello Ex Ospedale San Lorenzo 2

L'intervento di ristrutturazione su un complesso di valore storico monumentale (legge 1089/39) prevede la realizzazione di residenza specializzata per anziani e servizi alla collettività (poliambulatori).

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		20.070

Castello Ex Caserma San Daniele 3

Il progetto di ristrutturazione su un complesso vincolato (legge 1089/39) all'interno dell'Arsenale prevede la realizzazione di 53 alloggi per il personale dipendente del Ministero della Difesa.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			10.058

Castello Complesso Santa Maria Ausiliatrice 4

L'intervento di ristrutturazione prevede la realizzazione di edilizia residenziale per studenti (n. 81 alloggi) ed anziani (n. 20 alloggi). Acquisizione chiavi in mano.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		6.823

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	4.913	4.913	4.852	492
Legge 20 dicembre 1995 n. ...	1996				
	1997	594	580	222	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.500	1.500		
	1998				
TOTALE		7.007	6.993	5.074	492

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	20.070	20.070	15.072	9.052
Legge 20 dicembre 1995 n. ...	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		20.070	20.070	15.072	9.052

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	9.616	9.616	9.616	6.101
Legge 20 dicembre 1995 n. ...	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	442	442		
	1998				
TOTALE		10.058	10.058	9.616	6.101

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n. ...	1996	6.700	6.700	6.700	6.700
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	123	123		
TOTALE		6.823	6.823	6.700	6.700

Comune di Venezia

Cannaregio - Complesso ex Penitenti. 5
Intervento di ristrutturazione con ricavo di alloggi per anziani - studenti e servizi.
Immobile soggetto a convenzione con IRE.

progettazione
1.500

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.500	1.500		
	1998				
TOTALE		1.500	1.500		

Cannaregio - Ex Area Saffa. 6
Intervento di nuova edificazione (n. 38 alloggi) dell'ultimo dei sei lotti di edilizia residenziale.

progettazione istruttoria appalto lavori in corso
11.954

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	8.352	8.352	8.333	1.027
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	2.102	2.102	2.102	
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.500	1.500	1.500	
	1998				
TOTALE		11.954	11.954	11.935	1.027

Cannaregio - Acquisto immobile. 7
Acquisto chiavi in mano di n. 7 alloggi al civico n° 747 di Cannaregio

progettazione istruttoria appalto lavori in corso lavori ultimati
2.343

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.343	2.343	2.343	2.343
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.343	2.343	2.343	2.343

Dorsoduro - Immobile Rio Novo. 8
Restauro e risanamento di edificio ad uso di civile abitazione e negozi (n. 7 alloggi)

progettazione istruttoria appalto lavori in corso
3.170

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	3.170	3.170	3.170	388
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		3.170	3.170	3.170	388

Dorsoduro Ex Convento delle 'Terese' 9

Intervento di restauro e ristrutturazione su un complesso di interesse storico monumentale (legge 1089/39).
Il progetto prevede la realizzazione di edilizia speciale per studenti per un totale di 250 posti letto.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		21.771

Dorsoduro Casa 7 camini 10

Intervento sperimentale di restauro, risanamento e ristrutturazione di un tipico edificio vincolato di edilizia residenziale minore (n. 21 alloggi).

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		2.000

San Polo Fabbriato Calle Carampane 11

Intervento di restauro e risanamento di edificio ad uso residenziale (n. 16 alloggi).

progettazione	istruttoria appalto
	5.800

Giudecca Area ex Fregnan 12

Intervento di nuova edificazione ad uso residenziale per complessivi 38 alloggi.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		8.150

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	11.764	11.764	11.764	2.010
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	8.000	8.000		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	2.007	2.007		
TOTALE		21.771	21.771	11.764	2.010

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.000	2.000	2.000	1.419
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.000	2.000	2.000	1.419

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.000	2.000	2.000	394
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	3.800	3.800		
TOTALE		5.800	5.800	2.000	394

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	8.150	8.150	8.150	6.977
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		8.150	8.150	8.150	6.977

Giudecca Fabbricato ex Cipriani 13

Immobile da destinare a residenza (n. 23 alloggi). E' da definire l'incarico di progettazione.
L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			3.808

Giudecca Ex Magazzini Granari 14

Intervento di restauro e ristrutturazione su un complesso di valore storico monumentale (legge 1089/39) eseguito in 2 lotti per un totale di n. 76 alloggi.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		9.704

Giudecca SS. Cosma e Damiano 15

Intervento di restauro e ristrutturazione su un complesso di valore storico monumentale (legge 1089/39).
Si ricavano 26 unità abitative e botteghe artigiane.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		6.614

Giudecca Ex pastificio Zaggia 16

Interventi di ristrutturazione ad uso residenziale per un totale di 32 alloggi.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			5.265

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	3.808	3.808	3.808	3.808
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		3.808	3.808	3.808	3.808

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.104	2.104	2.104	824
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	600	600	600	364
	1997	7.000	7.000	7.000	596
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		9.704	9.704	9.704	1.784

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.448	2.448	2.448	1.618
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	4.166	4.166	4.166	
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		6.614	6.614	6.614	1.618

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	5.265	5.265	5.265	5.265
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		5.265	5.265	5.265	5.265

Giudecca Ex fabbrica del ghiaccio 17

Interventi di ristrutturazione ad uso residenziale per un totale di 23 alloggi.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			2.038

Giudecca Interventi di recupero urbano 18

Interventi di recupero su alloggi di proprietà comunale ad uso residenziale.

progettazione	istruttoria appalto
	8.000

Giudecca Complesso ex Herion 19

Il complesso è composto da un blocco a schiera (3 alloggi), dalla villa in stile veneziano, con annesso fabbricato di servizio, parco e cavana, dall'ex opificio ubicato nella ex chiesa (vincolata) di S. Cosma e da un fabbricato recente adibito a servizi. L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			5.950

Lido Immobili Via D'oge Beato 20

Intervento di nuova edificazione per 16 alloggi su area di proprietà comunale.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		3.547

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.038	2.038	2.038	2.038
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.038	2.038	2.038	2.038

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.112	1.112		
	1998	6.888	6.888		
TOTALE		8.000	8.000		

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	5.950	5.950		
TOTALE		5.950	5.950		

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	3.547	3.547	3.547	2.688
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		3.547	3.547	3.547	2.688

Comune di Venezia

Lido Immobile Alberoni 21

L'intervento di ristrutturazione prevede la realizzazione di edilizia residenziale per n. 30 alloggi. Acquisto chiavi in mano.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			8.227

Palestrina Villa Taice 22

Interventi di ristrutturazione ad uso residenziale per un totale di 8 alloggi.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			457

Murano Immobile Calle San Cipriano 23

Acquisto chiavi in mano di n. 20 alloggi. Interventi di nuova edificazione in cooperativa.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			3.410

Burano Immobili oggetto di edilizia sperimentale 24

Intervento sperimentale (legge 94/82) di manutenzione e ristrutturazione su 8 edifici per complessivi 23 alloggi, parte dei quali (n. 20) occupati.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		845

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	8.227	8.227	8.195	4.507
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		8.227	8.227	8.195	4.507

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	457	457	457	457
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		457	457	457	457

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.576	1.576	1.576	1.576
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	1.834	1.834	1.834	1.834
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		3.410	3.410	3.410	3.410

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	845	845	845	132
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		845	845	845	132

Comune di Venezia

Acquisizioni di alloggi singoli o raggruppati diffusi nella città.

Il totale programmato viene così suddiviso:

- 7.125 acquisto n. 42 alloggi, la cifra è comprensiva di locali o scoperti adibiti a servizi;
- 100 trattativa in corso;

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
100			7.125

Manutenzione straordinaria e diffusa

Interventi sul patrimonio immobiliare comunale destinato a residenza.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	3.047	17.683	13.927

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	6.790	6.790	6.790	6.790
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	32	32	32	
	1997	140	140	140	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	263	163	163	
	1998				
TOTALE		7.225	7.125	7.125	6.790

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	20.928	20.304	16.318	13.906
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	3.358	3.358	3.198	
	1997	5.421	5.189	3.015	21
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.903	1.903	425	
	1998	3.047	3.047		
TOTALE		34.657	33.801	22.956	13.927

QUADRO FINANZIARIO - RESIDENZA


Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento


	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	130.411	129.787	99,52	120.691	92,55	73.812	56,60
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996	18.792	18.792	100,00	18.632	99,15	8.898	47,35
	1997	21.155	20.909	98,84	10.377	49,05	617	2,92
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	8.220	8.120	98,78	2.088	25,40		
	1998	21.815	21.815	100,00				
TOTALE		200.393	199.423	99,52	151.768	75,75	83.327	41,58

STATO AVANZAMENTO - RESIDENZA

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
1.800	16.847	119.338	62.608
1%	8%	60%	31%

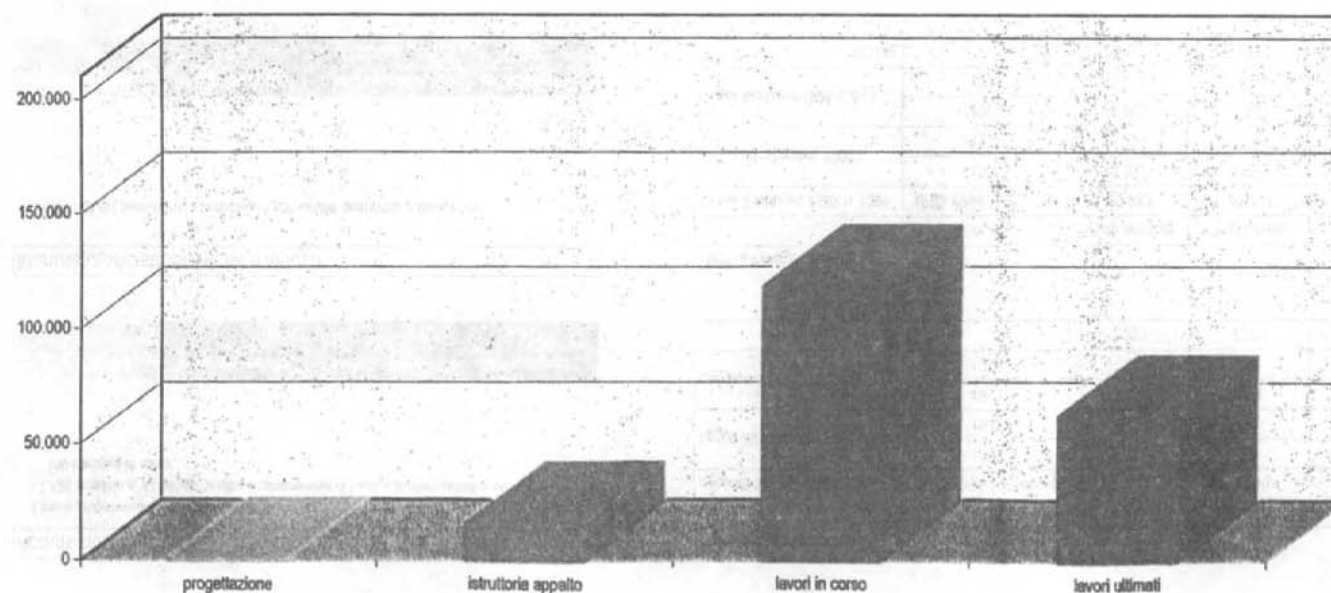

importi in milioni

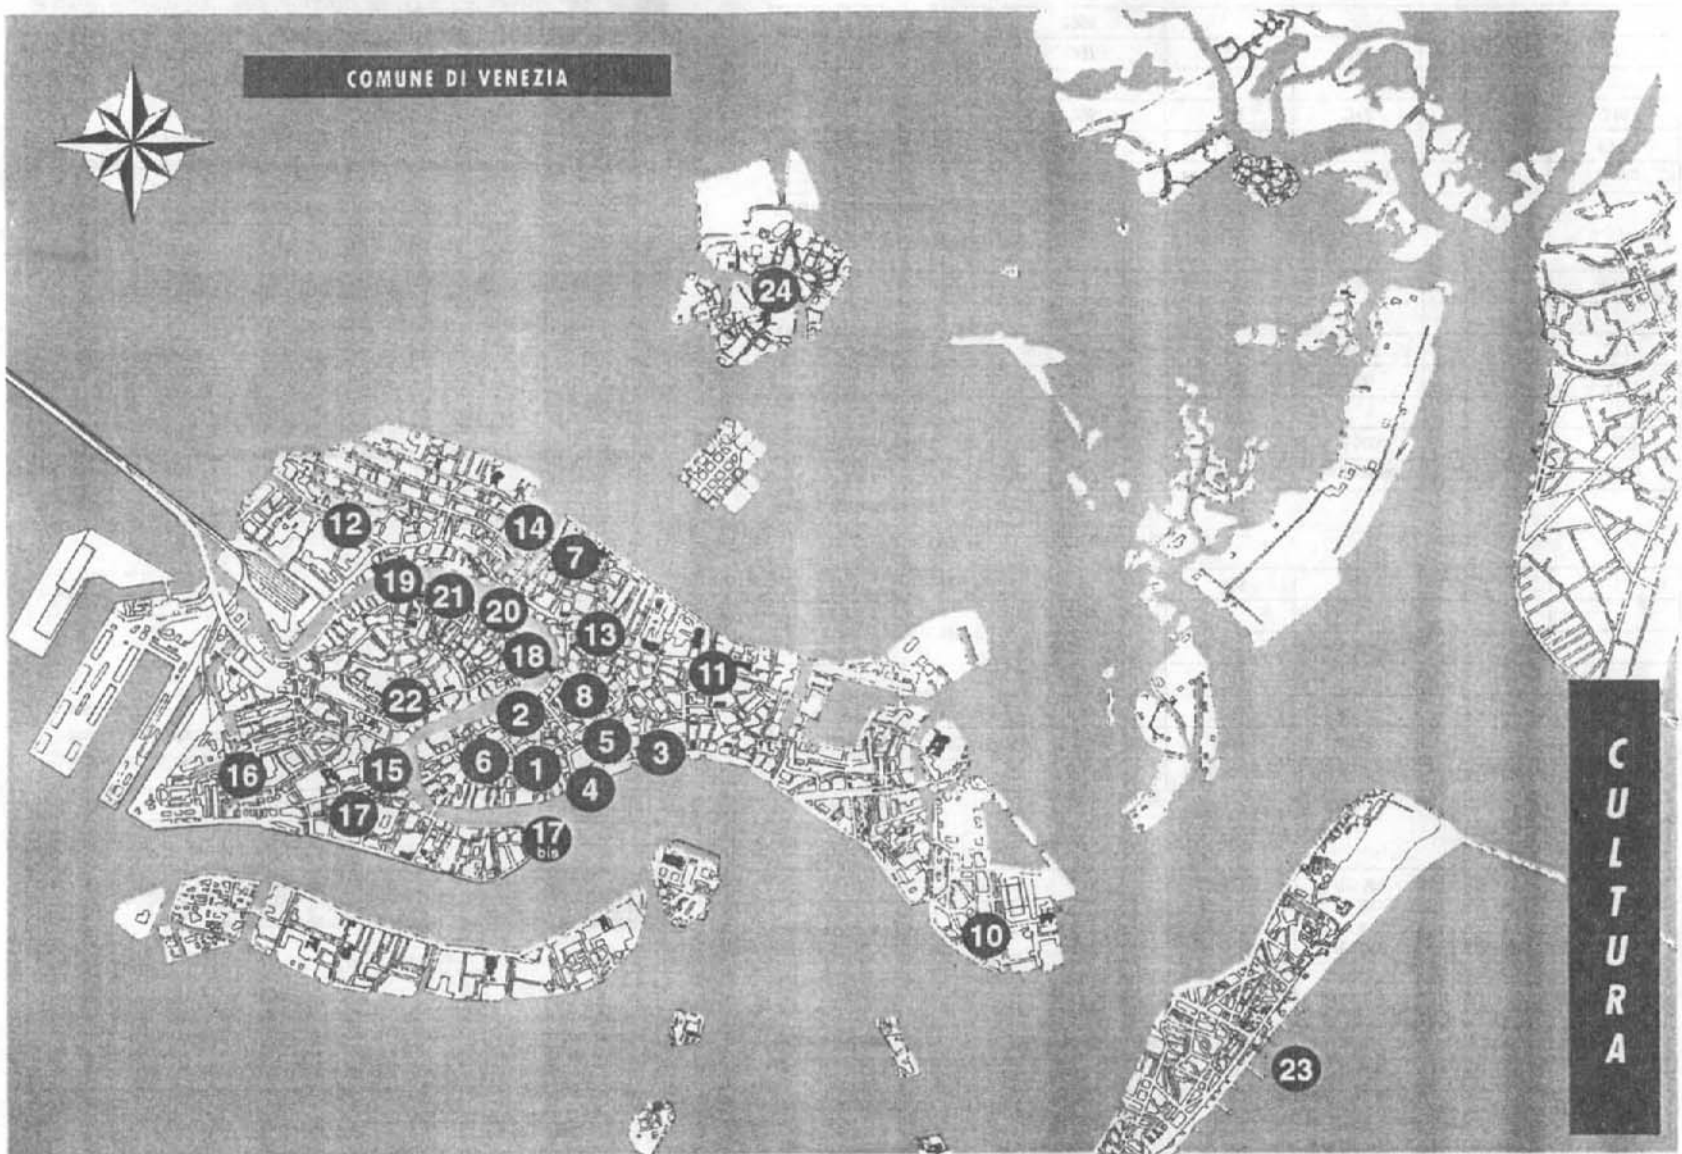

San Marco - San Marco - Teatro La Fenice

La cifra di 3.298 milioni (legge 139/92) si riferisce a lavori eseguiti prima dell'incendio del 29 gennaio 1996. La cifra di 102.300 milioni (legge 515/96) rappresenta l'anticipazione che l'Amministrazione Comunale ha impegnato per consentire in tempi rapidi l'espletamento dell'appalto concorso per la ricostruzione del teatro (il cui costo totale è stimato in lire 152 miliardi). Come da accordi intercorsi con il governo lo Stato ha provveduto al reintegro con un contributo di 9 miliardi di lire di impegno (pari a 90 miliardi) nella Legge 2 ottobre 1997 n. 345.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		102.300	3.298

San Marco - Palazzo Pesaro degli Orfei

Il progetto di restauro del palazzo, di valore storico monumentale, prevede il restauro conservativo e la razionalizzazione dei volumi ad uso museale ed espositivo.



San Marco - Palazzo Ducale e Prigioni

Il Palazzo Ducale simbolo della millenaria storia di Venezia è interessato da lavori di restauro conservativo manufattivo e messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		5.169	4.131

San Marco - Museo Correr e Procuratie

Interventi di restauro conservativo e di messa a norma degli impianti su immobile di valore storico monumentale.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		2.417	2.053

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	3.298	3.298	3.012	1.786
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	102.300	102.300	102.300	
	1998				
TOTALE		105.598	105.598	105.312	1.786

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	486	486		
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		486	486		

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	3.500	3.500	3.500	3.500
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	800	800	800	244
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	5.000	5.000	5.000	387
	1998				
TOTALE		9.300	9.300	9.300	4.131

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.878	1.878	1.878	1.707
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	342	342	342	316
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.250	313	313	30
	1998				
TOTALE		4.470	2.533	2.533	2.053

San Marco Torre dell'Orologio 5

Monumentale edificio costruito sul finire del XV secolo è interessato da lavori di restauro conservativo.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.000

San Marco Chiesa di San Maurizio - Mostra Trentennale 6

Acquisizione del diritto d'uso della Chiesa di S.Maurizio da adibire a sede della Mostra "1966 - 1996 Laboratorio Venezia. La Laguna, i fiumi, la città e il mare".

progettazione
700

San Marco Palazzo "Manin-Pilsen" 7

Edificio localizzato alle spalle della P.zza S.Marco, avente una superficie di circa 7.000 mq (ex albergo ed uffici) che diventerà sede della Biblioteca Storica del Museo Correr.
L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			15.073

San Marco Cinema Olimpia 8

Acquisto immobile dall'ULSS.

progettazione
1.452

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	750	250	250	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	250	250	250	
TOTALE		1.000	500	500	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	700	700		
TOTALE		700	700		

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	15.073	15.073	15.073	
TOTALE		15.073	15.073	15.073	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	51	51		
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	94	93	93	
	1998	1.307	1.307	1.307	
TOTALE		1.452	1.451	1.400	

San Marco Archivio documentazione storica 9

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			570

Castello Padiglione Italia 10

Progetto di restauro conservativo e ristrutturazione per un utilizzo a sede museale permanente.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			3.902

Castello Chiesa San Lorenzo 11

Restauro conservativo per utilizzo pubblico, culturale, espositivo su immobile di valore storico monumentale.

progettazione	istruttoria appalto
	4.060

Cannaregio Teatrino Groggia 12

Restauro di tipo conservativo per utilizzo pubblico della struttura.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.480

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	570	570	570	570
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		570	570	570	570

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	3.902	3.902	3.831	3.479
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		3.902	3.902	3.831	3.479

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.800	1.800	398	13
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.260	2.260		
	1998				
TOTALE		4.060	4.060	398	13

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	994	994	500	311
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	486	486		
TOTALE		1.480	1.480	500	311

Cannaregio Teatro Malibran 13

Intervento di restauro conservativo, manutentivo e di messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		25.748

Cannaregio Scuola Grande Misericordia 14

Interventi di restauro conservativo, manutentivo e di ristrutturazione su edificio di valore storico monumentale. Le cifre si riferiscono ai costi di progettazione.



Dorsoduro Cà Rezzonico 15

Interventi di restauro conservativo e di messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			9.121

Dorsoduro Chiesa delle "Terese" 16

Edificio di valore storico monumentale interessato da lavori di restauro conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.787

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.980	2.980	2.980	827
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	5.978	5.978	5.978	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	16.790	16.790	16.790	2.100
	1998				
TOTALE		25.748	25.748	25.748	2.927

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	317	317	256	155
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	630	630	630	
	1997	101	101	101	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.048	1.048	987	155

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	6.636	6.641	6.153	5.941
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	78	78	66	66
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.407	2.407	1.747	232
	1998				
TOTALE		9.121	9.126	7.966	6.239

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	287	287	287	287
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.500	1.500	1.068	
	1998				
TOTALE		1.787	1.787	1.355	287

Dorsoduro Chiesa Ognissanti 17

Intervento manutentivo e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			350

Dorsoduro Magazzini del Sale 17 bis

progettazione
320

Santa Croce Cà Corner della Regina 18

Intervento conservativo e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale. Le cifre si riferiscono ai costi di progettazione.

progettazione	istruttoria appalto
	10.791

Santa Croce Fontego dei Turchi 19

Intervento manutentivo, conservativo e messa a norma degli impianti, su edificio di valore storico monumentale.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		10.432

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	350	350	341	155
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		350	350	341	155

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	320	320		
TOTALE		320	320		

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	251	251	251	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	30	30	30	
	1997	265	265	265	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.745	2.745		
	1998	7.500	7.500		
TOTALE		10.791	10.791	546	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.932	1.932	1.932	794
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.500	2.500	2.500	78
	1998	6.000	6.000	6.000	
TOTALE		10.432	10.432	10.432	872
