

Cimiteri

Manutenzione straordinaria sui cimiteri delle isole della laguna.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		9.887	7.519

**Manutenzione straordinaria patrimonio storico-monumentale
convenzionato con ULSS**

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			3.300

Manutenzioni straordinarie e diffuse

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		5.283	8.046

Comune di Venezia**Fonti di Finanziamento**

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	11.806	11.806	11.577	7.519
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	815	337		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	4.785			
TOTALE		17.406	12.143	11.577	7.519

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	3.300	3.300	3.300	2.678
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		3.300	3.300	3.300	2.678

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	8.872	7.871	6.951	5.668
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	474	474	339	155
	1997	995	849	718	177
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.447	876	38	33
	1998	2.055	463		
TOTALE		13.843	10.533	8.046	6.033

Comune di Venezia


QUADRO FINANZIARIO - SERVIZI

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	81.132	80.061	98,68	74.662	92,03	37.705	46,47
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996	2.824	1.934	68,48	1.639	58,04	463	16,40
	1997	17.528	16.894	96,38	7.810	44,58	879	5,91
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	40.392	37.096	91,84	26.385	65,32	15.315	37,92
	1998	15.286	7.388	48,33				
TOTALE		157.162	143.373	91,23	110.496	70,31	54.362	34,59

STATO AVANZAMENTO - SERVIZI

Importo totale	Istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
12.621		52.214	52.327
0%		59%	33%

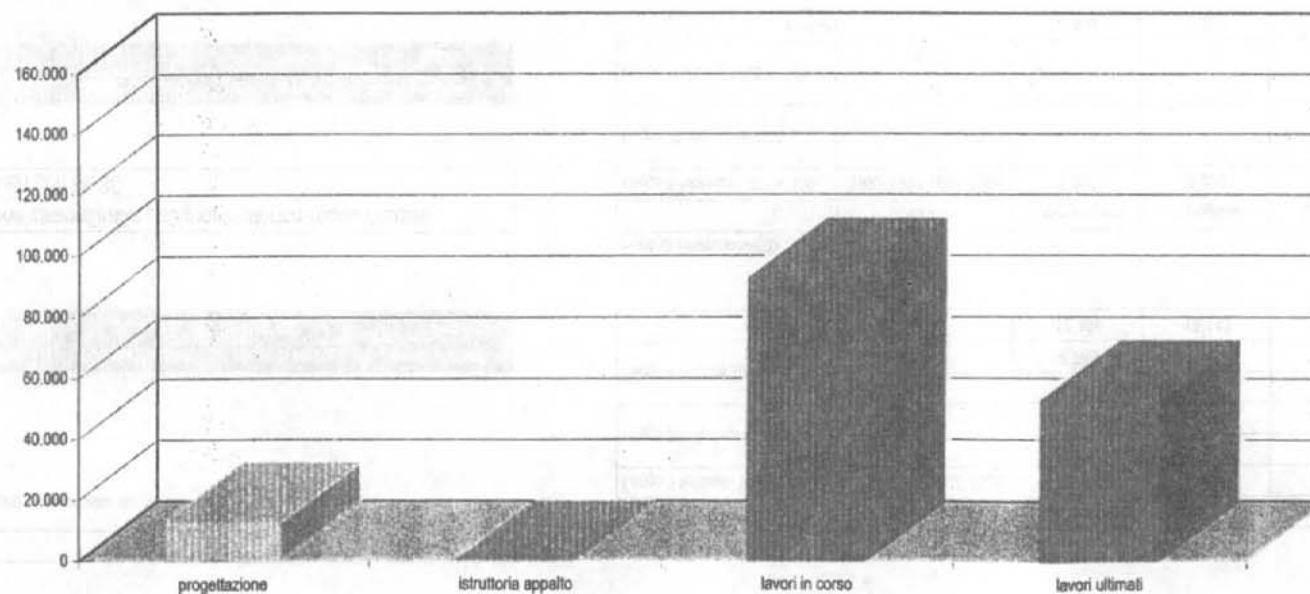

importi in milioni

Comune di Venezia

Interventi vari per adeguamento piani di sicurezza legge 626/94

--

Thetis

Collaborazione dell'Amministrazione Comunale al progetto pilota "Thetis - Polo delle tecnologie del mare" all'Arsenale - cofinanziamento CEE.

	struttura appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			900

Varie lett. a) art. 6 Legge 798/84 (studi e ricerche, imprevisti, ecc...)

	struttura appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		10.064	7.608

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	2.438			
TOTALE		2.438			

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	900	900	900	900
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		900	900	900	900

Fonti di Finanziamento


	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	8.293	7.643	7.215	7.215
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	704	704	563	363
	1997	700	579	405	30
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	5.425	4.548	4.548	
	1998	2.550	497	257	
TOTALE		17.672	13.971	12.988	7.608

QUADRO FINANZIARIO

Totale lettera a) art 6 Legge 798/84
Residenza-Cultura-Scuola-Sport-Verde-Servizi-Varie

STATO AVANZAMENTO - INTERVENTI lett. a)

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
29.135	47.336	450.130	202.743
4%	6%	62%	28%

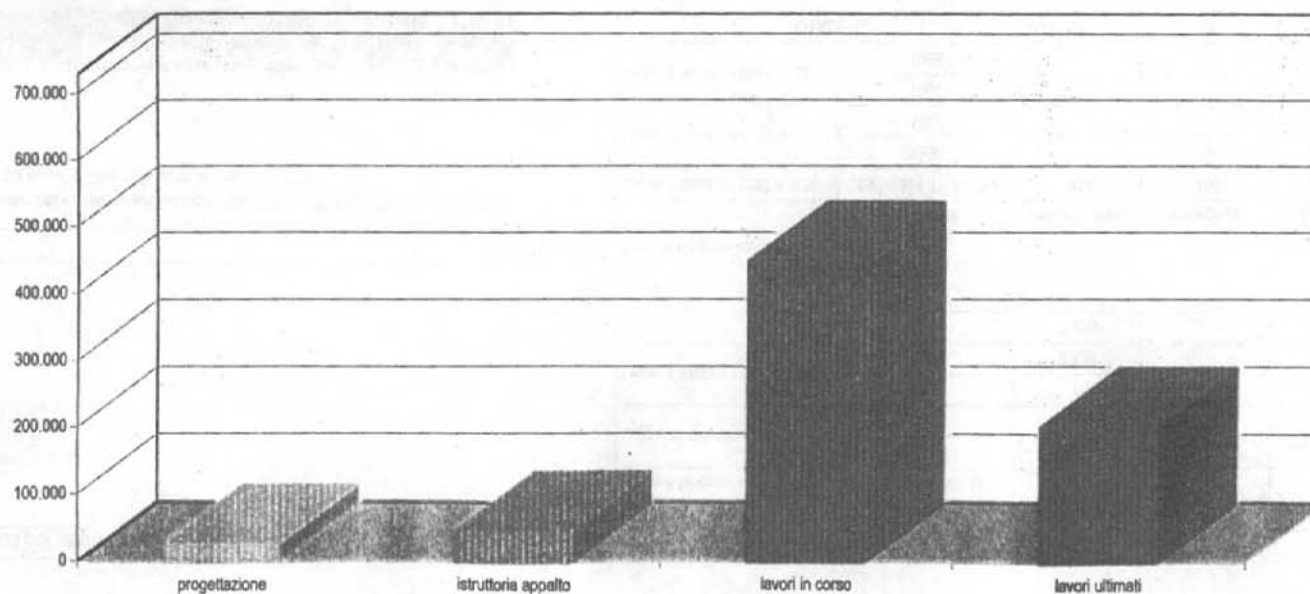

importi in milioni


Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	319.325	315.636	98,84	279.051	87,39	167.325	52,40
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996	34.000	33.027	97,14	28.605	84,13	12.188	35,85
	1997	68.400	66.105	96,64	36.925	53,98	2.337	3,42
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	223.286	216.698	97,05	185.113	82,90	18.269	8,18
	1998	84.393	70.287	83,29	27.338	32,39		
TOTALE		729.404	701.753	96,21	557.032	76,37	200.119	27,44

Interventi finalizzati alle opere di urbanizzazione primaria.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

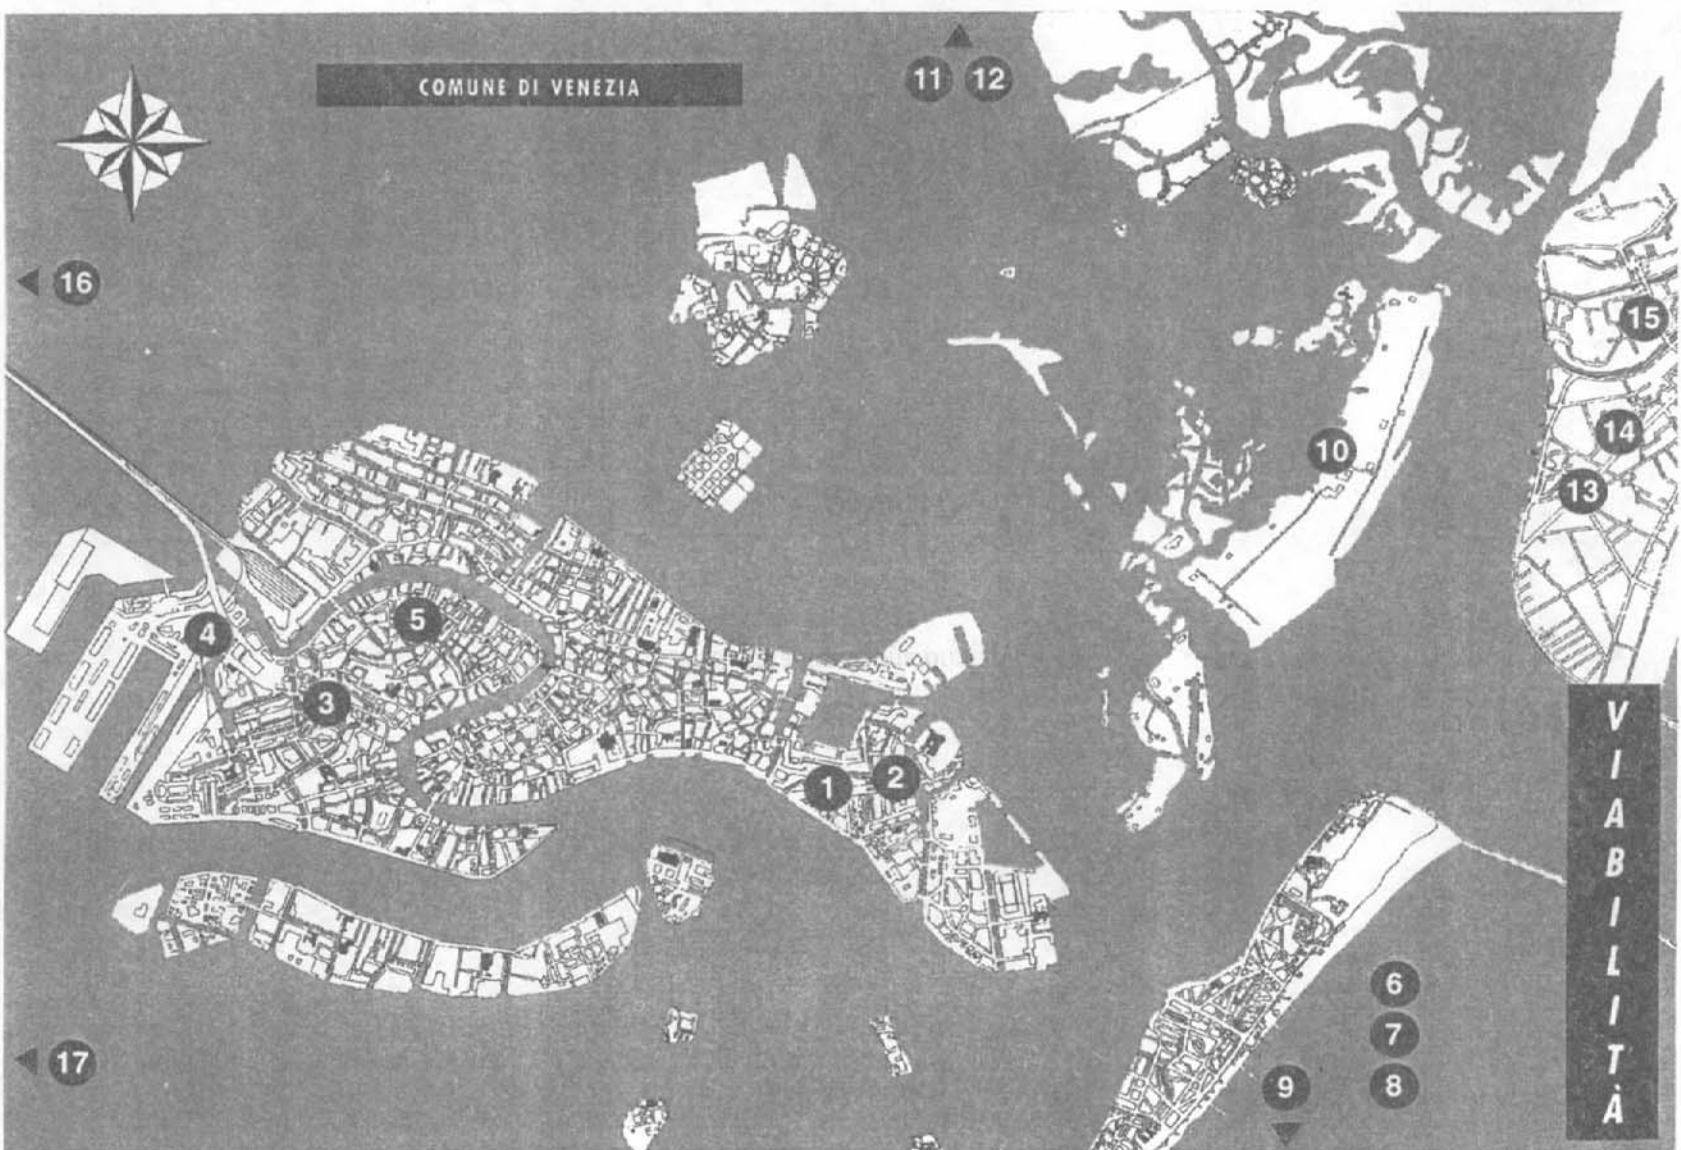

Castello Via Garibaldi 1

Opere di nuova pavimentazione stradale e di sistemazione dell'arredo urbano.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			3.620

Castello Sant'Anna 2

Opere di urbanizzazioni interne all'ex Convento.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso
		1.000

Dorsoduro Campo Santa Margherita 3

Intervento di sistemazione e manutenzione dell'arredo urbano con presenza di essenze arboree ad alto fusto.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso
		1.420

Santa Croce Piazzale Roma - Tronchetto 4

Intervento di nuova viabilità e segnaletica stradale (cordone, marciapiedi, spartitraffico, parcheggi, ecc.).

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	3.527	3.527	3.457	3.457
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	93	93	77	77
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		3.620	3.620	3.534	3.534

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.000	1.000	1.000	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.000	1.000	1.000	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.420	1.341	1.244	63
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.420	1.341	1.244	63

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	865			
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	868			
	1998				
TOTALE		1.733			

Santa Croce Campo San Giacomo da l'Orio 5

Intervento di sistemazione e manutenzione dell'arredo urbano con presenza di essenza arboree ad alto fusto.

struttura appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		1.100

Lido Via Lepanto 6

Intervento di sistemazione e manutenzione dell'arredo urbano con creazione isola pedonale.

struttura appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		2.763

Lido Piazzale Bucintoro 7

Intervento di sistemazione e manutenzione dell'arredo urbano e nuova rotonda sul mare.

struttura appalto	lavori in corso
	7.568

Lido ponti, marciapiedi, piste ciclabili, arredi urbani, marginamenti, ecc... 8

Interventi vari di manutenzione sulla viabilità ed arredo urbano.

struttura appalto	lavori in corso	lavori ultimati
5.000	9.396	2.000

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.100	1.100	880	83
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.100	1.100	880	83

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.763	2.763	2.277	842
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.763	2.763	2.277	842

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	536	536	536	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	2.500	2.500	2.500	234
	1997	1.532	1.532	1.532	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	3.000	3.000	3.000	
	1998				
TOTALE		7.568	7.568	7.568	234

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	700	700		
	1997	4.000	1.553	323	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	11.696	8.249		
	1998	500			
TOTALE		16.896	10.502	323	

Pellestrina	Interventi vari di urbanizzazione (pavimentazione, arredo, ecc...)	9
-------------	---	---

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		1.470	1.179

San'Erasmo	Ramo via delle Motte	10
------------	----------------------	----

Intervento di manutenzione e rifacimento dell'asse viario.



Burano	Piazza imbarcadere	11
--------	--------------------	----

Intervento di manutenzione e sistemazione dell'arredo urbano.



Burano	Mazzorbo - PEEP	12
--------	-----------------	----

Opere di urbanizzazione primaria.



Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.864	1.705	1.540	1.179
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	785	785		
	1998				
TOTALE		2.649	2.490	1.540	1.179

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	250			
	1998				
TOTALE		250			

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.000			
	1998				
TOTALE		1.000			

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	750			
	1998				
TOTALE		750			

Isole Treportine Piazza Treporti 13

Intervento di manutenzione e sistemazione dell'arredo urbano.

struttura appalto
1.604

Isole Treportine Urbanizzazioni varie 14

struttura appalto
2.104

Cavallino Sistemazione strade bianche 15

struttura appalto
2.025

San Giuliano Realizzazione Parco San Giuliano 16

L'area interessata dal progetto è pari a 700 ettari.

L'articolato progetto, in parte finanziato dalla Comunità Europea (URBAN), prevede la creazione di aree verdi, ricreative, associative e infrastrutture.

struttura appalto	lavori in corso
20.544	

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	1.000	1.000	104	
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	604	604		
	1998				
TOTALE		1.604	1.604	104	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.104	2.104		
	1998				
TOTALE		2.104	2.104		

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	82	82		
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	818	818		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.107	1.107	96	
	1998	18	18		
TOTALE		2.025	2.025	96	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	544	544	530	530
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	14.150	14.150		
	1998	5.850	5.850		
TOTALE		20.544	20.544	530	530

Fusina * Terminal sud di accesso alla città antica

Predisposizione del Concorso internazionale per la progettazione del Terminal.
Redazione del Piano Particolareggiato e delle analisi propedeutiche al Piano.

120

Approdi traghetti pubblici gondole in Canal Grande

progettazione	struttura appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.150

Manutenzione straordinaria e diffusa e opere di urbanizzaz. primaria

progettazione	struttura appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		10.893	9.076

Adeguamento e manutenzione impianto pubblica illuminazione

progettazione	struttura appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		6.702	2.711

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	420	420		
	1998	500	500		
TOTALE		920	920		

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.150	1.150	1.055	1.055
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.150	1.150	1.055	1.055

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	14.389	14.319	10.202	9.076
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	1.375	1.326	440	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	3.173	3.093	2.360	
	1998	1.032	1.032	138	
TOTALE		19.969	19.770	13.140	9.076

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	6.174	6.174	5.377	2.711
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	540	540	40	
	1997	595	595	53	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.043	2.043	1.858	
	1998	61	61		
TOTALE		9.413	9.413	7.328	2.711

Comune di Venezia

Realizzazione strutture a traffico acqueo

progettazione	istruttoria appalto
900	200

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	100	100		
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	1.000	100		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.100	200		

Comune di Venezia

Interventi su infrastrutture e opere di urbanizzazione centri urbani insulari

Accordi di programma con Stato e Regione. Quota prevista di competenza Comunale.

- Malamocco Alberoni	5 mil
- Pellestrina San Pietro in Volta	5 mil
- Sant'Erasmo	4 mil
- Burano	8,3 mil

progettazione
20.300

Parametri meteo - marini

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		600

Varie lett. b) art. 6 Legge 798/84 (studi e ricerche, imprevisti, ecc...)

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		2.790	1.876

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	20.300	20.300	20.300	
	1998				
TOTALE		20.300	20.300	20.300	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	600	600	111	111
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		600	600	111	111

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.430	2.369	1.888	1.759
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	260	240	220	117
	1997	187			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.750	1.584	1.500	
	1998	39			
TOTALE		4.666	4.193	3.608	1.876

QUADRO FINANZIARIO

lettera b) - art 6 - Legge 798/84

Viabilità-Accordi di prog. per infrast. e op. di urb.-Parametri meleo/Marini-Vario


Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	38.544	37.310	96,80	30.097	78,08	20.866	54,14
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996	5.000	4.980	99,60	2.864	57,28	351	7,02
	1997	9.600	6.017	62,68	2.425	25,26	77	0,80
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	64.000	57.439	89,75	29.114	45,49		
	1998	8.000	7.461	93,26	138			
TOTALE		125.144	113.207	90,46	64.638	51,65	21.294	17,02

STATO AVANZAMENTO - INTERVENTI lett. b)

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
26.353	10.933	62.383	25.475
21%	9%	50%	20%

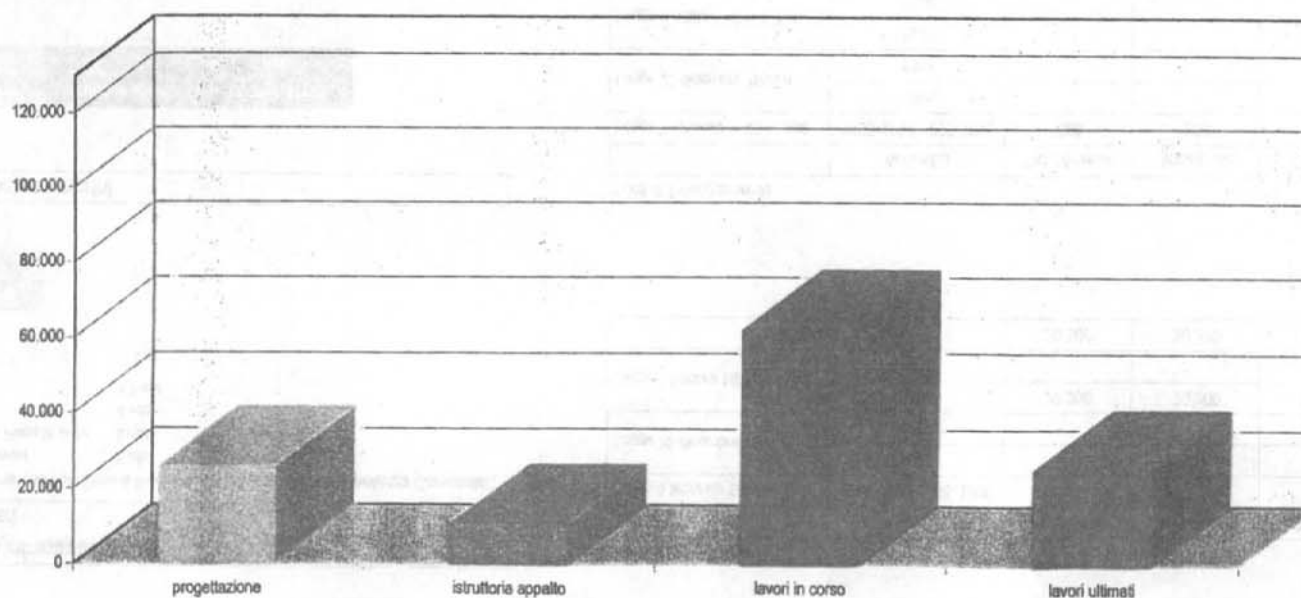

importi in milioni

Contributi per la esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato.

Assegnazione di contributi ai privati:

- | | |
|---|------------------|
| - per il restauro e il risanamento conservativo di immobili da adibire a residenza (una apposita convenzione obbliga i proprietari a risiedere o ad affittare per almeno 15 anni) | 106,830 miliardi |
| - per l'acquisto della prima casa di abitazione (giovani coppie e sfrattati); | 43,030 miliardi |
| - per il restauro e messa a norma degli immobili adibiti ad attività produttive artigianali; | 3,440 miliardi |
| - per il recupero di un'isola abbandonata (iniziativa sperimentale). | 2 miliardi |

Contributi al patrimonio immobiliare privato

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| propaganda : | predisposizione bando |
| istruttoria appalto : | emissione bando |
| lavori in corso : | approvazione graduatoria provvisoria |
| lavori ultimati : | approvazione graduatoria definitiva |

Contributi in conto interessi e in conto capitale per restauro di immobili privati. (6° bando)

Numero unità immobiliari risanate in conto interessi 199
Numero unità edilizie risanate in conto capitale 100

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			24.200

Contributi in conto interessi e in conto capitale per restauro di immobili privati. (7° Bando).

Numero unità immobiliari risanate in conto interessi 81
Numero unità edilizie risanate in conto capitale 231

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			27.800

Contributi al patrimonio immobiliare privato destinato alle attività artigiane produttive.

Numero utenze convenzionate in conto interessi 38
Numero utenze convenzionate in conto capitale 47

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			3.440

Contributi per il recupero del patrimonio immobiliare privato su una isola della laguna centrale.

progettazione	istruttoria appalto
	2.006

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	24.200	24.200	24.200	9.636
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		24.200	24.200	24.200	9.636

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	27.800	27.800	27.800	6.717
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		27.800	27.800	27.800	6.717

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	2.000	2.000	2.000	
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	940	940	940	
	1998	500	500		
TOTALE		3.440	3.440	2.940	

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	2.006	2.006	2.000	
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	6	6		
TOTALE		2.006	2.006	2.000	
