



Immobili di interesse pubblico adibiti ad usi vari



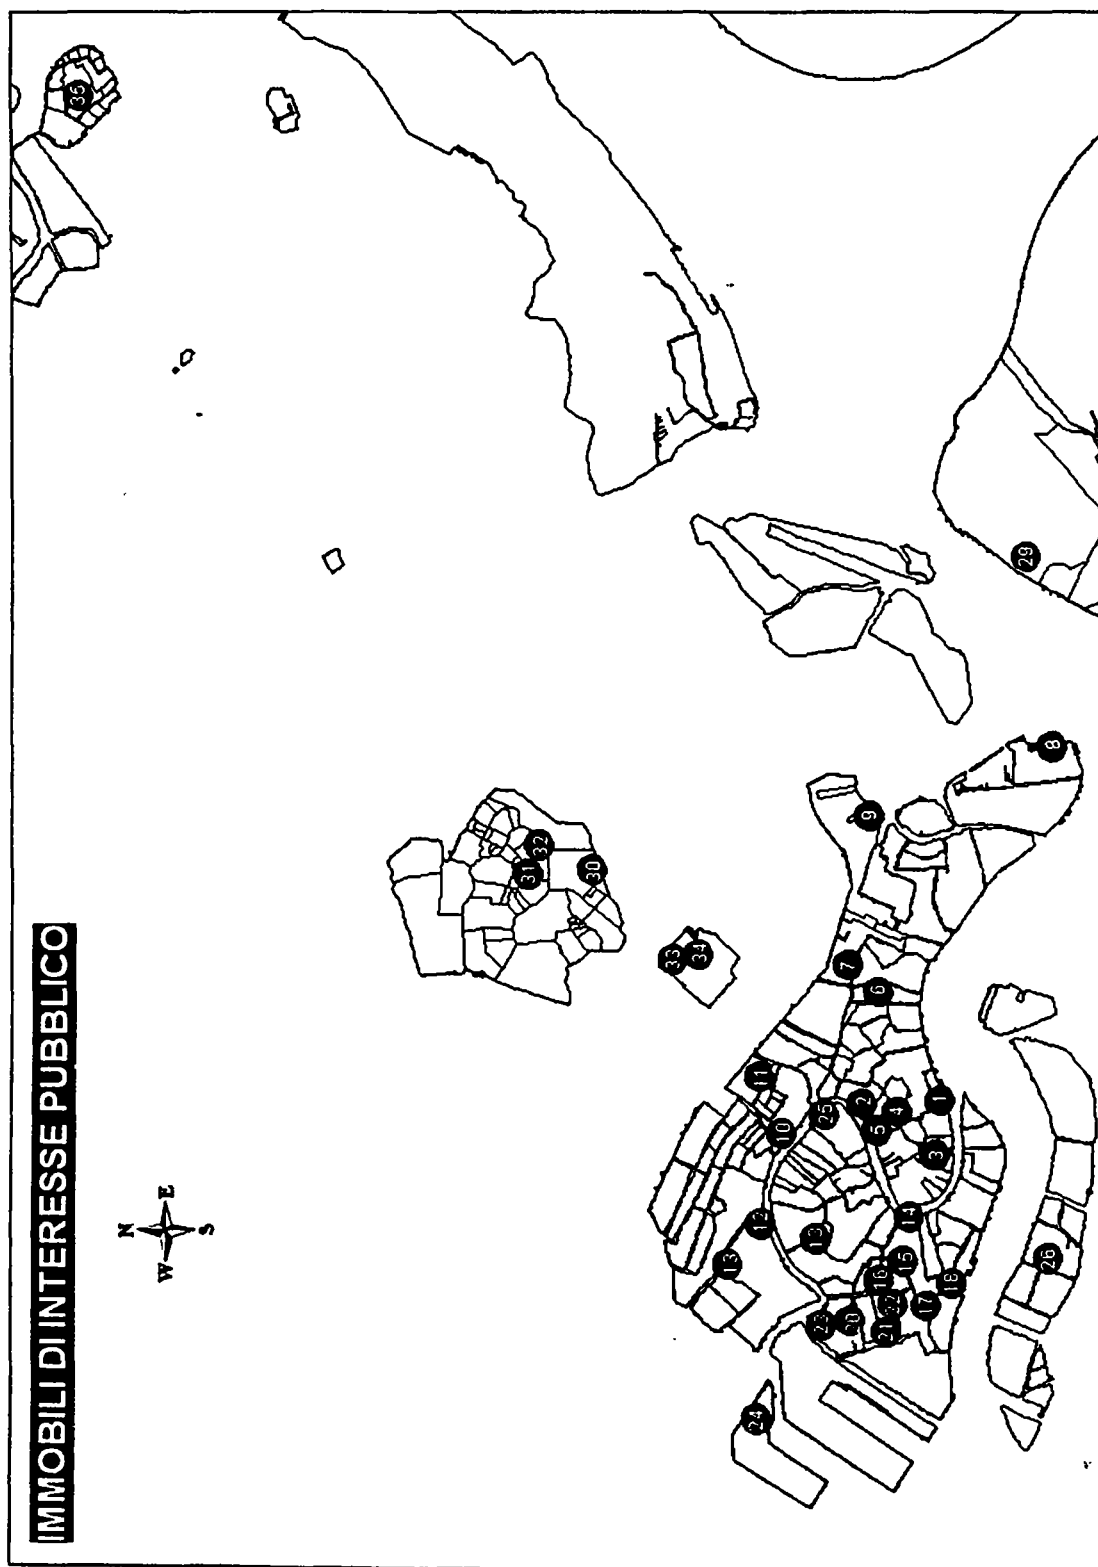

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

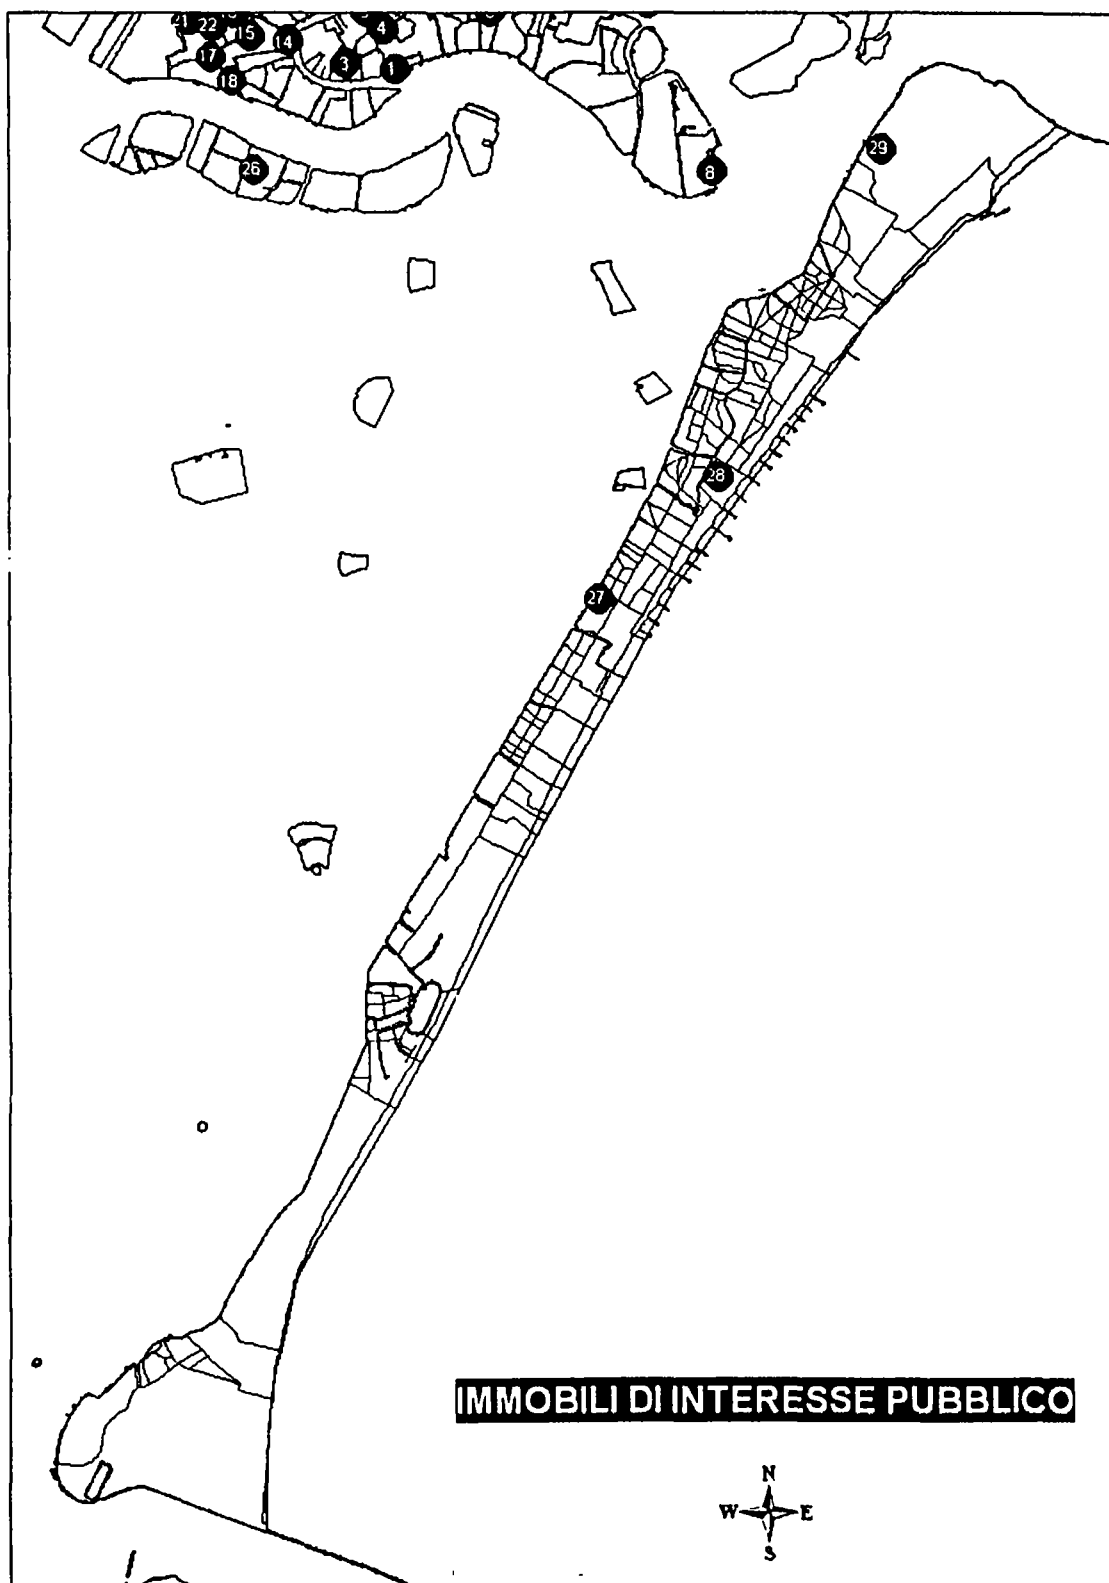

Cà Giustinian - San Marco 1

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
1° semestre 2001

L'edificio è composto da due palazzi distinti, Giustinian e Badoer-Tiepolo. Il primo di origine tardo gotica, con affaccio sul Canal Grande nel 1500 fu annesso al retrostante palazzo come corpo unico grazie all'adeguamento interno delle murature e dei solai. Dopo numerose modifiche (E. Mozzi, 1937) e cambi di destinazione (albergo, Casinò di Venezia), nel secondo dopoguerra l'immobile divenne sede di uffici comunali. Il progetto prevede il restauro edilizio, statico, impiantistico e il ripristino della Sala delle Colonne che potrà acquistare la funzione di spazio per convegni e manifestazioni.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		12.332	5.012	4.498	4.259



Cà Loredan e Cà Farsetti - San Marco 2

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
dicembre 2001

Fondati nel secolo XII, i due palazzi, composti da due corpi ben distinti, si affacciano sul Canal Grande a pochi passi da Rialto. Abitazioni di importanti famiglie prima, adibiti ad albergo poi, nell'Ottocento divennero sede degli uffici del Municipio di Venezia, nel 1867 il primo, nel 1826 il secondo. Oggi i due palazzi, sede centrale degli uffici Comunali, sono interessati da una serie di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e di adeguamento delle norme vigenti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		17.536	17.520	7.792	4.936



Palazzo Zaguri - San Marco 3

Intervento
in progettazionePrevisione fine lavori
dicembre 2000

Costruzione gotica della fine del XIV secolo, rimaneggiata nel '500, con due prospetti a due piani di elegantissime bifore. Attualmente qui vi ha sede il Centro Documentazione della Pubblica Istruzione. Gli interventi previsti, riguardano il restauro conservativo e la messa a norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		121	121	115	47
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	6.500	6.500		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		6.621	6.621	115	47


XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Intervento in progettazione Immobile Campo Marín - San Marco 4

Intervento
in progettazionePrevisione fine lavori
settembre 2001Acquisto e ristrutturazione di un immobile da
destinare ad uso uffici.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		26.860	26.860	26.860	15.220



Intervento concluso Casa Corner - San Marco 5

Intervento
concluso

Acquisto immobili destinati ad uso uffici.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6.034	6.034	6.034	6.034



Intervento in corso Palazzo Zorzi - Castello 6

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
2° semestre 2000

Il palazzo realizzato su preesistenti case agli inizi del 1500 (opera attribuita a M. Condussi) fu uno dei primi ad essere rivestito in pietra d'Istria. Il palazzo in grave stato di degrado verrà restaurato e a seguito di una convenzione tra il Comune e l'UNESCO, verrà destinato a sede degli uffici del ROSTE (Regional Office Science Technology Europe).

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2.600	2.600	2.600	2.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Palazzo Gradenigo - Castello 7

Intervento concluso

Costruito nel secolo XVII, conserva all'interno stucchi e decorazioni sette-ottocentesche. L'intervento mira al recupero integrale di tutti gli elementi di interesse storico e artistico eliminando le intrusioni di epoche più recenti e alla predisposizione del palazzo per la nuova funzione: sede del Centro di calcolo e elaborazione dati e sede della Venus Spa (Venezia Informatica e Sistemi, partner tecnologico del Comune). A tal fine è stato interamente cabiato e dotato di impiantistica altamente sofisticata che ha permesso di preservare la planimetria originale.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5.318	5.318	5.318	4.978



Convento Sant'Elena - Castello 8

Intervento in corso

Previsione fine lavori
dicembre 2001

Fondato nel 1175 il complesso ha da tempo perso l'ambiente originario in cui era inserito. Del convento rimangono due corpi del chiostro (seconda metà del XV secolo) e la vera da pozzo settecentesca. Il recupero mira ad affiancare le funzioni parrocchiali e conventuali con attività a queste compatibili quali la ricerca e lo studio. L'intervento, a carico del comune, riguarda un'ala del chiostro, destinata a sede della Fondazione "Venezia per la ricerca della pace". La ristrutturazione adibirà i nuovi spazi a sale conferenze, a esposizione, a sala riunioni e studio. Disporrà inoltre di tre camere per forestieri.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		12.783	12.783	12.626	3.045
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	581	581		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		13.364	13.364	12.626	3.045



Cantieri ACTV - Castello 9


Intervento in progettazione

Previsione fine lavori
dicembre 2002

Intervento di ristrutturazione di un capannone.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5.400	5.400	5.400	86

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI




Cà Vendramin Calergi - Cannaregio

10

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
1° semestre 2000

Palazzo rinascimentale di M. Colussi con importante facciata sul Canal Grande rivestita di marmo con intarsi policromi. Sul lato si sviluppa il giardino con ala seicentesca. Attualmente è sede invernale del Casinò Municipale. L'intervento prevede la ristrutturazione e la messa a norma degli impianti elettrici e di trattamento dell'aria.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		10.174	9.980	9.047	3.354
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	600	600		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		10.774	10.580	9.047	3.354



Ex Convento dei Crociferi - Cannaregio

11

Intervento
concluso

Il vasto complesso fondato dai Crociferi nel XII secolo e ricostruito nel XVI con l'attigua chiesa, passò ai Gesuiti nel 1657. Con la soppressione dell'ordine il complesso fu adibito ad usi profani (prima scuola e del 1807 caserma). Oggi il convento è di proprietà comunale. Il restauro conservativo, eseguito solo in parte, mira al recupero dei volumi interni che furono alterati dall'uso militare.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6.159	6.159	6.159	5.213



Palazzo Manfrin Venier - Cannaregio

12

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
gennaio 2000

Costruito da A. Tirali nel 1735 si affaccia sul Canale di Cannaregio con un prospetto in pietra bianca privo di sovrastrutture decorative. Posteriormente si sviluppa un ampio giardino un tempo famoso per le essenze e piante rare. È sottoposto a restauro conservativo e messa a norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3.566	3.566	3.566	611

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI




Palazzo Bonfadini - Cannaregio 13

Intervento concluso

Palazzo settecentesco con affaccio sul canale di Cannaregio. Il comune ha acquistato il complesso nel 1993 per destinarlo a sede degli uffici amministrativi dell'Azienda Multiservizi Ambientali Veneziana (AMAV). La cifra è riferita all'acquisto.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2.384	2.384	2.384	2.374



Cà Foscari Sede Università - Dorsoduro 14

Intervento in corso

Previsione fine lavori
dicembre 2000

Imponente edificio realizzato a partire dal 1452 come residenza personale rappresentativa del Doge. La facciata, sul Canal Grande, e la composizione del palazzo è una delle più significative creazioni architettonico-urbanistiche del più maturo gotico veneziano. Oggi il palazzo, sede della Università di Ca' Foscari, viene investito da un complesso restauro conservativo e manutentivo per risolvere i gravi problemi statici delle facciate prospicienti i canali.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5.000	5.000	5.000	1.218
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	4.000	4.000		
	1999				
Legge 3 agosto 1998 n. 295	2000				
Totale		9.000	9.000	5.000	1.218



Immobile Santa Margherita - Dorsoduro 15

Intervento in corso

Previsione fine lavori
1° semestre 2000

Edificio isolato, che si erge al centro del Campo S. Margherita, ex Scuola dei Varolieri (pellicciai) un tempo prospiciente al Rio Ca' Canal interrato nel 1863. Fu edificata nel 1725 riproducendo fedelmente la più antica sede di Cannaregio. L'interno modificato per ospitare un piccolo cinematografo, negli anni Settanta divenne la sede della Democrazia Cristiana. Acquisito dal Comune nel 1997 per adibirlo a uffici. La cifra è riferita all'acquisto.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.744	1.044	1.044	1.044

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spazio polivalente Rio Novo - Dorsoduro **16**Intervento
concluso

Tale complesso edilizio è costituito da corpi di fabbrica che, seppur fatiscenti, sono ancor oggi chiaramente individuabili nella loro consistenza fisico-volumetrica e morfologica. Si tratta di edifici costruiti in periodo novecentesco, in aree precedentemente libere, con funzioni di deposito e lavorazione di materiali edili, dislocati attorno ad un'area verde. Vengono ricavati servizi comunali ad uso quartierale.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1 250	1 250	1 140	1 083

Palazzo Minotto - Dorsoduro **17**Intervento
concluso

Restauro, eseguito solo in parte, di un edificio cinquecentesco in grave stato di degrado.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2 590	2 590	2 590	2 025

Convento delle Terese - Dorsoduro **18**Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
giugno 2000

Il complesso conventuale di S. Teresa della fine del XVII secolo, si sviluppa intorno ad un grande chiostro ad arcate che include la semplice facciata della chiesa. Dopo essere stato adibito ad orfanotrofo, nel 1925 fu in buona parte destinato dal comune a ricovero degli sfrattati e dei senzatetto. Alcuni degli alloggi sono stati liberati solo in anni recentissimi. Oggi il complesso versa in pesanti condizioni di degrado e di dissesto con gravi alterazioni del distributivo a seguito all'incongruo utilizzo. L'intervento prevede il recupero delle strutture originali e il restauro e risanamento conservativo del convento che verrà destinato a sede universitaria (IUAV).

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		23 643	23 643	23 643	10 996

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Palazzo Cappello - S.Croce

19

Intervento
in corso

Previsione fine lavori
dicembre 2001

Costruzione del tardo '500 o dei primi del '600 il cui androne di apre sul vasto giardino. Terminato il restauro conservativo, in vista di un apposito Accordo tra Stato e Comune, verrà destinato a sede degli uffici amministrativi della Direzione della sovrintendenza.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	6.000	6.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale	-	6.000	6.000		



Cittadella della Giustizia - Santa Croce

20

Intervento
in progettazione

Previsione fine lavori
dicembre 2002

Esteso complesso sorto intorno al 1786, su un'area ancora libera, tra i più antichi insediamenti industriali di Venezia, nonostante le modifiche subite, conserva ancora l'essenziale struttura originaria estremamente funzionale sviluppata attorno ad un cortile interno. L'intervento prevede il progetto e l'adattamento della struttura per la sede dei nuovi uffici giudiziari. L'importo si riferisce ai soli costi di progettazione.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3.827	3.827	3.827	25



Sede ASPIV - Santa Croce

21

Intervento
concluso

Costruzione degli anni Trenta inserita nell'area che ospita gli impianti dell'Acquedotto. L'immobile in parte non utilizzato in parte destinato a magazzino, verrà interessato da lavori che modificheranno la struttura distributiva interna, da lavori di restauro della struttura muraria esterna e di rifacimento delle coperture. E' sede degli uffici amministrativi dell'ASPIV.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		4.500	4.000	4.000	4.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Rio Terrà dei Pensieri - Decentramento - Santa Croce **22**

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
dicembre 2000Ristrutturazione di un edificio destinato a
sede del Decentramento dell'Assessorato
Casa del Comune

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.000	1.000		
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.000	2.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		3.000	3.000		



Autorimessa comunale - Santa Croce **23**

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
dicembre 2000Costruzione risalente alla metà degli anni '30,
su progetto dell'ing. Miozzi, ha una capienza
di circa 2.500 posti auto. È sottoposta a
restauro manutentivo e messa a norma degli
impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6.458	6.458	6.458	5.616
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.000	1.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		7.458	7.458	6.458	5.616



Tronchetto - Interscambio - Santa Croce **24**

Intervento
in progettazionePrevisione fine lavori
dicembre 2001Centro interscambio merci gomma/acqua
localizzato sull'isola del Tronchetto, per lo
stoccaggio e la distribuzione di merci di ogni
genere nel centro di Venezia. È previsto un
sistema per non interrompere la catena del
freddo degli alimenti; organizzato con porte
sezionali per lo scarico delle merci direttamente
dagli autotreni, e pontili per il canco nelle
imbarcazioni.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2.500			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Immobile Pescheria - San Polo **25**Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
novembre 1999

Costruzione dei primi del secolo (1907) realizzata in stile neogotico con porticato con grande arcate ogivali e loggiato superiore con affaccio sul Canal Grande. È il centro del mercato del pesce dal 1300. L'intervento, si insensce in quello più complesso che riguarda la più generale sistemazione del mercato e degli uffici giudiziari, riguarda il restauro e la messa a norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.500	1.500	1.500	259

Complesso ex Herion - Giudecca **26**Intervento
concluso

Il complesso è composto da un blocco a schiera (3 alloggi), dalla villa in stile veneziano, con annesso fabbricato di servizio, parco e cavana, da un fabbricato recente adibito a servizi e dalla chiesa (vincolata) di S. Cosmo e Damiano. La chiesa edificata nel XV secolo, soppressa al culto nel 1810, venne completamente trasformata per diventare la sede dell'opificio industriale tessile Herion nel 1886. Nel 1997 il Comune ha acquistato l'intero complesso per destinare l'ex chiesa a struttura ricettiva a carattere alberghiero. L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6.135	6.135	6.102	6.102

Centro Civico - Lido **27**Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
1° semestre 2000

Ristrutturazione del complesso ex tiro a volo da adibire a sede del centro civico.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		4.425	4.425	4.345	1.512

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Casinò - Lido **28**Intervento
concluso

Palazzo costruito su progetto di E. Mozzi negli anni Trenta, con ambiguo linguaggio litorio, per ospitare la sede estiva del Casinò Municipale, funzione che conserva ancora.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		986	986	798	798

Convento San Nicolò - Master - Lido **29**Intervento
in progettazionePrevisione fine lavori
agosto 2000

Fondato dai Benedettini nel 1053 e più volte restaurato nei secoli XIV e XVI. Soppresso nel 1770 e adibito a caserma, solo nel 1926 tornò all'originaria destinazione. Gli interventi di manutenzione straordinaria renderanno il complesso idoneo ad ospitare il "Master Europeo per i diritti umani".

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		755	755	720	720
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	521	521		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		1.276	1.276	720	720

Scuola Vetrai A. Zanetti e stazione sper. Vetro - Murano **30**Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
1° semestre 2000

L'intervento investe uno dei due fabbricati industriali (1930), nell'area ex Montecatini. Nel 1934 il Comune acquista uno dei fabbricati che viene utilizzato prima come capannone e magazzino poi come sede di residenze abusive che si protraggono fino agli anni Settanta. Il progetto di recupero prevede il mantenimento della struttura originale, lunga 107 metri ed in parte sviluppata su due livelli, e l'inserimento all'interno di una nuova struttura adatta ad accogliere le nuove funzioni. Parte dei volumi verranno utilizzati dal Centro di Formazione vetrai, parte dalla Stazione Sperimentale del Vetro.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		7 869	7 869	3 776	3 595

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Palazzo da Mula - Murano **31**Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
dicembre 2000

Edificio Quattrocentesco, con ricca facciata aperta da finestrate gotiche, si apre sul cortile perimetralmente da un portico a bifore. L'intervento è stato rivolto sia alla conservazione degli elementi decorativi sia alla riorganizzazione orientata dalla tipologia del complesso, dalle potenzialità delle sue strutture e dalla necessità di mantenere inalterata l'organizzazione spaziale. Il piano terra, il cortile e il portico hanno suggerito un uso ad uffici e servizi con affluenza di pubblico, ad emeroteca e a spazio per manifestazione all'aperto. Il primo e il secondo piano vengono destinati rispettivamente alle esposizioni e a servizio degli uffici di quartiere. Gli importi si riferiscono alla parte finale del restauro.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1 344	1 344	639	609

Conterie - Murano **32**Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
giugno 2001

Il complesso, degli inizi del Novecento, è nato per la produzione di conterie (perle e perline). L'attività cessa nel 1993 dopo un lento declino avviato negli anni Settanta. L'obiettivo progetto di recupero è l'integrazione nel tessuto urbano della vasta area dismessa. L'intervento prevede il restauro conservativo e la riqualificazione funzionale. Gli spazi recuperati verranno destinati a residenza studentesca (280 posti letto), a Edilizia Sovvenzionata (50 alloggi), ad attività museali e ad attrezzature pubbliche e collettive.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5 451	4 969	4 611	1 111
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1 000	900		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		6 451	5 869	4 611	1 111

Chiesa San Michele **33**Intervento
in progettazionePrevisione fine lavori
dicembre 2002

La chiesa, una delle prime costruzioni religiose a Venezia nello spirito del Rinascimento, fu eretta da M. Colussi alla fine del XV secolo. L'intervento prevede il restauro conservativo.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.000			
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		2 000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Ampliamento Cimitero San Michele **34**
Intervento
in progettazionePrevisione fine lavori
dicembre 2001

La conformazione e destinazione d'uso attuale dell'isola derivano prevalentemente dagli interventi attuati agli inizi del secolo XIX quando venne congiunta all'isola di S. Cristoforo della Pace, già sede del cimitero di Venezia. La nuova estensione risponde alla richiesta di adeguamento alle esigenze cittadine e alla necessità di ricoverare tanghi prelevati dall'escavo dei ri. Nella sacca già marginata (17.640 mq) verranno creati 3.000 posti per le salme e 5.000 tra ossari e cinerari, e realizzate una cappella e forno crematorio. Su una nuova isola artificiale (55.000 mq), unita con due ponti a S. Michele, saranno creati 20.600 posti tra loculi e campi inumatori.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1 008	1 008	1 008	618
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	23 000	23 000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		24 008	24 008	1 008	618


Tempo libero - Burano **35**
Intervento
in progettazionePrevisione fine lavori
dicembre 2000

Intervento di ristrutturazione.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1 259	1 251	1 251	1 251
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1 000			
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		2 259	1 251	1.251	1 251

Cimiteri
Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
giugno 2001

Manutenzione delle strutture cimiteriali del centro storico e delle isole.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		21 070	21 070	19 460	11 002
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	9 000	9 000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		30 070	30 070	19 460	11 002

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Manutenzioni straordinarie e diffuse

Intervento
in corsoPrevisione fine lavori
fine 2000

Le manutenzioni includono l'acquisto ed i restauri dell'ex Opificio Cipriani alla Giudecca da destinare a deposito archivio giudiziario, per un totale di 5.258.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		30.737	30.737	25.172	21.551
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	13.084	13.084		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale	-	43.821	43.821	25.172	21.551

Totale Immobili di interesse pubblico adibiti ad usi vari

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		246.318	234.598	209.483	127.292
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	70.286	67.186		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		316.604	301.784	209.483	127.292
