


XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Varie

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2 005	2 005	2 005	1 450
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	300	300		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		2 305	2 305	2.005	1 450


Totale Insediamenti Produttivi

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		125 150	123 900	103 226	65 785
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	11 047	10 947		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		136 197	134 847	103 226	65.785

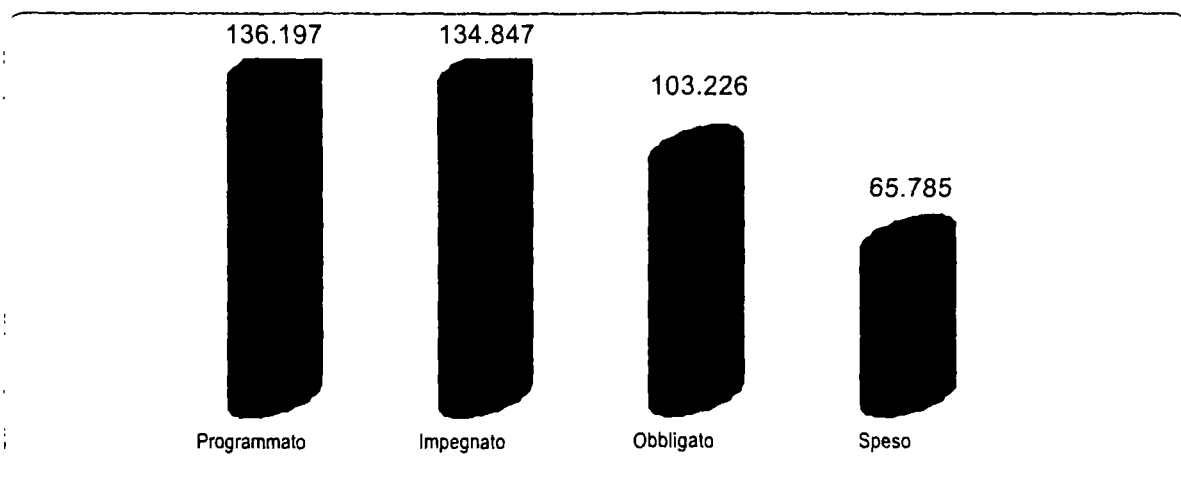

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero interventi in progettazione	Numero interventi in corso	Numero interventi conclusi
2	10	6

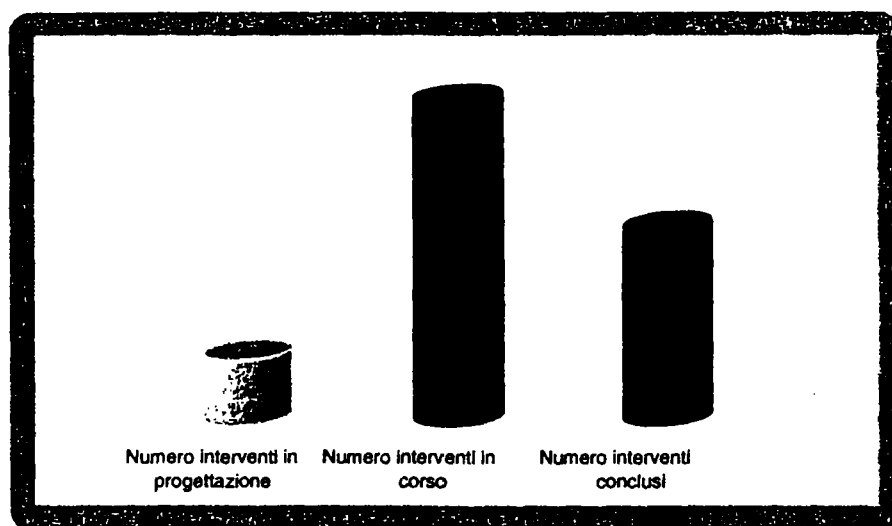

Documento E Comune di Chioggia

Interventi per la salvaguardia di Venezia – Prospetto riepilogativo stanziamenti Legge n. 798/84 e successive - Aggiornamento al 31 dicembre 1999

PAGINA BIANCA

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - PROSPETTO RIEPILOGATIVO STANZIAMENTI LEGGE 798/84 E SUCCESSIVE

LEGGE	RIFERIM.ESERCIZI	STANZIAMENTO	EROGATO	DA EROGARE	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	MANDATI EMESSI
798/84	1984-1985-1986	20.250.000.000	20.250.000.000	0	20.240.530.902	9.469.098	
910/86	1987-1988-1989	25.500.000.000	25.500.000.000	0	25.468.415.483	31.584.517	
67/88	1988-90-91-92-94	11.976.900.000	11.976.900.000	0	11.826.313.318	150.586.682	
TOTALI LEX 798-910-67		57.726.900.000	57.726.900.000	0	57.535.259.703	191.640.297	47.199.934.409
LEX 360/91	1991	4.350.000.000	4.350.000.000	0	4.349.596.092	403.908	3.766.478.486
139/92 - 1^	1992	32.497.892.295	32.497.892.295	0	32.497.892.295	0	25.153.695.636
139/92 - 2^	1993	12.656.329.974	12.656.329.974	0	12.656.329.974	0	11.367.351.930
139/92 - 3^	1995	11.945.619.875	11.945.619.875	0	11.945.619.875	0	5.361.413.880
139/92 - 4^	1996	12.000.000.000	4.487.072.504	7.512.927.496	12.000.000.000	0	3.604.749.098
TOTALI LEX 139/92		69.099.842.144	61.586.914.648	7.512.927.496	69.099.842.144	0	45.487.210.544
539/95 - 1^	1996	10.000.000.000	4.665.000.000	5.335.000.000	10.000.000.000	0	1.488.217.383
539/95 - 2^	1997	18.000.000.000	526.890.483	17.473.109.517	18.000.000.000	0	526.890.483
TOTALI LEX 539/95		28.000.000.000	5.191.890.483	22.808.109.517	28.000.000.000	0	2.015.107.866
515/96 - 1^	1997	58.000.000.000	2.722.111.093	55.277.888.907	58.000.000.000	0	2.722.111.093
515/96 - 2^	1998	32.000.000.000	4.192.247.833	27.807.752.167	32.000.000.000	0	127.150.020
TOTALI LEX 515/96		90.000.000.000	6.914.358.926	83.085.641.074	90.000.000.000	0	2.849.261.113
345/97 - 1^	1998	19.000.000.000	1.100.459.600	17.899.540.400	19.000.000.000	0	1.100.459.600
345/97 - 2^	1999	27.000.000.000	1.169.162.800	25.830.837.200	27.000.000.000	0	1.132.232.000
TOTALI LEX 345/97		46.000.000.000	2.269.622.400	43.730.377.600	46.000.000.000	0	2.232.691.600
295/98 - 1^	1999	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0
TOTALI LEX 295/98		2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0
TOTALE GENERALE		297.670.742.144	238.039.686.452	51.596.370.555.682	297.484.697.939	192.044.205	103.550.684.018

COMUNE DI CHIOGGIA - QUADRO RIPILOGATIVO RISORSE / IMPIEGHI - LEGGE 139/92 E SUCCESSIVE

FINANZIAMENTO	LEGGE	CAPITOLO	PROGRAMMA E CONTRATTI	ISTITUTO MUTUANTE	IMPORTO	EROGAZIONI
1 ^a TRANCHE ES. 1992	139/05-02-92	326850	CC.108/26-07-95 - Rep.1299/23-12-92 NOTAIO CARLO GIUBBINI FERRONI RICOGNIZIONE FINALE CC.191/06-12-95 MODIFICATA CON CC.179-180/19-12-97	SANPAOLO-IMI Spa (ex IMI SpA)	32.497.892.295	32.497.892.295
2 ^a TRANCHE ES. 1993	139/05-02-92 538/93	326850	CC.27/15-03-94 - Rep.3319/26-07-94 NOTAIO CARLO GIUBBINI FERRONI INTEGRATA E MODIF. CC.18/01-02-96 RICOGNIZIONE FINALE CC.179/19-12-97 MODIFICATA CON CC.86/08-07-99	SANPAOLO-IMI Spa (ex IMI SpA)	12.656.329.974	12.656.329.974
3 ^a TRANCHE ES. 1995	139/05-02-92 206/95	326850	CC.166/25-11-94 - Rep.3833/09-08-95 NOTAIO CARLO GIUBBINI FERRONI INTEGRATA E MODIF. CC.19/01-02-96 RICOGNIZIONE FINALE CC.180/19-12-97	SANPAOLO-IMI Spa (ex IMI SpA)	11.945.619.875	11.945.619.875
4 ^a TRANCHE ES. 1996	139/05-02-92 206/95	326850	CC.168/06-11-95 - Rep.4255/22-12-95 NOTAIO CARLO GIUBBINI FERRONI MODIFICATA CON CC.86/08-07-99	SANPAOLO-IMI Spa (ex IMI SpA)	12.000.000.000	4.487.072.504
5 ^a TRANCHE ES. 1996	539/20-12-95 1 ^a quota	326860	CC.192/06-12-95 - Rep.33600/28-12-95 NOTAIO MARIO LUPI MODIFICATA CON CC.86/08-07-99	CREDIOP Spa	10.000.000.000	4.665.000.000
6 ^a TRANCHE ES. 1997	539/20-12-95 2 ^a quota	da 400000 a 450000	CC.187/20-11-96 - Rep.4874/29-11-96 NOTAIO CARLO GIUBBINI FERRONI MODIFICATA CON CC.86/08-07-99	SANPAOLO-IMI Spa (Capogruppo) (ex IMI SpA)	18.000.000.000	526.890.483
7 ^a TRANCHE ES. 1997	515/04-10-96 1 ^a quota	da 460000 a 499000	CC.188/20-11-96 - Rep.4873/29-11-96 NOTAIO CARLO GIUBBINI FERRONI MODIFICATA CON CC.86/08-07-99	SANPAOLO-IMI Spa (Capogruppo) (ex IMI SpA)	58.000.000.000	2.722.111.093
8 ^a TRANCHE ES. 1998	515/04-10-96 2 ^a quota	da 400030 a 400140	CC.162/15-10-97 - Rep.78561/26-11-97 NOTAIO ALESSANDRO CAPUTO MODIFICATA CON CC.86/08-07-99	CA.RI.VE. SpA	32.000.000.000	4.192.247.833
9 ^a TRANCHE ES. 1998	345/02-10-97 1 ^a quota	da 400020 a 400250	CC.181/19-12-97 - Rep.35547/29-12-97 NOTAIO MARIO LUPI	CREDIOP Spa	19.000.000.000	1.100.459.600
10 ^a TRANCHE ES. 1999	345/02-10-97 2 ^a quota	da 500001 a 500010	CC.165/10-12-98 - Rep.493911/29-12-98 NOTAIO TESEO SIROLI MENDARO	CREDIOP Spa	27.000.000.000	1.169.162.800
11 ^a TRANCHE ES. 1999	295/03-08-98 1 ^a quota	500011	CC.172/21-12-98 - Rep.493910/29-12-98 NOTAIO TESEO SIROLI MENDARO	CREDIOP Spa	2.500.000.000	
RIPARTIZIONE FINANZE E CONTABILITA' - Un. Ragioneria - Spese				IN TOTALE	235.599.842.144	75.962.786.457

Documento F Università Ca' Foscari di Venezia

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la
salvaguardia di Venezia - Aggiornamento al 30 ottobre 1999

PAGINA BIANCA



UNIVERSITÀ
CA' FOSCARI
DI VENEZIA

DIVISIONE SERVIZI TECNICI

Il Direttore

Ca' Foscari, 23 dicembre 1999

Prot. n. 585

Al Ministero dei Lavori Pubblici
Magistrato alle Acque di Venezia
Comitato di Indirizzo
Coordinamento e Controllo

VENEZIA

Oggetto: Legislazione speciale per Venezia – Richiesta dati

Si risponde alla lettera del 22 dicembre 1999 prot.n. 291/GAB per inviare copia del quadro sullo stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale aggiornato al mese di Ottobre 1999.

Cordiali saluti.



Il Direttore della Divisione Servizi Tecnici
Dott. Ing. Antonino Lo Cascio
Coordinatore Generale

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999

LEGGE 331/85 - Fondi Ministeriali

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) LAVORI NOPPI/C.P.I. (e revisione prezzi)

Edilizia Sportiva

- 1) CALLE DEI GUARDIANI - Il finanziamento è destinato alla realizzazione parziale ed al risanamento di alcuni capannoni da adibire a palestra polivalente. E' in corso il montaggio della copertura.
I lavori stanno ultimando.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999LEGGE 67/88 - Fondi Ministeriali

1) SAN SEBASTIANO - Fino ad ora sono stati realizzati vari interventi suddivisi in più stralci per il restauro della sede Universitaria, l'adeguamento del muro di confine, porzioni del I°, II°, III° e V° stralcio, acquisto di ascensori, sistemazione degli spazi esterni e della cabina Enel. I lavori sono stati tutti eseguiti.

2) S. MARGHERITA - Fino ad ora con questi fondi sono stati in parte eseguiti i lavori di adeguamento funzionale della sede Universitaria. I predetti lavori sono stati completati.

3) CA' GARZONI E MORO - Gli interventi edilizi finanziati in parte con questa legge sono stati ultimati. Si sta predisponendo l'appalto per i lavori strutturali di Ca' Moro.

4) CA' FOSCARI - L'importo è servito per finanziare la progettazione (circa 200.000.000.) e con i rimanenti sono state effettuate le indagini geognostiche e conoscitive del palazzo.

5) S. MARTA - Fino ad ora sono stati eseguiti alcuni interventi di cui il principale è l'adeguamento funzionale del fabbricato "C" per il quale è stata impegnata la somma di Lire 5.020.000.000. (finanziamento parziale) il cui intervento è stato eseguito. Si è chiusa la contabilità dei lavori.

6) CALLE DEI GUARDIANI - Fino ad ora sono stati eseguiti vari interventi tra i quali parte della sistemazione della sede del custode per L. 57.000.000 circa e la sistemazione degli scoperti per un importo di L. 65.000.000 circa.

Il resto della somma è stato impegnato per realizzare i lavori già descritti alla legge 331/85.

7) PALAZZO NANI MOCENIGO - Ad eccezione alcuni interventi condominiali e di riparazione del tetto per L. 144.000.000., il rimanente è stato impegnato per il restauro architettonico e funzionale del palazzo che recentemente ha avuto il benestare della Salvaguardia, ed attualmente è in corso la predisposizione dei progetti esecutivi per provvedere alle operazioni di appalto.

8) CA' CAPPELLO - Sono stati eseguiti due stralci esecutivi di intervento

9) WOLF FERRARI - L'intervento è stato completato nel 1991.

10) CELESTIA - L'intervento è stato completato nel 1993.

11) S. GIOBBE ED ALTRI EDIFICI - Il finanziamento fa parte del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla fase "A", I° stralcio del complesso universitario. Le opere che competono sono state eseguite completamente.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999LEGGE 407/89 - Fondi Ministeriali

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) VIA TORINO Capannoni - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. E' stata effettuata la gara d'appalto vinta dall'Impresa Edile Costruzioni Srl. I lavori stanno ultimando.

2) S. GIOBBE fase "A" - Il finanziamento fa parte del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla fase "A", I° stralcio del complesso universitario. Le opere che competono sono state eseguite completamente.

Edilizia Sportiva

1) CALLE DEI GUARDIANI - Il finanziamento è destinato alla realizzazione ed al risanamento di alcuni capannoni da adibire a palestra polivalente. I lavori sono stati già descritti alla legge 331/85 e alla legge 67/88.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1997

LEGGE 725/94 - Fondi Ministeriali

Edilizia Generale e Dipartimentale

- 1) S. GIOBBE fase "A" - Le opere sono descritte alla legge 407/89.
- 2) S. SEBASTIANO - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Edilizia Sportiva

- 1) CALLE DEI GUARDIANI - Il finanziamento è destinato alla realizzazione ed al risanamento di alcuni capannoni da adibire a palestra polivalente. I lavori sono stati già descritti alla legge 331/85, alla legge 67/88 e 407/89.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999LEGGE 550/95 - Fondi Ministeriali

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) S. MARTA Teatro G. Poli - Restauro e adeguamento funzionale. La gara d'appalto è stata aggiudicata all'impresa Garbuio Oscar &C. Snc. Sono in corso le opere di fondazione. Durante dette opere si sono presentate alcune difformità nelle fondazioni preesistenti le quali hanno avuto bisogno di modifiche progettuali. Tali modifiche consistono in opere di rinforzo soprattutto a sostegno dei muri perimetrali.

2) VIA TORINO Capannoni - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. La descrizione dei lavori è già stata fatta alla legge 407/89.

3) S. GIOBBE fase "A" - Le opere sono descritte alla legge 407/89 e alla legge 725/94.

Edilizia Sportiva

1) CALLE DEI GUARDIANI - Il finanziamento è destinato alla realizzazione ed al risanamento di alcuni capannoni da adibire a palestra polivalente. I lavori sono stati già descritti alle leggi nn. 331/85, 67/88, 407/89 e 725/94.

LEGGE 663/96

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) ATTUAZIONE D.Lgs. 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.

2) San Giobbe Fase "A" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

3) VIA TORINO Capannone - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Edilizia Sportiva

1) CALLE DEI GUARDIANI - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999

LEGGE 450/97

Edilizia Generale e Dipartimentale

- 1) **ATTUAZIONE D.Lgs. 626/94** - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.
- 2) **SAN BASILIO** - E' stato affidato l'incarico di progettazione preliminare e definitiva.
- 3) **San Giobbe Fase "A"** - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 4) **VIA TORINO Capannone** - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Edilizia Sportiva

- 1) **CALLE DEI GUARDIANI** - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999LEGGE 139/92Mutuo IMI

1) INFORMATIZZAZIONE ATENEO E BIBLIOTECHE - Fino ad ora sono stati eseguiti due grossi interventi che riguardano: il primo la conversione su nastro magnetico dei cataloghi delle biblioteche per un importo di L. 2.200.000.000. ed il secondo la realizzazione della rete informatica di Ateneo e l'acquisto delle relative apparecchiature per l'importo di L. 3.000.000.000. Si prevede di destinare la somma rimanente al finanziamento delle opere di restauro e adeguamento funzionale della fase "A" di S. Giobbe.

2) S. GIOBBE fase "A" - Quota parte del finanziamento relativo del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla fase "A" I° stralcio. Lavori completamente eseguiti.

3) ZATTERE Acquisto Sci - E' stato effettuato un acquisto "chiavi in mano" di un edificio sito alle Zattere dove è stato insediato il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Europei e Postcoloniali. I lavori sono stati eseguiti ed ultimati nel novembre '95. (Superficie mq 1436)

4) OPERE VARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Sono stati eseguiti vari interventi di natura manutentoria e di completamento di alcune opere di restauro e ristrutturazione già avviati e finanziati con altre leggi, con particolare riferimento ai seguenti interventi:

- parte dell'imbrigliamento della sede centrale di Ca' Foscari
- realizzazione di alcuni serramenti nella sede di S. Marta
- porzione del restauro ed adeguamento funzionale della sede di Ca' Cappello
- porzione del restauro e adeguamento funzionale del Fabbricato "C" di S. Marta.

5) CA' DALLA ZORZA Acquisto 3° piano - Acquisto di alcuni locali posizionati al terzo piano da destinare all'uso istituzionale dell'Università.

Mutuo BNL

1) S. GIOBBE fase "A" - Quota parte del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla Fase "A" I° stralcio di S. Giobbe.. Importo completamente utilizzato.

2) CA' BEMBO acquisto - E' stato acquistato un immobile che era concesso in Comodato dalla Cassa di Risparmio di Venezia. L'operazione è stata conclusa nel 1996. (Superficie mq 2107)

3) ZATTERE Acquisto Star Gas 1 - Sono stati acquistati i locali. (Superficie mq 404)

4) ZATTERE Acquisto Star Gas 2 - Sono stati acquistati i locali (Superficie mq 386)
