ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CIX-*bis*
n. 5

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GIUBILEO DELL'ANNO 2000

(Anno 1998 e Primo trimestre 1999)

(Articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 651)

Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000

(MICHELI)

Trasmessa alla Presidenza il 30 aprile 1999

TIPOGRAFIA DEL SENATO

PAGINA BIANCA

ANNO 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

ANNO 1998

1. *Premessa* . . . . . *Pag.* 4

2. *La gestione amministrativa* . . . . . » 8

2.1 Sintesi delle relazioni precedenti . . . . . » 8

2.1.1 La prima relazione trimestrale (18 settembre 1996-31 marzo 1997) . . . . . » 8

2.1.2 La seconda relazione trimestrale (1° aprile-30 giugno 1997) . . . . . » 10

2.1.3 La terza relazione trimestrale (1° luglio-30 settembre 1997) . . . . . » 11

2.1.4 La quarta relazione trimestrale (1° ottobre-31 dicembre 1997) . . . . . » 12

2.2 La riprogrammazione del piano nei quattro trimestri del 1998 . . . . . » 15

2.3 Gli interventi definanziati . . . . . » 19

2.4 Gli accordi di programma e le conferenze di servizi . . » 31

2.5 I rapporti tra la Santa Sede e lo Stato italiano . . . . . » 38

3. *Il piano a fine 1998* . . . . . » 40

3.1 Sintesi del piano e sue variazioni . . . . . » 40

3.2 Una lettura del piano per settori . . . . . » 52

3.3 Lo stato di attuazione . . . . . » 55

3.4 Schede di approfondimento . . . . . » 57

3.4.1 Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extralberghiere . . . . . » 57

3.4.2 Interventi inerenti i principali complessi museali. » 58

3.4.3 Interventi per la viabilità nell'area di San Pietro. » 63

3.4.4 Interventi inerenti la mobilità a Roma e nell'area romana . . . . . » 65

3.4.5 Interventi inerenti le «Aree basilicali» . . . . . » 69

3.4.6 Principali interventi per la sanità . . . . . » 72

3.4.7 Principali interventi concernenti la «sicurezza» . . » 73

3.4.7 Area per grandi eventi presso Tor Vergata . . . . » 74

4. *Gestione finanziaria* . . . . . *Pag.* 79

4.1 Situazione al 31 dicembre 1998 . . . . . » 79
4.2 Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie . » 80

5. *La vigilanza* . . . . . » 82

5.1 Il monitoraggio . . . . . » 82
5.1.1 Il quadro normativo . . . . . » 82
5.1.2 La metodologia e le procedure per l'affidamento » 82
5.1.3 Relazioni trimestrali del soggetto monitore - Sintesi . . . . . » 87
5.1.4 Gli interventi ad «alto rischio» . . . . . » 92

5.2 La vigilanza del Ministro dei lavori pubblici . . . . . » 96
5.3 La vigilanza della BEI . . . . . » 96

APPENDICE . . . . . » 101

Decreto ministeriale dell'8 maggio 1998. . . . . » 105
Decreto ministeriale del 15 maggio 1998 . . . . . » 112
Decreto ministeriale del 16 luglio 1998 . . . . . » 115
Decreto ministeriale del 7 gennaio 1999. . . . . » 118

ALLEGATI . . . . . » 123

1. Le modifiche al piano degli interventi secondo i vari decreti. . . . . » 125
2. Situazione finanziaria in relazione al singolo intervento » 257
3. Lo stato di attuazione per singolo intervento (istogrammi) . . . . . » 323

PRIMO SEMESTRE 1999

1. Sintesi del quinto rapporto trimetrale . . . . . » 377
2.8 Struttura attuale del piano . . . . . » 377
2.9 Lo stato di attuazione. . . . . » 378
2.10 Valutazione del rischio di ritardo finale. . . . . » 379
2.11 Considerazioni complessive . . . . . » 379
2.12 Situazione finanziaria . . . . . » 381
2.12.1 Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie » 381

ALLEGATI . . . . . » 383

2.1 Graficizzazione dello stato di attuazione . . . . . » 383
2.2 Tabulato dell'attuazione finanziaria . . . . . » 383

1 Premessa

Alla data di presentazione della presente Relazione, sono ormai trascorsi più di due anni dalla adozione del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000, avvenuta con DPCM in data 18 settembre 1996.

Tale lasso di tempo e segnatamente quello relativo all'anno appena trascorso, ha consentito alla Commissione di modificare ed integrare il Piano stesso al fine di renderlo sempre più congruente con le finalità con le esigenze emergenti in relazione alla celebrazione del Giubileo del 2000. A differenza, pertanto, dalle precedenti Relazioni, la presente intende tracciare un primo, ancorché necessariamente sommario, bilancio delle attività fin qui svolte dalla Commissione stessa e da tutti gli altri soggetti a diverso titolo impegnati nella attuazione del Piano.

Per rendere comunque conto dell'attività pregressa è stata predisposta una breve sintesi delle Relazioni precedenti, mentre più ampio spazio è stato dedicato all'operato della Commissione durante il 1998 ed agli avvenimenti, rilevanti ai fini dell'attuazione del Piano, intervenuti durante il periodo anzidetto.

Una sezione a parte è stata dedicata : all'utilizzo degli strumenti di snellimento procedurale ai fini dell'attuazione del Piano; agli interventi "definanziati", per spiegare le motivazioni che hanno portato la Commissione ad assumere determinazioni in tal senso e le conseguenze programmatiche e finanziarie di tali deliberazioni sul Piano; ai rapporti che, per la realizzazione di taluni interventi, è stato necessario porre in essere fra la Santa Sede e lo Stato Italiano.

Il Piano, nella configurazione al 31 dicembre 1998, viene quindi analizzato, sia nel suo complesso che attraverso una lettura per settori, in modo da renderne comprensibile l'evoluzione e lo stato di attuazione. Di alcuni interventi o gruppi di interventi sono stati poi esaminati in modo più approfondito.

Un capitolo a sé stante è stato dedicato alla gestione finanziaria del Piano ed agli strumenti di controllo dello stesso ed ai soggetti ad esso deputati.

Completano il testo tre Allegati che consentono di leggere l'evoluzione del Piano, sia programmatica, che finanziaria, nonché lo stato di attuazione, in relazione ad ogni singolo intervento.

Si riportano di seguito alcune abbreviazioni utilizzate nel testo :

- *Commissione – Commissione per Roma Capitale di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 396/90, integrata – ai sensi del comma 2.bis, art. 1 della legge n. 651/96 - per le questioni di specifico interesse delle rispettive provincie, dai presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;*
- *Piano – Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo;*
- *U.R.C.G.E. – Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi.*

2 La gestione amministrativa

2.1 Sintesi delle relazioni precedenti

2.1.1 La prima relazione trimestrale (18 settembre 1996 – 31 marzo 1997)

Con la prima relazione trimestrale, la Commissione per Roma Capitale, ai sensi del comma 10, art.1, della legge 23 dicembre 1996 n. 651, ha dato conto delle decisioni e degli atti programmatori assunti in merito alla definizione del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le determinazioni e gli indirizzi comunque inerenti la gestione del Piano stesso, così come recepiti nei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

Con DPCM in data 18 settembre 1996, è stato adottato il Piano degli interventi, definito dalla Commissione con delibera n. 2 dell'8 luglio 1996, Piano che, come diffusamente esplicitato nella Relazione di accompagnamento, è stato articolato nei settori di seguito elencati, suddivisi, a loro volta, in sotto-settori riferiti a singoli interventi, ovvero a gruppi d'interventi fra loro tipologicamente omogenei.

- ***A. Sociale ed accoglienza***

  Centri di accoglienza, residenze protette, case famiglia, servizi di assistenza sociale, servizi di ristorazione, ecc.; nonché gli interventi attinenti la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture ricettive (centri di accoglienza, ostelli, campeggi, alberghi e "case per ferie"); n. 74 interventi per un finanziamento complessivo di Lit. 330, 8 miliardi.

- ***B. Beni culturali***

  Tutela, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e architettonico; realizzazione di nuove strutture per ospitare manifestazioni ed eventi; programmi di produzione di eventi culturali; n. 256 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.560,2 miliardi.

- ***C. Manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale***

  Riorganizzazione urbana, risistemazione degli spazi pubblici (percorsi pedonali, restauro facciate, ecc.) arredo urbano (segnaletica, illuminazione pubblica, luoghi di attesa per mezzi pubblici, ecc.), salvaguardia e riqualificazione ambientale, tutela della salute, ottimizzazione dell'uso delle risorse (parchi, aree verdi, verde attrezzato, aree protette, energia, acqua, ecc.); programmi di informazione e educazione; n. 65 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.590,55 miliardi.

- ***D. Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana***
  Accessibilità e mobilità pedonale e veicolare; trasporti pubblici e privati; su ferro, su gomma, fluviale, aerea; urbana, extraurbana; abbattimento barriere architettoniche); n. 37 per un finanziamento complessivo di Lit. 1.588,05 miliardi.
- ***E. Servizi speciali e formazione***
  Piani straordinari di prevenzione e di interventi in casi di emergenza per l'Anno Santo del 2000 (sicurezza, protezione civile, sanità, smaltimento rifiuti, ecc.) valorizzazione e promozione delle risorse umane coinvolte nelle attività di preparazione all'evento giubilare; n. 58 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.330 miliardi.
- ***F. Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'Evento***
  Programmi di gestione e di controllo dello svolgimento delle attività connesse alle manifestazioni dell'Anno Santo del 2000; programmi di informazione dei cittadini e dei visitatori (turismo, traffico, cultura, servizi pubblici e privati, servizi speciali, ecc.); n., 10 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.90,4 miliardi.

Il numero complessivo degli interventi ricompresi nel Piano era pari a 500 a fronte di una assegnazione finanziaria, ai sensi dell'art.2, comma 1 del DL n. 455 /96, pari a 3.500 miliardi.

Con DPCM in data 5 novembre 1996, nelle more della conversione in legge del DL n.551 del 23 ottobre 1996, sono stati recepiti alcuni provvedimenti che la Commissione ha adottato fra cui:

- il definanziamento, totale o parziale, di alcuni interventi, per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie necessarie per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Galleria Principe Amedeo d'Aosta (D.08.01) e del suo collegamento con il Sottopasso di Castel Sant'Angelo ed il Parcheggio da realizzarsi sul Gianicolo in area dello Stato Città del Vaticano ;
- il mandato all'Ufficio per Roma Capitale di trasferire ai soggetti beneficiari le occorrenze finanziarie per far fronte agli oneri relativi alla progettazione degli interventi ed alle eventuali attività di indagine a questa strumentali;
- l'avvio della procedura per la definizione dei criteri di monitoraggio e delle misure di snellimento procedurale (in attuazione dell'art. 1, comma 6 bis, della legge n. 651/1996);
- la ripartizione del contributo complessivo di Lit. 40 miliardi a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti in materia di accoglienza e di monitoraggio, rispettivamente in 32 miliardi (accoglienza) ed 8 miliardi (monitoraggio) e la calendarizzazione del trasferimento delle quote relative ai 32 miliardi (art. 1, comma 12, del D.L. n. 551/1996).

Con il successivo DPCM in data 11 dicembre 1996, sono state adottate alcune importanti direttive in ordine alla gestione ed al controllo sull'attuazione del Piano:

- "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano";
- "Indirizzi circa le modalità per la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del Piano e l'informazione della pubblica opinione";
- "Criteri per il monitoraggio".

Infine, con D.M. in data 21 dicembre 1996, è stato adottato il parziale definanziamento dell'intervento relativo alla realizzazione dell'asse viario Olimpica - Pineta Sacchetti (D.12.01), deliberato dalla Commissione al fine di fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie indispensabili per la realizzazione del Sottopasso di Castel Sant'Angelo e della Galleria Principe Amedeo d'Aosta, fissate rispettivamente in 169 e 68 miliardi. Tale definanziamento che doveva essere "momentaneo", è poi divenuto definitivo.

2.1.2 La seconda relazione trimestrale (1° aprile – 30 giugno 1997)

La suddetta relazione, sulla scorta della precedente, ha dato atto dei provvedimenti adottati nel periodo in esame e segnatamente dei DD.MM. 18 aprile 1997 e 24 giugno 1997.

Con il primo, tra l'altro:

- è stato ridotto l'importo dello stanziamento a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., portandolo dagli originari 40 miliardi a 32 miliardi. Ciò in quanto la legge di conversione n.651/96 del citato DL n. 551/96, recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", ha limitato il contributo in questione alle prestazioni connesse al "piano di accoglienza", eliminando, pertanto, qualsiasi riferimento a compiti nel campo del "monitoraggio";
- si è stabilito di subordinare l'effettivo trasferimento delle somme stanziate a favore di interventi presenti anche nel Programma per Roma Capitale (legge n. 396/90), alla certificazione circa l'autonomia funzionale degli interventi relativi al Giubileo, rispetto a quelli già facenti parte del Programma per Roma Capitale;
- si è precisato che con la locuzione "termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi" di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 2, della legge n. 651/1996, debba intendersi la data del verbale di aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura;
- si è, altresì, precisato che con la locuzione "sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione", di cui al comma 3 bis, dell'articolo 1, della legge n. 651/1996, debba intendersi l'aumento superiore al 20% dell'importo di aggiudicazione, se intervenuto, ovvero del solo importo del lavoro, servizio o fornitura, quale risulta dal quadro economico, nel caso di gara non ancora espletata;
- si è stabilito che la Commissione procedesse, in sede di modifica ed integrazione al Piano, ad una valutazione comparativa delle richieste di inclusione, dando priorità alla finalità perseguita dagli interventi proposti, al relativo grado di

fattibilità in relazione al livello di definizione progettuale conseguito, alla complessità realizzativa ed al grado di perfezionamento degli adempimenti amministrativi;

- si è stabilito che le proposte di modifiche del Piano relative a strutture alberghiere ed extra - alberghiere fossero indirizzate direttamente alla Regione Lazio, titolare dell'intervento relativo agli incentivi previsti per questo specifico settore;
- è stato inserito nel Piano con codice F.04.02 e con apposito finanziamento, l'intervento denominato "Osservatorio sul Piano del Giubileo";
- in merito all'attività di "monitoraggio" del Piano, il cui coordinamento era già stato affidato all'U.R.C.G.E., si è demandato al Ministro dei lavori pubblici l'espletamento della gara per l'individuazione del soggetto monitore e sono stati approvati il "Disciplinare tecnico e capitolato d'oneri" elaborati dall'Ufficio anzidetto.

Con il DM 24 giugno 1997 sono state apportate altre modifiche ed integrazioni al Piano che si sono concretizzate principalmente in :

- taluni definanziamenti, cambi di soggetti beneficiari e proroghe temporali, nonché finanziamenti di interventi relativi al prioritario settore della sicurezza delle Basiliche patriarcali, degli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, del porto canale di Fiumicino al fine di garantire la sicurezza dell'accesso a quest'ultimo e per consentire un migliore espletamento delle funzioni di soccorso a mare;

sono inoltre state assunte le seguenti determinazioni:

- si è stabilito di sottoporre ad ulteriore istruttoria – per la verifica di conformità ai criteri indicati dalla LR n. 20/97 in materia di ricettività - tutti gli interventi ricompresi nel Piano, rubricati con codice A.07, ad eccezione di quelli di nuova costruzione ed ampliamento di strutture ricettive;
- si è stabilito che la prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi del Piano per il Giubileo fosse presentata direttamente dal Ministro dei lavori pubblici delegato per materia;
- si è stabilito inoltre che le risorse rivenienti da eventuali futuri definanziamenti fossero prioritariamente destinate ai settori della mobilità, della sicurezza e della protezione civile, dell'accoglienza, della ricettività e della gestione dell'evento.

2.1.3 La terza relazione trimestrale (1° luglio – 30 settembre 1997)

L'attività di modifica ed integrazione del Piano esercitata, nel periodo in esame, dalla Commissione si è formalizzata con il D.M. del 4 agosto 1997. In particolare con tale atto:

- si è confermato l'inserimento nel Piano di tutti gli interventi già rubricati con codice A.07, sottoposti al supplemento istruttorio succitato, e concernenti il "Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e

nella regione, al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo", vuoi in quanto conformi ai criteri della LR n. 20/97, vuoi perché contraddistinti da finalità coerenti con le celebrazioni giubilari;

- è stato disposto che i soggetti beneficiari degli interventi rubricati con codice A.07, dovessero attenersi alle disposizioni del comma 1, art. 12, della legge regionale del Lazio n. 20/1997, in merito al mantenimento della titolarità e della destinazione d'uso dell'immobile ad attività ricettiva per non meno di dieci anni dalla data dell'erogazione del contributo;
- sono state assentite modifiche di titoli e termini temporali relative ad alcuni interventi;
- si è preso atto dell'esigenza di far fronte all'onere per la realizzazione degli svincoli del parcheggio del Gianicolo, pari ad un costo stimato di Lit. 11.950.000.000, e la Commissione si è impegnata a reperire tale somma a valere sui ribassi d'asta intervenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori o forniture finanziati ai sensi della legge n. 651/96.

La Relazione oltre a fornire elementi circa lo stato di attuazione degli adempimenti amministrativi, riportava anche lo stato di avanzamento della fase realizzativa, riferendo che, in merito alla gestione finanziaria, al 30 settembre 1997, erano stati effettuati 104 mandati di pagamento per complessive Lit. 133.371.290.000, nonché trasferimenti, con variazione compensativa di bilancio, al Ministero BB.CC.AA. per Lit. 327.315.000.000 ed al Ministero degli Interni per Lit. 5.000.000.000.

Nel trimestre in esame la Commissione è stata inoltre aggiornata sull'attività svolta dall'U.R.C.G.E. in ordine a tutte le procedure relative all'appalto del "Servizio di monitoraggio del Piano". In particolare sono stati resi noti i tempi e le modalità della procedura di gara ad evidenza pubblica in ambito CEE, in relazione alla quale, in data 29 settembre si era ormai giunti alla conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice – all'uopo nominata dal Ministro dei lavori pubblici- , con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultata essere quella presentata dall'ATI fra Italconsult, S.p.A., SIM – Società Italiana per il Monitoraggio S.p.A. e Infraplan S.A..

2.1.4 La quarta relazione trimestrale (1° ottobre – 31 dicembre 1997)

La relazione relativa a tale periodo fa riferimento al D.M. 22 dicembre 1997 con il quale, tra l'altro:

- sono state recepite le modifiche ed integrazioni che la Commissione ha apportato al Piano, nel quadro della propria attività di programmazione ed indirizzo, ed in particolare è stato inserito nel Piano, con codice D.08.03, l'intervento avente per oggetto le "Interconnessioni tra il parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna", con un finanziamento di 11.950 milioni;

- si è stabilito l'obbligo per i soggetti beneficiari dei finanziamenti di comunicare tempestivamente alla Commissione la data relativa all'intervenuta aggiudicazione dei lavori;
- si è altresì stabilito l'obbligo, in capo al soggetto beneficiario del finanziamento, ovvero, al Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio nella qualità di stazione appaltante, di comunicare all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, al momento dell'intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'importo dei lavori a base d'asta, nonché il valore assoluto e il valore percentuale del ribasso d'asta intervenuto.

La Relazione dava inoltre notizia dell'avvenuto scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, di cui al comma 13, art. 1, della legge n. 651/96, concernente le modalità di attuazione dell'intervento relativo al parcheggio da realizzarsi sul Gianicolo in area extraterritoriale (tale argomento è comunque più diffusamente trattato al punto 1.4 della presente Relazione).

In ordine allo stato di avanzamento della fase realizzativa del Piano, la Relazione riportava il seguente prospetto relativo agli impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie aggiornato al 31 dicembre 1997:

Impegni	Lit. 534.949.437.700
Trasferimenti al Ministero BB.CC.AA.	Lit. 331.813.500.000
Trasferimenti al Ministero degli Interni	Lit. 50.000.000.000

per un totale di Lit. 916.762.937.700 di cui Lit. 646.539.703.400 trasferite anche in termini di cassa. Gli impegni assunti si riferivano a 193 interventi, vuoi per anticipi per le attività progettuali (circa 76 miliardi), vuoi per anticipazioni su lavori o forniture già appaltate (circa 358 miliardi).

Il trasferimento al Ministero per i beni Culturali e Ambientali era riferito all'avvio di tutti gli interventi di competenza ricompresi nel Piano. Il trasferimento al Ministero degli Interni era riferito agli interventi in materia di sicurezza.

Alla fine del trimestre in questione sono intervenuti altresì due fatti significativi ai fini del controllo e della gestione del Piano del Giubileo ed di tutte le attività ad esso comunque connesse.

Il primo concerne la stipula del contratto di appalto relativo al "Servizio di monitoraggio del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000", appalto affidato in data 18 dicembre 1997 alla già citata ATI fra le Soc. Italconsult, SIM – Società Italiana per il Monitoraggio e Infraplan, per un importo contrattuale di Lit. 4.019.037.400 (IVA esclusa).

Con tale atto ha preso così avvio quella importante attività di verifica e controllo dell'avanzamento del Piano prevista dalla legge n.651/96 - alla quale è dedicata una apposita sezione della presente Relazione -, che si è affiancata a quella già esercitata dalla Commissione, dal Ministro dei lavori pubblici, dalla BEI, dall'U.R.C.G.E.,

nonché da tutti gli altri soggetti a diverso titolo coinvolti nella realizzazione del Piano.

Il secondo riguarda la "Nomina del Sindaco di Roma a commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 nell'ambito del territorio comunale di Roma" avvenuta con DPCM in data 31 dicembre 1997.

Con tale provvedimento al Sindaco di Roma – affiancato da un Comitato di coordinamento composto di quindici membri e costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un nucleo di esperti in numero massimo di cinque- è stato affidato, con mandato fino al giugno 2001, il compito di coordinare i soggetti titolari di interventi localizzati nel Comune di Roma al fine di:

- formulare al Ministro competente per delega, proposte di rimodulazione del Piano, anche in ordine alla priorità delle iniziative da assumersi, nonché alle possibili intese con altre amministrazioni, per le attività ed i servizi di loro competenza;
- proporre misure organizzative e procedurali tese alla tempestiva realizzazione di tutti gli adempimenti per il Giubileo;
- coordinare le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi, segnatamente nelle aree delle basiliche e nel centro della città;
- assicurare il coordinamento operativo tra i cantieri inclusi nel Piano e quelli comunque realizzati benché non ricompresi nello stesso;
- armonizzare le esigenze operative dei cantieri con quelle della comunità locale, con riferimento sia ai problemi del funzionamento dei servizi a rete ed alla persona, che a quelli relativi alla sicurezza e salubrità ambientale, nonché alla informazione ed alla trasparenza delle procedure;
- coordinare le attività previste dal "piano dell'accoglienza", anche in riferimento al programma delle manifestazioni e delle iniziative concomitanti ;
- assicurare l'attuazione delle indicazioni della Commissione mista fra lo Stato Italiano e la Santa Sede.

Per il raggiungimento dei fini anzidetti, al Commissario Straordinario è stato conferito il potere di impartire, alle amministrazioni competenti, direttive ed indicazioni operative, e di ottenere dalle stesse tutte le informazioni e la documentazioni ritenute utili all'espletamento del mandato.

Al Commissario è stato altresì attribuito il compito di promuovere la convocazione di conferenze di servizi, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, nonché quello di riferire periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, "*sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolino la proficua attuazione*".

2.2 La riprogrammazione del Piano nei quattro trimestri del 1998

Nel corso del 1998 la Commissione per Roma Capitale ha proceduto ad una sempre più incisiva azione di modifica ed integrazione del Piano, in modo da renderlo più aderente alle necessità emergenti dall'aggiornamento dei programmi delle varie Amministrazioni o degli altri soggetti beneficiari dei finanziamenti, in ordine all'accertamento della concreta fattibilità di talune opere anche per sopravvenute esigenze non previste in precedenza. L'attività di rimodulazione del Piano, soprattutto per ciò che concerne il finanziamento di nuove iniziative o l'integrazione finanziaria di interventi già presenti nel Piano, si è resa possibile grazie alle risorse finanziarie rese disponibili sia dai definanziamenti parziali o totali di taluni interventi, sia dai ribassi d'asta intervenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori o forniture che, con frequenza sempre crescente, passavano dalla fase relativa agli adempimenti amministrativi, a quella realizzativa.

In particolare occorre innanzitutto menzionare il definanziamento, provvedimento adottato con apposito DM in data 5 febbraio 1998, dell'intervento relativo al Sottopasso di Castel Sant'Angelo (D.07.01) e l'inserimento nel Piano di un nuovo intervento denominato "Sottovia Lungotevere in Sassia" rubricato con codice D.07.02 e dotato di un'assegnazione finanziaria pari a Lit. 43,5 miliardi.

Il definanziamento del "Sottopasso " – un'opera particolarmente significativa per la sua rilevanza strategica nell'assetto della viabilità del più importante settore della città di Roma in occasione del Giubileo - è intervenuto a seguito del mancato raggiungimento dell'unanimità dei consensi in sede di conferenza dei servizi (19.12.1997), dovuto, fra l'altro, a perplessità emerse in ordine alla realizzabilità dell'opera nei tempi prescritti, anche in relazione agli ulteriori approfondimenti archeologici ed idrogeologici richiesti.

E' però con la seduta dell'11 marzo 1998 che la Commissione ha apportato un significativo ed incisivo insieme di modifiche ed integrazioni al Piano, recepito con D.M. in data 8 maggio 1998, pubblicato sulla GU. n.150 del 30 giugno 1998. Con detto decreto si è provveduto:

- ad accogliere le richieste di proroga dei tempi programmati - lettere c) e d) - concernenti una serie di interventi per i quali tali slittamenti temporali erano compatibili con il completamento degli interventi stessi entro l'inizio dell'anno giubilare;
- a modificare il titolo del settore E del Piano da "Servizi speciali e formazione" in "Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione", per renderlo congruente con l'effettiva tipologia di interventi in esso attualmente ricompresi;
- a definire puntualmente, sulla base degli approfondimenti programmatici e progettuali eseguiti dai soggetti attuatori, gli interventi - di valenza strategica

in relazione alle celebrazioni giubilari - concernenti le aree delle Basiliche (S. Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, Santa Maria Maggiore, San Paolo Fuori le mura) che sono stati disaggregati, peraltro senza aumento di spesa, in interventi inerenti settori specifici ed attribuiti agli effettivi soggetti attuatori con i relativi finanziamenti;

- a definanziare totalmente o parzialmente cinque interventi (A01.08, A09.01, C01.17, C03.05, D.04.01) –per i quali e per i successivi si rinvia all'apposito paragrafo - in quanto giudicati non fattibili in tempo utile, per un totale di Lit. 97.250 milioni. Fra questi va segnalato quello relativo alla linea tranviaria Archeotram ed opere connesse;
- a definanziare inoltre (al netto dei trasferimenti già operati), su proposta del rispettivo soggetto beneficiario, per far fronte al finanziamento di interventi ritenuti di importanza strategica ai fini delle celebrazioni giubilari, undici opere, ancorché valutate fattibili (B01.01, B08.06., B12.01, B16.21, B16.22, B.16.23, C.01.08, C01.09, C.19.01/a1, D.02.01, D.03.01, per un totale di Lit. 196.478 milioni.

Ancora, per effetto degli approfondimenti programmatici e progettuali condotti dai rispettivi soggetti beneficiari, sono stati definanziati i seguenti interventi, A.07.02, C01.26, C07.01, D19.02; -E04.01 -E04.04, per un totale di £. 51.600 milioni.

E' stato altresì revocato il finanziamento relativo all'intervento A07.02 – "Campeggio da realizzare nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario Garibaldi" per Lit.321.100.000.

Si è provveduto anche al definanziamento parziale di alcuni interventi localizzati a Castel Gandolfo: C.04.01, C.04.02/A, C.04.02/B, C.04.03, C.04.04, per un totale di 11.050 milioni.

Quest'ultima decisione è scaturita a seguito dell'accertamento, avvenuto in sede di conferenza di servizi, della sussistenza di vincoli di tutela ambientale sulle aree interessate dagli interventi suddetti e dalla conseguente impossibilità di realizzare le opere proposte.

Si è inoltre accertato in circa 71 miliardi l'ammontare, immediatamente disponibile, dei ribassi d'asta conseguenti all'espletamento delle gare d'appalto già intervenute in relazione ad interventi ricompresi nel Piano.

La Commissione ha pertanto avuto a disposizione, fra definanziamenti e ribassi d'asta, una somma di circa 550 miliardi, pari ad un settimo dell'intero ammontare finanziario del Piano, da destinare a modifiche ed integrazioni al Piano stesso.

Tale considerevole somma è stata destinata, per circa 121 miliardi ad integrazioni finanziarie di interventi già ricompresi nel Piano e per circa 428 miliardi al finanziamento di 66 nuovi interventi, scelti nell'ambito dei settori ritenuti prioritari in relazione ai criteri di selezione già precedentemente stabiliti dalla Commissione stessa. Si segnalano in particolare 140 miliardi destinati a due

interventi promossi dal Comune di Roma per "Incentivi per la manutenzione ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali"; 93 miliardi circa al Ministero dell'Interno e a quello della Difesa per 18 interventi riferiti alla realizzazione di strutture o di forniture o prestazioni di servizi inerenti problemi di "pubblica sicurezza" o "servizi speciali"; 50 miliardi sono poi stati destinati alle provincie di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina per interventi finalizzati al miglioramento della viabilità provinciale. Nell'elenco figurano inoltre sei interventi concernenti le Basiliche di S. Maria Maggiore, S, Giovanni in Laterano e S: Paolo fuori le Mura, per i quali, essendo gli immobili di proprietà della Santa Sede, si è reso necessario un ulteriore scambio di note, del quale si riferisce al punto 1.5.

Con il DM in data 15 maggio 1998 le modifiche ed integrazioni al Piano sono state limitate alla sola ridefinizione degli interventi relativi al Comune di Castel Gandolfo, mentre sono state introdotte importanti modifiche agli "Indirizzi di attuazione finanziaria del Piano". Queste ultime sono state deliberate dalla Commissione, anche al fine di snellire ulteriormente le procedure amministrative di natura finanziaria e ridurre i relativi tempi, in analogia a quelle previste in relazione alla legge n. 270/97 concernente il Piano degli interventi per il Giubileo del 2000 in località al di furori del Lazio. In particolare l'erogazione delle risorse occorrenti per la realizzazione dei lavori o delle forniture, una volta intervenuta l'aggiudicazione della gara d'appalto, è passata dal 20 al 50% delle risorse stesse.

Con il successivo DM in data 16 luglio 1998, la Commissione ha movimentato circa 150 miliardi, ripartendo tale somma in quanto a 42 miliardi circa in integrazioni finanziarie di interventi già ricompresi nel Piano ed in quanto a 106 miliardi circa, in finanziamenti di 23 nuovi interventi, fra i quali circa 38 miliardi per tre interventi concernenti la Stazione Termini, 24 miliardi all'ATAC per una ulteriore fornitura di mezzi pubblici, nonché altri finanziamenti nel campo dei "servizi speciali" – sicurezza e sanità – ed uno di tre miliardi destinato alla definizione progettuale ed agli studi relativi alla "Area Grandi Eventi", individuata, dopo lunghe e difficili trattative, nell'ambito di Tor Vergata.

Nel Piano, ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 1, della legge n. 270/1997 - quella concernente il Piano degli interventi per il Giubileo in località al di fuori del Lazio - sono inoltre stati inseriti tre interventi proposti da soggetti privati, senza oneri a carico dello Stato ed ai soli fini di poter utilizzare le procedure acceleratorie richiamate dal citato testo di legge.

Al Decreto in questione è stata inoltre allegata, sub E, la "Normativa di riferimento per l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano del Giubileo Lazio" che la Commissione ha definito, anche in questo caso in analogia con l'operato dalla Commissione preposta alla definizione del Piano per il Giubileo al di fuori del Lazio, per dissipare alcuni dubbi interpretativi circa l'applicazione della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, in merito ad interventi finanziati ai sensi della legge n. 651/96 e realizzati da enti ecclesiastici.

Con delibera n. 6 del 1 dicembre 1998, recepita con DM in data 7 gennaio 1999, la Commissione ha movimentato circa 179 miliardi, dei quali, circa 53 assegnati al finanziamento di 11 nuovi interventi e circa 109 ad integrazioni di interventi già presenti nel Piano. La Commissione ha stabilito, inoltre, di accantonare circa 13 miliardi quale fondo per fare fronte alla eventuale corresponsione di premi di accelerazione previsti negli atti di gara e nei relativi contratti, in favore degli esecutori di interventi compresi nel Piano, che ultimino i lavori in anticipo rispetto ai tempi contrattuali. La Commissione ha altresì individuato i settori o le tipologie di intervento, elencati in ordine di priorità, da finanziarsi con le future somme rivenienti dai ribassi d'asta.

Nel periodo in esame sono altresì state emanate tre direttive del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo del 2000

Con la n. 1 del 5 maggio 1998, il Commissario Straordinario ha impartito disposizioni e richiesto informative coerentemente con i compiti di coordinamento conferitigli in materia di Giubileo, ed ha altresì delineato la suddivisione delle competenze e le rispettive titolarità in ordine alle strutture chiamate a collaborare con l'Ufficio del Commissario stesso. Quest'ultimo Ufficio ha altresì, in attuazione della Direttiva. 1, impartito alcune disposizioni per disciplinare la "anticipazione dei lavori appaltati" ed il relativo "premio di accelerazione".

Con la Direttiva n. 2 del 18 maggio 1998, il Commissario ha posta in essere la nuova organizzazione finalizzata al coordinamento dei cantieri insistenti sul territorio del Comune di Roma ed articolata nel nuovo "Ufficio Centrale Temporaneo" e del già operante "Ufficio Speciale coordinamento cantieri".

Con la Direttiva n. 3 del 29 dicembre 1998, il Commissario ha provveduto ad individuare, nell'ambito delle attività afferenti al Piano dell'accoglienza, le seguenti aree tematiche (settori) e le rispettive amministrazioni o enti incaricati della gestione dell'anno 2000:

Settore	**Responsabile Istituzionale**
Sicurezza	Prefettura di Roma
Grandi Eventi	Agenzia per il Giubileo
Protezione civile	Prefettura di Roma
Igiene Urbana	AMA
Sanità	Regione Lazio
Mobilità locale	Comune di Roma
Volontariato (parte italiana)	Agenzia per il Giubileo
Ricettività	Regione Lazio
Informazione di servizio	Agenzia per il Giubileo
Comunicazione locale	Agenzia per il Giubileo
Comunicazione ed informazione nazionale ed internazionale	Dipartimento per il Turismo
Sala Situazioni	Agenzia per il Giubileo
Coordinamento attività operative Giubileo Lazio ed Extra Lazio	Dipartimento per il Turismo

2.3 Gli interventi definanziati

Nel corso dell'attività di modifica ed integrazione al Piano attuata dalla Commissione e recepita, a tutto il 1998, in 12 decreti, sono stati definanziati totalmente o parzialmente gli interventi di seguito elencati secondo il settore di appartenenza.

In linea di massima i definanziamenti di taluni interventi sono stati deliberati dalla Commissione vuoi per l'imprevisto manifestarsi di cause ostative alla realizzazione totale o parziale degli stessi, vuoi per l'impossibilità di completare le opere di interventi, ancorché fattibili, entro i tempi programmati.

E' questo, ad esempio, il caso degli interventi di maggiore dimensione, complessità ed impegno finanziario, concernenti infrastrutture e nodi di scambio per il miglioramento della mobilità nella città di Roma, la cui realizzazione ha palesato difficoltà obiettive tali da non garantire con certezza l'ultimazione entro tempi compatibili con la scadenza giubilare. Per gran parte di essi il soggetto attuatore ha deciso di rinviarne la realizzazione in tempi successivi al Giubileo, anche al fine di evitare che gli inevitabili inconvenienti prodotti dai relativi cantieri non si aggiungessero al maggior carico di afflussi previsti per l'anno 2000.

Si tratta, pertanto, di una rimodulazione temporale di programmi attuativi che saranno comunque realizzati, e ciò anche per utilizzare il lavoro progettuale già svolto e portare a compimento l'iter procedurale ed autorizzativo avviato.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Estremi del provvedimento	Importo del definanziamento
A.01.01	Centri diurni per persone senza fissa dimora (Roma). Allestimento delle strutture presso gli ospedali Santo Spirito e Spallanzani.	Comune di Roma	DM 24/6/97	900.000.000
A.01.08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimina)	Comune di Roma	DM 8/5/98	1.350.000.000
A.01.09	Casa di accoglienza temporanea per pellegrini (Roma). Ristrutturazione dell'immobile ex Istituto Modigliani	Comune di Roma	DM 24/6/97	700.000.000
A.01.20	Casa di accoglienza ebraica per anziani "Ricovero iesraelitico". (Roma) Recupero del compolessop di S. Ambrogio della Masisima	Comune di Roma	DM 24/6/97	5.000.000.000
A.07.02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma). Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi"	Provincia di Roma	DM 16/7/98	321.100.000

A.07.08	Ostello della gioventù e centro di accoglienza (Velletri/Roma) Progettazione degli interventi di ristrutturazione dell'ex casa circondariale e primi interventi funzionali	Comune di Velletri	DM 22/12/97	1.000.000.000
A.07.17	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Ristrutturazione dell'edificio ex Divina Provvidenza	Comune di Nettuno	DM 16/7/98	2.700.000.000
A.07.38	Ostello della Gioventù (Norma/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico (1° stralcio funzionale)	Comune di Norma	DM 16/7/98	1.200.000.000
A.08.01	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extraalberghiere	Regione Lazio	DM 24/6/97	30.365.000.000
A.09.01	Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma) Lavori di restauro e allestimento	USL RM E	DM 8/5/98	9.350.000.000
B.01.01	Area del Grande Campidoglio: palazzo Senatorio (Roma). Prosecuzione dei lavori di consolidamento, restauro e musealizzazione del Tabularium (prima fase)	Comune di Roma	DM 8/5/98	8.075.000.000
B.08.06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Olearie), completamento restauro Museo delle Cere	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	DM 8/5/98	1.300.000.000
B.12.07	Arsenale Pontificio (Roma) Restauro completo dell'immobile per utilizzazione museale (Museo del Tevere)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali'	DM 18/4/97	1.500.000.000
B.13.37	Chiesa della SS. Annunziata (Roma) Restauro della facciata	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	DM 18/4/97	500.000.000
B.13.53	Chiesa S. Andrea in via Flaminia (Roma) Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	DM 18/4/97	400.000.000
B.16.21	Acquedotto della Villa dei Quintili (Roma) Restauro, risanamento funzionale e tecnico impiantistico. Completamento restauro arcate e piloni	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	DM 8/5/98	1.000.000.000
B.16.22	Parco delle tombe della Via Latina (rOma). Scavi archeologici, restauri e adeguamento funzionale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	DM 8/5/98	1.723.000.000
B.16.23	Flaminia: Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma) Scavi archeologici, restauri e sistemazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	DM 8/5/98	2.320.000.000

B.18.15	Riqualificazione del comprensorio della Mentorella (Capranica Prenestina/Roma) Sistemazione dell'area circostante e realizzazione di un'area parcheggio	Provincia di Roma	DM 18/4/97	400.000.000 (1)
B.19.01	Sinagoghe, denominate Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo (Roma). Restauro degli arredi antichi delle Cinque Scole del Ghetto, adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio	Comune di Roma	DM 24/6/97	2.500.000.000
B.19.11	Monastero di Santa Scolastica (Subiaco/Roma) Restauro	Comune di Subiaco	DM 18/4/97	2.000.000.000 (1)
C.01.08	Intervento urbanistico connesso alla linea S.Pietro - Venezia.	Comune di Roma	DM 8/5/98	18.810.000.000
C.01.09	Intervento urbanistico connesso alla linea S.Pietro - Aurelia	Comune di Roma	DM 8/5/98	7.600.000.000
C.01.16	Attraversamento di Villa Pamphilj (Roma) Realizzazione galleria artificiale sulla via Olimpica (prima fase)	Comune di Roma	DM 24/6/97	27.000.000.000
C.01.17	Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi	Comune di Roma	DM 8/5/98	13.700.000.000
C.02.07	Pista ciclabile Castel S. Angelo-Ponte Sublicio	Comune di Roma	DM 16/7/98	2.000.000.000
C.03.05	Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram	Comune di Roma	DM 8/5/98	19.000.000.000
C.04.01	Terminal bus	Comune di Castel Gandolfo	DM 15/5/98	1.500.000.000
C.04.02 /a	Area di Castel Gandolfo (Roma) Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico	Comune di Castel Gandolfo	DM 15/5/98	12.000.000.000
C.04.02 /b	Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza	Comune di Castel Gandolfo	DM 15/5/98	6.000.000.000
C.04.03	Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta	Comune di Castel Gandolfo	DM 15/5/98	1.650.000.000
C.04.04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastrutture fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di Castel Gandolfo	DM 15/5/98	1.200.000.000
C.04.G	Recupero e restauro monumenti	Comune di Castel Gandolfo	DM 15/5/98	500.000.000
C.19.01 /a1	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Intervento del Comune di Roma - Rio Galeria. (Adduttrici acque nere e impianto di depurazione - località Casalotti).	Comune di Roma	DM 8/5/98	40.000.000.000
D.02.01	Linea tramviaria S.Pietro Aurelia	Comune di Roma	DM 8/5/98	47.500.000.000

D.03.01	Tram Venezia - San Pietro Realizzazione della linea tranviaria.	Comune di Roma	DM 8/5/98	67.450.000.000
D.04.01	Linea tramviaria Archeotram	Comune di Roma	DM 8/5/98	53.200.000.000
D.07.01	Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Costruzione di un sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione di scambio-parcheggio per circa 25 posti pullman)	Comune di Roma	DM 5/2/98	161.638.184.000
D.09.01	Area della Stazione Tiburtina (Roma) Infrastrutturazione	Ferrovie dello Stato	DM 16/7/98	34.000.000.000
D.12.01	Tratto viario Olimpica - Pineta Sacchetti (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italico e via Pineta Sacchetti	Comune di Roma	DM 5/11/96 DM 21/12/96	91.700.000.000
D.18.01 /1	Linee A e B della metropolitana (Roma) Potenziamento nodo di Termini	Comune di Roma	DM16/7/98	29.726.856.210
D.19.01	Nodi di scambio (Roma) Connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina	Comune di Roma	DM 24/6/97	40.000.000.000
D.19.02	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"	Ferrovie dello Stato	DM 8/5/98	30.000.000.000
E.01.10	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona presso l'ex Caserma Pepe	AMA	DM 24/6/97	2.380.000.000
E.01.21	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Bravaria	AMA	DM 24/6/97	1.790.000.000
E.01.23	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) Terminal Ostiense	AMA	DM 24/6/97	7.140.000.000
E.04.01	Piano di valorizzazione delle risorse umane(Lazio).Formazione e aggiornamento professionale per addetti alla P.A. Impiego operatori in servizio civile	Regione Lazio	DM 8/5/98	10.728.000.000
E.04.04	Piano di valorizzazione delle risorse umane(Lazio). Strumenti formativi per l'autoapprendimento; riqualificazione centri formazione professionale	Regione Lazio	DM 8/5/98	2.872.000.000
E.05.10	Acquisto 4 gruppi elettrogeni con relativi shelter	'Ministero Difesa	DM 7/1/99	1.000.000.000
E.05.31	Ampliamento e ristrutturazione sede EUR	Min. Interno - Corpo nazionale VV. FF – Dip. Protezione Civile	DM 7/1/99	1.500.000.000

(1) Si tratta di definanziamenti apparenti in quanto gli interventi sono stati incorporati, con il relativo finanziamento, in altri già presenti nel Piano stesso.

Per dar modo di valutare le ragioni di cancellazione dal Piano, ovvero di definanziamento totale o parziale dei sopra elencati interventi, viene riportato di seguito il dettaglio delle relative motivazioni, limitatamente agli interventi di importo superiore ai 3 miliardi di lire.

A.08.01 – *"Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extralberghiere" – Finanziamento 130 miliardi.*

Con DM 24/6/97 l'intervento , che vede come soggetto attuatore la Regione Lazio, è stato parzialmente definanziato per circa 30 miliardi. Tale riduzione finanziaria è stata deliberata dalla Commissione in relazione al fatto che le finalità perseguite dall'intervento in questione erano già in parte soddisfatte da alcuni interventi ricompresi nel settore A del Piano e rubricati con il codice A.07 "Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella Regione, al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo". Di tale intervento si riferisce più diffusamente in altra parte della presente relazione.

A.09.01 - *"Corsia Sistina-Ospedale S. Spirito – Centro temporaneo di accoglienza dei pellegrini nell'area della Basilica di S. Pietro – Lavori di restauro e allestimento" - Finanziamento 10 miliardi.*

L'intervento concerne il restauro della monumentale ala dell'Ospedale S. Spirito, finalizzato ad un riuso a fini culturali e di accoglienza.

Erano previsti interventi conservativi agli affreschi distribuiti su tutte le pareti della grande sala e lavori di rifacimento del tetto, del pavimento oltreché di allestimento e climatizzazione.

L'intervento, il cui progetto ha ottenuto tutte le necessarie approvazioni è stato definanziato con il D.M. 8.5.1998 sulla base di una temuta non fattibilità entro i tempi utili per le celebrazioni giubilari.

Sono stati mantenuti in favore dell'intervento solo 650 milioni destinati ai lavori urgenti per le riparazioni delle coperture della Corsia Sistina, il cui cattivo stato di manutenzione minacciava l'ulteriore compromissione dei dipinti murali.

B.01.01 - *"Area del Grande Campidoglio: Palazzo Senatorio. Prosecuzione dei lavori di consolidamento e restauro" - Finanziamento 5 miliardi.*

L'intervento si riferisce all'ampio progetto di restauro, consolidamento e musealizzazione del Palazzo Senatorio che è stato diviso in due distinte fasi.

La prima ha riguardato il consolidamento e restauro del Tabularium, tuttora in corso di esecuzione per un importo di 10 miliardi e mezzo, finanziato con i fondi di Roma Capitale.

La seconda fase, cui si riferisce l'intervento in oggetto riguarda invece il restauro ed il consolidamento dei piani superiori al Tabularium, e prevede, tra l'altro il trasferimento di alcuni uffici allocati nel palazzo del Campidoglio.

Proprio in relazione alle difficoltà connesse alla presenza degli uffici, è stata valutata la difficoltà di portare a compimento l'opera entro i tempi stabiliti dal

programma del giubileo e si è pertanto deciso, da parte del Comune, di chiederne il definanziamento.

Il progetto, peraltro inserito nel Programma di Roma Capitale nell'ambito di finanziamenti attribuiti per l'anno 1998, è stato approvato da tutti gli uffici competenti ed è in corso la gara di appalto.

C.01.08 - *"Intervento urbanistico connesso alla linee San Pietro-Venezia"- Finanziamento 12 miliardi.*

D.03.01 - *"Tram Venezia-San Pietro, realizzazione della linea tranviaria"- Finanziamento 71 miliardi.*

I due interventi attengono entrambi, per un totale di 83 miliardi, alla realizzazione di una linea tranviaria San Pietro-Piazza Venezia, con percorso lungo Corso Vittorio Emanuele e Via del Plebiscito.

Il progetto è da considerare collegato alla tranvia San Pietro-Aurelia, che ne costituisce la prosecuzione verso i quartieri della zona Ovest della città.

Il progetto ha ottenuto tutte le approvazioni necessarie. Il Comune di Roma ha comunque deciso di non intraprendere la realizzazione dell'opera prima del Giubileo e quindi di chiederne il definanziamento, dal momento che i suoi cantieri andavano ad interferire proprio con quella parte del Centro storico che è adiacente all'area critica della Basilica di San Pietro.

Gli eventuali cantieri di questa tranvia sarebbero andati dunque ad assommarsi agli altri cantieri già installati , creando effetti moltiplicativi dei disagi che già attualmente gravano su questo settore di Roma.

La realizzazione della linea tranviaria, considerata di vitale importanza, è stata pertanto rimandata al periodo immediatamente successivo alla conclusione delle celebrazioni giubilari.

C.01.09 - *"Intervento urbanistico connesso alla linee San Pietro-Aurelia"- Finanziamento 8 miliardi.*

D.02.01 - *"Linea tranviaria San Pietro-Aurelia"- Finanziamento 59 miliardi.*

I due interventi attengono entrambi alla realizzazione di una linea tranviaria S; Pietro-Aurelia lungo il percorso di Via Gregorio VII.

Il progetto, da considerare quale prosecuzione della linea P. Venezia-San Pietro, ha ottenuto tutte le approvazioni necessarie.

Il progetto completo in tutte le sue parti è stato vagliato anche dal soggetto monitore, che lo ha dichiarato fattibile sia pure con una certa criticità.

Anche per questi interventi il Comune di Roma ha inteso non intraprendere i lavori in occasione del Giubileo e quindi proporre il definanziamento dal momento che avrebbero interferito con l'area di massima concentrazione di interventi che è appunto quella circostante S. Pietro, al fine di non creare ulteriori rischi ad un'area già sufficientemente interessata da cantieri di grande importanza ed estensione e che già comportano pesanti riflessi sul traffico urbano.

Il progetto continua ad essere ritenuto assolutamente valido ed è stata rinviata la sua realizzazione, al periodo immediatamente successivo alle celebrazioni giubilari.

C.01.16 - *"Attraversamento di Villa Pamphily mediante galleria artificiale (prima fase) "- Finanziamento 27 miliardi.*

L'opera prevede l'interramento dell'attuale Via Olimpica, che, realizzata in occasione delle Olimpiadi del 1960, ha spezzato in due parti il comprensorio unitario della Villa Doria Pamphily.

L'opera riveste pertanto un alto valore ambientale, ma è anche finalizzata alla velocizzazione del traffico su questo importante asse viario, con l'eliminazione di vari incroci e semafori.

Il progetto era pronto ed anche l'iter delle approvazioni si poteva dire concluso. Di fatto, però, il costo totale dell'intervento era stimato in 85 miliardi, dei quali si rendevano disponibili nell'ambito del programma giubilare solo 27. Anche sulla base di questo, con molto anticipo già con il decreto ministeriale del 24 giugno 1997, l'intervento è stato definanziato per supportarne altri ritenuti di prioritaria importanza strategica, nel quadro delle finalità giubilari.

C.01.17 - *"Via Pineta Sacchetti: allargamento del tratto da Piazza Giuriconsulti fino a Via Trionfale"- Finanziamento 14 miliardi.*

L'intervento di allargamento della Via Pineta Sacchetti riveste grande importanza anche perché su di essa andrà a connettersi, in futuro, il collegamento in tunnel tra la via Olimpica e la stessa via Pineta Sacchetti, denominato "passaggio a nord-ovest".

L'intervento è stato diviso in tre tratte: una prima da via Trionfale a via La Nebbia, che è stata già realizzata ed ultimata nel corso del 1998; una seconda tratta da via La Nebbia a via di Forte Braschi e una terza tratta da via di Forte Braschi a Piazza Giureconsulti. L'intervento in oggetto si riferisce alla seconda tratta (via La Nebbia-Via di Forte Braschi) il cui progetto è stato già predisposto ed approvato.

Il definanziamento è da mettersi in relazione alle vicende dell'intero asse viario Olimpica - Circonvallazione Cornelia di cui fa parte anche il "passaggio a nord-ovest" che è stato a sua volta definanziato.

Si è deciso, infatti, da parte del Comune di realizzare l'intera opera con fondi ordinari, al fine di svincolarsi dai tempi predeterminati e troppo costrittivi del Giubileo, ma anche per non appesantire ulteriormente i quartieri Aurelio e Trionfale, che già vedono fortemente diminuita la loro accessibilità lungo le direttrici principali di accesso di Via Gregorio VII, impegnata dai cantieri della Galleria PASA e di via Ubaldo degli Ubaldi, tuttora interessata dai lavori del prolungamento della metro A.

Interventi relativi al Comune di Castel Gandolfo

C.04.01 *"Terminal bus"- Finanziamento 1,5 miliardi.*

C.04.02 *"Centro accoglienza e galleria pedonale"- Finanziamento 18 miliardi.*

C.04.03 *"Parcheggio bus lunga sosta"- Finanziamento 1,65 miliardi.*

C.04.04 *"Stazione La Villetta potenziamento"- Finanziamento 1,2 miliardi.*

L'insieme degli interventi era stato studiato allo scopo di agevolare l'arrivo ed il deflusso dei pellegrini che si recheranno a Castel Gandolfo nel periodo giubilare in occasione delle udienze estive del Pontefice.

I predetti interventi sono stati definanziati, perché quasi tutti localizzati in ambiti che, ai sensi dell'art. 1 quinques dalla legge 431/85, sono sottoposti a vincolo di inedificabilità fino alla definitiva approvazione dei piani paesistici che, all'epoca della presentazione ed esame dei progetti, erano stati solo adottati.

Il definanziamento é stato determinato, peraltro, anche dal parere negativo espresso in merito dalla competente Soprintendenza.

Con DM del 15 maggio 1998, una parte dei finanziamenti attribuiti al Comune Castelgandolfo è stata recuperata nella misura di circa 11 miliardi, per far fronte ad una serie di interventi più numerosi, ma di più ridotte dimensioni, e precisamente:

C.04.A	Terminal bus	1.300 milioni
C.04.B	Centro servizi di prima necessità	1.500 milioni
C.04.C	Sottopasso pedonale via Maremmana	300 milioni
C.04.D	Realizzazione aree e strutture di parcheggio al servizio del centro storico	2.550 milioni
C.04.E	Sistemazione viabilità urbana	1.800 milioni
C.04.F	Sistemazione della passeggiata sul lungolago Comune di Castelgandolfo	1.000 milioni
C.04.G	Recupero e restauro monumenti	500 milioni
C.04.H	Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"	2.100 milioni
	Totale	11.050 milioni

C.19.01/a1 - *"Depurazione delle acque del Bacino del Tevere. Risanamento e trattamento delle acque. Intervento del Comune di Roma-Rio Galeria (Adduttrici acque nere e impianto di depurazione località Casalotti)"- Finanziamento 40 miliardi.*

In origine l'importo dell'intervento era di 75 miliardi ed il soggetto beneficiario la Regione Lazio.

Successivamente l'importo dell'intervento è stato ridotto da 75 a 40 miliardi ed attribuito al Comune di Roma quale soggetto beneficiario.

L'intervento è stato completamente definanziato poiché in fase di progettazione definitiva si è evidenziata la necessità di realizzare un depuratore nella parte terminale dell'adduttrice in località Pantan Monastero, che ha comportato l'adozione di una variante di Piano regolatore preliminare all'esproprio e ciò ha messo in discussione i tempi preventivati.

L'intervento sarà comunque realizzato, poiché successivamente al definanziamento, è stato inserito nel Programma di Roma Capitale, con l'assegnazione di risorse a valere sullo stanziamento per il 1998 della legge n. 396/90.

Il progetto e la variante sono stati, nel frattempo approvati ed è in corso il provvedimento deliberativo per l'indizione della gara di appalto.

D.04.01 – *"Linea tranviaria Archeotram" Finanziamento 56 miliardi.*
C.03.05 – *"Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram" Finanziamento 20 miliardi.*

I due interventi, facenti capo ad una stessa opera, sono stati definanziati con DM 8 maggio 1998 in quanto valutati non fattibili in tempi compatibili con le celebrazioni giubilari.

Il progetto non era giunto a sufficiente maturazione, in particolare per quello che riguarda la tratta dalla via Appia Antica alla Piramide.

Le FS che in precedenza si erano dichiarate disponibili a consentire il passaggio della linea nelle aree di loro pertinenza, in sede di conferenza di servizi, hanno ritirato la loro disponibilità rendendo necessaria una variante di percorso che ha messo in discussione la realizzabilità dell'opera nei tempi giubilari.

Il progetto, seppure definanziato, è in via di definizione per essere realizzato successivamente al Giubileo con fondi ordinari del Comune.

D.07.01 - *"Sottopasso di Castel S. Angelo: costruzione di un sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione di scambio-parcheggio per 25 pullman"- Finanziamento 169 miliardi.*

Il Sottopasso di Castel Sant'Angelo è l'opera più rilevante tra quelle definanziate.

L'intervento prevedeva la costruzione di una galleria stradale destinata ad assorbire il traffico veicolare del lungotevere allo scopo di pedonalizzare l'area antistante Castel Sant'Angelo, Piazza Giovanni XXIII (che consente il collegamento tra l'area antistante il Castello e via della Conciliazione) e Lungotevere in Sassia davanti all'ospedale S. Spirito.

L'intervento ha avuto due distinte fasi progettuali.

Nella prima fase è stato individuato un percorso sotterraneo da realizzare con la tecnica dello scavo a cielo aperto ad una quota di poco inferiore all'attuale piano di scorrimento viario sul Lungotevere.

Questa soluzione è stata abbandonata con decisione del 30 luglio 1997, in quanto la Commissione Interministeriale di vigilanza ha verificato che il tunnel avrebbe intercettato reperti ritrovati nel corso degli scavi, riconosciuti di grande pregio e non rimuovibili.

In quell'occasione è stata impostata una nuova progettazione che prevedeva un tunnel da realizzare a quote inferiori del precedente ma sempre lungo lo stesso percorso.

Il nuovo tunnel, situato a circa 20 metri sotto il piano di calpestio, si sarebbe dovuto realizzare con uno scavo in galleria mediante l'uso di una macchina speciale.

A dicembre del 1998 però, a seguito delle valutazioni espresse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed in considerazione delle necessità di approfondire ulteriormente lo studio geologico per evitare rischi della stabilità di Castel Sant'Angelo, la Commissione ha definitivamente deliberato, data l'impossibilità di poter concludere i lavori in tempo utile per le celebrazioni giubilari, il definanziamento dell'intervento e finanziato il c.d. "Sottopassino" o "Sottovia del Lungotevere in Sassia", di dimensioni più contenute, ma comunque utile al raggiungimento dell'obiettivo di

decongestionamento viario dell'area e di collegamento al parcheggio sul Gianicolo in corso di realizzazione.

D.09.01 - *"Stazione Tiburtina" - Finanziamento 150 miliardi.*

L'intervento è stato parzialmente definanziato con DM 16/7/98, riducendo lo stanziamento iniziale di 34 miliardi.

Il progetto della Stazione Tiburtina comprende sostanzialmente 4 diverse opere tra loro connesse:

1. il completamento, l'ammodernamento e la meccanizzazione della galleria pedonale (sottostante i binari) la quale dal binario 17 verrà prolungata fino al binario 24, per raggiungere il fronte Pietralata della stazione.
2. il nuovo assetto del piano del ferro, con l'ampliamento degli attuali marciapiedi, che verranno portati ad una larghezza di 9 metri e la nuova conformazione del fronte Pietralata della stazione.
3. la realizzazione sul sedime dell'area ferroviaria della nuova tangenziale Est per il tratto che va dalla via Monti Tiburtini (Ponte Lanciani) all'immissione del tratto urbano della A-24 nella tangenziale, all'altezza del cimitero del Verano.
4. la costruzione della piastra della stazione ponte che coprirà l'intero fascio di binari e relativa copertura, con la quale si andrà a realizzare un galleria sopraelevata dell'altezza di circa 10/12 metri.

Il definanziamento di 34 miliardi riguarda quest'ultima componente dell'opera di ristrutturazione della stazione Tiburtina.

La piastra e la relativa galleria ponte hanno subito rallentamenti nel corso della progettazione, a seguito delle prescrizioni e relativi aggiustamenti richiesti dalla Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Roma.

La realizzazione di questa parte dell'opera verrà comunque realizzata, senza soluzione di continuità, rispetto alle altre parti, con i fondi delle FS.

D-12-01 - *"Tratto viario Olimpica-Pineta Sacchetti (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italico e via Pineta Sacchetti - Finanziamento 100 miliardi.*

Il progetto del "passante a nord-ovest" che prevedeva la realizzazione di un tunnel viario a quattro corsie di marcia, tra la via Olimpica e via Trionfale, al momento dell'inserimento nel Piano del Giubileo era ancora allo stadio di definizione progettuale di livello preliminare.

I successivi approfondimenti progettuali, connessi alla complessità dell'opera e ai numerosi problemi di impatto ambientale da risolvere, hanno comportato significative modifiche onde pervenire alla migliore soluzione progettuale.

Ciò ha comportato, da un lato, una notevole dilazione dei tempi prevedibili per la realizzazione con l'impossibilità di ottemperare agli obblighi di completamento dell'opera entro i termini prescritti dalla legge n. 651/96 e, dall'altro, una forte lievitazione dei costi, che sono passati da 100 a 215 miliardi.

In considerazione di ciò l'opera è stata parzialmente definanziata ed inserita nel piano di investimenti del bilancio comunale per l'anno 1998. A valere sui fondi ex lege n. 651/96 sono comunque rimasti 8,3 miliardi da sommarsi ai 1,7 miliardi già destinati all'opera con i fondi di cui alla legge n. 396/90.

Il progetto definitivo è stato completato e sarà esaminato in una prossima conferenza di servizi convocata per il marzo del 1999.

D-18-01/1 - *"Linee A e B" della metropolitana – Nodo di Termini – Ristrutturazione del nodo di scambio tra le due stazioni- Finanziamento 40 miliardi.*

L'opera è finalizzata a migliorare la funzionalità dei collegamenti pedonali tra le due stazioni di Termini della metro A e della metro B, attualmente assai problematici, a causa della lunghezza e tortuosità dei percorsi.

Per provvedere alla ristrutturazione del nodo di scambio tra le due stazioni sono state eseguite in prima battuta una serie di opere provvisionali (per il mantenimento del servizio) e di opere propedeutiche (ai lavori veri e propri di ammodernamento, di abbreviazione dei percorsi e meccanizzazione degli stessi tramite scale mobili e tapis roulant) che hanno comportato una spesa di 10 miliardi.

I lavori propedeutici di scavo hanno messo in luce, dietro e al di sotto delle pareti delle gallerie pedonali una serie di reperti murari antichi, già fortemente intaccati e resi in gran parte inintelligibili dai lavori della metro B completati in occasione del giubileo del 1950.

Questi ritrovamenti hanno determinato comunque un supplemento di indagini archeologiche, imposte dalla competente Soprintendenza di Roma, che hanno inevitabilmente comportato un allungamento dei tempi oltre il limite dell'inizio dell'anno giubilare e quindi il definanziamento dell'opera per i residui 30 miliardi.

Tale deliberazione non ha tuttavia annullato l'esecuzione di quest'opera di grande importanza, che è stata finanziata con i fondi ordinari del Comune di Roma. Attualmente le opere di ristrutturazione del nodo sono in corso di realizzazione.

D.19.01 - *"Nodi di scambio (Roma), connessioni con metropolitane e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminio, Anagnina"- Finanziamento 40 miliardi.*

Nel corso di progettazione dei succitati nodi di scambio si è sempre più evidenziata la necessità di predisporre programmi unitari complessi per ciascuno dei quattro siti.

Nei quattro nodi di scambio figurano infatti opere ed infrastrutture che fanno capo a competenze molto diverse (ANAS, COTRAL, FS, ENEL, ACEA etc.), che richiedono l'inquadramento in un progetto urbanistico generale che renda compatibili tra loro tutti gli obiettivi ed i progetti che fanno capo a diversi interlocutori.

E' stato pertanto necessario desistere da una progettazione affrettata che si sarebbe rivelata difficilmente realizzabile nei tempi prescritti ed è stato deliberato il definanziamento dell'intervento nella sua globalità.

Per i nodi di scambio, Trionfale-Ipogeo degli Ottavi e Flaminio-Saxa Rubra il Comune ha avviato la progettazione urbanistica particolareggiata con un finanziamento di due miliardi da reperirsi nell'ambito dei finanziamenti del Programma per Roma Capitale.

D.19.02 - *"Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e 'Passante dei laghi'"- Finanziamento 40 miliardi.*

L'intervento riguarda i nodi di scambio delle Stazioni Aurelia e Ostiense.
Alla Stazione Aurelia sono stati destinati 10 miliardi per il nodo di scambio gomma-rotaia costituito da un parcheggio per 45 posti bus, 30 posti auto e relative corsie di afflusso e deflusso connesse direttamente alla stazione Aurelia.
Questa opera è stata confermata ed è in corso di esecuzione.
Gli altri 30 miliardi per i quali è stato decretato il definanziamento erano invece destinati al nodo di scambio del Terminal Ostiense che prevede questa serie di opere:

- ampliamento del viadotto della Via Cristoforo Colombo sulla ferrovia con sistemazione viaria di via Capitan Bavastro e corsie di accesso e deflusso dalla via Cristoforo Colombo.
- Nuova sistemazione del parcheggio esterno all'Air Terminal Ostiense.
- Sottopassaggio pedonale ferroviario da costruire ex novo tra l'Air Terminal ed il binario 8 situato nella zona mediana del fascio dei binari della stazione Ostiense, ove corrono i binari dedicati al passante ferroviario dei laghi, che collega la stazione Ostiense con la stazione S. Pietro idoneo a facilitare l'afflusso dei pellegrini all'area del Vaticano.

Il definanziamento di questa opera è stato determinato dalla complessità dei problemi urbanistici da risolvere che non hanno consentito di pervenire in tempo utile alla progettazione definitiva

E.01.23 - *"Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) Terminal Ostiense"- Finanziamento 7.140 milioni.*

Per il Giubileo, al fine di rendere più efficiente il servizio di smaltimento di rifiuti, sono state proposte dall'AMA, la municipalizzata cui compete tale servizio, una serie di zone attrezzate ove poter svolgere il lavoro di scambio del carico di rifiuti tra i mezzi più piccoli e più agili (piccole compattatrici, spazzatrici e furgoni con cassone aperto) e quelli di maggior capienza destinati a raggiungere le discariche.

Nell'ambito del programma per il Giubileo sono state individuate 20 aree intermedie attrezzate.

Per tre di esse: Bravaria, ex Caserma Pepe e Terminal Ostiense (quella in esame il cui costo richiedeva un finanziamento superiore alle altre) è stato decretato il definanziamento a seguito della sopravvenuta indisponibilità dell'area, pur di proprietà comunale, da mettersi in relazione con la scarsa compatibilità con altri programmati impieghi delle aree circonvicine.

2.4 Gli Accordi di Programma e le Conferenze di Servizi

La legge n. 651/96 recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", pur nella sua natura di "legge speciale", non ha inteso introdurre alcuna deroga in materia di procedure inerenti i "lavori pubblici"; al contrario, al comma 6 dell'art. 1 si è ribadita l'assoluta "ordinarietà" delle disposizioni da applicare agli interventi finanziati ai sensi della legge medesima, richiamando esplicitamente l'applicazione della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi ricompresi nel Piano, in ordine all'iter degli adempimenti amministrativi, hanno pertanto potuto beneficiare delle procedure di snellimento già previste dell'ordinamento legislativo vigente; in particolare si è fatto ampio ricorso agli istituti della "conferenza di servizi" e dell'"accordo di programma", già peraltro positivamente sperimentati in relazione all'attuazione degli interventi ricompresi nel Programma per Roma Capitale, di cui alla legge n. 396/90, legge che , fra l'altro, aveva introdotto alcune importanti innovazioni proprio in relazione agli istituti in questione.

Come si può evincere dalla tabella di seguito riportate, numerosi "accordi di programma " si sono resi necessari per tutte le opere per la cui realizzazione si rendeva necessaria una variante agli strumenti urbanistici vigenti e segnatamente per quelle afferenti il settore della viabilità. Sono inoltre in corso di sottoscrizione gli accordi relativi ai seguenti interventi: D.14.03 - S.P. Laurentina ; D.13.08 - S.P. San Marino - Due Santi; C.18.04 - Bosco di Cave – Castelli Romani, nonché quello relativo alla "Area grandi eventi", individuata, dopo complesse ricerche e trattative, a Tor Vergata.

Anche l'istituto della "conferenza di servizi" è stato ampiamente utilizzato, come evidenziato dal lungo elenco di seguito riportato, che testimonia l'enorme sforzo cui sono state sottoposte le pubbliche amministrazioni e segnatamente quella del Comune di Roma, per far fronte al massiccio e contemporaneo avvio di numerosissimi interventi, molto sovente contraddistinti da complessi iter autorizzativi.

Sempre in merito alle "conferenze di servizi", come già precedentemente ricordato, al Commissario Straordinario di Governo è stato attribuito il compito di promuoverne la convocazione, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127.

Si segnala, infine, che, al fine di favorire la partecipazione anche di soggetti privati al conseguimento delle finalità del Piano, il comma 6, art. 1 della legge 7 agosto 1997 n. 270, concernente il Piano degli interventi per il Giubileo fuori del Lazio, ha previsto la possibilità di inserimento nel Piano stesso di interventi realizzati da privati, ai soli fini, però, dell'applicazione agli stessi degli snellimenti procedurali previsti dalla legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Tale disposizione è stata estesa anche agli interventi proposti da privati e ricadenti all'interno della Regione Lazio.

ACCORDI DI PROGRAMMA

Codice			Oggetto	Data Accordo	Pubblicazione sul B.U.R.
A	07	01	Convitto ITA "Garibaldi"(Roma)	18/03/97	13/97
A	07	29	Area attrezzata sosta campers (Frasso Sabino)	16/03/98	15/98
B	19	31	Riqualificazione Borgo di Farfa e restauro Monastero (Fara Sabina)	24/04/98	17/98
B	19	26	Santuario Fonte Colombo (Rieti)	07/07/98	27/98
C	18	02	Santuario della Mentorella (Capranica Prenestina)	26/05/98	20/98
D	08	03	Interconnessioni tra il parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	19/03/98	Approvato
D	10	01	Autostrada Roma Fiumicino. Realizzazione terza corsia. Lotto 2° e 3°	07/01/98	Approvato
D	13	01	Parcheggio di Ciampino	25/11/98	01/99
D	13	02	Parcheggio a raso per nodo di scambio Colleferro /Roma a servizio traffico linea Roma - Cassino	11/06/98	23/97
D	13	03	Parcheggio di scambio a Zagarolo	21/05/97	20/97
D	13	05	Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli	16/06/97	25/97
D	13	06	Parcheggio a raso per il nodo di Civitavecchia	16/06/97	25/97
D	13	07	Parcheggio a raso per il nodo di scambio di Ladispoli	25/06/97	25/97
D	13	10	Strada Pedemontana dei Castelli	26/05/98	20/98
D	13	11	S.P. Maremmana II	11/03/98	12/98
D	13	12	Collegamento S.P. Nomentana - S.P. San Martino - Via Vallagati (Monterotondo - Roma)	22/04/98	Approvato
D	14	05	S.P. Tiberina	06/08/98	25/98
D	14	06	S.P. Settecamini (Guidonia Roma) Raddoppio rete stradale	19/12/98	Approvato
D	14	07	S.P. Pratica di Mare	06/08/98	25/98
D	14	08	Collegamento S.P. Settecamini - S.P. Pantano - SS 636 Maremmana.	19/12/98	Approvato
D	18	02/2	Potenziamento Ferrovie concesse : Roma Nord	05/03/98	Approvato

CONFERENZE DI SERVIZI

N.	Codice			Oggetto	Data	Esito
1	C	09	02/1	Riqualificazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica). Sistemazione del Parco della Caffarella	29/01/98	Approvato
2	D	08	03	Progetto nodo Piazza Rovere	29/01/98	Approvato
3	A	05	01/1	S.Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane.(Risanamento parco)	30/01/98	Approvato
4	A	05	01/2	S.Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane.(Parcheggi)	30/01/98	Approvato
5	A	05	01/3	S.Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane.(Manutenzione straord. Padiglioni direz.))	30/01/98	Approvato
6	A	05	01/4	S.Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane.(Manutenzione ordin. cappella e 3 padiglioni)	30/01/98	Approvato
7	A	05	01/5	S.Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane.(Ristrutturazione 5 padiglioni))	30/01/98	Approvato
8	A	05	02	Ex Colonia marina Vittorio Emanuele III	03/02/98	Approvato
9	D	14	06	Potenziamento S.P. Settecamini	19/02/98	Approvato
10	D	14	08	Prolungamento S.P. Settecamini	19/02/98	Approvato
11	E	02	03	Complesso ospedaliero S. Eugenio Realizzazione dipartimento emergenza accettazione (1° stralcio funzionale)	20/02/98	Rinviata
12	C	01	10	Piazze S. Pietro in Vincoli, S.Prassede.... Riqualificazione ambientale, risagomatura strade, ripristino selciati.	23/02/98	Approvato
13	C	03	01	Ristrutturazione sede stradale via Giubbonari.	26/02/98	Approvato
14	C	03	02	Ristrutturazione Piazza della Minerva	26/02/98	Approvato
15	C	04	15	Riqualificazione Appia Antica.	27/02/98	Approvato
16	C	01	12	Percorso "C" autobus turistici .	04/03/98	Approvato con prescrizioni.
17	C	01	13	Percorso "D" autobus turistici .	04/03/98	Approvato
18	C	12	04/2	Villa Doria Pamphily. Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini di villa Vecchia.	13/03/98	Approvato
19	C	01	22/1	Villa Doria Pamphily. Restauro Casale di Giovio	16/03/98	Approvato
20	C	01	22/2	Villa Doria Pamphily. Restauro e allestimento museale Cascina Falsetti.	16/03/98	Approvato
21	A	01	06	Comunità alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione immobile a Vigne Nuove	26/03/98	Approvato

22	C	12	04/1	Villa Doria Pamphily. Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del teatro.	09/04/98	Approvato
23	B	19	56	Abbazia Montecassino - area esterna	15/04/98	
24	D	08	03	Parcheggio del Gianicolo e viabilità	15/04/98	Approvato
25	C	11	04	Area archeologica del Celio	16/04/98	Approvato
26	E	02	02	Ospedale S. Giovanni	16/04/98	Approvato
27	D	09	01	Infrastrutture area stazione Tiburtina	23/04/98	Rinviata
28	E	02	03	Ospedale S. Eugenio	30/04/98	Approvato
29	E	01	01	Automezzi e attrezzature per il territorio comunale	04/05/98	Approvato
30	C	01	24	Restauro e recupero Villino Corsini	05/05/98	Approvato
31	C	01	26	Riqualificazione area Teatro Marcello	07/05/98	Approvato
32	E	01	11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Sede di zona via Gomenizza	11/05/98	Approvato
33	E	01	13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Sede di zona via Giolitti	11/05/98	Approvato
34	E	01	15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Sede di zona Arco di Travertino	11/05/98	Approvato
35	E	01	17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Sede di zona via Bellami	11/05/98	Approvato
36	E	01	18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Area intermedia attrezzata	11/05/98	Approvato
37	E	01	25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Sede di zona Tor di Quinto	11/05/98	Approvato
38	E	01	26	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Potenz. Area intermedia via Campoboario	11/05/98	Approvato
39	C	11	06	Parco del Celio.Immobile in uso all'ordine di Suor Tertesa di Calcutta	15/05/98	Approvato
40	D	18	02/2	Riqualificazione e potenziamento Ferrovia Roma Nord	19/05/98	Parere sospeso per PRG
41	B	01	01	Area del grande Campidoglio	22/05/98	Approvato
42	E	01	08	Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali	25/05/98	Approvato
43	B	02	01.3	Area archeologica Fori Imperiali. Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.	28/05/98	Sospesa
44	C	11	03	Parco del Celio.Restauro ex palestra dei vigili.	28/05/98	Sospesa
45	D	18	02/2	Ferrovie Concesse. Potenziamento linea Roma Nord.	02/06/98	Rinviata
46	E	02	04	Ospedale G.B.Grassi di Ostia	04/06/98	Approvato
47	F	01	02	Cinema Castello - Centro servizi stampa	05/06/98	Rinviata
48	B	04	01	Palazzo delle Esposizioni - Progetto restauro ed adeg. Funzion. e Tecnolog.	09/06/98	Approvato

49	C	03	04	Area pedonale del Colosseo	09/06/98	Approvato
50	C	11	01.1	Parco del Celio - Via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali.restauro e manut.	09/06/98	Approvato
51	C	11	01.2	Parco del Celio - Sistemazione dei percorsi pedonali e carrabili, integrazione illuminazione e nuovi impianti.	09/06/98	Approvato
52	C	11	07	Lavori di restauro del Pulpito di S. Domenico	09/06/98	Approvato
53	C	13	01.1	Lavori di restauro dei Casali Mellini nel Parco di Monte Mario.	09/06/98	Rinviata
54	B	02	01.1	Area archeologica Fori Imperiali. Allestimento del Museo dei Fori Imper. e Mercati Traianei	16/06/98	Sospesa
55	C	01	25	Villa Doria Pamphili - Recupero e restauro Arco dei quattro Venti	16/06/98	Approvato
56	C	12	03	Villa Doria Pamphily. Bonifica e recupero vegetazione della Valle dei Daini.	17/06/98	Approvato
57	E	01	24	Sedi di zona e aree intermedie(Roma). Realizzazione area intermedia attrezzata Via Acquafredda (1° LOTTO)	17/06/98	Rinviata
58	E	01	28	Nuovo stabilimento AMA a Roma Nord (1° LOTTO)	17/06/98	Approvato
59	E	01	29	Nuovo stabilimento AMA a Roma Sud (1° LOTTO)	17/06/98	Approvato
60	C	19	01/b	Risanamento e trattamento acque.Sistemazione idraulica fosso Acqua Mariana	25/06/98	Rinviata
61	D	19	04	Nodo di scambio Valle Aurelia	25/06/98	Approvato
62	C	13	01/1	Parco di Monte Mario - Recupero dei Casali Mellini	26/06/98	Approvato
63	F	01	02	Sala stampa - Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizionedei mass media	03/07/98	
64	E	03	02/4	Lavori di straordinaria manutenzione restauro e adeguamento impianti di porzione del fabbricato "ex Istituto Luce"	13/07/98	Sospesa
65	A	01	21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro di servizi socio-sanitari. Recupero edilizio ex Convento S. Bartolomeo all'Isola.	23/07/98	Approvato
66	E	02	02/3	Ospedale S. Giovanni. Restauro Ospedale antico	27/07/98	Approvato
67	E	01	22/1	Ristrutturazione Area Intermedia Attrezzata Via Sannio	28/07/98	Approvato
68	E	01	30	Servizi igienici pubblici. Realizzazione e ristrutturazione attrezzature igieniche fisse.	28/07/98	Rinviato
69	C	09	02/2	Riqualificazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica). Restauro manufatti storici.	29/07/98	Approvato
70	D	18	02/2	Riqualificazione e potenziamento Ferrovia Roma Nord	30/07/98	Approvato
71	E	03	02/1	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative dell'edificio sito in viale Trastevere 18 - Roma	26/08/98	Approvato

72	E	03	02/2	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative dell'edificio sito in via Ferruccio 9 - Roma	26/08/98	Approvato
73	E	03	02/3	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative dell'edificio sito in viale Togliatti 987 - Roma	26/08/98	Approvato
74	E	03	02/5	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative dell'edificio sito in via della Consolazione 4 - Roma	26/08/98	Approvato
75	C	01	21/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche	03/09/98	Approvato
76	C	01	23	Villa Doria Pamphilj (Roma) : restauro arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro.	03/09/98	Approvato
77	E	03	02/4	Lavori di straordinaria manutenzione restauro e adeguamento impianti di porzione del fabbricato "ex Istituto Luce"	10/09/98	Approvato
78	C	13	1/2	Parco di Monte Mario e Casali Mellini - Monte Mario : consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	14/09/98	Approvato
79	C	02	1.1	Area della Basilica di S.Pietro in Vaticano. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture e rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza.	15/09/98	Sospesa
80	C	02	2.2	Area della Basilica di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture e rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza.	15/09/98	Sospesa
81	C	02	3.1	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture e rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza.	15/09/98	Sospesa
82	C	01	18/1	Villa Borghese Portico dei leoni ecc.	18/09/98	Approvato
83	C	01	18/2	Villa Borghese propilei egizi ecc.	19/09/98	Approvato
84	C	04	04	Area Castel Gandolfo Potenziamento infrastrut. Fermata la villetta	21/09/98	Approvato
85	C	07	01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis-Catacombe di S. Marcellino. Sistemazione delle aree a verde.	24/09/98	Approvato
86	C	08	01/2	Restauro del Parco di Villa Borghese	28/09/98	Rinviata
87	E	01	30	Servizi igienici pubblici. Realizzazione e ristrutturazione attrezzature igieniche fisse.	12/10/98	Approvato
88	C	02	04	Itinerari giubilari e storici. Contributo alla manutenzione delle sedi stradali.	15/10/98	Approvato

89	C	11	05	Recupero dell'area di S.Gregorio al Celio recupero delle aree a verde di S.Gregorio al Celio, ex antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	23/10/98	Approvato
90				Croce Rossa	27/10/98	Propedeutica Approvato
91	C	06	01	Giardini di S. Giovanni e Via Carlo Felice (Roma). Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	28/10/98	Approvato
92	D	18	04	Stazione Termini	03/11/98	Approvato
93	C	01	21/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) : sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati.	13/11/98	Approvato
94				Tor Vergata	20/11/98	Propedeutica Approvato
95	C	02	05	Intervento di adeguamento dei parcheggi a disposizione delle catacombe aperte al pubblico in Roma.	23/11/98	Approvato
96	A	01	29	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia per famiglie disagiate	25/11/98	Approvato
97	C	05	1.1	Giardini di Castel S. Angelo - Lavori di recupero infrastr. e vegetaz.: giardini dei bastioni	16/12/98	Rinviato
98	C	05	1.2	Giardini di Castel S. Angelo - Lavori di recupero fossato	16/12/98	Rinviato
99	B	20	02	Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Piccolomini	21/12/98	Approvato

2.5 I rapporti tra la Santa Sede e lo Stato Italiano

Il comma 13, art.1, della legge n. 651/96 prevede che : "*I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stati Italiano, delle modalità di attuazione degli interventi*".

Nella stesura iniziale del Piano (settembre 1996), l'unica opera prevista nel territorio dello Stato Città del Vaticano e parzialmente finanziata dallo Stato Italiano, era quella relativa al "Parcheggio in area Gianicolo"(D.08.02).

Lo scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la realizzazione dell'opera suddetta è avvenuto tra il 3 ed il 19 dicembre 1997.

Dal carteggio, emerge che:

- la Santa Sede, per la costruzione del parcheggio nell'area di sua proprietà in zona extraterritoriale, intende avvalersi dei diritti di cui al 2° comma dell'art.16 del Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929, diritti che conferiscono alla Santa Sede di dare ai suddetti immobili l'assetto che crede, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali e comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la chiesa cattolica;
- ad avvenuta realizzazione dell'opera la Santa Sede procederà alla sospensione del privilegio per quanto attiene all'uso del manufatto in ragione della sua destinazione a parcheggio, al quale verrà applicata la normativa e la giurisdizione italiana;
- sul costo totale del progetto, previsto in 85 miliardi di lire italiane, il Governo della Repubblica darà un contributo di 40 miliardi di lire ai sensi della legge 651/96 e della deliberazione n.7/97 del 4 giugno 1997 della Commissione per Roma Capitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le interconnessioni del parcheggio con il sistema di viabilità esterno sono a carico dello Stato italiano; le relative opere saranno realizzate dal Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio;
- l'affidamento dei lavori è regolato dall'ordinamento giuridico della Santa Sede, ma nel contratto di appalto è stato convenuto, in linea di massima, un rinvio alla normativa italiana in materia;
- in tema di accesso e di facilitazioni di agibilità di area il Comune di Roma provvederà a garantire un'appropriata disciplina della sosta nelle aree circostanti ed a mantenere in perpetuo, gratuitamente, l'uso del suolo pubblico per le uscite sia pedonali che veicolari.

Il Governo della Repubblica Italiana si è impegnato a corrispondere il relativo finanziamento direttamente alla Santa Sede in tre soluzioni e precisamente:

- il 50% alla comunicazione di avvenuto inizio lavori;
- il 40 % alla notifica dell'avvenuta utilizzazione dell'80% del primo acconto;
- il 10% su certificazione dell'avvenuto completamento dell'intervento.

Il 15 luglio 1998 è poi intervenuto un ulteriore scambio di note tra la Santa Sede ed il Governo della Repubblica Italiana, in ordine alla realizzazione dei lavori concernenti le Basiliche patriarcali di S. Paolo fuori le Mura, S. Giovanni in Laterano e S. Maria Maggiore.

In particolare, con tale scambio di note si è convenuto che, l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori saranno disciplinati dall'ordinamento giuridico vaticano, assoggettandone la realizzazione al rispetto della normativa italiana in materia di impiantistica e di sicurezza sotto ogni profilo, oltre che di abbattimento delle barriere architettoniche.

La Santa Sede si è inoltre impegnata a realizzare le opere nel rispetto dei termini indicati nel Piano.

Per ciò che concerne le modalità di erogazione dei finanziamenti, sono stati ribaditi gli impegni già assunti in merito, con il precedente scambio di note, relativo al Parcheggio in area Gianicolo.

3 Il Piano a fine 1998

3.1 Sintesi del Piano e sue variazioni

Anche in ragione della complessità di molti degli interventi facenti parte del Piano, quest'ultimo ha subito, nel corso del 1998, numerose modifiche ed integrazioni ispirate sia, come si è già detto, alla volontà di rendere tale atto programmatorio sempre più aderente alle effettive esigenze emergenti in ordine alla celebrazione dell'evento giubilare, sia alla necessità di garantire la conclusione e la "piena funzionalità" delle opere, delle forniture e dei servizi, in una data utile ad affrontare i fabbisogni relativi all'afflusso dei pellegrini e dei visitatori a Roma e nella Regione Lazio.

Le variazioni fin qui apportate configurano, pertanto, le attuali caratteristiche che assume il Piano e ne individuano lo stato di definizione programmatica al 31 dicembre del 1998 (vedi Allegato 1).

Il Piano, a tale data, consta di 754 interventi complessivi, riconducibili ad 81 sotto-settori o ambiti complementari di azione, riferiti ai già ricordati sei settori di intervento in cui, ab origine, è stato articolato il Piano stesso e segnatamente: sociale ed accoglienza; beni culturali; manutenzione, arredo urbano e patrimonio ambientale; accessibilità e mobilità nell'area metropolitana; sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione; informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento

Il valore complessivo del Piano in termini di investimento è pari a circa Lit. 3.652,4 miliardi di lire (pari a 1.875 milioni di Euro). Il costo complessivo del Piano è coperto per 3.500 miliardi di lire (1.807 milioni di Euro) attraverso il finanziamento pubblico statale derivante dalla Legge 651/96 e per 181 miliardi (93,5 milioni di Euro) – corrispondenti a meno del 5% del costo totale del Piano - da altre fonti di finanziamento sempre pubbliche o di Enti ecclesiastici.

Per quanto attiene all'articolazione del Piano per soggetti beneficiari raggruppati per tipologia, il più alto numero di interventi, pari a 278, riguarda le amministrazioni comunali del Lazio (incluso il Comune di Roma), per un importo totale di finanziamento pari a 851,9 miliardi di lire (439,8 milioni di Euro) seguite dalle amministrazioni ed aziende centrali (inclusa FS S.p.A.) con 257 interventi pari a un finanziamento di 1.034,8 miliardi di lire (534,2 milioni di Euro). Altri soggetti locali hanno in carico la realizzazione di 157 interventi per 1.194,8 miliardi di lire (616,8 milioni di Euro) e 62 interventi sono ripartiti fra amministrazione regionale del Lazio

ed amministrazioni provinciali per un importo del finanziamento di 389,9 miliardi di lire (201,3 milioni di Euro). (Tab. 1 e Tav. 1)

La residuale cifra di 28,6 miliardi di lire (12, 4 milioni di Euro) è riferita, in quanto a 12,7 miliardi alla creazione di un fondo per fare fronte alla eventuale corresponsione di premi di accelerazione previsti negli atti di gara e nei relativi contratti, in favore degli esecutori di interventi compresi nel Piano, che ultimino i lavori in anticipo rispetto ai tempi contrattuali, sia per far fronte alle maggiori occorrenze dovute a varianti o ad accordi bonari; in quanto a 15,9 miliardi circa, a somme già trasferite, per progettazioni o altre occorrenze, ad interventi poi definanziati.

Tab. 1 - Sintesi degli interventi inseriti nel Piano al 31/12/1998

Tipologie di soggetti beneficiari	Interventi (N°)	Finanziamenti (miliardi di lire)	Cofinanziamenti (miliardi di lire)	Totale costo interventi (miliardi di lire)
Amministrazioni ed aziende centrali	257	1.034,8	51,3	1.086,1
Amministrazione regionale e provinciale	62	389,9	10,8	400,7
Amministrazioni comunali	278	851,9	14,8	866,7
Altri soggetti	157	1.194,8	104,1	1.298,9
Totale	754	3.471,4	181,0	3.652,4,8
Altro (1)	-	28,6	-	
		3.500,0		

(1) Tale voce include le somme già erogate per interventi poi definanziati ed il "fondo" accantonato per eventuali premi di incentivazione
Fonte: URCGE, 1999

Analizzando in dettaglio l'articolazione degli interventi fra i principali soggetti beneficiari (Tab. 2), si osserva che il 27,3% degli interventi (per un ammontare, però, del 9,1% dei finanziamenti) attiene alle iniziative di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, promosse e realizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Naturalmente i soggetti che per localizzazione sono maggiormente coinvolti nella preparazione e gestione dell'evento giubilare, vale a dire il Comune di Roma e le aziende ad esso collegate, risultano essere le più impegnate nella realizzazione, oltre che nella programmazione del Piano.

Difatti, il Comune di Roma e le aziende ad esso collegate risultano le amministrazioni ed i soggetti procedenti per la realizzazione di 210 interventi, pari al 27,8% del totale e con un importo complessivo pari al 40,6% dei finanziamenti messi a disposizione dallo Stato Italiano per il Giubileo nel Lazio.

Data la diversità degli ambiti di competenza, delle scelte di natura programmatoria e delle modalità operative che contraddistinguono i soggetti coinvolti nella realizzazione del Piano, si osserva che quest'ultimo è articolato in un insieme di interventi assai differenziati per dimensione ed i cui costi di realizzazione si discostano anche significativamente dal costo medio per intervento.

A fronte di una media di circa 5,1 miliardi di lire per iniziativa, gli interventi realizzati dal Comune di Roma sono quelli che si avvicinano maggiormente a tale dato, mentre l'importo medio è ampiamente superato dagli interventi promossi o in corso di realizzazione a cura delle amministrazioni ed aziende centrali (ad esclusione del Ministero per i beni le attività culturali i cui interventi sono contraddistinti da un costo medio particolarmente basso), nonché da quelli relativi alla Regione Lazio ed alle aziende collegate al Comune di Roma, che presentano valori rispettivi superiori ai 10 miliardi per intervento.

La dimensione dell'intervento, in termini di complessità realizzativa e di costo, ha inciso fortemente sulla concreta attuazione del programma. Se infatti si confronta il valore medio degli interventi per ente attuatore e la percentuale degli stessi avviati ed in fase di realizzazione, si evidenzia un rapporto di avanzamento inversamente proporzionale alla dimensione di ciascun intervento.

Tab. 2 - Piano degli interventi relativi al Giubileo nel Lazio per principali categorie di beneficiari (situazione al 31/12/1998)

Soggetti beneficiari	Interventi		Finanziamento		Costo complessivo degli interventi		Costo medio per intervento
	n°	%	miliardi di lire	%	miliardi di lire	%	milioni di lire
Ministero per i beni e le attività culturali	206	27,3	317,3	9,1	364,3	9,4	1.768
Altre amministrazioni ed aziende centrali	51	6,8	717,5	20,7	721,7	23,8	14.15
Regione Lazio	16	2,1	214,2	6,2	218,8	5,6	13.678
Amministrazioni provinciali	46	6,1	175,7	5,0	181,9	4,7	3.954
Comune di Roma	139	18,4	697,3	20,1	723,6	18,6	5.206
Aziende del Comune di Roma	71	9,4	727,6	20,5	769,4	19,8	10.836
Altre amministrazioni comunali	139	18,4	154,6	4,4	168,4	4,3	1.211
Enti religiosi	36	4,8	95,8	2,8	142,6	3,7	3.961
Altri soggetti	50	6,6	371,4	10,7	386,9	10,0	7.738
Totale	754	100,0	3.471,4	100,0	3.652,4	100,0	5.148

Fonte: URCGE, 1999

A fronte infatti di 51 interventi programmati dalle amministrazioni centrali, il cui valore è di circa 3 volte superiore alla media, ne risultano in fase di realizzazione 21 con una quota del 41,1%, inferiore al valore medio dell'intero Piano. Tale andamento trova conferma sia per ciò che concerne gli interventi di competenza della Regione Lazio, che per quelli attuati dalle aziende del Comune di Roma, o comunque ad esso collegate (Tab. 3).

Tab. 3- Rapporto tra costo medio degli interventi ed avanzamento nella realizzazione

		Costo medio degli interventi		Stato di avanzamento degli interventi		
				Programmati	In fase di realizzazione (2)	
		Miliardi di lire	N. indice valore medio =100	n.	n.	% su interventi programmati
1)	Ministeri ed aziende centrali (1)	14,1	276	51	21	41,1
2)	Regione Lazio	13,7	267	16	6	37,5
3)	Aziende del Comune di Roma	10,4	204	57	13	22,8
4)	Altri soggetti	8,5	167	64	29	45,3
5)	Comune di Roma	5,2	101	139	63	45,3
	Valore medio	5,1	100	754 (3)	507 (3)	67,2
6)	Amministrazioni provinciali	4,0	77	46	31	67,4
7)	Enti religiosi	4,0	77	36	23	63,9
8)	Ministero beni e attività culturali	1,8	34	206	202	98,0
9)	Altre amministrazioni comunali	1,2	24	139	118	84,9

(1) Escluso Ministero per i beni e le attività culturali
(2) Situazione al 31.12.1998
(3) Numero totale interventi
Fonte: URCGE, 1999

All'estremo opposto si colloca il Ministero per i beni e le attività culturali, con un valore per intervento inferiore al 34% del valore medio, ed un tasso di attuazione pari al 98%. Si può pertanto concludere che, in termini di attuazione, per i ristretti tempi di programmazione e di progettazione degli stessi, alla fine del 1998, risultano in avanzata realizzazione le attività previste da amministrazioni fortemente strutturate, con impegni relativamente circoscritti e di piccola dimensione.

Il Piano è articolato in una serie di obiettivi differenziati per tipologie. Si è già rilevato come una parte assai significativa di questi riguarda la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

Complessivamente a questa categoria appartengono 352 interventi sui complessivi 754, con un finanziamento accordato pari al 16,1% del totale (Tab. 4).
La quota di interventi in fase di realizzazione per questa categoria è pari all'85,8% (302 su 352 programmati). In termini di incidenza sul finanziamento complessivo il settore a maggiore assorbimento di risorse riguarda la accessibilità e la mobilità cui sono

destinati 1.372,4 miliardi di lire (pari a 708,5 milioni di Euro) e corrispondenti al 39,5% del finanziamento complessivo; si tratta di 63 interventi, dei quali risultano in fase di realizzazione 37 (pari al 58,7% del complesso).

Tab. 4 - Settori e sotto-settori di intervento (al 31/12/1998)

Settori	Sotto-settori	Interventi	Finanziamento accordato		Costo complessivo		Quota di cofinanziamento	Interventi in realizzazione	
	n.	n.	milioni	%	milioni	%	%	n.	%
A. Sociale e Accoglienza	7	85	300.342	8,7	323,469	8,9	7,1	59	69,41
B. Beni culturali	17	352	557.320	16,1	607.971	16,6	8,3	312	88,64
C. Manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale	18	136	571.217	16,5	572.217	15,7	0,2	62	45,59
D. Accessibilità e mobilità nell'Area Metropolitana	18	63	1.372.361	39,5	1.417281	38,8	3,2	37	58,73
E. Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione	7	104	489.717	14,1	551.117	15,1	11,1	32	30,77
F. Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	3	14	180.359	5,2	180.359	4,9	0,0	5	35,71
Totale	70	754	3.471.407	100,0	3.562.415	100,0	5,0	507	67,2

Fonte: URCGE 1999

Di particolare rilievo, sia per numerosità che per impegno finanziario, sono gli interventi destinati alla manutenzione, alla rete urbana ed alla tutela dell'ambiente: 136 interventi che assorbono il 16,5% dei finanziamenti complessivi.

La realizzazione di questi progetti risulta particolarmente complessa e per tale ragione quelli in corso di realizzazione coprono il 37,5% del totale (51 sui 136 programmati).

Uno dei settori strategicamente più importanti per il Piano, attiene l'accoglienza ed il "sociale", vale a dire quell'insieme di interventi finalizzati alle categorie disagiate; in tale settore al quale afferiscono 85 progetti per una quota dell'8,7% del finanziamento totale. Gran parte di questi progetti sono in corso di realizzazione e la quota in attuazione si attesta attorno alla media generale.

Di particolare importanza sono i programmi relativi ai servizi speciali (sicurezza, sanità, ecc.) ed alla formazione delle figure professionali che saranno maggiormente

coinvolte nella gestione quotidiana dell'evento giubilare; il settore di cui fanno parte (E) concentra 104 progetti ed il 14% circa delle risorse complessive messe a disposizione, ma che vede una relativamente bassa capacità di spesa ed attuazione, visto che poco meno di 1/3 degli interventi sono stati attivati ed avviati.

Nel settore, infine, dell'informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento, da effettuarsi soprattutto attraverso sistemi informatici, sono previsti 14 interventi, cui è destinato il 5,2% delle risorse.

Per quanto riguarda la localizzazione degli interventi è, naturalmente, la città di Roma a concentrare su se stessa la gran parte delle necessità di supporto all'accoglienza dei flussi di pellegrinaggio che troveranno nella capitale il terminale dei diversi itinerari, in parte interessanti anche altre aree territoriali del nostro Paese (Tab. 5).

Tab. 5- Ripartizione degli interventi per localizzazione

Localizzazione	Numero		Finanziamento		Costo totale		Quota % cofinanziamento	Interventi in fase di realizzazione	
	n.	%	milioni	%	milioni	%	%	n.	%
Comune di Roma	499	66,2	2.578.005	74,3	2.732.934	74,8	5,7	308	61,72
Altri Comuni della Prov. di Roma	141	18,7	540.258	15,6	548.786	15,0	1,6	116	82,27
Totale Prov. Roma	640	84,9	3.118.262	89,8	3.281.720	89,8	5,0	424	66,25
Prov. di Frosinone	29	3,8	40.503	1,2	42.930	1,2	5,7	27	93,10
Prov. di Latina	32	4,2	36.434	1,0	41.649	1,1	12,5	20	62,50
Prov. di Rieti	20	2,7	41.336	1,2	45.239	1,2	8,6	18	90,00
Prov. di Viterbo	17	2,3	33.698	1,0	35.054	1,0	3,9	16	94,12
Senza riferimento territoriale	16	2,1	201.173	5,8	205.823	5,6	2,3	2	12,50
	754	100,0	3.471.407	100,0	3.652.415	100,0	5,0	507	67,20

Fonte: URCGE 1999

All'interno del territorio del Comune di Roma sono, infatti, concentrati 499 interventi su 754, per un importo complessivo di finanziamenti accordati di 2.578 miliardi di lire (pari a 1.330,9 milioni di Euro) ed una concentrazione del 74,3% di tutte le risorse disponibili. Nella città di Roma sono, attualmente, in fase di realizzazione 308 interventi dei 499 anzidetti, pari al 61,7% .

Anche gli altri comuni della provincia di Roma e, quindi, parte dell'hinterland metropolitano della città, sono interessati agli interventi per un ulteriore finanziamento di 540,3 miliardi di lire (pari a 278,9 milioni di Euro). In complesso nella provincia di Roma sono concentrati l'84,9% degli interventi e l'89,8% dei finanziamenti accordati.

Dei 507 interventi in fase di realizzazione 424 sono localizzati nella Provincia di Roma dove, quindi, la preparazione del Giubileo risulta in avanzata fase attuazione

Equilibrata appare inoltre la situazione programmatica ed attuativa in ordine alle altre provincie della Regione Lazio, sia come numero di interventi che come entità di finanziamenti attribuiti.

Per quanto attiene la struttura finanziaria del Piano si è già detto che esso è praticamente a totale carico del finanziamento statale, essendo la quota di cofinanziamento pari al 5% dell'importo globale del Piano stesso (Tab. 6).

Tale dato percentuale è comunque il frutto di una realtà assai differenziata che vede solo pochi soggetti impegnati con quote di cofinanziamento significative e comunque non superiori ad un terzo dell'investimento globale. E' questo il caso degli Enti religiosi e dell'azienda del Comune di Roma AMA.

Per ciò che concerne i dati relativi ai Comuni delle provincie del Lazio o delle provincie stesse, esclusa quella di Roma, va ricordato che la presenza di una percentuale di cofinanziamento superiore alla media è dovuta al fatto che per gli interventi afferenti il sotto-settore A.07 "Completamento della rete degli ostelli e dei campeggi nella città metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo" era previsto, fin dalla prima stesura del Piano, un finanziamento pari al 75% del costo di realizzazione.

Negli altri casi la quota di cofinanziamento supera di poco il valore medio o è del tutto assente.

Tab. 6- Soggetti beneficiari con quote di cofinanziamento superiori al 5% del costo complessivo degli interventi.

Soggetto beneficiario	Quota di cofinanziamento % sul costo dell'intervento
Enti religiosi	32,8
AMA	30,0
Comuni della Provincia di Rieti	14,1
Ministero per i beni e le attività culturali	12,9
Provincia di Latina	11,9
Comuni della Provincia di Latina	11,8
Comuni della Provincia di Frosinone	8,2
Aziende sanitarie	7,5
Comuni della Provincia di Roma	6,3
Valore medio	5,0

Fonte: URCGE 1999

Per una più completa descrizione dell'attuale configurazione del Piano e del suo stato di attuazione, si riportano di seguito, una tavola analitica ed alcuni grafici illustrativi dei dati precedentemente riportate.

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI AL GIUBILEO NEL LAZIO
(LEGGE 651/96)

TAVOLA 1

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER SOGGETTO BENEFICIARIO

Soggetto beneficiario	*NUMERO*	%	*FINANZ. ACCORDATO* milioni	%	*COSTO INTERVENTI* milioni	%	*QUOTA % DI COFINANZ.*	*INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE* numero	%
AMMINISTRAZIONI CENTRALI									
Min. BB. CC. AA.	206	27,3	317.320	9,1	364.320	10,0	12,9	202	98,06
Min. Interni	25	3,3	130.426	3,8	130.426	3,6	0,0	8	32,00
Min. LL. PP.	5	0,7	132.200	3,8	132.200	3,6	0,0	4	80,00
altri Ministeri	13	1,7	37.546	1,1	37.546	1,0	0,0	2	15,38
ANAS	3	0,4	127.295	3,7	131.565	3,6	3,2	3	100,00
FS	5	0,7	290.022	8,4	290.022	7,9	0,0	4	80,00
Totale Amm. Centrali	257	34,1	1.034.808	29,8	1.086.079	29,7	4,7	223	86,77
AMM. REGIONALE E PROVINCIALE									
Regione Lazio	16	2,1	214.194	6,2	218.844	6,0	2,1	6	37,50
Provincia di Roma	35	4,6	97.971	2,8	100.149	2,7	2,2	25	71,43
Provincia di Frosinone	3	0,4	19.537	0,6	19.912	0,5	1,9	2	66,67
Provincia di Latina	5	0,7	22.132	0,6	25.132	0,7	11,9	3	60,00
Provincia di Rieti	1	0,1	17.500	0,5	17.500	0,5	0,0	0	0,00
Provincia di Viterbo	2	0,3	18.566	0,5	19.177	0,5	3,2	1	50,00
Totale Amm. Regionale e Provinc.	62	8,2	389.900	11,2	400.714	11,0	2,7	37	59,68
AMM. COMUNALI									
Roma	139	18,4	697.285	20,1	698.285	19,1	0,1	63	45,32
altri Comuni in Prov di Roma	66	8,8	93.788	2,7	100.138	2,7	6,3	56	84,85
Comuni in Prov. di Frosinone	18	2,4	17.262	0,5	18.814	0,5	8,2	18	100,00
Comuni in Prov. di Latina	26	3,4	13.340	0,4	15.121	0,4	11,8	16	61,54
Comuni in Prov. di Rieti	19	2,5	23.836	0,7	27.739	0,8	14,1	18	94,74
Comuni in Prov. di Viterbo	10	1,3	6.394	0,2	6.644	0,2	3,8	10	100,00
Totale Amm. Comunali	278	36,9	851.906	24,5	866.741	23,7	1,7	181	65,11
ALTRI SOGGETTI									
Istituzioni sanitarie	29	3,8	184.115	5,3	199.115	5,5	7,5	20	68,97
Agenzia Romana Giubileo	14	1,9	174.423	5,0	174.423	4,8	0,0	4	28,57
AMA	36	4,8	97.394	2,8	139.144	3,8	30,0	6	16,67
STA	5	0,7	50.276	1,4	50.276	1,4	0,0	1	20,00
ACEA	4	0,5	10.677	0,3	10.677	0,3	0,0	0	0,00
ATAC-COTRAL	12	1,6	394.865	11,4	394.865	10,8	0,0	6	50,00
Istituzioni culturali	7	0,9	47.161	1,4	47.161	1,3	0,0	1	14,29
Enti religiosi	36	4,8	95.809	2,8	142.551	3,9	32,8	23	63,89
altri beneficiari	14	1,9	140.074	4,0	140.670	3,9	0,4	5	35,71
Totale altri soggetti	157	20,8	1.194.793	34,4	1.298.881	35,6	8,0	66	42,04
TOTALE	754	100,0	3.471.407	100,0	3.652.415	100,0	5,0	507	67,24

NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SOGGETTO BENEFICIARIO (L. 651/96)

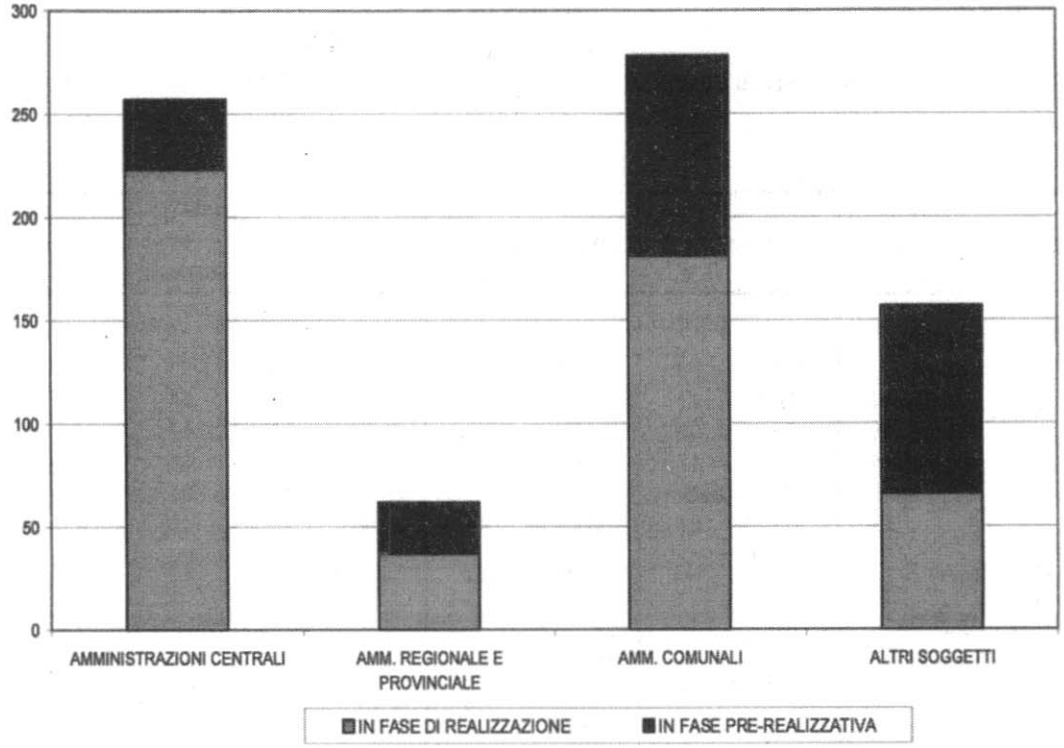

FINANZIAMENTI ACCORDATI PER SOGGETTO BENEFICIARIO (L. 651/96)

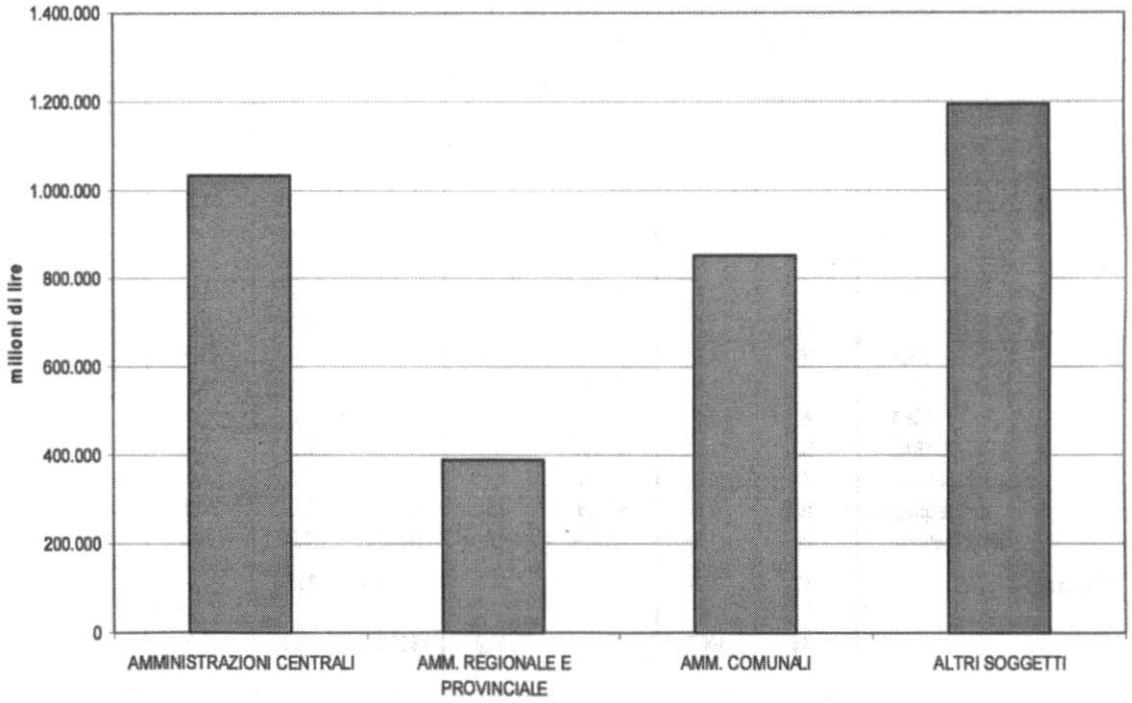

PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER SOGGETTO BENEFICIARIO (L.651/96)

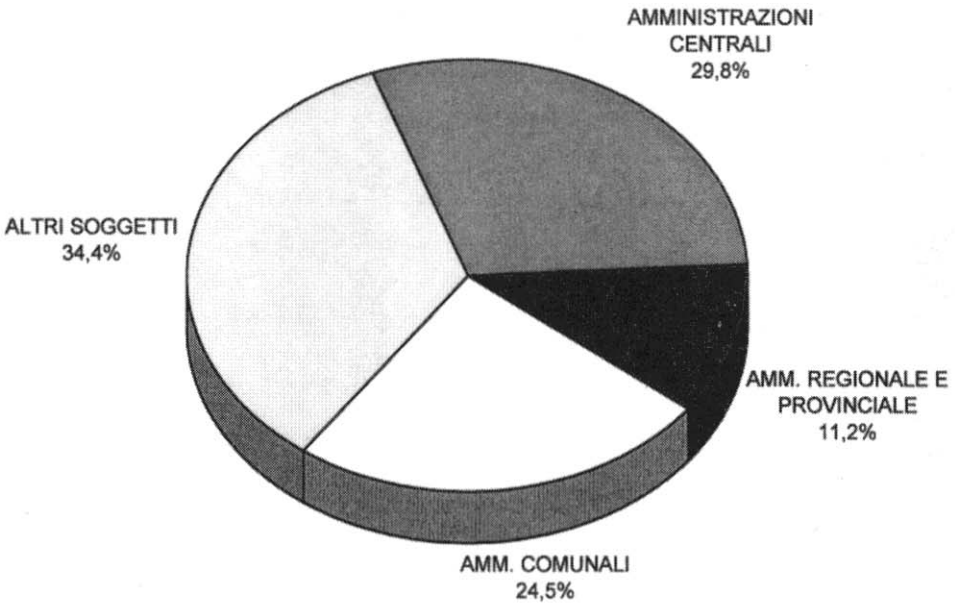

COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SOGGETTO BENEFICIARIO (L. 651/96)

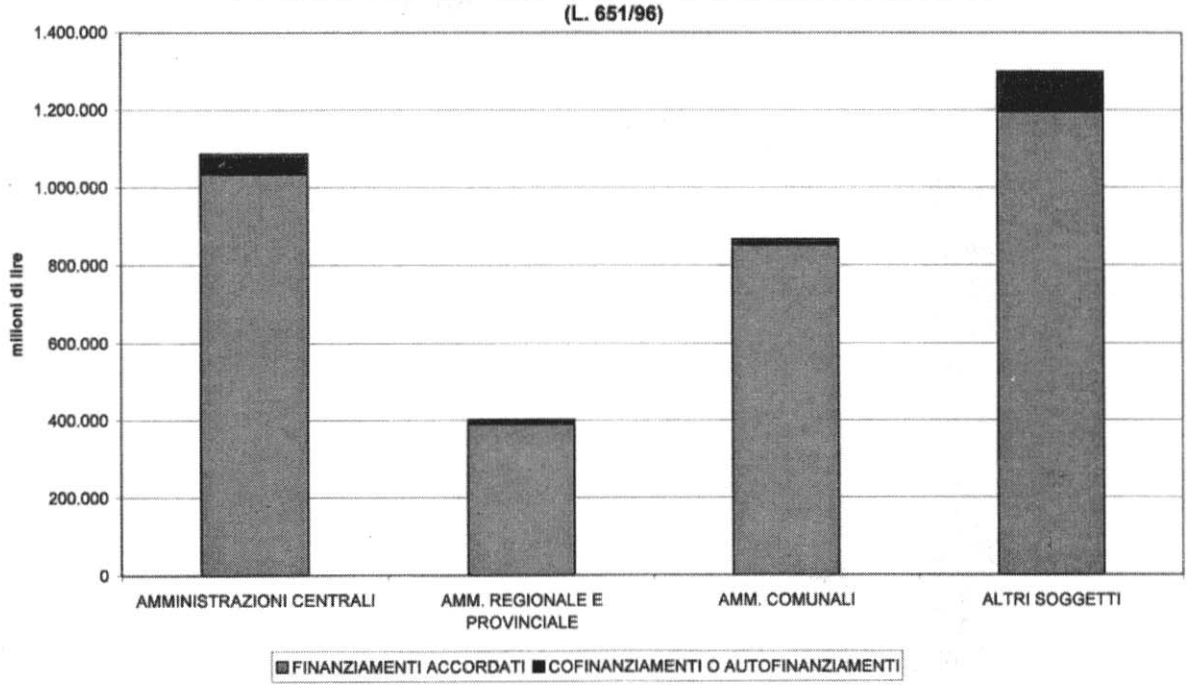

NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER LOCALIZZAZIONE (L. 651/96)

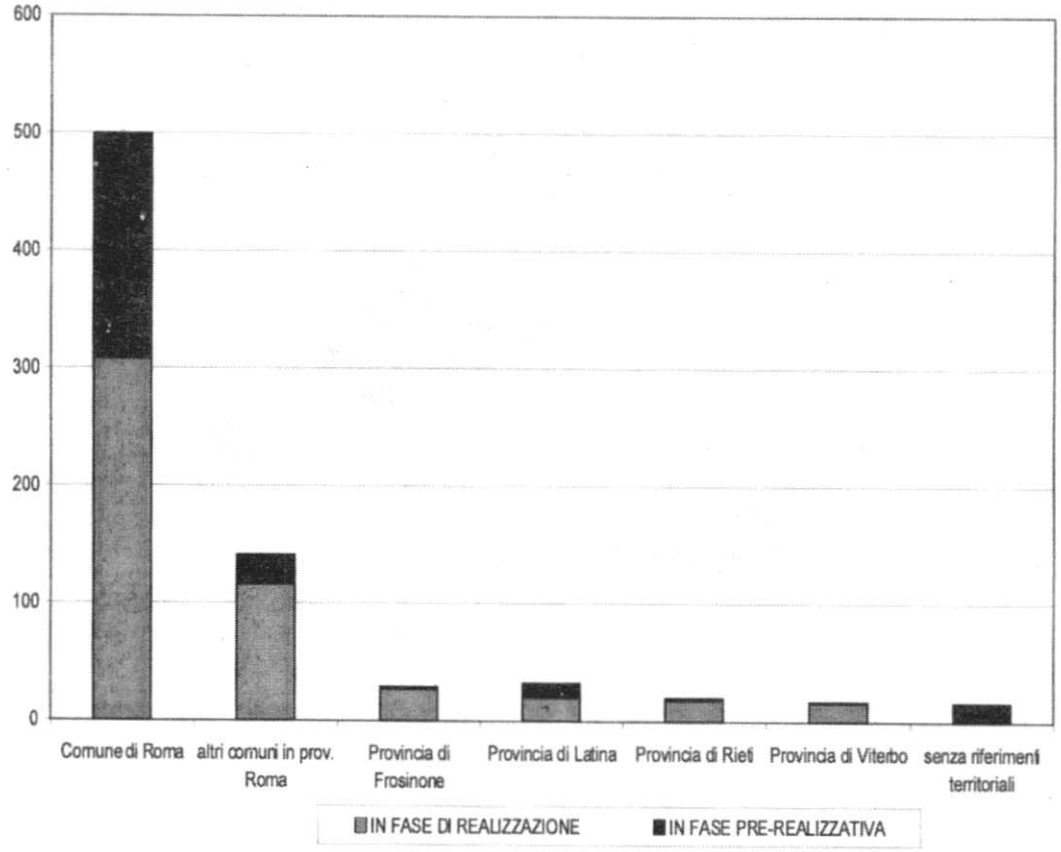

FINANZIAMENTI ACCORDATI PER LOCALIZZAZIONE (L. 651/96)

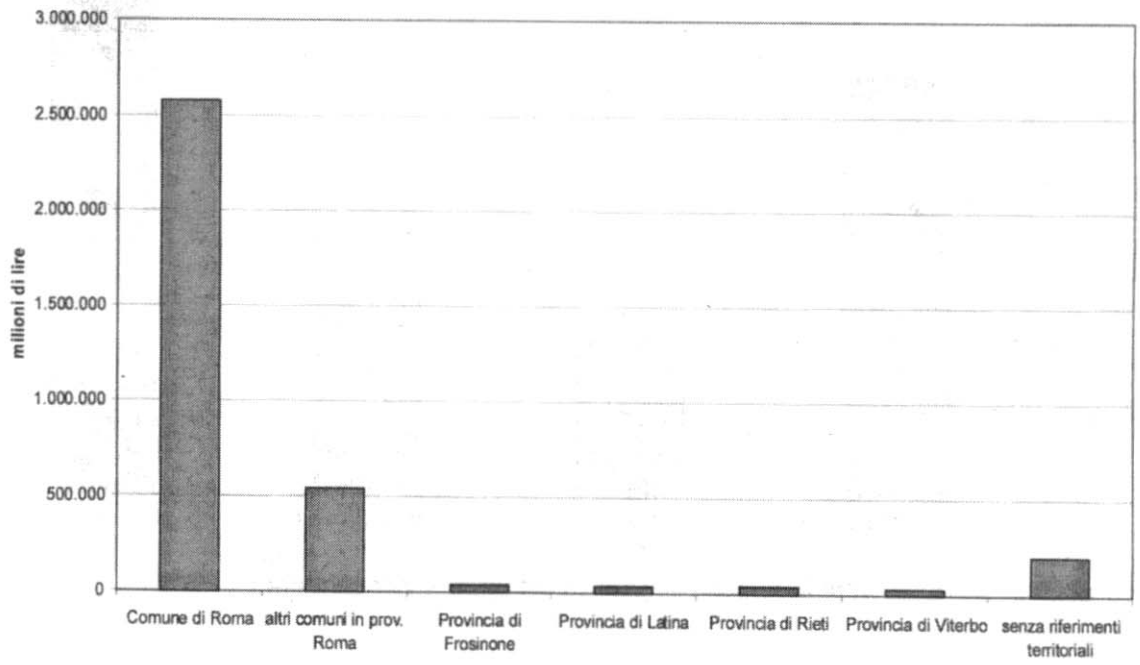

PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER LOCALIZZAZIONE (L.651/96)

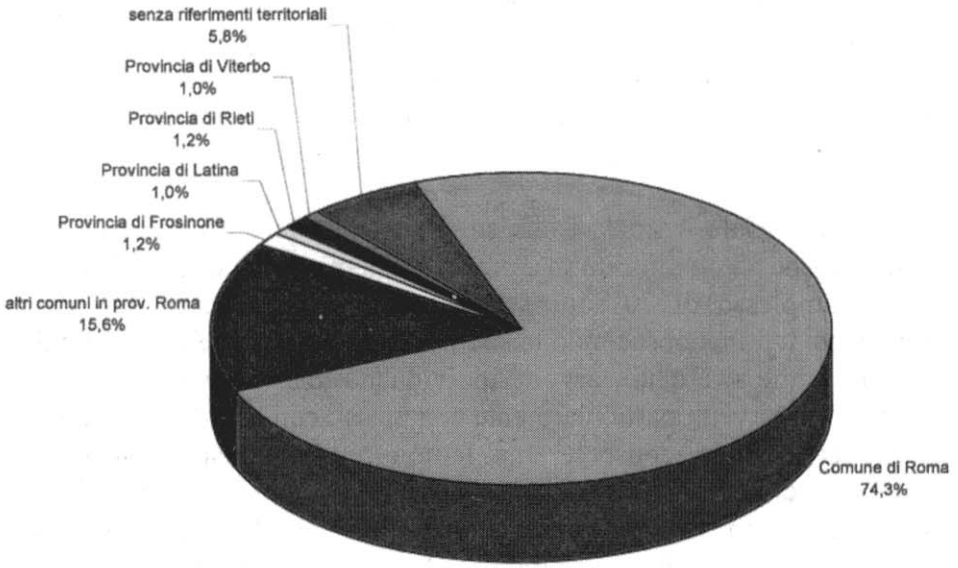

COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER LOCALIZZAZIONE (L. 651/96)

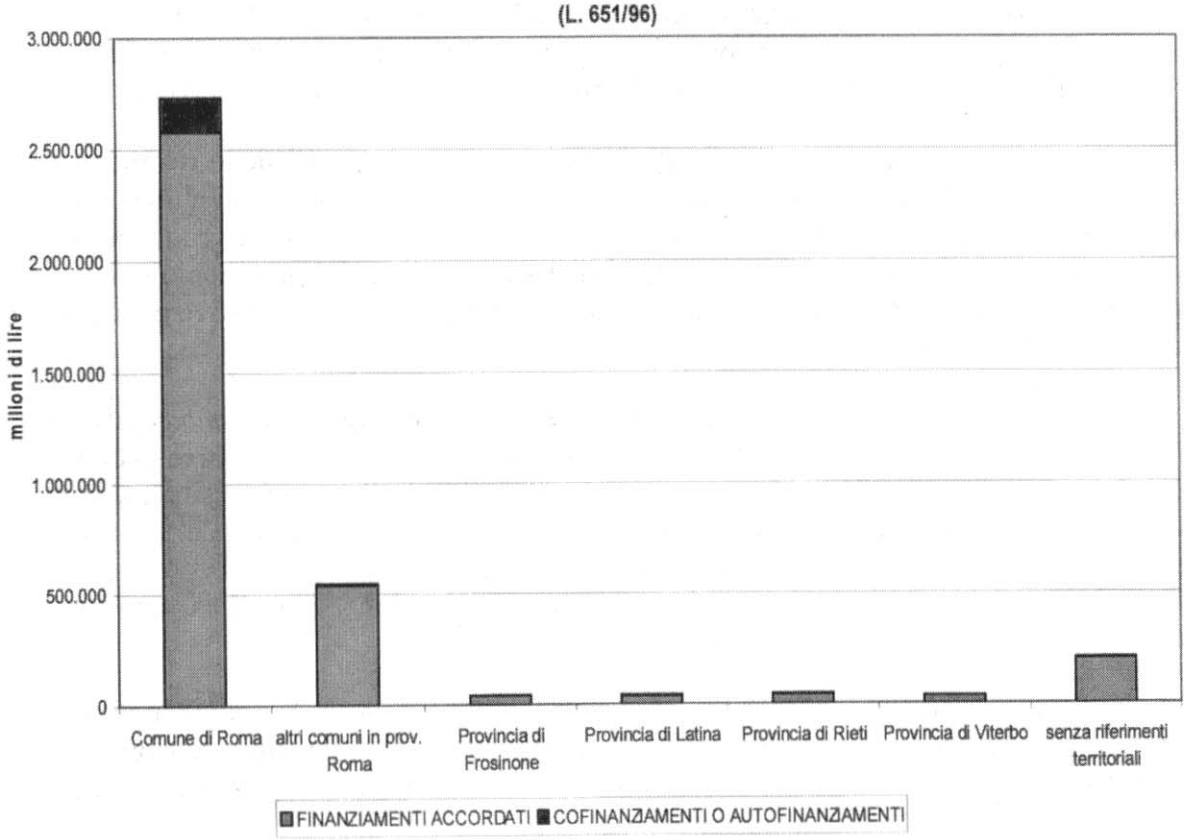

3.2 Una lettura del Piano per settori

Come più volte ricordato, il complesso degli interventi attualmente ricompresi nel Piano è riconducibile a 6 principali settori che rispecchiano altrettante aree-obiettivo di adeguamento di Roma e del Lazio in vista delle celebrazioni dell'evento giubilare.
L'articolazione degli interventi fa, inoltre, riferimento a sotto-settori che meglio rappresentano la portata dei programmi attualmente in corso.

Una lettura settoriale rende sistemico l'insieme dei programmi in corso, riducendone la diffusione ad un più ridotto e preciso insieme di linee operative.

Si tratta in complesso di 70 sotto-settori, cui si riferiscono i 754 interventi attualmente ricompresi nel Piano, secondo la suddivisione indicata nelle Tabelle 5 e 7.

I sotto-settori, come si è detto, a volte individuano una "area-obiettivo", a volte coincidono, in caso di interventi particolarmente complessi, con l'intervento stesso.

Una siffatta architettura consente una lettura più sintetica di quanto si sta realizzando a Roma e nel Lazio.
Tale riaggregazione è motivata da diverse situazioni: interventi a rete, ovvero programmi seriali o complementari, programmi diversificati, ma posti in uno stesso ambito o contesto.

Nel settore A. *Sociale e accoglienza,* i sotto-settori con una significativa numerosità di interventi riguardano la rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione (43 interventi) e le strutture per l'assistenza ed accoglienza delle categorie disagiate (27 interventi). Vi è poi un sotto-settore che comprende un unico intervento e segnatamente quello relativo agli "Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extralberghiere" che, gestiti con apposita legge regionale, costituiscono un contributo agli interventi eseguiti dai privati nel campo della ricettività e che, sicuramente, riguarderanno un elevato numero di interventi.

Per quanto attiene il settore B. *Beni culturali,* che , come si è detto ricomprende quasi la metà degli interventi del Piano, sono 69 gli interventi conservativi attinenti beni archeologici, 101 quelli riferiti alle chiese, basiliche e monasteri, 25 concernenti i complessi museali; sono poi 110 i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale nella provincia di Roma e nella regione Lazio; sono poi previste 10 iniziative nel campo delle "attività culturali".

Nel settore C. *Manutenzione, arredo urbano e salvaguardia ambientale,* 30 interventi afferiscono alla manutenzione straordinaria di strade, piazze, aree pedonali, giardini ed aree verdi, 33 all'adeguamento dell'accessibilità alle aree di visita giubilare, 20 al restauro di parchi e giardini, 11 ad opere di risanamento ambientale. Di questo settore fanno parte gli interventi concernenti le sistemazioni della "Aree delle basiliche", interventi di cui è superfluo rammentare la valenza strategica, nonché le opere previste nel Comune di Castel Gandolfo.

L' *Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana* (settore D) è caratterizzata da un elevato numero di sotto-settori, in quanto, data la rilevanza economica e dimensionale di taluni interventi, essi coincidono sovente con una singola opera; è

questo il caso, ad esempio, della Infrastrutturazione della Stazione Tiburtina, del Passante dei Laghi, della Terza corsia della Roma-Fiumicino, del Porto di Civitavecchia. In questo settore sono comprese poi altre opere di forte valenza strategica quali: la riqualificazione dell'area del Gianicolo in relazione al parcheggio che si sta realizzando in area extraterritoriale; numerose opere di adeguamento della viabilità del comune e della provincia di Roma, nonché delle altre provincie del Lazio; la realizzazione di parcheggi di scambio; l'acquisto di mezzi per il trasporto pubblico su gomma o su ferro.

Per quanto attiene il settore E la maggior parte dei sottosettori prevede una pluralità di azioni concernenti : i *servizi pubblici*, quali ad esempio la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (33 interventi) e il potenziamento dei mezzi di soccorso e di pronto soccorso ospedaliero (25 interventi); la *sicurezza e la protezione civile* (41 interventi); *la formazione e la valorizzazione di risorse umane* (5 interventi).

Più concentrato, anche se non meno significativo, è il numero di interventi relativo all'*informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento* (settore F), affidati all'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., ad eccezione di quello che concerne il "Monitoraggio del Piano".

Se le rimodulazioni del Piano avvenute durante il biennio 1997-98, non hanno apportato modifiche ai settori in cui lo stesso è articolato, hanno invece significativamente variato il numero degli interventi nello stesso ricompresi, che sono passati da 500 agli attuali 754, con un incremento del 50% circa. (Il numero anzidetto fa riferimento ai soli interventi attualmente in corso di realizzazione, ad esclusione, pertanto, di quelli totalmente definanziati).

Tale notevole incremento corrisponde solo parzialmente ad un effettivo aumento di opere, in quanto frutto del successivo frazionamento di interventi che, sotto un unico titolo, ricomprendevanvano più interventi, anche se omogenei per tipologia o afferenti una opera complessa. Il primo caso è esemplificato dagli interventi facenti capo al settore B. *Beni cultuali* , passati da 256 a 352 e segnatamente quelli eseguiti dal Ministero per i beni e le attività culturali; il secondo caso è invece ben rappresentato dai settori C e D, concernenti tipologie di interventi più complessi, quali, ad esempio, quelli riguardanti le Aree delle Basiliche o gli interventi di risanamento ambientale.

Il forte aumento delle iniziative previste nel settore E concernente la "*Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione*", passate da 58 a 104, è invece in buona parte dovuto ad un effettivo inserimento di nuovi interventi, con il quale la Commissione ha provveduto a colmare alcune lacune presenti nel Piano in merito ai sotto-settori della sicurezza e della protezione civile, entrambi di estrema importanza ai fini della celebrazione del Giubileo del 2000 ed in relazione ai quali, all'epoca dell'adozione del Piano, non erano ancora state definite le iniziative da assumersi (Tab. 7).

Tab. 7 – Articolazione del Piano per settori – Variazioni del numero degli interventi

Settori	Situazione al 18/09/96		Situazione al 31/12/1998		Variazioni	
	n.	%	n.	%	n.	%
A - Sociale e accoglienza	74	14,8	85	11,3	+11	14,9
B - Beni culturali	256	51,2	352	46,7	+96	37,5
C - Manutenzione, arredo urbano, Patrimonio ambientale	65	13,0	136	18,00	+71	109,2
D - Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana	37	7,4	63	8,4	+26	70,3
E – Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione	58	11,6	104	13,8	+46	79,3
F - Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	10	2,0	14	1,8	+4	40,0
TOTALE	500	100,0	754	100,0	+254	50,8

Tab. 8 - Articolazione del Piano per settori – Variazioni della ripartizione dei finanziamenti

Settori	Situazione al 18/09/96	Situazione al 31/12/1998	Variazioni Assolute	%
	milioni	milioni	milioni	
A - Sociale e accoglienza	330.800	300.489	-30.311	-9,16
B - Beni culturali	560.200	559.225	-975	-0,17
C - Manutenzione, arredo urbano, Patrimonio ambientale	590.550	573.907	-16.643	-2,81
D - Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana	1.598.050	1.383.552	-214.498	-13,4
E – Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione	330.000	489.716	+159.716	+48,3
F - Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	90.400	180.359	+89.959	+99,0
Accantonamento	-	12.743		
TOTALE	3.500.000	3.500.000		

Per ciò che attiene invece alle conseguenze delle modifiche ed integrazioni apportate al Piano in ordine alla ripartizione dei finanziamenti, esse assumono particolare rilevanza in rapporto ai settori D, E ed F, come desumibile dalla tabella allegata (Tab. 8).

Difatti mentre i settori A, B e C evidenziano scostamenti che rappresentano semplici assestamenti fisiologici, i settori E ed F presentano incrementi rispettivamente del 48% (+ 160 miliardi circa) e del 99 % (+ 90 miliardi circa) delle risorse economiche originariamente assegnate, e di contro, il settore D fa registrare una sensibile contrazione (-13,4%) del budget originariamente previsto, che è passato da Lit. 1.598.050.000.000 a Lit. 1.383.552.000.000 (- 214 miliardi).

Nel procedere ad ulteriori rimodulazioni, sarà posta particolare attenzione alla natura degli interventi che dovessero essere espunti dal Piano, in considerazione della necessità di assicurare alla BEI, per il cui tramite è stata effettuata parte della provvista finanziaria, la permanenza nel Piano stesso di interventi aventi natura di "investimento", per un importo complessivo pari ad almeno 2.800 miliardi.

Al riguardo, il Presidente del Consiglio si era impegnato all'epoca a garantire, per il tramite dell'U.R.C.G.E., il monitoraggio sull'attuazione degli interventi ai quali la Commissione Tecnica della BEI ha accordato le risorse comunitarie.

3.3 Lo stato di attuazione

Relativamente allo stato di attuazione del Piano oltre a quanto già detto nei paragrafi precedenti, si rinvia per una lettura analitica dello stesso all'Allegato 3, dove viene riportato lo stato di avanzamento di ogni singolo intervento, nonché a quanto riportato in merito nelle relazioni trimestrali prodotte dal Soggetto Monitore e sintetizzate al punto 4.1.3 della presente Relazione.

Per consentire una immediata e sintetica lettura dell'evoluzione dello stato di attuazione del Piano è stata elaborata la tabella di fianco riportata.

Si segnala che le leggere discordanze esistenti fra alcuni dati riportati nella citata tabella e nelle altre elaborate dall'U.R.C.G.E. ed i dati riportati dal Soggetto Monitore nelle proprie relazioni in ordine, sia al numero complessivo degli interventi, che a quello degli interventi in fase di realizzazione, sono dovute ad oggettive difficoltà interpretative di talune situazioni, nonché agli effetti delle riprogrammazioni del Piano stesso, su tutti i sistemi di verifica e controllo, ivi compreso il servizio di "monitoraggio"; esse, comunque, non incidono significativamente sulla valutazione complessiva dei fenomeni osservati.

L'EVOLUZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL GIUBILEO NEL CORSO DELL'ANNO 1998

PARAMETRI	TOTALE				LAVORI				BENI CULTURALI				FORNITURE			
	dic. 98	set. 98	giu. 98	mar. 98	dic. 98	set. 98	giu. 98	mar. 98	dic. 98	set. 98	giu. 98	mar. 98	dic. 98	set. 98	giu. 98	mar. 98
Numero interventi																
totali	754 (1)	720 (1)	720 (2)	632 (2)	438	435	447	376	209	205	205	192	90	71	63	59
non appaltati	216	224	304	342	148	181	257	281	7	0	1	11	57	43	45	50
appaltati	528(2)	487	411	285	290	254	190	95	202	205	204	181	33	28	18	9
in realizzazione	432(3)	359	307	215	262	161	102	57	148	192	201	156	21	6	4	2
completati	76	19	7	2	17	4	3	1	54	9	1	1	5	6	3	0
Indicatori procedurali																
Avanzam. Medio (%)	62%	55%	40%	40%	58%	52%	42%	40%	75%	65%	41%	40%	45%	41%	35%	30%
Ritardo affidamento (gg)	100	94	57	-	109	100	75	-	74	74	18	-	136	129	124	-
Margine finale (gg)	50	61	80	105	58	78	93	91	44	44	83	138	19	14	-27	68
Indicatori di costo																
Finanziamento L.651 (mld)	3471(5)	3265	3380	3446	2051	2083	2350	2425	322	306	325	323	785	591	565	560
Costo totale (mld)	3652(5)	3407	3550	3700	2171	2163	2432	2611	369	354	379	377	799	606	595	577
Economie (mld)	303	118	110	91	247	86	102	75	52	50	28	-15	4	-18	-20	1
% economie	8,3%	3,5%	3,1%	2,5%	11,4%	4,0%	4,2%	2,9%	14,1%	14,1%	7,4%	-4,0%	0,5%	-3,0%	-3,4%	0,2%
Valutazione di criticità																
Alta criticità	85	99	98	187	66	66	83	129	4	20	25	33	15	11	14	23
Media criticità	147	167	219	200	90	109	126	157	35	37	41	21	22	21	26	22
Bassa criticità	377	317	276	216	230	165	127	74	129	138	138	138	18	13	10	4
Valutazione di rischio																
Alto rischio	52	37	73	-	45	36	70	-	0	0	0	-	7	1	3	-
Medio rischio	238	250	214	-	178	156	126	-	30	68	66	-	30	26	22	-
Basso rischio	322	308	313	-	155	155	149	-	138	127	138	-	29	26	26	-
Rischio nullo	58	23	8	-	13	8	5	-	36	9	0	-	9	6	3	-
Importo Alto rischio (mld)	978	882	933	-	912	877	917	-	0	0	0	-	66	5	16	-
Importo Medio rischio (mld)	1092	1118	1114	-	781	648	700	-	67	178	124	-	244	292	290	-
Importo Basso rischio (mld)	804	696	647	-	369	364	226	-	271	172	254	-	164	160	167	-
Importo rischio Nullo (mld)	190	133	110	-	18	12	11	-	15	3	0	-	157	118	99	-

(1) - compresi 17 incentivi (2) - compresi 3 incentivi (3) compreso 1 incentivo e 10 interventi di cui non si hanno informazioni

(4) inclusi 13 mld. Per incentivi

3.4 Schede di approfondimento

3.4.1 Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extralberghiere

Fin dalla sua prima stesura, nel Piano è stato inserito un intervento (cod. A.08.01) finalizzato alla riqualificazione delle strutture ricettive di proprietà privata, avente come proponente e soggetto beneficiario la Regione Lazio ed una dotazione finanziaria di 130 miliardi, poi ridotti ,con DM in data 24/6/97, a circa 99,7.

A tale scopo è stato costituito (con L.R. 20/97, integrata dalla L.R.9/98) un fondo speciale per l'erogazione di contributi in c/capitale e c/interessi a enti e soggetti privati che intendono ampliare e riqualificare immobili destinati ad attività ricettive.

Le iniziative ammissibili al finanziamento devono riguardare interventi su determinate strutture (es. : alberghi fino a tre stelle; campeggi e villaggi turistici; alloggi agro-turistici; case per ferie; ostelli per la gioventù) e devono prevedere la realizzazione di opere di costruzione e ampliamento strutturale (compreso l'acquisto di immobili adiacenti alla struttura ricettiva, per il potenziamento delle capacità di accoglienza), di adeguamento degli impianti, di superamento delle barriere architettoniche.

Le opere previste dagli interventi ammessi al contributo dovranno concludersi entro il 30/11/99.

La Regione Lazio aveva affidato la gestione del fondo speciale alla FILAS, che avrebbe dovuto condurre l'istruttoria delle domande di finanziamento, l'erogazione dei contributi ai beneficiari e il monitoraggio sull'attuazione dei singoli interventi. Tuttavia, successivamente alla fase di recepimento delle domande di finanziamento da parte della FILAS, la Regione Lazio ha avocato nuovamente a sé la gestione del fondo speciale e trasferito le competenze per l'espletamento dell'istruttoria delle domande e per il monitoraggio dell'esecuzione delle opere finanziate, all'Istituto per la Promozione Industriale (IPI).

L'IPI ha condotto l'istruttoria delle 923 domande che la FILAS aveva ritenuto ammissibili e che prospettano, in sede di istanza, opere che comporterebbero lavori per circa 2.260 miliardi .A seguito dell'istruttoria tecnica e finanziaria l'importo dei lavori ammissibili si è ridotto a circa 1.547 miliardi. In base agli ulteriori accertamenti istruttori, peraltro ancora in corso, sembra si possa ipotizzare un importo dei lavori ammissibili al contributi, pari a circa 978 miliardi. A tale dato corrisponderebbe, secondo la Regione Lazio, un fabbisogno così ripartito:

- Lit. 17,2 miliardi per contributi in conto capitale
- Lit. 222,2 miliardi per contributi in conto interessi (dato massimo)
- Lit. 239,4 miliardi Totale fabbisogno contributo.

3.4.2 Interventi inerenti i principali complessi museali

Fra i numerosi interventi in corso di esecuzione su "beni culturali", sia nella città di Roma, che nel Lazio, vengono di seguito descritti più in dettaglio quelli concernenti il "sistema museale" pubblico. Tale scelta è dovuta sia alla rilevanza dell'impegno finanziario di tali interventi, che al indubbio ruolo che i musei svolgeranno all'interno della "offerta culturale" cui potranno fare riferimento i pellegrini durante l'Anno Santo.

Fra gli interventi in corso di esecuzione a cura dal Comune di Roma si segnalano:

– *Area del Grande Campidoglio. Musei Capitolini. Secondo lotto funzionale (B.01.02)*

La riorganizzazione dei musei Capitolini (forse la più antica collezione archeologica del mondo) inquadrata nel progetto "Area del Grande Campidoglio" ha preso avvio, almeno a livello programmatico, ormai da molto tempo ed è inclusa nel Programma per Roma Capitale. Essa è finalizzata ad una radicale rinnovamento dell'impianto museale, sia attraverso l'ampliamento degli spazi ad esso dedicati, sia tramite la realizzazione di un percorso di visita che consentirà, una volta realizzato, di collegare fra loro il Palazzo Nuovo ed il Palazzo dei Conservatori con l'ampliamento da realizzarsi tramite la copertura del Giardino Romano , passando attraverso gli ambienti del Tabularium, posti al di sotto del Palazzo Senatorio.

La realizzazione del lotto finanziato con i fondi ex lege 651/96 ha preso avvio a settembre del '98 con la consegna del Cortile di Michelangelo, cui è seguita, a novembre, la consegna del Palazzo Nuovo. Data la complessità della fase preparatoria che implica lo spostamento di circa 3.000 opere d'arte, l'inizio dei lavori vero e proprio è previsto per gennaio '99,. La consegna del Palazzo dei Conservatori per la realizzazione degl'impianti è prevista per luglio '99. La fine dei lavori è programmata per dicembre '99.

- *Museo dei Fori Imperiali (B.02.01/1 – B.01.01/2)*

Gli interventi previsti nei Mercati Traianei, nel più ampio ambito del sistema museale che comprende le aree archeologiche, ed in diretta prosecuzione con i lavori di restauro ed adeguamento funzionale attualmente in corso, consistono nella risoluzione di alcuni problemi architettonici non risolti nei lavori del 1930, funzionali alla nuova destinazione d'uso e nell'allestimento museale. La consegna dei lavori è stata effettuata il 22/12/98. La durata dei lavori è prevista in 300 giorni.

– *Palazzo delle Esposizioni (B.04.01)*

Il progetto di intervento prevede la valorizzazione della sede espositiva per consentire un uso più intensivo rendere la struttura più adatta ad un circuito espositivo internazionale. L'intervento si configura come manutenzione straordinaria. La consegna dei lavori, con procedura d'urgenza, è prevista per i primi di gennaio '99. La durata dei lavori è prevista in 300 giorni.

– Palazzo Braschi (B.05.01/2)

Il Palazzo ospita il Museo di Roma ed è oggetto di due distinti interventi finanziati con i fondi ex lege 651/96.Il primo, che beneficia di un finanziamento di 2 miliardi, è finalizzato alla realizzazione di prerestauri, imballaggi, movimentazione delle opere attualmente contenute nel museo. Il secondo, finanziato per 13 miliardi, prevede : interventi strutturali al solaio di copertura e del IV piano; consolidamento, ristrutturazione, adeguamento degli impianti dal piano terra al terzo piano, limitatamente alla zona d'angolo compresa fra via di Pasquino, Piazza di Pasquino, via di S. Pantaleo; realizzazione degli impianti e realatice centrali; realizzazione del corpo ascensore.
Per la realizzazione dell'intervento si è scelta la formula dell'appalto integrato; la consegna del cantiere è stata effettuata a settembre '98; l?impresa ha elaborato il progetto esecutivo ed i lavori sono attualmente in corso.

Fra gli interventi in corso di esecuzione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali si segnalano:

Museo Nazionale Romano

Il Museo Nazionale Romano, sarà articolato, alla fine del programma di lavori avviati ormai da molti anni, in quattro sedi : il Museo delle Terme, l'ex Collegio Massimo, Palazzo Altemps e la Crypta di Balbo. Quasi tutti gli interventi sugli immobili anzidetti fanno già parte del Programma per Roma Capitale ed i lavori sono stati avviati con i relativi fondi. Con i finanziamenti per il Giubileo del 2000 il programma museale ha avuto nuovo impulso e dovrebbe essere portato a compimento prima dell'inizio delle celebrazioni giubilari, almeno per ciò che concerne tre delle quatto sedi citate.

- Palazzo Altemps (B.08.01)

I lavori sono finalizzati alla completa apertura al pubblico del palazzo. L'intervento, riguarda i lavori di restauro e primo scavo della zona centrale e sistemazione del cortile, con completamento ed allestimento del museo antiquario, del teatro e dei locali di servizio. L'importo del finanziamento è pari a 5 miliardi.

L'intervento è nella fase di esecuzione lavori; attualmente si sta procedendo alla sistemazione interna dell'edificio.

- Museo delle Terme di Diocleziano (B.08.02, B.08.03, B.08.04, B.08.05, B.08.06, B.08.07, B.08.0, B.16.18/16)

Il Museo Nazionale Romano, nella sede delle Terme di Diocleziano, è oggetto di 8 distinti interventi finalizzati al miglioramento della fruibilità, all'apertura al pubblico di nuovi spazi espositivi ed all'adeguamento delle strutture, con un finanziamento complessivo di circa 21 miliardi. I lavori riguardano il completamento dei restauri del Chiostro di Michelangelo, il restauro ed allestimento delle Olearie, dell'ex Museo delle Cere e della zona delle Grandi Aule presso le Terme!

Sono previsti anche lavori di impiantistica e la realizzazione della zona di ingresso

con biglietteria e guardaroba, nonché la realizzazione di apparati didattici e la sistemazione del giardino presso Piazza dei Cinquecento.

Risultano attualmente in fase di esecuzione e procedono secondo programma: il restauro di parte delle superfici esterne del Chiostro di Michelangelo; la sistemazione del giardino con la nuova collocazione del materiale lapideo ivi conservato; l'apertura di un nuovo ingresso per il pubblico. A conclusione delle opere edili e impiantistiche nelle sale espositive si procederà all'allestimento museale.

- Crypta Balbi (B.08.09)

L'intervento presso la Crypta Balbi, prevede un finanziamento di 10 miliardi di lire. Esso è finalizzato alla valorizzazione del monumento romano e prevede il restauro e l'apertura al pubblico di un settore.

I lavori riguardano: la sistemazione dell'area archeologica rinvenuta in più di un decennio di scavi; il recupero dei reperti; il restauro delle strutture edilizie su Via delle Botteghe Oscure e su Via Caetani, per la loro utilizzazione come museo della Roma altomedioevale.

Lo stato di avanzamento dei lavori può essere valutato pari a circa un terzo del totale. Le lavorazioni già avviate riguardano: il consolidamento fondale delle murature; il consolidamento e la pulitura delle volte; il ripristino di un solaio.

I lavori di scavo archeologico hanno riportato alla luce un pilastro del Porticus Minucia che ha provocato dei rallentamenti nei lavori. Ciò nonostante l'intervento appare realizzabile entro il 1999.

- Palazzo Barberini (B.09.01, B.16.18/1 e B.16.18/2)

L'intervento, finanziato con circa 7 miliardi di lire, tende al miglioramento della fruibilità ed agli adeguamenti funzionali. Gli attuali lavori si inseriscono nel quadro di un più ampio progetto di restauro dell'intero complesso, che le Soprintendenze competenti (in particolare l'Architettonica di Roma) stanno svolgendo da numerosi anni. I lavori della Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici di Roma riguardano il restauro del piano terra nell'ala nord, del cortile della Cavallerizza, dell'androne e della rampa; la realizzazione di canalizzazioni di servizio che circondano l'intero edificio, ed infine la posa in opera di una centrale termica. Gli interventi attuati dalla Soprintendenza Archeologica di Roma sono: lo scavo, il restauro e la sistemazione delle strutture del complesso monumentale antico sotto il giardino del Palazzo e lo scavo archeologico, la documentazione degli ambienti e dei reperti, ed il restauro degli affreschi e delle strutture ritrovate sotto l'ala nord del Palazzo.

- Villa Giulia (B.10.01/a, B.10.01/b e B.10.01/c)

Gli interventi sul Museo Nazionale di Villa Giulia prevedono opere di restauro sul complesso di Villa Poniatowsky, Villa Strohl-Fern e Villa Giulia, il finanziamento globale è di 23 miliardi di lire.

I lavori relativi a Villa Poniatowsky prevedono il recupero strutturale e funzionale dell'edificio del Valadier e l'organizzazione degli spazi espositivi destinati alle collezioni del Latium Vetus.

Nell'edificio di Villa Giulia si intende portare a compimento la valorizzazione della villa completando il restauro conservativo del complesso monumentale e realizzando itinerari di visita nei giardini e negli ambienti sotterranei, con l'apertura della "neviera" affrescata e l'accesso, all'interno del Ninfeo, ai diversi livelli della costruzione. E' previsto il restauro architettonico dei prospetti interni (emiciclo) ed esterni (ala destra), l'allestimento museale delle sezioni Agro falisco-capenate e Castellani, oltre ad adeguamenti funzionali e impiantistici, servizi di accoglienza e realizzazione di un padiglione didattico.

La porzione di parco di Villa Strohl-Fern dovrà restituire parte dell'originaria unità ai due fabbricati (Villa Giulia e Villa Poniatowsky) nel loro complesso. Su questa fascia saranno realizzate opere di canalizzazione di servizio, recinzioni e sistemazione finale a verde.

Attualmente sono in corso lavori di restauro dei prospetti dell'emiciclo e dell'ala destra di Villa Giulia; nella Villa Poniatowsky - dove sono state rinvenute interessanti decorazioni murali – i lavori procedono sia all'interno della villa che nei fabbricati annessi delle ex concerie Riganti e studi; così come nella porzione di parco di Villa Strohl–Fern.

- Galleria Nazionale d'Arte Moderna (B.11.0)

L'intervento, per un importo di 11 miliardi, è seguito direttamente dagli Uffici della Galleria. Prevede l'adeguamento e la sistemazione di numerose sale poste nelle due ali dell'edificio che accoglieranno l'esposizione permanente.

Nel prossimo mese di febbraio è prevista l'ultimazione dei lavori e la consegna dell'ala est dell'edificio, ad esclusione della sala libraria per la quale i tempi di ultimazione saranno posticipati di alcuni mesi. Il cantiere si sposterà quindi nell'ala ovest, il cui lavori dovrebbero terminare ad ottobre 1999.

- Vittoriano (B.12.03)

L'intervento, finanziato per 8 miliardi di lire, è finalizzato alla riapertura al pubblico del monumento. I lavori sono curati dalla Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici di Roma e prevedono il restauro delle superfici esterne, delle decorazioni musive e di alcuni gruppi bronzei. È previsto inoltre il progetto di un allestimento museale ed il rilievo dell'intero complesso monumentale.

I lavori attualmente stanno procedendo nel portico superiore, con il restauro e la pulitura delle superfici marmoree; il restauro dei bronzi procede a rilento a causa di difficoltà di natura tecnica. Procedono invece senza difficoltà le attività di rilievo.

- Museo Nazionale della Grafica (B.14.01)

L'intervento in oggetto riguarda il restauro e l'adeguamento funzionale ai fini museali

del complesso monumentale Calcografia - Palazzo Poli, nuova sede dell'Istituto Nazionale per la Grafica in Roma.

Gli obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere in vista del Giubileo sono:

- la realizzazione dei depositi per i disegni e le stampe per la ricollocazione delle collezioni;
- il recupero funzionale di aree da destinarsi ad apertura al pubblico, in particolare delle zone da dedicare a mostre temporanee.

- *Museo di Palazzo Venezia (B.14.02)*

Il restauro del complesso edilizio di Palazzo Venezia è finanziato per 8 miliardi. L'intervento prevede il restauro delle facciate interne ed esterne, il consolidamento strutturale e la revisione delle coperture. I lavori sui prospetti esterni sono relativi al fronte su piazza Venezia ed a quello su piazzetta San Marco. È stata approvata una perizia di variante che prevede la sostituzione dei lavori di restauro relativi al prospetto su via del Plebiscito - che non verrà realizzato - con il prospetto opposto su via di San Marco. Verranno inoltre restaurati i prospetti del cortile cosiddetto degli aranci.

Sono stati conclusi i restauri dei prospetti su piazzetta San Marco e sul fronte di piazza Venezia, ad eccezione della torre d'angolo. I lavori di rifacimento delle coperture ed il restauro dei prospetti relativi al cortile interno sono in una fase avanzata di lavorazione e probabilmente saranno ultimati in anticipo rispetto al previsto. I lavori relativi al prospetto su via di San Marco sono in fase iniziale.

- *Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo (B.14.04 e B.14.05)*

L'intervento è teso al miglioramento della fruibilità del Monumento, oltre che del museo. Le opere di restauro previste tendono ad agevolare i percorsi di cinta ed a favorire le comunicazioni tra i contenuti storici del mausoleo adrianeo. Si stanno conducendo opere di scavo che prevedono il restauro di tutti i manufatti ritrovati e la relativa catalogazione. E' previsto inoltre l'allestimento di un deposito attrezzato per la conservazione dei reperti. Interessante è la prevista realizzazione di un prodotto informatico a scopo didattico e la creazione di un modello tridimensionale del monumento, al fine di evidenziare le diverse fasi costruttive dello stesso.

I lavori procedono secondo programma. In collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Roma si sta effettuando il restauro della rampa elicoidale e lo scavo negli ambienti interni del mausoleo.

- *Museo delle Navi Romane di Nemi (B.14.06)*

Nel quadro delle iniziative destinate al recupero delle funzioni proprie del museo, il Piano ha stanziato 800 milioni da destinare alla valorizzazione dell'attuale allestimento. I lavori sono rivolti soprattutto all'inserimento di strutture e servizi destinati alla riqualificazione del museo, anche in vista dell'inaugurazione della mostra sui Santuari precristiani del Lazio fra la costa ed i monti Albani, ove si esporranno il ciclo statuario proveniente dal Santuario di Minerva di Pratica di Mare,

cui faranno corona reperti provenienti dai Santuari di Ardea e di Diana Nemorense. I lavori, attualmente in esecuzione, nonostante alcuni ritardi dovuti a difficoltà di reperimento di materiali speciali, che non hanno reso possibile la posa in opera della copertura prevista, si concluderanno nel rispetto dei tempi previsti.

- Museo Ostiense di Ostia Antica (B.15.03)

Il finanziamento di 2 miliardi di lire consente di proseguire lavori già iniziati con fondi ordinari. Il progetto attuale riguarda l'adeguamento e l'allestimento del museo e la sistemazione delle collezioni che vi saranno esposte e del materiale illustrativo didattico.

I lavori prevedono sia il restauro di paramenti murari esterni dell'edificio, che la sistemazione degli ambienti interni, degli impianti museali e di sicurezza.

Le attività di tipo strutturale sono state eseguite secondo i tempi previsti. Sono stati inoltre predisposti gli impianti tecnologici che saranno poi collegati ad un terminale centrale collocato nell'Antiquarium Ostiense, a cui faranno capo tutti gli impianti di sicurezza dell'area archeologica.

Attualmente si sta realizzando la tinteggiatura delle pareti interne e delle murature esterne con la pulitura e il consolidamento degli apparati decorativi della facciata. Una volta terminato il restauro esterno e l'adeguamento degli ambienti espositivi si procederà all'allestimento museale.

Le date delle singole attività di cantiere riportate dal programma dei lavori sono state rispettate e si prevede una conclusione anticipata dei lavori.

Per ciò che concerne sempre il settore "museale" si segnalano i seguenti interventi in corso di esecuzione in ambito regionale:

- Palazzo Chigi di Ariccia (B.18.06)

- *Genazzano (B.12.16 – B.19.08)*

3.4.3 Interventi per la viabilità nell'area di San Pietro

- Galleria principe Amedeo Savoia Aosta (PASA) (D.08.01)

L'intervento prevede la realizzazione di una galleria stradale da Piazzale della Rovere a Piazzale Gregorio VII lungo e sotto la galleria Principe Amedeo e Via di Porta Cavalleggeri. E' finanziato con 56 miliardi di lire ed è affidato al Comune di Roma, che data la complessità dell'opera si è avvalso come stazione appaltante del Provveditorato OO.PP. per il Lazio.

L'opera permette di pedonalizzare Via della Conciliazione, raccogliendo il traffico che percorre il Lungotevere in Sassia (tramite il costruendo sottovia) e percorre in sotterranea la galleria Principe Amedeo e un lungo tratto di Via Gregorio VII fino all'omonimo piazzale, con uno sviluppo di 850 m.

L'inizio effettivo dei lavori è avvenuto il 9/2/98.

La prima fase esecutiva è stata dedicata alla rimozione delle interferenze (attraverso richieste di preventivi alle aziende per gli spostamenti dei pubblici servizi, relative approvazioni, preparazione di documentazione integrativa, accordi con il Comune per la gestione del traffico, ecc).

Contemporaneamente sono iniziati i lavori nella Galleria PASA per la realizzazione delle paratie laterali con metodo "Trencher". Il cattivo funzionamento del "Trencher" ha portato, su iniziativa della Direzione Lavori, a modificare la tecnologia ricorrendo alla "berlinese di micropali"; la variante è stata approvata dal CTA con voto n.2436 del 15/9/98. Su tale base i lavori sono ripresi e, al 6/11/98, le paratie di destra risultavano finite, quelle di sinistra completate al 67%.

Alla stessa data, la situazione dei lavori all'esterno era la seguente: lungo Via di P. Cavalleggeri le paratie (doppie) di destra risultano completate al 57%, quelle di sinistra appena iniziate; su P.za della Rovere le paratie risultano completate al 26%. E' stato quasi ultimato il minitunnel, che correndo parallelo alla galleria, ospiterà tutti i cavi dei servizi.

Nel complesso l'avanzamento risulta essere pari al 32%, sensibilmente inferiore a quanto programmato ad aprile '98. L'impresa, tuttavia, ha presentato un programma aggiornato, basato sul potenziamento della produzione del cantiere, che dovrebbe consentire il recupero del ritardo ed il completamento entro il 2/11/99.

Un prossimo evento critico è rappresentato dal completamento del solettone di copertura all'interno della galleria e la relativa pavimentazione, con conseguente riapertura al traffico della galleria stessa. Il Comune ha preteso la riapertura per metà dicembre '98 e l'impresa si è impegnata a soddisfare la richiesta.

- *Sottovia lungotevere in Sassia (D.07.02)*

Questo intervento è stato inserito nel Piano del Giubileo in sostituzione del Sottopasso di Castel Sant'Angelo, che è stato definanziato all'inizio del 1998. Il sottovia è stato inserito nel Piano in Febbraio '98 con un finanziamento di 43,5 miliardi di lire e affidato al Comune di Roma, che data la complessità dell'opera si è avvalso come stazione appaltante del Provveditorato OO.PP per il Lazio.

Il Sottovia inizia da Piazza Pia e tramite una rampa di discesa percorre in sotterranea il Lungotevere in Sassia fino a riemergere sul lungotevere all'inizio di Via della Lungara, eliminando le intersezioni a raso dei ponti Vittorio Emanuele e Principe Amedeo, nonché favorendo l'accesso alla galleria PASA ed al parcheggio del Gianicolo. Lo sviluppo totale dell'opera è di 450 m.

Altro effetto atteso dell'opera è un miglioramento della vivibilità della zona ed in particolare dell'Ospedale Santo Spirito.

I lavori sono in corso.

- *Interconnessioni tra la viabilità ed il parcheggio del Gianicolo (D.08.03)*

L'intervento, finanziato con Lit. 15,4 mld ed affidato al Provveditorato OO.PP. del

Lazio, consiste nella realizzazione dei collegamenti tra la Galleria PASA ed il costruendo Parcheggio del Gianicolo: l'accesso da Piazza della Rovere viene realizzato attraverso l'allargamento della salita Sangallo mentre l'accesso dalla Galleria PASA viene realizzato attraverso una galleria sotterranea (rampa Torlonia) che raggiunge Piazza Urbano VIII sottopassando la salita del Gianicolo. La sistemazione della stessa Piazza Urbano VIII con gli accessi al parcheggio fanno parte dell'intervento. I lavori hanno avuto inizio il 12.08.1998 e sono articolati su cinque fasi.

I primi due mesi di attività sono stati dedicati alla cantierizzazione ed alla rimozione di pubblici servizi.

Successivamente ha preso avvio la Fase 1: è stata completata la realizzazione dei micropali sulla rampa Sangallo ed è stata avviata la realizzazione di pali sulla tratta terminale della rampa Torlonia.

L'esecuzione della tratta centrale della suddetta rampa in terreno di proprietà Torlonia è stata necessariamente differita fino al 18 novembre quando è stato raggiunto l'accordo tra le parti e siglato un verbale di accesso e asservimento.

Alla data del 18.11.1998 risultava un avanzamento globale pari circa al 6%, per un importo di 491 milioni sul totale di 8,2 miliardi. al netto del ribasso. L'avanzamento risulta sensibilmente inferiore a quello programmato; l'impresa, tuttavia, ha presentato un programma aggiornato (tuttora all'esame della Direzione Lavori), basato sul potenziamento della produzione del cantiere, che dovrebbe consentire il recupero del ritardo e il completamento entro il 12.11.1999.

3.4.4 Interventi inerenti la mobilità a Roma e nell'area romana

- Infrastrutturazione della stazione Tiburtina (D.09.01)

L'intervento è stato inizialmente dotato di un finanziamento di 150 mld affidato alle FF.SS. Esso comprende la fase funzionale prioritaria del programma di infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina e nodo di interscambio, oggetto dell'accordo di programma del 11.11.1997. La Conferenza dei Servizi conclusa l'11.05.1998 ha evidenziato che solo una parte degli interventi poteva essere realizzata nei tempi giubilari. In conseguenza il finanziamento è stato ridotto a 116 miliardi, relativo alle seguenti parti dell'opera: viabilità di accesso al piazzale posteriore (stralcio 2000 della Circonvallazione interna ramo Nord), allargamento e ampliamento del piano di stazione comprese le strutture di fondazione della piastra-ponte, prolungamento del sottopasso pedonale fino al piazzale posteriore. Sono rimaste a carico di FF.SS. le seguenti opere: le strutture in elevazione della piastra-ponte e gli interventi sul fabbricato viaggiatori.

L'appalto dei lavori per un importo netto di 79,3 mld relativo sia alle opere finanziate con i fondi del Giubileo che quelle a carico di FF.SS., è avvenuto in data 06.08.1998.

L'avvio dei lavori è avvenuto all'inizio di settembre 1998 con la cantierizzazione e la rimozione delle interferenze con i sottoservizi. Tale fase iniziale ha incontrato notevoli difficoltà operative da parte dell'impresa determinando un certo ritardo

nell'inizio effettivo dei lavori. Recentemente nel mese di novembre i lavori hanno progredito speditamente con la demolizione di fabbricati e lo spostamento delle interferenze nella fascia di realizzazione della circonvallazione.

Il programma lavori redatto dall'impresa ha incontrato difficoltà nell'approvazione da parte della Direzione Lavori. Si ritiene che solo alla fine di novembre si potrà disporre di un programma lavori concordato.

L'avanzamento dei lavori al 20 novembre è valutato sommariamente al 3%; tuttavia la mancanza di un programma lavori aggiornato ed approvato dalla Direzione Lavori non permette al momento di valutare i ritardi e le relative possibilità di recupero entro novembre 1999.

- Autostrada Roma - Fiumicino - Realizzazione terza corsia (lotto 2°) (D.10.01/a)

L'intervento consiste nella realizzazione della terza corsia dal km 10+800 al km 14+000 (dal ponte su Rio Galeria allo svincolo per l'autostrada Roma – Civitavecchia compreso).

La programmazione dei lavori prevede quattro macrofasi:

- km 11+790 - km 13+140 - Realizzazione di una variante provvisoria di 1700 metri con la costruzione di un sovrapasso ferroviario, al quale, in fase di realizzazione, sono stati aggiunti due passaggi, realizzati con elementi corrugati "Armco", che consentono il prolungamento della Via Sabbatino con la possibilità di raggiungere la stazione ferroviaria ed il collegamento dell'azienda agricola Rinaldi;
- km 13+140 - km 14+000 - Realizzazione e adeguamento delle rampe esistenti al bivio con l'autostrada A12 Roma – Civitavecchia;
- km 10+800 - km 11+790 - In questo tratto è previsto l'allargamento dei due ponti su Via Portuense e su Rio Galeria;

  km 11+790 - km 13+140 - Allargamento della sede stradale con la realizzazione di due opere strutturali per lo scavalcamento della ferrovia e di Via Sabotino. Per quanto riguarda l'opera ferroviaria, viene realizzata un'opera gemella a quella già realizzata per la variante provvisoria della macrofase 1, dopo la demolizione dell'opera esistente.

La realizzazione della variante provvisoria si è resa necessaria per riallineare la livelletta stradale senza interrompere il traffico, essendosi verificati cedimenti localizzati della massicciata.

L'importo del finanziamento è di 90 miliardi.

A seguito di un ricorso al TAR per opposizione all'affidamento d'appalto, con delibera n. 492/98 del 25-03-1998 notificata all'ANAS il 30-03-1998, il cantiere è stato fermo dall'1-04-1998 al 24-04-1998. L'ultimazione lavori è stata spostata, in conseguenza, al 22-12-1999.

E' stato riformulato un programma lavori con ultimazione al 30-10-1999, escluse le opere di segnaletica.

E' in via di realizzazione la variante provvisoria di 1,7 km che, correndo

parallelamente all'attuale tracciato, consentirà la deviazione del traffico autostradale per la realizzazione del ponte sulla ferrovia, riducendo al minimo i disagi per il traffico sia verso Civitavecchia che verso l'aeroporto.

Sono state apportate due varianti al progetto, la prima per consentire il passaggio di mezzi agricoli all'azienda Rinaldi e la seconda concernente il prolungamento della via Sabbatino per garantire il collegamento con l'attuale stazione ferroviaria.

E' in corso l'ultimazione del ponte sulla ferrovia, che consente il passaggio della variante provvisoria, con il montaggio delle travi prefabbricate per l'impalcato.

La sospensione e le varianti hanno determinato un forte ritardo nell'avanzamento dei lavori rispetto al programma iniziale.

L'apertura al traffico della variante è prevista per il 15/12/98: a questa data sarà possibile effettuare una verifica dell'andamento dei lavori e sulla possibilità di ultimazione nei tempi previsti.

Ad oggi l'avanzamento dei lavori è pari al 22,5% con un sensibile ritardo sul programma iniziale è in corso di predisposizione un programma aggiornato che, grazie al raddoppio dei turni di lavoro ed attività contemporanee su diverse tratte, dovrebbe permettere il recupero del ritardo ed il completamento entro il 22.12.1999.

- Linea ferroviaria La Storta – Viterbo (D.15.01)

L'intervento si inserisce nel quadro del più vasto progetto della così detta "Passante dei laghi" che collega Viterbo, nella zona dei laghi al nord di Roma, a Velletri, nella zona dei laghi a sud di Roma passando per l'anello ferroviario intorno alla capitale. La parte nord del passante inizia alla stazione San Pietro e termina a Viterbo: di questa, la tratta S.Pietro – La Storta è in corso di realizzazione con i fondi di Roma Capitale, mentre l'intervento giubilare riguarda la tratta rimanente e prevede:

- il raddoppio della linea La Storta – Cesano, subito dopo la Stazione La Storta, dal km 15+492 al km 23+725. In questo tratto vengono realizzate la fermata dell'Olgiata, la stazione di Cesano, tre sottovia, un cavalcavia, quattro tombini, un'opera di protezione dell'acquedotto Traiano Paolo ed altre opere minori, oltre ad una variante stradale sulla via Braccianese fino all'intersezione con la Cassia, per alleggerire il traffico nell'abitato di La Storta;
- elettrificazione da Cesano a Viterbo, con la realizzazione di tre sottostazioni elettriche.

L'importo del finanziamento è di 193.5 miliardi.

Sono previsti 14 appalti, di cui:

- 8 appalti conclusi;
- 1 con avviso di gara pubblicato il 18-3-1998, in via di ultimazione;
- 5 con trattativa privata, convenzioni esistenti o gare tramite servizio acquisti e forniture;

Le gare sono state divise in più categorie:

1. Opere civili, (di questa categoria fanno parte quattro appalti)

2. Elettrificazione
3. Impianti di sicurezza e segnalamento
4. Impianto di telecomando
5. Adeguamento impianto CTC (DCO di Viterbo)
6. Stralcio galleria artificiale strada Braccianese
7. Autoservizi sostitutivi
8. Allaccio ENEL alla SSE
9. Acquisto materiale di esercizio
10. Spostamento sottoservizi e attraversamenti interferenti.

I cantieri hanno superato le difficoltà della fase organizzativa iniziale e sono state avviate le lavorazioni di tutte le opere. E' stata completata la bonifica di tutta la linea.

Le indagini archeologiche, sotto la sorveglianza della Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale, hanno portato ad importanti ritrovamenti. In conseguenza, si sono rese necessarie delle modifiche di leggera entità alla fermata Olgiata, mentre nell'area dello svincolo tra la Cassia e la Braccianese, i lavori di scavo sono stati bloccati in attesa di trovare una soluzione, con il rischio di un possibile ritardo sul completamento della linea.

Le numerose interferenze con i sottoservizi si stanno risolvendo, attraverso la cooperazione degli Enti Gestori.

I lavori risultano attualmente in ritardo rispetto ai programmi iniziali; tuttavia i programmi aggiornati predisposti dall'impresa prevedono il completamento nei tempi giubilari.

-Interventi sul Grande Raccordo Anulare (D.11.01)

Il GR.A. ha un'estensione di km. 68 + 223. Oggi, in considerazione dei volumi di traffico, presenta alcune caratteristiche assolutamente insufficienti rispetto alla classificazione di autostrada avvenuta nel 1978.

L'Anas, di concerto con le Amministrazioni Comunale e Regionale, ha da tempo intrapreso il potenziamento dell'autostrada con la realizzazione della terza corsia per ogni senso di marcia secondo un progetto generale esecutivo redatto nel 1985.

L'intervento è stato poi inserito nel programma per Roma Capitale e, per il lotto 23 bis, anche nel piano del Giubileo.

L'opera pur rientrando solo per un lotto nel piano del Giubileo, riveste una fondamentale importanza per la mobilità in vista delle celebrazioni dell'Anno Santo.

Sotto il coordinamento dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, si è pertanto proceduto alla conclusione dell'accordo di programma e della conferenza di servizi in modo che l'opera medesima sia completata entro il 1999.

L'adeguamento previsto consiste nel trasformare l'attuale sede, mediamente larga 22 metri e costituita da due corsie per ogni senso di marcia separate da aiuole spartitraffico di due metri, in una nuova piattaforma con caratteristiche autostradali di larghezza complessiva di metri 33 con tre corsie per ogni senso di marcia e

spartitraffico di 4 metri.

Risultano già adeguati, per complessivi km.32 + 800 circa, i tratti compresi tra:

- la statale n.4 via Salaria e la strada provinciale Prenestina;
- le statali Tuscolana ed Anagnina;
- l'Ardeatina e la statale Pontina,
- l'autostrada per l'aeroporto e la strada comunale Pisana.

Un primo programma di completamento (lotti 16, 17, 17b, 18b, 19, 22a,23b) prevede l'eliminazione delle soluzioni di continuità esistenti sul tratto compreso tra le autostrade Roma – Firenze, Roma – L'Aquila, Roma – Napoli e Roma – Fiumicino, dove sono state avviate le progettazioni esecutive, propedeutiche all'appalto dei lavori ed intrapresi i rapporti con gli Enti e Amministrazioni competenti per il rilascio dei prescritti pareri relativi all'impatto delle opere sul territorio.

Per la restante tratta compresa tra la statale n.1 via Aurelia e la statale n.3 via Flaminia sono state avviate le progettazioni preliminari e definitive, in particolare per il tratto Flaminia – Salaria, nuovo ponte di Castel Giubileo e per il tratto Aurelia svincolo di Boccea.

L'ampliamento a tre corsie per ogni senso di marcia è previsto, nella quasi totalità del percorso, su uno o su due lati in aderenza al corpo stradale esistente del quale mantiene le stesse caratteristiche geometriche di tracciato.

Allo stato attuale non si registrano ostacoli significativi all'esecuzione dei lavori che nella totalità dei casi procede secondo il programma concordato con l'impresa ed approvato dalla Direzione Lavori dell'Anas.

E' doveroso far rilevare che le opere di allargamento del G.R.A. e della Roma – aeroporto di Fiumicino per la realizzazione della terza corsia insistono su aree intensamente antropizzate con la presenza di edifici anche industriali o destinati ad attività commerciale di grande interesse economico.

L'occupazione delle relative pertinenze ha generato nella quasi totalità dei casi un contenzioso che non sempre è stato facile risolvere.

E' risultato indispensabile procedere all'occupazione dei relativi piazzali.

Si è resa necessaria nella totalità dei casi l'indagine archeologica e l'adeguamento della fitta rete di servizi interferenti con i lavori stradali.

3.4.5 Interventi inerenti le "Aree basilicali"

Si tratta di un insieme di interventi per un finanziamento globale di circa 73 miliardi nelle seguenti aree basilicali:

- Area della Basilica di San Pietro (C-02-01/1);
- Area della Basilica di S. Giovanni, S. Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme (C-02-02/2);
- Area della Basilica di San Paolo (C-02-03/1);

aventi per oggetto l'adeguamento delle infrastrutture esistenti e la realizzazione

delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini. Beneficiario era il Comune di Roma che però ha preferito mantenere, per motivi di snellimento procedurale, la sola titolarità degli interventi di effettiva competenza.

In tal senso, per ogni area, l'intervento principale (infrastrutture e sistemazioni superficiali) è rimasto al Comune di Roma, mentre quelli accessori sono stati affidati alle società comunali competenti, al Ministero dell'Interno, alle Ferrovie dello Stato e alle Amministrazioni patriarcali delle Basiliche.

Gli interventi attuali sottoelencati risultano dalla disaggregazione di tre interventi finanziati nella prima stesura del Piano (uno per ogni area basilicale) per ognuno dei quali si indica il finanziamento in milioni di lire:

Intervento	Soggetto attuatore	San Pietro	San Giovanni	San Paolo
A - Infrastrutture a rete. Strutture temporanee	Comune di Roma	25.955	22.213	13.500
B - Illuminazione pubblica	ACEA	1.869	3.864	1.944
C - Impianti semaforici e pannelli informativi	STA	1.786	224	615
D - Risanamento igienico-ambientale	AMA	907	1.457	386
E - Impianti tecnologici TVCC, Sicurezza	Ministero Interno	2.805	3.285	1.491
F - Percorso pedonale Ponte Gelsomino	F.S.	1.446		
G - Restauro transetto Basilica	Amm. Patriarcale			1.256
Totale		35.141	28.686	19.192

Gli interventi principali sono stati ulteriormente suddivisi in cantieri, la cui situazione è ricapitolata di seguito.

Area Basilicale di San Pietro:

L'intervento è stato articolato in 3 cantieri, da appaltare separatamente, contrassegnati dalle seguenti sigle:

CON (Via della Conciliazione) 7.248 ml	La progettazione non è stata approvata dalle Soprintendenze. La Commissione incaricata si sta orientando alla eliminazione del proposto rialzo della sede stradale. La nuova progettazione dovrà essere effettuata dalla STA. Tempi di esecuzione da determinare
RIS (Piazza Risorgimento) 10.250 ml BOR (Ristrutturazione di Borgo) 3.197 ml	Le progettazioni definitive sono state approvate dalla Conferenza dei Servizi il 15/09/98; le progettazioni esecutive sono in corso e gli appalti sono previsti all'inizio del 1999. La durata dei lavori dovrebbe essere di 6-8 mesi.

Area Basilicale di San Giovanni:

L'intervento è stato articolato in 4 cantieri, da appaltare separatamente, contrassegnati dalle seguenti sigle:

MAR (S. Maria Maggiore) 4.005 ml CRO (S. Croce in Gerusalemme) 1.583 ml	Le progettazioni definitive sono state approvate dalla Conferenza dei Servizi il 15/09/98; le progettazioni esecutive sono in corso e gli appalti sono previsti all'inizio del 1999. La durata dei lavori dovrebbe essere di 6-8 mesi.
GIO (Piazza di Porta S. Giovanni) 8.171 ml	La progettazione non è stata approvata dalle Soprintendenze che hanno richiesto di adottare una sistemazione temporanea per il 2000, per poi trasferirla altrove. Le varianti progettuali dovranno essere effettuate dalla STA e poi appaltate. Tempi di esecuzione da determinare.
QUA (Via dei SS. Quattro) 1.533 ml	Progettazione esecutiva completata. Delibera indizione gara in preparazione. Inizio lavori previsto gennaio 1999, durata 4-6 mesi.
SOT (Sottopasso Piazzale Appio) 3.202 ml	L'ufficio cantieri ha sollevato obiezioni per il forte impatto sul traffico della costruzione; le interferenze con i sottoservizi sono rilevanti. La fattibilità dell'intervento è in discussione.

Area Basilicale di San Paolo:

L'intervento è stato articolato in tre cantieri, da appaltare separatamente, contrassegnati dalle seguenti sigle:

PAO (San Paolo, area limitrofa alla Basilica e Parco Schuster) 7.351 ml	La progettazione definitiva è stata approvata dalla Conferenza dei Servizi il 15/09/98; la progettazione esecutiva è in corso e l'appalto è previsto all'inizio del 1999. La durata dei lavori dovrebbe essere di 4-6 mesi.
OST (Via Ostiense) 1.679 ml	Progettazione esecutiva comple-tata. Delibera indizione gara in preparazione. Inizio lavori previsto gennaio 1999, durata 4-6 mesi.
LUN (Lungotevere San Paolo) 1.552 ml	

b - Gli interventi dell'ACEA comprendono l'adeguamento dell'illuminazione pubblica. Le progettazioni sono avviate e saranno completate non appena sarà definita la progettazione STA. Non si prevedono difficoltà esecutive.

c - L'intervento, affidato alla STA, sugli impianti semaforici e pannelli informativi, è stato progettato ed è pronto per l'appalto. La STA ha proposto di affidarlo ad un unico appaltatore.

d - Gli interventi dell'AMA comprendono attività di disinfezione, disinfestazione e rattizzazione delle aree basilicali. L'AMA ha definito le aree specifiche per tipologia d'intervento e la programmazione strategica negli anni 1999 e 2000. Non si prevedono difficoltà esecutive.

e - Il Ministero dell'Interno realizzerà interventi per il potenziamento del livello di sicurezza delle basiliche e delle aree circostanti. Affidamenti per oltre metà delle forniture sono già intervenuti, mentre gli altri (riguardanti apparecchiature

radiografiche a struttura fissa e metal detector a porta) sono previsti per metà dicembre p.v. Ulteriori apparecchiature minori per la sicurezza (metal detector portatili per armi ed esplosivi) saranno acquistati successivamente.

f - Per il percorso pedonale protetto Ponte Gelsomino la progettazione è stata approntata da FS, ma l'appalto non è stato ancora affidato dato che l'ente propone di inserirla in un più vasto piano di opere di urbanizzazione della Stazione S. Pietro per il quale il finanziamento deve ancora essere assicurato.

3.4.6 Principali interventi per la sanità

Degli interventi indicati nel seguente prospetto riepilogativo, sono in fase di esecuzione tutti quelli ricompresi nella categoria "lavori" (con completamento previsto nell'ultimo trimestre '99), mentre gli interventi per "forniture" sono in fase di aggiudicazione.

Intervento	**Cat.**	**Beneficiario**	**Descrizione/Importo**
Ospedale Santo Spirito	(L)	USL RME	DEA 1° livello 25 mld
Ospedale San Giovanni	(L)	Complesso San Giovanni Addolorata	DEA 2° livello 10 mld
Ospedale Sant'Eugenio	(L)	USL RMC	DEA 2° livello 30 mld
Ospedale Grassi – Ostia	(L)	USL RMD	DEA 1° livello 6 mld
Policlinico Gemelli	(L)	Univ. Sacro Cuore	DEA 2° livello 15 mld
Policlinico Gemelli	(L)	Univ. Sacro Cuore	Struttura Sanitaria di Ospitalità protetta 7 mld
Policlinico Umberto I	(L)	Azienda Polic. Umberto I	DEA 2° livello 10 mld
Ospedale San Filippo Neri	(L)+(F)	Azienda Ospedaliera San Filippo Neri	Unità terapia intensiva 3 mld
Manutenzione sede Osserv. Epidemiologico Regionale	(L)	Protettorato San Giuseppe	1,8 mld
Ospedale Spallanzani	(L)	IRCCS Lazzaro Spallanzani	Laboratorio 9,3 mld
Completamento servizio emergenza	(F)	Azienda Osp. San Camillo Forlanini	Sistema regionale di emergenza 118 (Lazio) 10,5 mld

Il monitoraggio degli interventi afferenti la categoria "Lavori", con particolare riferimento alle realizzazioni delle Strutture Emergenza/Accettazione, ha messo in luce i seguenti aspetti:

- ritardi nell'assegnazione dei lavori per tutti gli interventi rispetto ai tempi inizialmente programmati, eccetto l'Ospedale Santo Spirito;

- ritardi nelle consegne delle aree effettuate (in tutti i casi sotto riserva di legge), nelle more della stipula dei contratti con le imprese;
- difficoltà nella fase iniziale dei lavori in relazione ai necessari spostamenti di servizi esistenti, in conseguenza dell'obbligo di realizzazione in regime di operatività della struttura sanitaria. Fa eccezione l'Ospedale Santo Spirito dove si è optato per la chiusura dei servizi durante i lavori.

Si nota altresì che nel caso di alcuni interventi per Lavori (vedi ospedali: San Giovanni, Sant'Eugenio, Policlinico Gemelli, Spallanzani) è prevista un'ulteriore gara di appalto per l'acquisto di attrezzature, che risultano indispensabili per la fruibilità complessiva dell'opera da consegnare. Attualmente si registra ritardo nella definizione delle attrezzature e nell'indizione delle gare per l'acquisto delle stesse.

Nel quadro degli interventi concernenti il settore sanitario si segnalano come particolarmente complesse le opere di ristrutturazione dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) negli ospedali Santo Spirito, Policlinico Gemelli e Sant'Eugenio.

La chiusura dell'Ospedale Santo Spirito ha permesso un rapido sgombero delle aree con conseguente avanzamento dei lavori in linea con i programmi prefissati.

Può invece diventare critica la situazione negli altri due ospedali citati.

Al Policlinico Gemelli l'assegnazione dei lavori è avvenuta con ritardo rispetto ai programmi e ciò è problematico tenendo conto della complessità dell'opera da realizzare: piastra servizi, edificio di sei piani all'interno del quale il servizio DEA +2° livello, finanziato dalla 651/98, occupa soltanto 2 livelli. Le opere di fondazione sono appena iniziate; si sono registrati ritardi e difficoltà nella deviazione e sistemazione provvisoria dei servizi esistenti. Potenziali margini di recupero della presente situazione di difficoltà si potranno determinare successivamente, quando si disporrà di uno stato di avanzamento lavori più consistente di quello attuale.

All'ospedale Sant'Eugenio le opere sono state assegnate con ritardo a causa di difficoltà sorte nella fase di approvazione del progetto in Conferenza di Servizi. Altri problemi sorti nella fase di consegna delle aree di progetto hanno ritardato l'inizio dei lavori e costretto la direzione lavori a rivedere i programmi iniziali. Si valutano comunque realistiche le possibilità di recupero dichiarate dalla direzione lavori.

3.4.7 Principali interventi concernenti la "sicurezza"

Nel Piano così come definito ed adottato nel settembre 1996, gli interventi riguardanti espressamente la "sicurezza pubblica " facevano parte del settore E "Servizi speciali e formazione", sotto-settore 05 "Sicurezza pubblica e protezione civile" ed erano i seguenti:

- E.05.01 – Sicurezza Pubblica (Lazio, Roma) Piano degli interventi di potenziamento e adeguamento tecnologico del Sistema di Pubblica Sicurezza – Ministero dell'Interno – Finanziamento 5 miliardi.
- E.05.02 – Sistemi e servizi per la protezione civile (Lazio, Roma) Piano degli interventi e dei servizi per la sicurezza e la protezione civile – Dipartimento della Protezione civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Finanziamento 1 miliardo.

Oltre a quelli anzidetti erano previsti tre interventi inerenti la "Modernizzazione della vigilanza urbana (logistica e tecnologica)" aventi come soggetto beneficiario il Comune di Roma ed un finanziamento complessivo di 20 miliardi di Lire.

Con le successive modifiche ed integrazioni al Piano, la Commissione ha provveduto, ponendoselo anche quale autovincolo, a destinare le somme rivenienti da definanziamenti e ribassi d'asta soprattutto al sotto-settore "sicurezza pubblica e protezione civile", data la sua importanza strategica ai fini delle celebrazioni del Giubileo del 2000.

I finanziamenti destinati a tale sotto-settore sono difatti passati dai 6 miliardi iniziali agli attuali 178.

3.4.8 Area per Grandi Eventi presso Tor Vergata

Nel Piano sono previsti Lit. 3 miliardi (cod. D 22.01) destinati alle spese di progettazione per la realizzazione a Tor Vergata, del Centro di Accoglienza per la Manifestazione come previsto dal protocollo d'Intesa, in data 30.6.1998, sottoscritto dai seguenti soggetti istituzionali e non : Santa Sede, Regione, Provincia, Comune di Roma, Commissariato Straordinario, Agenzia per il Giubileo, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Con l'anzidetto protocollo è stato approvato dal Commissario Straordinario di Governo, dalla Santa Sede, dall'Università di Roma "Tor Vergata", dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Roma, dal Comune di Roma, il progetto di prefattibilità elaborato dall'Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. per lo svolgimento, nell'area dell'Università di Tor Vergata, della 15° Giornata della Gioventù, che si svolgerà nel corso dell'anno 2000.

Stante la complessità della progettazione che coinvolge competenze dirette di molteplici istituzioni e soggetti, è stata ravvisata dal Comune di Roma l'opportunità di ricondurre ad unità tutte le attività finalizzate all'organizzazione della manifestazione attraverso una complessa azione tecnica di coordinamento sia progettuale che operativo.

Con apposita convenzione in data 15.10.1998 tra il Commissario Straordinario di Governo, il Comune di Roma, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., il Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio è stato incaricato dell'attività di coordinamento della progettazione degli interventi strutturali, infrastrutturali provvisori e definitivi connessi alla realizzazione del Centro di Accoglienza nel comprensorio Universitario

di Tor Vergata per la celebrazione della 15° giornata Mondiale della Gioventù in occasione del Giubileo 2000.

A seguito di numerose riunioni tra tutti i soggetti coinvolti nella manifestazione, il Provveditorato ha predisposto, con l'apporto della propria struttura tecnica, una proposta di progetto preliminare, individuando gli interventi indispensabili per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza.

L'azione di coordinamento svolta ha consentito, infatti, di elaborare il progetto preliminare attraverso una stretta e fattiva collaborazione tra le varie Amministrazioni Statali (Ministero dell'Interno, Prefettura, Questura, Ministero Beni Culturali, Soprintendenze, Protezione Civile, Università), locali (Regione, Provincia, Comuni) e le Società di Servizio (ENEL, ACEA, AMA) e di utilizzare Studi e Programmi, già esistenti, che, per molteplici motivazioni, non erano stati oggetto di ulteriori sviluppi.

In particolare il territorio interessato dalla manifestazione, compreso tra la Via Casilina, il GRA, la Via Tuscolana ed attraversato dal tratto terminale dell'A2, riveste una notevole importanza strategica per il futuro sviluppo urbano con riferimento sia alla limitrofa area individuata per lo SDO, di cui alla Legge 396/90 sia per la presenza dell'Università "Tor Vergata" in fase di ultimazione.

Per tali motivazioni, questo quadrante, posto a sud-est della città, era già stato oggetto di numerosi studi da parte dei Dipartimenti tecnici del Comune di Roma finalizzati alla razionalizzazione viaria del territorio proprio in previsione del futuro sviluppo indotto dal trasferimento nello SDO, di attività del settore terziario.

Inoltre, a tutt'oggi il Comprensorio Universitario di "Tor Vergata" risulta ancora completamente sconnesso dal territorio circostante con conseguente difficile accessibilità da parte degli utenti.

In ultimo la costruzione della terza corsia del GRA in avanzata fase di realizzazione ha costituito una ulteriore barriera al collegamento sia dell'Università che del limitrofo territorio urbano con il resto della città.

Per quanto sopra il Provveditorato in relazione all'attività di coordinamento affidata ha prefissato i seguenti obiettivi in ordine di priorità:

- Come primo obiettivo con la collaborazione del Comune di Roma, della Provincia e della Regione si sono individuate quelle opere infrastrutturali viarie che consentissero di collegare il Comprensorio universitario al limitrofo tessuto urbano sia per consentire lo svolgimento della manifestazione con idonei standards di accessibilità per il flusso ed il deflusso dei partecipanti sia per rendere in modo permanente funzionale ed organico il territorio urbano esistente con adeguate direttrici varie.
- Come secondo obiettivo si è imposto il limite progettuale di non sovvertire o modificare lo sviluppo del programma universitario preventivato individuando quegli interventi, già previsti che potevano essere anticipati senza danno per i programmi di costruzione in esecuzione.
- Come terzo obiettivo si è preordinato di limitare in relazione alla manifestazione, le modifiche ambientali del Comprensorio Universitario, che si sviluppa per circa 300 ettari, proponendo un intervento di rinaturazione a verde, l'eliminazione degli

elettrodotti ENEL ed ACEA ad alta tensione presenti, la chiusura di una vecchia cava esistente, il recupero e pulizia dei fossi esistenti per il ripristino idrologico dell'area, la bonifica degli ordigni bellici.

Sulla base delle indicazioni dell'Agenzia Romana per la Preparazione del Giubileo, della Protezione Civile e della Questura si sono poi ipotizzate quelle opere, a carattere provvisorio, connesse alla Manifestazione che ne consentissero in sicurezza lo svolgimento, Tali interventi consistenti principalmente nella viabilità provvisoria, nell'allestimento dei centri servizi, nella distribuzione impiantistica per l'illuminazione, la diffusione sonora, visiva e telefonica e nella dotazione dei servizi igienici-sanitari sono stati ipotizzati prevedendone la rimozione ed il ripristino dopo la manifestazione.

La proposta di progetto preliminare è stata trasmessa a più di 40 soggetti coinvolti sull'argomento ed è stata convocata in data 20.11.1998 apposita Conferenza di Servizio sull'argomento al fine di verificare la possibilità di proseguire l'attività progettuale propedeutica alla realizzazione.
In data 20.11.1998 la Conferenza di Servizi sulla proposta di progetto preliminare si è regolarmente svolta con esito positivo, consentendo di acquisire ulteriori indicazioni e suggerimenti progettuali.

Sono stati, quindi, predisposti i progetti definitivi dei singoli interventi inclusi nella proposta di progetto preliminare al fine di proseguire l'attività approvativa.
Il Comune di Roma ha delegato al Provveditorato anche la predisposizione delle progettazioni definitive degli interventi di propria competenza, possibilità prevista nella citata convenzione in data 15.10.1998.
In data 23.12.1998, come previsto nel cronoprogramma allegato al progetto preliminare i progetti definitivi sono stati consegnati dalla competenti Amministrazioni al Provveditorato per la convocazione di una nuova Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri definitivi sulle singole opere:

I progetti definitivi predisposti sono stati i seguenti:

A. Infrastrutture stradali urbane previste nei programmi del Comune di Roma di riorganizzazione varia del quadrante Sud-Est della città. Opere permanenti in variante al PRG vigente
   1 Svincolo del collegamento Romanina – Tor Vergata e viabilità complementare;
   2 Svincolo di collegamento Torrenova – Tor Vergata e viabilità complementare;
   3 Completamento tangenziale Tor Vergata – Casilina;
   4 Collegamento Via del Fosso di S. Maura – Viale dei Romanisti;
   5 Soprapasso GRA – Collegamento Romanina – Via Alimena.

B. Interventi permanenti di Urbanizzazione primaria previsti nei programmi del Comune di Roma:
   6 Collettore fognario nell'area Tor Vergata – Tronco 1 – Casilina – Nuovo Policlinico;
   6/a Collettore fognario nell'area Tor Vergata – Tronco 2 – Policlinico – Fosso del Lombardo;

7 Cabina primaria ENEL

C. Infrastrutture stradali Università di Roma "Tor Vergata" di collegamento area universitaria con il territorio circostante. Opere permanenti conformi agli indirizzi del vigente Piano di assetto generale dell'Università, oggetto di apposito Accordo di programma in fase di revisione
   8 Collegamento area universitaria – Via del Vermicino (in parte Comune di Roma e in parte Comune di Frascati);
   8/a Collegamento area universitaria – Via del Vermicino – tratto ASI Stazione FF.SS. (manutenzione straordinaria stradale Provinciale);
   9 Collegamento area universitaria Via Casilina – GRA;
   10 Viabilità di secondo livello di collegamento interno complesso edilizio Universitario.

D. Interventi permanenti di recupero ambientale del territorio Universitario:
   11 Bonifica ordini bellici;
   12 Recupero ambientale della cava;
   13 Sistemazione fossi;
   14 Rinaturazione a verde del territorio.

E. Opere infrastrutturali provvisorie finalizzate alla predisposizione dell'area universitaria per accogliere le manifestazioni:
   15 Viabilità provvisoria compreso i ripristino;
   16 Impianti idrico-sanitari (potabile e non potabile);
   17 Impianti elettrici;
   18 Impianti audio;
   18/a Impianti video (maxi schermo);
   18/b Impianti telefonici;
   19 Recinzione perimetrale comparti;
   20 Allestimento delle attrezzature per i servizi nell'area delle celebrazioni (servizi igienici chimici – cartellonistica – segnaletica).

F. Opere permanenti di edilizia universitaria conformi agli indirizzi del vigente Piano di Assetto Generale dell'Università:
   21 Parcheggi a raso e pluripiano di pertinenza del Policlinico.

Sono stati inoltre predisposti ulteriori due progetti preliminari relativi ad infrastrutture stradali urbane, anch'essi previsti nell'ambito dei futuri programmi di riorganizzazione viaria del Comune di Roma, richiesti dal Comune stesso per aumentare l'accessibilità e la funzionalità del Comprensorio universitario sia in relazione alle manifestazioni che al futuro sviluppo urbano della città del quadrante Sud-Est.

Gli ulteriori preliminari predisposti sono i seguenti e si pongono anch'essi in variante rispetto al vigente PRG:

- Collegamento stradale tra Cinecittà est – Via Ciamarra – Via Scinto – Osteria del Curato;

- Collegamento stradale tra viabilità complementare svincolo Romanina – Tor Vergata e Via Tuscolana;

I progetti pervenuti sono stati verificati per accertare sia la rispondenza alla proposta preliminare che per controllare il recepimento di tutte le indicazioni le prescrizioni e i pareri già resi dalle varie Amministrazioni.

Effettuata la verifica è stata quindi predisposta la Convocazione per la Conferenza di Servizi del 12.1.1999.

4 GESTIONE FINANZIARIA.

4.1 Situazione al 31 dicembre 1998.

Il Piano è stato più volte rimodulato dalla Commissione per Roma Capitale, che, come si è già detto, ha modificato, aumentando o diminuendo, anche per l'intero importo, le assegnazioni finanziarie destinate alla realizzazione dei singoli interventi, ovvero ha finanziato nuove iniziative. Tali determinazioni hanno prodotto nei settori di intervento individuati della legge 651/96, significative variazioni finanziarie e strutturali di cui si è già detto precedentemente.

La situazione finanziaria del Piano a fine '98, sia in merito alla ripartizione dei finanziamenti fra i settori, che per ciò che concerne impegni e pagamenti è quella riassunta nella seguente tabella:

PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000
INDICATORI FINANZIARI
Suddivisione per settori – Situazione al 31/12/1998

Settori	Assegnazioni al 31/12/1998	Impegni	Impegni / assegnazioni	Pagamenti
	milioni	milioni	%	milioni
Settore A - Sociale e accoglienza	300.498	161.174	53,6%	130.489
Settore B - Beni culturali	559.225	418.003	74,7%	364.022
Settore C – Manutenzione, arredo urbano, Patrimonio ambientale	573.907	81.856	14,3%	35.267
Settore D – Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana	1.383.552	601.934	43,5%	324.986
Settore E - Servizi speciali e formazione	489.716	137.582	28,1%	116.060
Settore F – Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	180.359	64.512	35,8%	50.529
Fondo (1)	12.743	-	-	-
TOTALE	**3.500.000**	**1.465.066**	**41,8%**	**1.021.353**

(1) La cifra di circa 12,7 miliardi alla creazione di un fondo per fare fronte alla eventuale corresponsione di premi di accelerazione previsti negli atti di gara e nei relativi contratti, in favore degli esecutori di interventi compresi nel Piano, che ultimino i lavori in anticipo rispetto ai tempi contrattuali, che per poter far fronte alle maggiori occorrenze dovute a varianti o ad accordi bonari.

Anche per ciò che concerne l'attuazione finanziaria del Piano, la Commissione con Delibera n.3/98, recepita con DM in data 15 maggio 1998, ha apportato significative modifiche a quanto in merito stabilito negli "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano" dalla Commissione medesima deliberati subito dopo la definizione e l'adozione del Piano (Allegato A del DPCM in data 11/12/96).

Tali modifiche hanno riguardato, fra l'altro, le modalità e l'entità delle anticipazioni da erogarsi ai soggetti beneficiari dei finanziamenti in relazione alla realizzazione degli interventi di rispettiva titolarità. Particolarmente significativo, anche al fine dello snellimento procedurale, è la riduzione di un passaggio nella procedura di erogazione dei fondi a valle dell'aggiudicazione della gara di appalto. Difatti mentre con il precedente criterio l'erogazione avveniva con un primo anticipo del 20%, quindi con uno del 30% ed un successivo fino all concorrenza del 90% dell'importo impegnato, con le modifiche apportate il primo anticipo è passato al 50% ed il successivo al 35%, ferma restando l'erogazione delle somme residue dopo l'emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione.

4.2 Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Fino al 31 dicembre 1998 sono stati:

- assunti impegni per	Lit.1.083.456.318.309
- trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit. 331.813.500.000
- trasferiti al Ministero Interni	Lit. 50.000.000.000
- TOTALE DELLE RISORSE ATTIVATE	Lit. 1.465.065.818.30

A fronte dei predetti impegni sono state effettuate erogazioni per Lit. 1.021.353.000.000, pari a circa il 30% delle risorse assegnate.

Gli impegni assunti, per Lit. 1.083.456.318.309, si riferiscono al finanziamento di n. 340 interventi e più precisamente:

- risultano emessi n. 265 decreti di impegno pari al 5% dell'importo dell'assegnazione finanziaria del singolo intervento, per consentire al soggetto beneficiario di provvedere alla progettazione dell'intervento per un complessivo importo di Lit. 94.943.267.588. Contestualmente si è provveduto ad emettere le relative autorizzazioni di pagamento ed i titoli di spesa;

- Sono stati emessi n. 205 Decreti di impegno per l'importo di Lit. 980.363.747.308 ai fini della realizzazione degli interventi, ed emessi n. 300 autorizzazioni di pagamento e relativi titoli di spesa per l'erogazione di anticipazioni nella misura iniziale del 20% o del 50% e successivamente fino alla concorrenza dell'85% degli impegni sopracitati. Delle predette anticipazioni Lit. 292.459.015.506 si riferiscono a lavori e Lit. 81.392.828.130 riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi;

• In unica soluzione sono state trasferite risorse alla Regione Lazio ai fini dell'accoglienza per Lit. 109.196.230.000 ed ai fini della valorizzazione delle risorse umane Lit. 42.740.000.000.

Il trasferimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pari a Lit. 331.813.500.000, si riferisce all'avvio della realizzazione di 204 interventi di competenza del Ministero compresi nel Piano.
La somma di 50 miliardi trasferita al Ministero degli Interni si riferisce a n. 7 interventi in materia di sicurezza.

5 LA VIGILANZA

5.1 Il Monitoraggio

5.1.1 Il quadro normativo

Fin dal primo D. L. in data 26 aprile 1996, n. 225, recante "Misure urgenti" per la predisposizione di un insieme coordinato di interventi finalizzati alla celebrazione del Grande Giubileo del 2000, il legislatore aveva previsto l'attuazione di una attività di "monitoraggio permanente, sia qualitativo che quantitativo" da effettuarsi in base ai criteri indicati dalla Commissione preposta alla definizione e gestione programmatica del Piano. Tale previsione è stata mantenuta anche nei successivi decreti di reitero.

La legge di conversione n. 651, del 23 dicembre 1996, nel confermare sostanzialmente quanto previsto nei decreti precedenti in materia di "monitoraggio" degli interventi, ha però introdotto alcune modifiche ed integrazioni che, da un lato hanno rafforzato la rilevanza della suddetta attività ai fini programmatori, stabilendo un collegamento organico fra la stessa e quella di "riprogrammazione del piano" (art. "il piano può essere modificato ed integrato anche sulla base dei risultati del monitoraggio.."), e, dall'altra, ha introdotto elementi chiarificatori in merito all'individuazione del "soggetto o dei soggetti" cui affidare tale attività. Se nei decreti il compito di assicurare il monitoraggio "in maniera coordinata" compete ai soggetti beneficiari dei finanziamenti, nella legge viene mantenuta tale competenza, ma si parla di "maniera unitaria" indicando così implicitamente la necessità dell'unicità del "soggetto monitore", mentre viene mantenuta la competenza del Ministro dei lavori pubblici in merito alla vigilanza e monitoraggio delle opere pubbliche di competenza dello Stato.

Forse per la prima volta, in un piano coordinato di interventi di natura prevalentemente edilizia e di così rilevante impegno economico-finanziario, si è inteso far ricorso a quella forma di "rilevazione sistematica" che, da tempo, in altri contesti extranazionali, contribuisce ad un efficiente ed efficace realizzazione di programmi di investimento pubblico.

5.1.2 La Metodologia e le procedure per l'affidamento

Con DPCM in data 5 novembre 1996 l'U.R.C.G.E. è stato incaricato di "*coordinare ed armonizzare le ipotesi di criteri di monitoraggio e di presentare uno schema unitario di criteri di monitoraggio da sottoporre alle determinazioni della Commissione*": Con DPCM in data 11 dicembre 1996 sono stati approvati i "Criteri per il Monitoraggio" elaborati dall'U.R.C.G.E.

Sulla base di tali disposizioni l'U.R.C.G.E. ha provveduto preliminarmente a specificare la natura e l'articolazione dei servizi di monitoraggio da richiedere al soggetto monitore, partendo dall'assunto che per "monitoraggio" debba intendersi l'organizzazione di una serie di attività tese a massimizzare la probabilità che un progetto, venga realizzato con il minimo impiego di risorse economiche ed in modo da conseguire i risultati quantitativi e qualitativi voluti originariamente, ovvero quelli ridefiniti in corso d'opera in seguito a nuove circostanze e nuove conoscenze. L'attività di monitoraggio, perché abbia significato deve, quindi, contemplare anche adeguati meccanismi di retroazione che permettano una possibile revisione degli obiettivi in base alle risultanze del processo di monitoraggio stesso.

La caratteristica fondamentale dell'attività di monitoraggio è, pertanto, la sistematica verifica dell'avanzamento di un determinato intervento. Questa può essere effettuata attraverso l'individuazione di specifici indicatori attraverso i quali misurare gli scarti tra quanto previsto e quanto realizzato. Il principale problema da definire nella fase di progettazione di un sistema di monitoraggio e, quindi, lo studio e la specificazione degli indicatori più adatti al tipo di intervento da sottoporre a controllo.

In base a tali considerazioni si è ritenuto che la attività di monitoraggio di norma riguardi:

- la fase ex ante: messa a punto del progetto e la selezione e ammissione al finanziamento;
- la fase on going: implementazione e controllo sulla gestione dei fondi;
- la fase ex post: verifica e collaudo dei risultati.

All'interno di un processo di monitoraggio si possono, pertanto, distinguere tre livelli:

- quello della raccolta dei dati di avanzamento degli interventi e di organizzazione di un sistema informativo;
- quello del controllo e della certificazione, intesi come aspetto formale dell'attuazione degli interventi;
- quello della diagnostica e delle raccomandazioni, intesi come aspetti propriamente valutativi dell'intervento.

L'U.R.C.G.E. ha ritenuto che nel caso in esame i servizi dovessero essere:

- l'acquisizione, al fine di precostituire un quadro di riferimento rispetto al quale rapportare i successivi riscontri, di informazioni relative alle caratteristiche strutturali degli interventi contenuti nel Piano;
- il rilevamento dei dati consuntivi degli adempimenti in relazione alle diverse fasi attuative degli interventi (progettazione, affidamento dei lavori, stipula contrattuale, inizio dei lavori, esecuzione dei lavori e collaudo dei lavori);
- confronto dei dati consuntivi con quelli del quadro di riferimento iniziale in modo da rilevare gli scostamenti e da permettere le opportune decisioni e azioni;
- analisi ed organizzazione dei dati rilevati in un sistema informativo unificato in grado da renderli disponibili ai soggetti competenti;
- elaborazioni di grafici e tabelle con l'impiego di procedure informatizzate,

compatibili con il sistema informativo unificato utilizzato dall'U.R.C.G.E, sulla scorta dei dati del singolo intervento e delle eventuali interconnessioni spazio - temporali con altri interventi del contesto;

- elaborazione trimestrale di indicatori sintetici attinenti ai costi, ai tempi, ai fabbisogni e gli aspetti ambientali, tecnologici e procedurali, di competenza del Ministro delegato per le aree urbane, della Commissione.

Per quanto riguarda la specificazione degli indicatori in base ai quali valutare l'andamento degli interventi, l'U.R.C.G.E. ha ritenuto necessario preliminarmente individuare, per ogni intervento, oltre ai normali indici fisici, amministrativi e finanziari, anche un indice, definito indice di criticità, che permettesse di misurare quale fosse il rischio che un intervento non fosse realizzato nei tempi programmati.

L'U.R.C.G.E. ha individuato quali elementi di criticità degli interventi: i livello di definizione progettuale; il rapporto tra la durata degli adempimenti amministrativi e la durata complessiva dell'intervento; il rapporto tra il tempo residuo ed il tempo di esecuzione; il rapporto tra il costo dell'intervento e la durata dello stesso; la complessità di realizzazione anche in relazione alla priorità dell'obiettivo; la necessità di fare ricorso a procedure di variante urbanistica; la disponibilità dell'area; la dimensione sopra/sotto soglia comunitaria dell'appalto; ed ha determinato il loro contributo al suddetto indice impiegando il metodo del confronto a coppie.

Tale indice ha permesso di graduare quale dovesse essere, durante il monitoraggio, la cadenza temporale e il contenuto delle verifiche da effettuare. E' stato, inoltre, programmato il ricalcolo di tale indice durante l'attività di monitoraggio. Qualora l'indice aumenta è previsto di incrementare i momenti di verifica e, se è possibile, di prendere delle decisioni correttive.

L'U.R.C.G.E. successivamente alla definizione dei contenuti del servizio di monitoraggio ha provveduto a predisporre gli elaborati necessari per indire la gara ad evidenza pubblica finalizzata alla individuazione del soggetto monitore stabilendo, fra l'altro, che il compenso relativo alle prestazioni del servizio fosse previsto parte a corpo (a forfait) e parte a misura.

Sono stati predisposti:

- il disciplinare tecnico contenente la descrizione e le prescrizioni delle diverse attività da affidare;
- un elaborato contenente i criteri per la determinazione della parte del compenso da corrispondere a corpo (tariffa);
- l'elenco dei prezzi unitari per la determinazione della parte del compenso da corrispondere a misura.

Con DM in data 18 aprile 1997 la Commissione ha demandato al Ministro dei lavori pubblici l'espletamento della gara per l'individuazione del soggetto monitore di tutti gli interventi ricompresi nel Piano, a prescindere dalla titolarità degli stessi e, contestualmente, ha approvato il "Disciplinare tecnico e Capitolato d'oneri" comprensivo dei principi generali relativi al monitoraggio degl'interventi ricompresi nel Piano, nonché la modulistica unificata.

Con DM in data 24 giugno 1997 è stato inserito nel Piano senza codice

l'intervento denominato "Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo" con una dotazione finanziaria di Lit. 6 miliardi.

- il bando di gara;
- disciplinare di gara;
- schema di contratto.

L'U.R.C.G.E. ha quindi elaborato il Bando di gara e lo Schema di contratto, sulla base del quale è quindi indetta una gara a procedura aperta in ambito CEE, per un importo presunto di Lit. 5.743.582.000.

Il bando di gara è stato predisposto nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 157/95.

In particolare per quanto riguarda le condizioni minime di carattere economico-finanziario e tecnico - organizzativo che dovevano essere soddisfatte dagli offerenti si sono seguiti, ove possibili, i criteri ed i parametri previsti dal D.P.C.M. n. 55/91(bando tipo relativo alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori) e per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione è stato previsto di impiegare quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata con la metodologia contenuta nel DPCM 27 febbraio 1997 n. 116.

Si è previsto di adoperare come elementi di valutazione il merito tecnico, le modalità organizzative dell'espletamento della commessa e modalità di assistenza tecnica all'U.R.C.G.E., la certificazione di qualità ed il ribasso percentuale da applicarsi al compenso a corpo ed ai prezzi unitari per i quali sono stati rispettivamente stabiliti i pesi di 40,15,5 e 40.

Il bando di gara, che prevedeva come termine per la presentazione delle offerte la data del 10 marzo 1998, è stato:

- inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) il 3 luglio 1997;
- pubblicato sulla GUCE S 132 in data 11 luglio 1997;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) Foglio Inserzioni n.159 in data 10 luglio 1997;
- pubblicato per estratto il 18 luglio 1997 sui seguenti quotidiani : Il sole 24 ore, La repubblica il Messaggero.

Il bando di gara prevedeva che i soggetti interessati a concorrere potessero ritirare direttamente all'Ufficio per Roma Capitale : il disciplinare di gara, lo schema di contratto, il disciplinare tecnico, la tariffa, l'elenco prezzi nonché l'elenco dei documenti da presentare a riprova del possesso dei requisiti previsti dal bando, nel caso di aggiudicazione.

Il termine per il ritiro della documentazione era fissato al 4 settembre 1997 ed a tale data risultavano 31 richieste di acquisizione della documentazione.

In data 2 settembre 1997 il Ministro per i lavori pubblici nominava, ai sensi di quanto disposto dal disciplinare di gara, la apposita Commissione giudicatrice. A tale Commissione, a norma del suddetto disciplinare, era demandato il compito di procedere, in seduta aperta al pubblico, all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ed, in sedute riservate, alla valutazione

delle offerte tecniche, e, di nuovo in seduta aperta al pubblico, alla apertura delle buste contenenti l'offerta economica ed alla compilazione della graduatoria dei concorrenti.

Al termine ultimo di presentazione, così come stabilito dal bando di gara, risultavano pervenute due offerte, presentate rispettivamente dall'ATI fra Italconsult S.p.A.. SIM Società Italiana per il Monitoraggio S.p.A. e Infraplan S.A. e l'ATI fra Bonifica S.p.A., Italeco S.p.A., Reconta Ernst &Young S.p.A.. .

La Commissione ha iniziato i propri lavori il giorno successivo al termine previsto dal bando per la ricezione delle offerte e, cioè, il giorno 5 settembre 1997. In tale seduta venivano ammesse alle fasi successive entrambe le due offerte pervenute.

Dopo la riunione aperta al pubblico, la Commissione ha tenuto altre cinque riunioni riservate per esaminare le offerte tecniche ed assegnare i relativi punteggi ai due concorrenti ammessi. La Commissione ha concluso i propri lavori il giorno 29 settembre 1997 nel corso di una seduta aperta al pubblico durante la quale sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche e stabilita la graduatoria definitiva dei concorrenti.

In data 3 ottobre 1997 l'U.R.C.G. sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione ha aggiudicato provvisoriamente il servizio all'ATI Italconsult S.p.A.. SIM Società Italiana per il Monitoraggio S.p.A. e Infraplan S.A.

Dopo i controlli e le verifiche previste dal Disciplinare di gara, il servizio è stato aggiudicato definitivamente il 5 dicembre 1997 e il 18 s.m. si è provveduto alla stipula del contratto d'appalto.

5.1.3 Relazioni trimestrali del Soggetto monitore – Sintesi

Come si è detto, il contratto con il Soggetto Monitore è stato sottoscritto a dicembre 1997. Per obbligo contrattuale esso era soggetto a produrre la prima Relazione Trimestrale sullo stato di attuazione del Piano entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell'obbligazione.

La prima Relazione è pertanto stata consegnata ad aprile 1998 con riferimento al primo trimestre di quell'anno. Per consentire una lettura dell'evoluzione dello stato di attuazione del Piano durante il 1998, così come emergente dall'attività di "monitoraggio", si allegano di seguito le sintesi delle Relazioni prodotte dal Soggetto Monitore durante l'anno suddetto.

Va rammentato che la IV Relazione del Soggetto Monitore non ha potuto tenere conto degli effetti sul Piano delle modifiche allo stesso apportate dalla Commissione con la delibera della n. 6 del 1 dicembre 1998, che è stata recepita con DM in data 7 gennaio 1999. Eventuali leggere discrepanze fra i dati riportati dall'U.R.C.G.E. e dal Soggetto Monitore devono pertanto essere imputati a tale fatto.

Si segnala altresì che non sono sottoposti a monitoraggio tutti gli interventi ricadenti in aree extraterritoriali o concernenti immobili di proprietà della Santa Sede (S. Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano, S. Paolo Fuori le Mura).

- **I RELAZIONE - Situazione al 31/3/98**

- Struttura del Piano

A tale data 632 interventi del Piano erano sottoposti a monitoraggio, ripartiti in:

- N. 376 di categoria Lavori per un importo totale di 2.611 mld,
- N. 59 di categoria Forniture per un importo totale di 577 mld,
- N. 192 di categoria Beni Culturali per un importo totale di 377 mld
- N. 5 di categoria Incentivi o misti per un importo totale di 135 mld.

- Stato di avanzamento

Su 632 interventi monitorati, 285 pari al 45% sono stati appaltati e di questi 215 interventi (pari al 34%) sono in fase di realizzazione, mentre 2 (pari al 0,3%) sono stati completati.

L'avanzamento medio del processo attuativo è del 40%.

La categoria relativa ai beni culturali è quella in più avanzata fase realizzativa, essendo il 94,3% degli interventi già stati appaltati (rispetto al 99,5% inizialmente previsto), mentre solo il 25,3% degli interventi della categoria lavori sono stati appaltati (rispetto al 61,5% inizialmente previsto) ed il 14,5% delle forniture è stato appaltato (rispetto al 56,7% inizialmente previsto). Appare evidente il forte ritardo sul previsto di queste due ultime categorie.

- **II RELAZIONE - Situazione al 30/6 /1998**

- Struttura del Piano

A tale data 720 interventi del Piano erano sottoposti a monitoraggio, ripartiti in:

- N. 447 di categoria Lavori per un importo totale di 2432 mld,
- N. 63 di categoria Forniture per un importo totale di 595 mld,
- N. 205 di categoria Beni Culturali per un importo totale di 379 mld
- N. 5 di categoria Incentivi o misti per un importo totale di 144 mld.

- Stato di avanzamento

Su 720 interventi, 411 pari al 57% erano sono stati appaltati e di questi 307 interventi (pari al 42.5%) erano in fase di realizzazione, mentre 7 (pari al 1%) erano completati.

L'avanzamento medio del processo attuativo è del 40%, con un ritardo medio di 57 giorni negli affidamenti; l'avanzamento è inalterato rispetto a quello registrato alla fine del trimestre precedente a causa dell'inserimento di 88 nuovi interventi che hanno appena iniziato l'iter attuativo.
Viene confermato che la categoria dei beni culturali è quella in più avanzata fase di realizzazione, essendo quasi tutti gli interventi già appaltati, mentre solo il 42,5% degli interventi della categoria lavori sono stati appaltati (rispetto al 82,9% inizialmente previsto) e il 27,8% delle forniture è stato appaltato (rispetto al 78,1% inizialmente previsto). E' evidente il forte ritardo sul previsto di queste due ultime categorie.

Notevole è l'avanzamento rispetto al trimestre precedente, con 411 (57%) interventi appaltati contro 285 (45%) nel trimestre precedente e 307 (42%) interventi in esecuzione contro 215 (34%) precedenti. In particolare nella categoria lavori si è passati dal 25% al 42% di interventi appaltati, mentre ancora molto arretrate sono le forniture passate dal 15% al 28% di interventi appaltati. L'avanzamento degli interventi dei beni culturali è stato minimo in quanto già quasi interamente appaltati (94% a marzo '98).

Il numero di interventi completato è passato da 2 a 7.

- Valutazione del "Rischio di ritardo finale"

Una valutazione di rischio di ritardo finale svolta su 611 interventi ha dato il seguente quadro:

- ALTO RISCHIO N. 73 per un importo totale di 933 mld (33%)
- MEDIO RISCHIO N. 215 per un importo totale di 1114 mld (40%)
- BASSO RISCHIO N. 315 per un importo totale di 647 mld (23%)
- RISCHIO NULLO N. 8 per un importo totale di 110 mld (4%)

Si ricorda che gli interventi ad alto rischio sono quelli la cui data di completamento è a ridosso della data di inizio delle celebrazioni giubilari (24 dicembre 1999) e che presentano rilevanti difficoltà d'attuazione/esecuzione.

- **III RELAZIONE - Situazione al 30/9/98**

- Struttura del Piano

A tale data 720 interventi del Piano erano sottoposti a monitoraggio, ripartiti in:

- N. 435 di categoria Lavori per un importo totale di 2163 mld,
- N. 71 di categoria Forniture per un importo totale di 606 mld,
- N. 205 di categoria Beni Culturali per un importo totale di 354 mld,
- N. 9 di categoria Incentivi o misti per un importo totale di 284 mld.

- Stato di avanzamento

Su 720 interventi monitorati, 488 pari al 68% sono stati appaltati, di questi 359 interventi sono in fase di realizzazione e 19 sono stati completati.

L'avanzamento medio del processo attuativo è del 55%, con un ritardo medio di 94 giorni negli affidamenti ed un margine residuo medio di tempo tra il completamento e inizio Giubileo di 61 giorni.
La categoria "beni culturali" è quella che mantiene il più avanzato livello di attuazione, essendo tutti gli interventi già appaltati, mentre solo il 58,4% della categoria lavori sono stati appaltati (rispetto al 90% inizialmente previsto) e il 40% delle forniture è stato appaltato (rispetto al 95% inizialmente previsto).
Notevole è stato l'avanzamento della categoria lavori passata dal 42,4 al 58,4% di interventi appaltati, mentre minore è stato quello delle forniture passato dal 26,3 al 40%. L'avanzamento degli interventi su beni culturali è stato minimo in quanto già quasi interamente appaltati a giugno '98.

- Valutazione del "Rischio di ritardo finale"

La valutazione di rischio di ritardo finale riferita a 622 interventi ha dato il seguente risultato:

- ALTO RISCHIO N. 37 interventi per un importo totale di 901 mld (32%)
- MEDIO RISCHIO N. 254 interventi per un importo totale di 1143 mld (40%)
- BASSO RISCHIO N. 308 interventi per un importo totale di 647 mld (23%)
- RISCHIO NULLO N. 23 interventi per un importo totale di 133 mld (5%)

Rispetto alla valutazione di giugno '98, il numero di interventi ad alto rischio si è notevolmente ridotto (da 73 a 37), ma l'importo totale non è cambiato significativamente; molti interventi di importo ridotto hanno ottenuto una valutazione migliore, mentre sono stati inseriti nuovi interventi ad alto rischio, di importo elevato.

Tra i 38 interventi giudicati ad alto rischio 26 non sono ancora appaltati, mentre 11 sono in fase di esecuzione. La quasi totalità degli interventi a rischio (36) ricade nella categoria "lavori", mentre non se ne trova alcuno nella categoria relativa ai beni culturali, solo 1 nella categoria "forniture" e 1 nella categoria "incentivi".

- **IV RELAZIONE - Situazione al 31/12/98**

- Struttura del Piano

A tale data erano sottoposti a monitoraggio 746 interventi, ripartiti in:

- N. 446 di categoria Lavori per un importo totale di 2288 mld
- N. 82 di categoria Forniture per un importo totale di 665 mld
- N. 209 di categoria Beni Culturali per un importo totale di 365 mld
- N. 9 di categoria Incentivi o misti per un importo totale di 284 mld

- Stato di avanzamento

Su 746 interventi, 527 pari al 70% sono stati appaltati e di questi 407 interventi (pari al 55%) sono in fase di realizzazione, mentre 51 (pari al 7%) sono stati completati.

L'avanzamento nel processo attuativo è in media del 62%, con un ritardo medio di 100 giorni negli affidamenti.
La categoria dei beni culturali è quella più avanzata essendo tutti gli interventi già appaltati, mentre solo il 72,2% della categoria lavori sono stati appaltati (rispetto al 99% inizialmente previsto) e il 58% delle forniture è stato appaltato (rispetto al 98% inizialmente previsto). E' evidente il forte ritardo sul previsto di queste due ultime categorie.
Costante è stato l'avanzamento con 527 (70%) di interventi appaltati contro 488 (68%) nel trimestre precedente e 407 (55%) di interventi in esecuzione contro 359 (50%) precedenti. In particolare nella categoria lavori si è passati dal 58,4% al 72,2% di interventi appaltati, mentre minore è stato quello delle forniture passato dal 40% al 45%. Gli interventi dei beni culturali, già interamente appaltati a settembre '98, sono sempre nella stessa fase.

In termini percentuali l'avanzamento medio nel processo attuativo attuale del 62% rispetto al 55% registrato alla fine del trimestre precedente.

Il numero di interventi completato è passato da 19 a 51.

- Valutazione del "Rischio di ritardo finale"

Nel complesso con riferimento alle date di completamento previsto, si osserva un notevole "affollamento" di interventi in esecuzione nell'ultimo trimestre del '99 (molto superiore a quello già segnalato nel precedente trimestre): il 62% degli interventi per un importo dell'82% del totale termineranno (secondo i programmi) tra ottobre e dicembre '99. Ciò è preoccupante sia per il rischio di possibile superamento della data di inizio del Giubileo sia per la concomitanza di tanti cantieri, molti dei quali con forte impatto sulla città di Roma.

A tale proposito si contano attualmente 35 interventi con cantieri aperti a Roma con diretto impatto sulla circolazione e 28 di imminente apertura. Da osservare che in molti casi per ogni intervento viene aperto più di un cantiere. Del totale di 63 interventi "impattanti" 46 sono al centro città e 17 sono ubicati in periferia.

Una valutazione di rischio di ritardo finale svolta su 677 interventi ha dato il seguente quadro:

- ALTO RISCHIO N. 53 per un importo totale di 1077 mld (33%)
- MEDIO RISCHIO N. 240 per un importo totale di 1178 mld (37%)
- BASSO RISCHIO N. 326 per un importo totale di 759 mld (24%)
- RISCHIO NULLO N. 58 per un importo totale di 190 mld (6%)

Rispetto alla valutazione di settembre '98 il numero di interventi ad alto rischio è aumentato (da 37 a 53) ed anche l'importo totale è aumentato (da 901 a 1063 mld).

Tra i 53 interventi giudicati ad alto rischio, 29 riguardano lavori non ancora appaltati, 16 lavori appaltati, 7 forniture non ancora affidate e 1 è un incentivo (vedi punto 5.1.4).

- **Valutazioni complessive del Soggetto Monitore sui quattro trimestri del 1998**

In base ai dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno 1998 è stata costruita la tabella allegata che presenta i dati più significativi per documentare l'evoluzione dello stato di attuazione del Piano nel suo complesso e per le tre principali categorie di opere.

In merito il Soggetto monitore ha espresso le seguenti considerazioni:

- Si osserva un ritardo generalizzato nell'avanzamento degli interventi rispetto alla programmazione iniziale, con un aumento sensibile del ritardo medio negli affidamenti degli appalti ed un'analoga riduzione del margine finale previsto fra la data di completamento delle opere e la data d'inizio del Giubileo (24/12/99).

- I suddetti ritardi si sono riscontrati soprattutto nelle fasi amministrative (predisposizione delle progettazioni, approvazioni, gare d'appalto, affidamenti) conseguentemente, al fine di restare nei termini finali molti beneficiari hanno operato una riduzione dei tempi d'esecuzione delle opere.

- Riguardo alle diverse categorie si osserva che l'andamento generale è più favorevole per gli interventi dei beni culturali (75% di avanzamento medio a dicembre '98), e meno favorevole per i lavori (58% di avanzamento medio) e per le forniture (45% di avanzamento medio). Ovviamente gli interventi più critici si riscontrano nella categoria lavori, mentre per la loro natura le forniture richiedono tempi di esecuzione più rapidi e quindi possono più facilmente recuperare i ritardi.

- Costi: rimanendo l'importo totale del finanziamento entro i 3.500 miliardi stanziati dalla Legge, si osserva che il costo totale (comprensivo di altri finanziamenti) ha subito delle oscillazioni nel corso dell'anno a seguito delle rimodulazioni, mentre le economie (dovute a ribassi d'asta o riduzioni di costo) sono cresciute gradualmente fino a superare i 300 miliardi a fine anno.

- Criticità: si registra una graduale riduzione della criticità degli interventi evidenziata dall'incremento degli interventi giudicati a media o bassa criticità a scapito di quelli giudicati ad alta. Tra gli 85 interventi valutati ad alta criticità a fine del '98 si trovano essenzialmente quelli di importo più rilevante o quelli d'importo più ridotto, ma con forti ritardi nelle fasi amministrative o date di completamento a ridosso dell'inizio del Giubileo.

- Rischio: le valutazioni di rischio di ritardo degli interventi sono iniziate nel secondo trimestre del '98. Si ricorda che il giudizio di rischio tiene conto del livello di criticità, della valutazione dei ritardi nella fase di esecuzione e della possibilità di recuperarli.
  Il numero degli interventi ad alto rischio è passato da 73 a fine giugno a 37 a fine settembre, per poi risalire a 52 a fine dicembre '98. Ricadono in questa categoria non solo gli interventi di importo più rilevante in ritardo di esecuzione, ma anche interventi di minore dimensione in forte ritardo nell'affidamento.

5.1.4 Gli interventi ad "alto rischio"

Si riporta di seguito l'elenco elaborato dal Soggetto Monitore in ordine agli interventi ritenuti ad "alto rischio", aggiornato al 31 dicembre 1998.

INTERVENTI AD ALTO RISCHIO - DICEMBRE 1998

LAVORI - NON APPALTATI

Codice			Categoria	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	lett. c)	lett. d)	Fase in corso
A	01	21	L	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola	Comune di Roma - Ufficio Città Storica	5.500.000	ott-98	nov-99	L5
A	07	03	L	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	1.110.000	ott-98	nov-99	L4
A	07	07/a	L	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	2.440.000	ott-98	nov-99	L4
A	07	10	L	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama	800.000	ott-98	nov-99	L5
A	07	23	L	Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Contigliano	2.200.000	giu-98	giu-99	L6
A	07	25	L	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	6.000.000	ott-98	nov-99	L4
A	07	39	L	Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)	Comune di Aprilia	2.667.000	ago-98	ott-99	L5
B	19	39	L	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	1.250.000	set-98	dic-99	L4
B	20	02	L	Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Piccolomini - Villa del Sole	Fondazione Niccolò Piccolomini	2.985.000	nov-98	nov-99	L3
C	05	01/1	L	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma - Dip. X	3.300.000	dic-98	lug-99	L4
C	05	01/2	L	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma - Dip. X	1.700.000	dic-98	lug-99	L4
C	06	01	L	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma - Dip. X	3.500.000	set-98	giu-99	L4
C	07	01	L	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma - Dip. X	2.000.000	ott-98	ago-99	L4
C	08	01/5	L	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma - Dip. X	1.000.000	nov-98	lug-99	L3
C	09	02/2	L	Riqualificaz. parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica). Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S.Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca	Comune di Roma - Dip. X	5.500.000	ago-98	nov-99	L4
C	12	01	L	Villa Doria Pamphilj (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma - Dip. X	4.600.000	dic-98	ago-99	L3

C	12	02	L	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma - Dip. X	3.000.000	ott-98	mag-99	L3
C	13	01/2	L	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma - Dip. X	4.300.000	nov-98	nov-99	L4
C	18	04	L	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione	Provincia di Roma	1.200.000	gen-99	ott-99	L4
D	13	12	L	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)	Provincia di Roma	6.200.000	ott-98	ott-99	L7
D	14	03	L	SP Laurentina (Roma) dal GRA fino al km 28+200. Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria	Provincia di Roma	15.000.000	ott-98	ott-99	L7
D	14	06	L	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	6.210.000	ott-98	ott-99	L7
D	14	08	L	Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	11.205.000	ott-98	dic-99	L7
D	20	02	L	Rifacimento e manutenzione segnaletica	STA	20.000.000	dic-98	dic-99	L3
E	01	11	L	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza	AMA	3.601.000	set-98	nov-99	L3
E	01	20	L	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli.	AMA	8.330.000	set-98	nov-99	L3
E	05	13	L	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Tor di Quinto"	Ministero Difesa - Arma Carabinieri	26.500.000	dic-98	dic-99	L5
E	05	14	L	Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Ministero dell'Interno	19.000.000	set-98	dic-99	L5
E	05	19	L	Nuovo complesso polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	Ministero dell'Interno	11.000.000	lug-98	ott-99	L4
					N.29	**182.098.000**			

LAVORI - APPALTATI

A	01	16	L	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	633.593	dic-97	giu-99	L8
B	18	22	L	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	300.000	lug-97	gen-99	L8
B	19	33	L	Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina) Completamento della ristrutturazione (I fase)	Provincia di Latina	5.000.000	dic-98	dic-99	L8
C	01	15/2	L	Via Appia Antica. 2° Lotto. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale del tratto da piazza Numa Pompilio al G.R.A.	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	14.906.733	lug-98	nov-99	L8
C	03	03	L	Via delle Muratte	Comune di Roma - Dip. VI - Uff. Città Storica	2.600.000	ott-98	nov-99	L8
D	07	02	L	Sottovia Lungotevere in Sassia	Provveditorato OO. PP. del Lazio	43.500.000	apr-98	dic-99	L8
D	08	01	L	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta	Provveditorato OO. PP. del Lazio	56.050.000	mag-97	giu-99	L8

D	08	03	L	Interconnessioni tra il parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Prov. OO. PP. Lazio	15.390.000	ago-98	nov-99	L8
D	09	01	L	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	116.000.000	ago-98	dic-99	L8
D	10	01/a	L	Autostrada Roma/Fiumicino. Realizzazione terza corsia (lotto 2°)	ANAS	67.044.994	feb-98	nov-99	L8
D	15	01/1	L	Raddoppio ed elettrificazione del tratto La Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo	Ferrovie dello Stato	174.504.261	feb-98	dic-99	L8
D	16	01	L	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (I° lotto)	Autorità portuale di Civitavecchia	88.075.341	nov-97	mag-99	L8
D	18	01/2a	L	Linea metropolitana. Adeguamento metro A. 1° stralcio	Comune di Roma - Dip. VII	20.940.000	ago-98	ago-99	L8
D	18	01/2b	L	Linea metropolitana. Adeguamento metro A. 2° stralcio	Comune di Roma - Dip. VII	79.970.000	ago-98	ago-99	L8
E	02	03	L	Ospedale Sant'Eugenio (Roma) Realizzazione del DEA di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	30.000.000	mar-98	ott-99	L8
E	02	05	L	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	15.000.000	feb-98	nov-99	L8
					N. 16	**729.914.922**			

FORNITURE (NON APPALTATE)

C	19	02	F	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita	Provincia di Roma	8.000.000	dic-98	nov-99	F3
E	05	04	F	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	24.948.000	mar-98	nov-99	-
E	05	06	F	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	8.252.000	mar-98	nov-99	-
E	03	01	F	Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani	STA	5.000.000	lug-98	nov-99	F3
E	05	18	F	Nuovo complesso polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	Ministero dell'Interno	4.046.000	giu-97	dic-99	F3
E	05	25	F	Acquisto eliambulanza	Min. Interno - Dip. Prot. Civ. - VV.FF.	11.000.000	mag-98	ott-98	F5
F	05	02	F	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Ag. Romana Prep. Giubileo	5.000.000	ott-98	mag-99	F3
					N. 7	**66.246.000**			

INCENTIVI

A	08	01	I	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio	99.653.000	lug-98	giu-99	I3
					N. 1	**99.653.000**			

TOTALE	**N. 53**	**1.077.911.922**

5.2 La Vigilanza del Ministro dei lavori pubblici

Ai sensi del comma 8, art. 1 della legge 651/96 "*Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici..*".

Il Ministro dei lavori pubblici, avendo già provveduto ad assicurare il "monitoraggio", come specificato in precedenza, tramite un unico soggetto individuato con procedura ad evidenza pubblica, prima con Circolare Ministeriale n. 1109/5074/447 del 3 febbraio 1998, poi con Direttiva ministeriale in data 15 settembre 1998 – pubblicata sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 1998 – ha demandato lo svolgimento della funzione di "vigilanza" al Servizio di Ispettorato Tecnico sui lavori pubblici, operante presso il proprio Dicastero, ed ha , contestualmente, definito: i Criteri generali della vigilanza, l'Ambito soggettivo ed oggettivo della stessa, nonché i criteri in base ai quali esercitarla.

L'U.R.C.G.E. ha provveduto, a partire da agosto 1998, ha trasmettere al Servizio anzidetto l'elenco degli interventi ritenuti ad "Alto rischio" dal soggetto monitore - così come ha comunicato tale valutazione ai soggetti titolari dei medesimi interventi - permettendo così l'avvio dell'attività di vigilanza prevista per legge. Quest'ultima ha consentito al Ministro dei lavori pubblici di avere una ulteriore e più puntuale fonte di informazione, oltre a quella rappresentata dalle "relazioni" del soggetto monitore, su tutti gli interventi di competenza, ma in particolare su alcune grandi opere eseguite da amministrazioni dello Stato o da Aziende di rilevanza statale.

La stretta collaborazione instauratasi fra il Servizio di Ispettorato, il Soggetto Monitore e l'U.R.C.G.E. ed il flusso di informazioni che ne scaturito, hanno fornito alla Commissione ulteriori elementi conoscitivi in base ai quali procedere agli aggiustamenti programmatici del Piano.

5.3 La Vigilanza della BEI

La legge n. 651/96 ha previsto, all'art. 2, uno stanziamento di Lit. 3.500 miliardi per la realizzazione degli interventi inclusi nel Piano del Giubileo ed all'uopo ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad accendere mutui quindicennali di pari importo.
Dopo una attenta indagine di mercato il Ministero del Tesoro ha individuato quale offerta più conveniente quella proposta da un pool di istituti di credito, che utilizza, in parte, una provvista riveniente da un finanziamento della Banca Europea di Investimenti pari a Lit. 1400 miliardi.
L'intervento della BEI si è rilevato fondamentale in quanto ha consentito di abbassare sensibilmente l'onere del Tesoro per il pagamento degli interessi, ma, nel contempo ha posto alcune condizioni operative quali:

- L'individuazione dei progetti da ancorare alla provvista finanziaria della Banca stessa
- Il monitoraggio, tramite la Banca capofila, dei suddetti interventi

- L'effettuazione di visite e ispezioni delle opere oggetto di finanziamento.

In data 12 dicembre 1996, con nota n. 2973, il Presidente del Consiglio pro tempore ha incaricato l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi di assumere l'impegno irrevocabile nei confronti della BEI a collaborare con questa e con gli Istituti finanziatori per individuare, nell'ambito del Piano del Giubileo, gli interventi sui quali la BEI riterrà di ancorare la quota della provvista finanziaria da fornire agli Istituti finanziatori; di trasmettere alla BEI e all'Istituto coordinatore finanziatore la documentazione inerente il monitoraggio degli interventi approvati e di informare la stessa Bei dello stato di erogazioni ai soggetti beneficiari, nonché di acquisire, da parte di coloro ai quali siano state destinate risorse finanziarie rivenienti dal prestito concesso dalla BEI agli Istituti finanziatori, un atto formale con il quale il soggetto beneficiario si impegni irrevocabilmente nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e della BEI a:

1. Realizzare gli interventi di competenza secondo quanto previsto nella scheda tecnica o nelle eventuali modifiche della stessa concordate con la BEI;
2. Completare e rendere pienamente funzionali le opere entro il termine indicato nel Piano;
3. Procedere agli appalti ed alle commesse di lavori, forniture, attrezzature e servizi, destinati all'esecuzione degli interventi, facendo ricorso, per quanto possibile, ed in maniera soddisfacente per la BEI, ad una concorrenza internazionale estesa almeno ai Paesi firmatari dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e nel rispetto delle direttive del Consiglio dell'Unione Europeo in materia;
4. Provvedere a che le opere costituenti l'intervento formino oggetto di adeguata copertura assicurativa nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
5. Provvedere a che le opere relative a ciascun intervento formino oggetto di lavori di manutenzione, di riparazione ed eventualmente di rifacimento o di revisione necessari per il mantenimento o ripristino delle loro normali capacità di utilizzo per la durata dell'ammortamento del finanziamento, fermo restando che la manutenzione straordinaria degli interventi storici oggetto del finanziamento BEI verrà effettuato compatibilmente con le disponibilità finanziarie dei soggetti ed enti competenti;
6. Consentire che gli Istituti Finanziatori e la BEI effettuino o facciano effettuare a persone da essi designate, visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori oggetto degli interventi da essi finanziati.

Anche nel corso dell'anno 1998 si sono svolte una serie di visite programmate dai rappresentanti della BEI al fine di acquisire informazioni circa le modalità dell'istruttoria dei progetti inclusi nel Piano, della revisione del Piano medesimo, della erogazione delle risorse, delle procedure di appalto e della metodologia di monitoraggio. In particolare, nel 1998 si sono tenute numerose riunioni per approfondire l'esame dei sottoprogetti: "Trasporto Pubblico Urbano", "ANAS - Roma, realizzazione della terza corsia su parti del GRA e su parti dell'Autostrada Roma Fiumicino", "FS Roma – Stazione Tiburtina e Passante dei laghi", "Roma Sistema

Stradale Urbano" e "Azienda Municipalizzata Ambiente", nonché dei progetti relativi ai "Beni culturali" ed alla "Riabilitazione Urbana".

In ottemperanza a quanto disposto dal Presidente del Consiglio, in data 16 settembre 1998, con nota n. 4681, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi comunicava alla BEI di aver acquisito, da tutti i soggetti beneficiari dei finanziamenti ex lege n. 651/96, le formali dichiarazioni di assunzione di impegno a realizzare gli interventi di propria competenza e di renderli funzionanti nei termini indicati nel Piano. Inoltre, informava l'Istituto che dalla data del primo decreto di approvazione del Piano del Giubileo (18 settembre 1996) erano intervenuti sei decreti di modifica ed integrazione, lo aggiornava sull'entità dei fondi impegnati ed erogati ed inviava i primi rapporti trimestrali del Monitore.

A tutt'oggi, risultano approvati dagli organi decisionali della Bei i seguenti sottoprogetti:

Settore D

Anas*	D	10	01	Autostrada Roma/Fiumicino. Realizzazion terza corsia (2° e 3° lotto)	Anas
Anas	D	10	01/a	Autostrada Roma/Fiumicino. Realizzazione corsia (2° lotto)	Anas
Anas	D	10	01/b	Autostrada Roma/Fiumicino. Realizzazione corsia (3° lotto)	Anas
Anas	D	11	01	GRA tratto Pisana-Aurelia (R Realizzazione 3° corsia e svincoli (lotto 23b	Anas
FS**	D	09	01	Infrastrutturazione dell'area della Sta Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie Stato
FS	D	15	01/1	Raddoppio ed elettrificazione del tratt Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Vite	Ferrovie Stato
Tpu***	D	02	01	Linea tramviaria S. Pietro –Aurelia	Comune Roma
Tpu	D	03	01	Tram Venezia San Pietro, Realizzazione linea tranviaria	Comune Roma
Tpu	D	04	01	Linea tranviaria Archeotram	Comune Roma
Tpu	D	05	01/1	Fornitura di 240 autobus urbani di tipo lun mt	Atac
Tpu	D	05	01/2	Fornitura di 20 autobus urbani di media cap	Atac
Tpu	D	05	01/3	Fornitura di 18 vetture tranviarie di g capacità	Atac
Tpu	D	051	01/6	Fornitura equipaggiamento "Chopper" motrici linea metro "A"	Cotral
Tpu	D	18	01/1	Potenziamento nodo Termini	Comune Roma
Tpu	D	18	01/2a	Linea metropolitana. Adeguamento metro	Comune

				stralcio	Roma
Tpu	D	18	01/2b	Linea metropolitana. Adeguamento metro stralcio	Comune Roma
Tpu	D	18	02/1a	Ferrovie concesse. Potenziamento linea R Lido	Comune Roma
Tpu	D	18	02/1b	Ferrovie concesse. Potenziamento linea R Lido. Manutenzione	Cotral
Tpu	D	18	02/2a	Ferrovie concesse. Potenziamento linea R Nord 1° stralcio: Labaro	Comune Roma
Tpu	D	18	01/2b	Ferrovie concesse. Potenziamento linea R Nord 2° stralcio: Saxa Rubra	Comune Roma

Sotto progetti BEI
* Anas Roma 2000
** FS – Roma 2000
*** Trasporto Pubblico Urbano

Settori B e C

B Beni Culturali

B	1	Area del grande Campidoglio, Palazzo senatorio e Musei capitolini
B	2	Area dei Fori Imperiali
B	3	Restauro e manutenzione percorso Mura Antiche
B	4	Palazzo delle Esposizioni
B	5	Palazzo Braschi (Museo di Roma)
B	8	Museo nazionale Romano
B	9	Palazzo Barberini e Palazzo Corsini
B	10	Museo Nazionale di Villa Giulia
B	11	Galleria Nazionale d'Arte Moderna
B	12	Interventi di restauro di immobili storici/artistici
B	13	Restauri ed interventi conservativi di Chiese e Basiliche
B	14	Restauro ed adeguamento di altri Musei archeologici, medievali, moderni
B	15	Interventi nelle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano
B	16	Restauro e consolidamento di beni culturali archeologici
B	18	Valorizzazione del patrimonio culturale nella provincia di Roma
B	19	Valorizzazione patrimonio culturale regionale (Circuito abbazie)
B	20	Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata - **Escluso**

C Manutenzione e arredo urbano patrimonio ambientale

C	1	Manutenzione straordinaria aree verdi e abbattimento barriere architettoniche
C	2	Adeguamento delle strutture per l'accessibilità nelle aree di visita **(Escluso C.02.06 "Ponti pedonali temporanei...")**

C	3	Arredo urbano e manutenzione delle facciate – **(Esclusi C.03.06/07 "Incentivi e contributi...")**	
C	4	Adeguamento infrastrutture area di Castel Gandolfo	
C	5	Giardini di Castel Sant'Angelo - manutenzione	
C	6	Giardini San Giovanni /Via Carlo Felice - manutenzione	
C	7	Parco Casilino – Labicano. Sistemazione a verde	
C	8	Restauro del Parco di Villa Borghese	
C	9	Riqualificazione dei Parchi della Caffarella e Acquedotti (Appia Antica)	
C	10	Restauro del Parco Villa Ada Savoia	
C	11	Recupero dell'area di San Gregorio al Celio	
C	12	Restauro del Parco di Villa Doria Pamphili	
C	13	Sistemazione ambientale pendici Monte Mario e Casale Mellini	
C	14	Bonifica delle pendici del Gianicolo	
C	15	Manutenzione straordinaria / restauro del Parco del Colle Oppio	
C	18	Riqualificazione ambientale nella provincia di Roma **(Escluso C.18.01 "Piano straordinario di prevenzione e sicurezza")**	
C	19	Opere di risanamento del Bacino del Tevere	**- Escluso**
C	20	Orto botanico	**- Escluso**

Nelle successive rimodulazioni del Piano, alcuni di questi interventi sono stati disaggregati in numerosi sotto interventi, con conseguenti modificazioni o integrazioni finanziarie.

Alcuni si sono rivelati irrealizzabili nei termini di legge, altri sono stati sostituiti con altri che più si confacevano alle finalità giubilari.

Allo stato attuale, sono stati definanziati totalmente gli interventi rubricati con i codici: D.02.01, D.03.01 e D.04.01, relativi al sottoprogetto "Trasporto Pubblico Urbano – Linee Tranviarie ed Archeotram", quelli rubricati con i codici : B.01.01, B.08.06, B.16.23, attinenti i Beni Culturali, e quelli rubricati con i codici : C.01.08, C.01.09 e C.03.05, attinenti la Manutenzione e l'Arredo Urbano, mentre quello attinente al potenziamento del nodo Termini, è stato definanziato solo parzialmente.

Si pone pertanto l'esigenza di includere nel Piano, con successivi provvedimenti, altri interventi che abbiano natura di investimento, al fine di mantenere in necessario equilibrio tra la quota di finanziamento comunitario ed il volume di investimenti.

APPENDICE

PAGINA BIANCA

Cronologia degli atti normativi

- 26 aprile 1996 – Decreto Legge n. 225 recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000".
- 31 maggio 1996 – DPCM con il quale viene conferita al Ministro dei lavori pubblici delega per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.
- 3 luglio 1996 – Decreto Legge n. 349 recante " Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000".
- 30 agosto 1996 – Decreto Legge n. 455 recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000".
- 18 settembre 1996 – DPCM di adozione del " Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000" (Presidente del Consiglio Prodi) – Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997.
- 23 ottobre 1996 - Decreto Legge n. 551 recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000".
- 5 novembre 1996 – DPCM recante "Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000" - Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997.
- 11 dicembre 1996 – DPCM recante "Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000" - Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997.
- 21 dicembre 1996 – DM recante " Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 previsto dal decreto-legge n.23 ottobre 1996, n. 551" - Pubblicato sulla G.U. n.76 del 2 aprile 1997.
- 23 dicembre 1996 – Legge n. 651 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", pubblicata sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 1997.
- 18 aprile 1997 – DPCM recante "Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000" – Pubblicato sul S.O. alla G.U. n.161 del 12 luglio 1997.
- 24 giugno 1997 – DM recante "Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000" – Pubblicato sul S.O. alla G.U. n.205 del 3 settembre 1997.
- 4 agosto 1997 – DM recante "Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi per il Giubileo"– Pubblicato sulla G.U. n.57 del 10 marzo 1998.

- 22 dicembre 1997 – DM recante "Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi per il Giubileo, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 651"– Pubblicato sulla G.U. n.57 del 10 marzo 1998.
- 8 maggio 1998 – DM recante "Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi per il Giubileo, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 651" – Pubblicato sulla G.U. n.150 del 30 giugno 1998.
- 15 maggio 1998 – DM recante "Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi per il Giubileo, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 651" – Pubblicato sulla G.U. n.162 del 14 luglio 1998.
- 16 luglio 1998 – DM recante "Modificazioni al Piano degli interventi per il Giubileo" – Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 28 settembre 1998.

D. M. dell'8 maggio 1998.

Rep. N.150/RC

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";

VISTO il D.P.C.M. 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 2/1998 dell'11 marzo 1998, concernente: "Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 e 9 aprile 1998 concernenti delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei Lavori Pubblici in materia di Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

CONSIDERATO che per la riunione della Commissione per Roma Capitale dell'11 marzo 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, con nota del 9 marzo 1998, n. 1223/R.C. ha delegato il Ministro dei Lavori Pubblici, delegato per le Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione medesima;

VISTE le osservazioni della Corte dei Conti - Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 44, del 27 aprile 1998;

RITENUTO, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, risultanti dalla succitata deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 2/98, con le modifiche conseguenti al succitato rilievo della Corte dei Conti;

DECRETA

1. *Sono stabiliti i nuovi termini relativi alle lettere c) e d) dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, limitatamente agli interventi indicati* ***nell'allegato A;***
2. *Il titolo della sezione E: "Servizi speciali e formazione" del Piano per il Giubileo è così modificato "Sicurezza, Protezione civile, Servizi speciali e Formazione";*
3. *Gli interventi già rubricati con codici C02.01; C02.02/2; C02.03, sono disaggregati e sostituiti dai seguenti interventi individuati sulla base degli approfondimenti programmatici e progettuali relativi a ciascuna area basilicale:*

   - *C02.01/1 - Area delle basilica di S. Pietro in Vaticano. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza. Restauro, ristrutturazione e demolizione di manufatti per attrezzature di accoglienza, informazione e ristoro e per la qualificazione urbana. Fornitura ed installazione di allestimenti interni ed esterni. Ristrutturazione e manutenzione delle sedi viarie e pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche; interventi di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico. Installazione di elementi di arredo urbano;*

     Soggetto beneficiario: Comune di Roma

     Costo dell'intervento £ 25.955.600.000

     Risorse ex lege n. 651 £ 25.955.600.000

     Termini lett. c): aprile 1999

Termini lett. d): ottobre 1999

- *C02.01/2 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione;*

  Soggetto beneficiario: ACEA

  Costo dell'intervento £ 1.869.560.000

  Risorse ex lege n. 651 £ 1.869.560.000

  Termini lett. c): marzo 1999

  Termini lett. d): dicembre 1999

- *C02.01/3 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale;*

  Soggetto beneficiario: STA

  Costo dell'intervento £ 1.786.400.000

  Risorse ex lege n. 651 £ 1.786.400.000

  Termini lett. c): giugno 1999

  Termini lett. d): novembre 1999

- *C02.01/4 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Interventi di risanamento igienico ed ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici;*

  Soggetto beneficiario: AMA

  Costo dell'intervento £ 907.430.000

  Risorse ex lege n. 651 £ 907.430.000

  Termini lett. c): settembre 1998

  Termini lett. d): novembre 1999

- *C02.01/5 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza;*

  Soggetto beneficiario: Ministero Interno

  Costo dell'intervento £ 2.805.000.000

  Risorse ex lege n. 651 £ 2.805.000.000

  Termini lett. c): aprile 1999

  Termini lett. d): novembre 1999

- *C02.01/6 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Stazione S. Pietro: allestimenti per strutture di servizio ai pellegrini e realizzazione del percorso pedonale protetto lungo Ponte Gelsomino;*

  Soggetto beneficiario: F.S.

  Costo dell'intervento £ 1.446.500.000

  Risorse ex lege n. 651 £ 1.446.500.000

  Termini lett. c): aprile 1999

  Termini lett. d): novembre 1999

- *C02.02/2 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; Realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza; Restauro, ristrutturazione e demolizione di manufatti per attrezzature di accoglienza, informazione e ristoro e per la riqualificazione urbana; fornitura ed installazione di allestimenti interni ed esterni; ristrutturazione e manutenzione di sedi viarie e pedonali con abbattimento delle*

barriere architettoniche; interventi di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico; installazione di elementi di arredo urbano. Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali;

Soggetto beneficiario: Comune di Roma

Costo dell'intervento £ 22.213.751.000

Risorse ex lege n. 651 £ 22.213.751.000

Termini lett. c): aprile 1999

Termini lett. d): ottobre 1999

- *C02.02/7 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione;*

  Soggetto beneficiario: ACEA

  Costo dell'intervento £ 3.864.003.000

  Risorse ex lege n. 651 £ 3.864.003.000

  Termini lett. c): marzo 1999

  Termini lett. d): dicembre 1999

- *C02.02/4- Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale;*

  Soggetto beneficiario: STA

  Costo dell'intervento £ 224.400.000

  Risorse ex lege n. 651 £ 224.400.000

  Termini lett. c): giugno1999

  Termini lett. d): novembre 1999

- *C02.02/5 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Interventi di risanamento igienico-ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici;*

  Soggetto beneficiario: AMA

  Costo dell'intervento £ 1.456.866.000

  Risorse ex lege n. 651 £ 1.456.866.000

  Termini lett. c): settembre 1998

  Termini lett. d): settembre 1999

- *C02.02/6 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza;*

  Soggetto beneficiario: Ministero interno

  Costo dell'intervento £ 2.385.350.000

  Risorse ex lege n. 651 £ 2.385.350.000

  Termini lett. c): aprile 1998

  Termini lett. d): novembre 1999

- *C02.03./1 - Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza. Restauro, ristrutturazione e demolizione di manufatti per attrezzature di accoglienza, informazione e ristoro e per la qualificazione urbana. Fornitura ed installazione di allestimenti interni ed esterni. Ristrutturazione e manutenzione delle sedi viarie e*

pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche; interventi di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico. Installazione di elementi di arredo urbano;

Soggetto beneficiario: Comune di Roma

Costo dell'intervento £ 13.500.184.000

Risorse ex lege n. 651 £ 13.500.184.000

Termini lett. c): aprile 1999

Termini lett. d): ottobre 1999

- *C02.03/2. - Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione;*

  Soggetto beneficiario: ACEA

  Costo dell'intervento £ 1.943.700.000

  Risorse ex lege n. 651 £ 1.943.700.000

  Termini lett. c): marzo1999

  Termini lett. d): dicembre 1999

- *C02.03/3 - Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale;*

  Soggetto beneficiario: STA

  Costo dell'intervento £ 614.900.000

  Risorse ex lege n. 651 £ 614.900.000

  Termini lett. c): giugno 1999

  Termini lett. d): novembre 1999

- *C02.03/4 - Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Interventi di risanamento igienico ed ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici;*

  Soggetto beneficiario: AMA

  Costo dell'intervento £ 386.536.000

  Risorse ex lege n. 651 £ 386.536.000

  Termini lett. c): settembre 1998

  Termini lett. d): settembre 1999

- *C02.03/5 - Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza;*

  Soggetto beneficiario: Ministero Interno

  Costo dell'intervento £ 1.491.600.000

  Risorse ex lege n. 651 £ 1.491.600.000

  Termini lett. c): aprile 1999

  Termini lett. d): novembre 1999

- *C02.03/6- Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Restauro e consolidamento del transetto della Basilica di S. Paolo fuori le mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S. Paolo;*

  Soggetto beneficiario: P. Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo

  Costo dell'intervento £ 1.256.320.000

  Risorse ex lege n. 651 £ 1.256.320.000

  Termini lett. c): aprile 1999

Termini lett. d): novembre 1999

Per effetto della disaggregazione e delle sostituzioni di cui al presente punto, restano nella disponibilità £ 625.900.000; pari alla differenza fra le previgenti assegnazioni finanziarie per £ 84.734 milioni e le attuali assegnazioni finanziarie pari a £ 84.108.100.000.

4. *Per gli interventi per i quali si dispone il definanziamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 651/1996, il soggetto già beneficiario è tenuto ad effettuare la rendicontazione delle somme utilizzate fino alla data della comunicazione dell'intervenuto definanziamento e ad inviarla all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della detta comunicazione.*

5. *Gli interventi di seguito indicati, in quanto valutati non fattibili in tempo utile per le celebrazioni giubilari, sono definanziati nella misura degli importi a fianco di ciascuno di essi indicata, computata al netto dei trasferimenti già operati a favore dei soggetti beneficiari:*

A01.08	*Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro "Massimina")*	*£ 1.350 milioni*
A09.01	*Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: Centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di S. Pietro (Roma). Lavori di restauro e allestimento.*	*£ 10.000 milioni*
C01.17	*Via Pineta Sacchetti (Roma). Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi*	*£ 13.700 milioni*
C03.05	*Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram*	*£ 19.000 milioni*
D04.01	*Linea tranviaria Archeotram*	*£ 53.200 milioni*
	TOTALE	*£ 97.250 milioni*

6. *Gli interventi di seguito indicati, ancorché valutati fattibili, sono definanziati, su proposta del rispettivo soggetto beneficiario, per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie per il finanziamento di interventi ritenuti di prioritaria importanza strategica, nel quadro delle finalità giubilari. L'importo del definanziamento è computato al netto dei trasferimenti già operati a favore del soggetto beneficiario ed è indicato a latere di ciascun intervento:*

7. *Gli interventi di seguito indicati sono definanziati nella misura degli importi a fianco di ciascuno di essi indicata, per effetto degli approfondimenti programmatici e progettuali condotti dai rispettivi soggetti beneficiari:*

C01.26	*Riqualificazione area Teatro Marcello, P.zza Monte Savello, via Catalana, via del Tempio, via S. Angelo in Peschiera, via della Tribuna Campitelli*	*£ 3.000 milioni*
C07.01	*Parco Casilino Labicano - Sistemazione delle aree a verde*	*£ 5.000 milioni*
D19.02	*Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "passante dei laghi"*	*£ 30.000 milioni*
E04.01	*Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'anno 2.000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti alla P.A. Impiego operatori in servizio civile*	*£ 10.728milioni*
E04.04	*Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio) Strumenti formativi per l'auto apprendimento; riqualificazione centri formazione professionale*	*£ 2.872 milioni*
	TOTALE	*£ 51.600 milioni*

8. *L'intervento di seguito indicato è definanziato, a causa del parere negativo della Conferenza dei servizi, nella misura a fianco indicata, computata al netto del trasferimento già operato a favore del soggetto beneficiario:*

A07.02	*Campeggio e area di sosta per camper (Roma) da realizzare nell'area dell'Istituto tecnico agrario G. Garibaldi*	*£ 321,100 milioni*

9. *Le assegnazioni finanziarie degli interventi di seguito indicati sono ridotti, sulla base delle prime verifiche di fattibilità, nella misura di seguito indicata:*

C04.01	*Area di Castel Gandolfo (Roma). Terminal bus*	*£ 500 milioni*
CO4.02/A	*Area di Castel Gandolfo (Roma). Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico*	*£ 4.000 milioni*
C04.02/B	*Area di Castel Gandolfo (Roma). Centro di prima accoglienza*	*£ 5.700 milioni*
CO4.03	*Area di Castel Gandolfo (Roma). Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta*	*£ 650 milioni*
C04.04	*Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"*	*£ 200 milioni*
	TOTALE	*£ 11.050 milioni*

10. *Le somme rivenienti da ribassi d'asta, conseguenti all'espletamento delle gare d'appalto relative agli interventi di cui* ***all'allegato B,*** *ammontano complessivamente a £ 71.066.998.985, immediatamente disponibili. Le originarie assegnazioni finanziarie, relative agli interventi indicati nello stesso allegato* ***B,*** *sono conseguentemente ridotte nella misura degli importi dei rispettivi ribassi d'asta, come indicato a fianco di ciascuno.*

11. *Risultano pertanto, al momento, complessivamente disponibili £ 549.364.321.985, pari alla somma dei seguenti importi:*

£ 93.472.323.000	*rivenienti da precedenti definanziamenti*
£ 625.900.000	*rivenienti da riduzione delle assegnazioni finanziarie precisate al punto 3*
£ 356.699.100.000,	*rivenienti da definanziamenti degli interventi indicati ai punti 5,6,7,8 e 9*
£ 71.066.998.985	*rivenienti da ribassi d'asta come indicato al punto 10*
£ 27.500.000.000	*rivenienti a conclusione del procedimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 651/1996, relativo all'intervento già rubricato con codice D.07.01.*

12. *Sono approvati i cambi di titolo, di soggetto beneficiario e le disaggregazioni di interventi, senza oneri aggiuntivi a carico della legge n. 651/96, di cui* ***all'allegato C.***

13. *Sono assentite le integrazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi indicati* ***nell'allegato D,*** *nella misura ivi prevista e per un importo complessivo pari a £ 120.766.680.000.*

14. *Sono inseriti nel Piano del Grande Giubileo dell'anno 2000, gli interventi meglio specificati* ***nell'allegato E,*** *che comportano assegnazioni finanziarie per complessive £ 427.962.000.000, comprensive dell'assegnazione finanziaria relativa all'intervento del Comune di Roma, intitolato "Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (II° stralcio)", pari a £ 27.500.000.000, che è posta a carico delle corrispondenti risorse che si renderanno disponibili a conclusione del procedimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 651/1996, relativa all'intervento già rubricato con codice D.07.01.*

15. *Conseguentemente le risorse finanziarie assegnate ammontano £ 548.728.680.000, e pertanto restano nella disponibilità della Commissione ulteriori £ 635.641.985, che, unitamente alle risorse rivenienti da ribassi d'asta nel settore dei Beni Culturali, allo stato pari a £ 8.096.257.412, ed a quelle ulteriori che potranno derivare da successivi ribassi d'asta, saranno assegnate, prioritariamente, nell'ambito delle richieste pervenute, per la realizzazione dei seguenti interventi elencati in ordine di priorità:*

- *Acquisto mezzi logistici per la Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco (Min. Interno)*
- *Interventi speciali di illuminazione cittadina (ACEA)*
- *Incentivi per iniziative culturali (Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma)*
- *Interventi nell'area del comune di Castel Gandolfo*
- *Gestione dell'accoglienza (Agenzia romana per la preparazione del Giubileo)*

- *Accoglienza assistita - Opera Don Bosco*
- *Accoglienza assistita - Campus Biomedico*
- *Ampliamento e ristrutturazione della sede dei Vigili del Fuoco dell'EUR*
- *Restauro e risanamento conservativo delle ex scuderie papali al Quirinale*
- *Acquisto di mezzi di trasporto (ATAC, COTRAL)*
- *Manutenzione ed adeguamento delle reti viarie provinciali (Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo)*
- *III° e IV° Struttura mobile per parcheggio di interscambio nel comune di Roma.*

16. *I soggetti beneficiari dei finanziamenti relativi ai nuovi interventi inclusi nel Piano sono tenuti a presentare all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, entro 30 giorni dalla richiesta, nuova certificazione di fattibilità conforme alle previsioni della presente deliberazione, utilizzando la modulistica approvata dalla Commissione e pubblicata sul supplemento ordinario n. 143 alla* Gazzetta Ufficiale *n. 161 del 12 luglio 1997.*

Roma, lì 08/05/1998

Il Ministro

F.to Costa

Registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 1998

Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 79

D..M. del 15 maggio 1998

Rep. N. 159/RC

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";

VISTO il D.P.C.M. 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 3/1998 del 11 marzo 1998 con la quale, a fini di semplificazione amministrativa sono state parzialmente modificati gli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui all'allegato A al D.P.C.M. 11 dicembre 1996, per quanto concerne in particolare le modalità e l'entità dei trasferimenti di fondi in favore dei soggetti beneficiari;

TENUTO CONTO che con successiva deliberazione n. 4 del 6 maggio 1998, la Commissione per Roma Capitale ha ritenuto, anche in conformità ai rilievi informalmente mossi dagli organi di controllo, di riconsiderare le suddette decisioni e di rielaborare nuove e diverse modalità circa gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 e 9 aprile 1998, concernenti delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei Lavori Pubblici in materia di Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

RITENUTO, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, risultanti dalla succitata deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 4/98;

DECRETA

1. *All'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio del 11/12/1996 recante "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano" sono apportate le seguenti modifiche:*
2. *"Per la realizzazione di ciascun intervento l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi assume il relativo impegno di spesa, al netto delle somme già impegnate per la progettazione e di quelle indicate nel Piano a titolo di cofinanziamento, a favore del soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione della certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, circa l'intervenuta aggiudicazione della gara di appalto, sulla base del quadro tecnico-economico, riformulato a seguito dell'intervenuto ribasso d'asta. Resta fermo l'obbligo della trasmissione del contratto ad avvenuta stipulazione dello stesso. L'Ufficio provvede all'erogazione al soggetto beneficiario del 50% dell'importo impegnato, al netto delle somme eventualmente già trasferite, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato e corredata dal relativo verbale di consegna dei lavori, ancorché sotto riserva di legge, sottoscritto dall'impresa.*
3. *Sulla base della certificazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo delegato, idoneamente documentata, dell'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo erogato ai sensi del precedente punto 1.9, l'Ufficio del Programma per Roma Capitale e Grandi Eventi provvede all'erogazione di un ulteriore 35% dell'importo dell'impegno di spesa assunto.*
4. *La somma residua è erogata su richiesta documentata dell'avvenuta certificazione del collaudo ovvero di regolare esecuzione.*

5. *Qualora l'intervento consista nella fornitura di beni o prestazione di servizi, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, sulla base della certificazione, da parte del soggetto beneficiario, dell'intervenuta stipulazione del contratto, provvede, a richiesta del soggetto beneficiario medesimo, all'assunzione dell'impegno di spesa e alla contestuale erogazione di un acconto del 50 % dell'impegno assunto. Per gli interventi consistenti in prestazione di servizi, le successive erogazioni sono effettuate con le modalità di cui ai punti 1.10 e 1.11. Per gli interventi consistenti in fornitura di beni, le successive erogazioni sono effettuate, sempre su richiesta del soggetto beneficiario, in conformità alle clausole contrattuali. Ciascuna erogazione è comunque subordinata alla certificazione, da parte del soggetto beneficiario, della conformità della prestazione resa alle previsioni contrattuali. Resta fermo l'obbligo della trasmissione del contratto ad avvenuta stipulazione.*

6. *1.12.bis Qualora il soggetto beneficiario del finanziamento sia una società a totale o prevalente capitale pubblico, e in relazione alla natura dell'intervento, non siano direttamente applicabili le procedure relative agli appalti di lavori o alle forniture di beni e servizi di cui ai punti precedenti, secondo le modalità ivi previste, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un suo delegato, assume l'impegno di spesa sulla base di idonea documentazione, comprovante il complessivo onere dell'intervento e le relative modalità di esecuzione, al netto delle somme già impegnate per la progettazione. Il 50% dell'importo dell'impegno assunto è corrisposto entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un suo delegato, attestante l'inizio delle attività. Un ulteriore 35% dell'importo dell'impegno assunto è corrisposto entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un suo delegato, sulla base di idonea documentazione, comprovante l'utilizzazione dell'80% dell'importo erogato nonché l'attività effettivamente svolta. La somma residua è erogata sulla base della rendicontazione finale, approvata dai competenti organi del soggetto beneficiario."*

7. *Gli interventi rubricati con codice C04 – 01; C04 – 02/A; C04 – 02/B; C04 – 03; C04 – 04 sono espunti dal Piano degli interventi per il Giubileo. Si rende pertanto disponibile la somma di £ 11.300 milioni.*

8. *Sono inseriti nel Piano degli interventi per il Giubileo, per un complessivo ammontare di finanziamenti assentiti pari a £ 11.050 milioni:*

Codice.	*Titolo dell'intervento*	*Soggetto Beneficiario del finanziamento*	*Costo Stimato in milioni*	*Risorse DL 651 In milioni*	*Altre risorse*	*Tempi lett. c)*	*Tempi lett. d)*
C 04 A	*Terminal Bus*	*Comune di Castel Gandolfo*	*1.300*	*1.300*		*ott-98*	*set-99*
C 04 B	*Centro Servizi di prima necessità*	*"*	*1.500*	*1.500*		*ott-98*	*set-99*
C 04 C	*Sottopasso pedonale di Via Maremmana*	*"*	*300*	*300*		*ott-98*	*set-99*
C 04 D	*Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico*	*"*	*2.550*	*2.550*		*ott-98*	*set-99*
C 04 E	*Sistemazione della viabilità urbana*	*"*	*1.800*	*1.800*		*ott-98*	*set-99*
C 04 F	*Sistemazione della passeggiata sul lungolago*	*"*	*1.000*	*1.000*		*ott-98*	*set-99*

C	*04*	*G*	*Recupero e restauro dei monumenti*	"	*500*	*500*	ott-98	set-99
C	*04*	*H*	*Potenziamento infrastruttura fermata Ferroviaria "LA VILLETTA"*	"	*2.100*	*2.100*	ott-98	set-99
			TOTALE DELLE OPERE		*11.050.*	*11.050*		

Roma, lì 15 maggio 1998

Il Ministro

f.to Costa

Registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 271

D. M. del 16 luglio 1998

Rep. N. 166/RC

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: <Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000".>, in G.U. – serie generale- n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo 2000, e sue successive modificazioni ed integrazioni, in supplemento ordinario alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997;

Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 5/1998 del 14 luglio 1998, avente ad oggetto: Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 e 9 aprile 1998, concernenti delega di funzione del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, rispettivamente in G.U. – serie generale- n. 278 del 27/11/1996 e n. 95 del 24/4/1998;

Considerato che nella riunione della Commissione per Roma Capitale del 14 luglio 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha delegato il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione medesima;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, come risultanti dalla succitata deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 5/1998;

DECRETA

1. *A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto, sono ridotte le assegnazioni finanziarie relative agli interventi di cui all'allegato A, nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 62.933.535.655 (£ 18.267.221.866 + £ 44.666.313.789);*
2. *Sono totalmente definanziati, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, i seguenti interventi con recupero di complessive £ 6.400.000.000:*

A07-17	*"Ostello della Gioventù"*	*Nettuno*	*Ristrutturazione dell'edificio ex Divina Provvidenza"*	*£ 2.700.000.000*
A07-38	*"Ostello della Gioventù*	*Norma*	*Recupero e riconversione ex edificio scolastico"*	*£ 1.200.000.000*
C04.G	*"Recupero e restauro dei monumenti"*	*Castel Gandolfo*		*£ 500.000.000*
C02-07	*"Pista ciclabile Castel Sant'Angelo-Ponte Sublicio"*		*che sarà realizzato con i fondi ordinari del Comune di Roma*	*£ 2.000.000.000*

3. *Gli interventi di seguito indicati sono parzialmente definanziati, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, con recupero di complessive £ 79.417.585.657, in quanto ritenuti non realizzabili in tempo utile per la celebrazione del Giubileo:*

C03-02	*"Isole pedonali di piazza della Minerva. Interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali" modificato in:*	*"Ristrutturazione della pavimentazione stradale di Piazza della Minerva",*	*definanziato per £ 779.459.147;*
C04-D	*"Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del Centro storico",*		*definanziato per £ 2.000.000.000;*
C04-H	*"Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria - LA VILLETTA"*		*definanziato per £ 700.000.000*
D09-01	*"Infrastrutturazione della Stazione Tiburtina e nodo di interscambio",*		*definanziato per £ 34.000.000.000;*
D18-01/1	*"Potenziamento nodo Termini",*		*definanziato per £ 29.762.826.510,*
D21-01	*"Realizzazione tranviaria largo Argentina-Via del Plebiscito"*	*modificato in "Qualificazione nodo di scambio tram-bus Piazza Argentina"*	*definanziato per £ 12.175.300.000;*

4. *Le risorse disponibili sono determinate, pertanto, in complessive £ 149.636.763.297, pari alla somma dei seguenti importi:*

£ 885.641.985.	*Risorse residue non assegnate dopo l'emanazione del D.M. n. 150/RC dell'8/7/1998*
£ 44.666.313.789	*Risorse rivenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento di cui al punto 1 della presente deliberazione*
£ 18.267.221.866	*Risorse rivenienti da ribassi d'asta relativi ad appalti di competenza del Ministero dei BB.CC.AA.*
£ 6.400.000.000	*Risorse rivenienti da definanziamenti totali di cui al punto 2 della presente deliberazione*
£ 79.417.585.657	*Risorse rivenienti da definanziamenti parziali di cui al punto 3 della presente deliberazione*

5. *Sono approvati i nuovi termini relativi alle lettere c) e d) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 651, relativamente agli interventi indicati nell'allegato B, in conformità delle richieste dei soggetti beneficiari o come modificate dal soggetto monitore nonché delle proposte di differimento formulate dal soggetto monitore medesimo.*

6. *Sono assentite le integrazioni finanziarie, i cambi di titolo e del soggetto beneficiario nonché le aggregazioni e disaggregazioni degli interventi, come indicati nell'allegato C, per un importo complessivo di £ 42.727.084.510.*

7. *Sono inclusi nel Piano gli interventi indicati nell'allegato D, per un importo complessivo di £ 106.226.000.000 (94.929.000.000 + 11.297.000.000 per Beni Culturali), in coerenza con le priorità indicate al punto 15 del D.M. n. 150/RC dell'8 maggio 1998, e sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate ai settori della sicurezza, sanità, mobilità e cultura ai fini di una maggiore completezza ed armonizzazione del Piano; pertanto a fronte di £ 149.636.763.297 di risorse disponibili e di complessive £ 148.953.084.510 (106.226.000.000 + 42.727.084.510) assentite, restano nella disponibilità della Commissione £ 683.678.787.*

8. *Sono inclusi nel Piano, ai soli fini della fruizione di procedure attuative acceleratorie e fatte salve le valutazioni e le determinazioni degli Uffici competenti circa il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di competenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 270/1997, i seguenti interventi proposti da soggetti privati:*

A07-47 "Progetto per la trasformazione di manufatti rurali in centro di accoglienza turistica"

Soggetto proponente: Soc. Agricola Abundantia S.r.l. – Roma

A07-48 "Progetto per la trasformazione di manufatti rurali in centro di accoglienza turistica

Soggetto proponente: Soc. Agri.Ma S.r.l. – Roma

A07-49 "Realizzazione in autofinanziamento di un albergo a basso costo"

Soggetto proponente: Iniziative immobiliari '96 S.r.l. – Roma

9. *Il punto 1.16 degli "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano", di cui all'allegato A del D.P.C.M. 11 dicembre 1996 e successive modificazioni, è così sostituito, a decorrere dalla data della delibera n. 5/98, citata in premessa:*

   "1.16. Il Comune di Roma, la Provincia di Roma e la Regione Lazio provvedono ad approvare l'atto unitario ed organico di affidamento all'Agenzia delle attività da svolgere, sulla base del contributo per la realizzazione del Piano dell'accoglienza disposto in favore della stessa Agenzia, con DD. MM. di recepimento delle deliberazioni della Commissione per Roma Capitale, assunte nelle sedute del 24 ottobre 1996 ed 11 marzo 1998.

   A seguito dell'approvazione del predetto atto di affidamento, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi eroga all'Agenzia l'ulteriore importo di £ 21 miliardi.

   L'erogazione delle successive quote di contributo avrà luogo alle date del 31 dicembre 1998, del 30 giugno e 31 dicembre 1999, del 31 maggio e 31 dicembre 2000. L'Agenzia correda la domanda di trasferimento delle risorse con la documentazione, previamente verificata dai soggetti affidatari, comprovante i costi sostenuti e gli impegni assunti. L'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi procede all'erogazione dell'importo corrispondente all'avanzamento documentato e verificato dai soggetti affidatari.

   L'ultima delle predette erogazioni ha luogo a saldo e nella misura rispondente ai costi effettivamente sostenuti e certificati come sopra, ove del caso, anche successivamente alla data del 31 ottobre 2000.".

10. *Dopo il punto 1.21 è aggiunto, infine, il seguente:*

    "1.21. Qualora le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento siano inferiori all'importo complessivo delle somme erogate al soggetto beneficiario, l'importo differenziale viene versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'utilizzazione per le finalità della legge n. 651/1996.".

11. *Sono approvati gli indirizzi attuativi di cui all'allegato E che costituisce parte integrante della presente deliberazione*

Roma, lì 16 luglio 1998

Il MINISTRO

F.to Costa

Registrato alla Corte dei Conti il 4 settembre 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 381

D. M. del 7 gennaio 1999

Rep. N. 181/RC

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";

VISTO il D.P.C.M. 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. – serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 e concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma", (in G.U. - serie generale - n. 18 del 23/1/1998);

VISTO il decreto ministeriale dell'8 maggio 1998, pubblicato sulla G.U. - serie generale – n. 150 del 30 giugno 1998 e relativo all'approvazione della deliberazione n. 2 dell'11 marzo 1998, con la quale la Commissione per Roma Capitale, integrata ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, della legge n. 651/1996, ha individuato i settori prioritari di intervento da finanziare a valere sulle future economie comunque realizzate;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 189 del 24 novembre 1998, avente ad oggetto: "Proposta di rimodulazione degli interventi comunali compresi nel Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000";

VISTA la nota n. ULSG/1800/XI. 3 del 27 novembre 1998, con la quale il Commissario Straordinario del Governo per il grande Giubileo del 2000, ai sensi dell'art. 1, lett. a), DPR 31 dicembre 1997, sulla base delle esigenze postulate dal processo attuativo del Piano, ha formulato proposte di modificazioni ed integrazioni del Piano medesimo;

CONSIDERATO che nella riunione della Commissione per Roma Capitale del 1° dicembre 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha delegato il Ministro dei Lavori Pubblici, delegato per le Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000 a presiedere la riunione medesima;

VISTA la deliberazione n. 6/98 adottata dalla Commissione per Roma Capitale, ex lege n. 651/1996, in data 1° dicembre 1998;

RITENUTO, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 11996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, come risultanti dalla succitata deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 6/98;

DECRETA

1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto, sono ridotte, per accertate minori esigenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato A, nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 158.437.363.918.

2. *Sono totalmente definanziati, su richiesta degli rispettivi soggetti titolari, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, i seguenti interventi con recupero di complessive £. 2.500.000.000:*

   E.05.10: "Acquisto 4 gruppi elettrogeni con relativi shelter":£. 1.000.000.000

   E.05.31: "Ampliamento e ristrutturazione sede EUR": £. 1.500.000.000

3. *Gli interventi di seguito indicati sono parzialmente definanziati, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, con recupero di complessive £. 17.491.191.000:*

   A.07.10 "Campeggio e aree di sosta per camper (Castel Madama)" non realizzabile e il cui stanziamento è ridotto da £. 600.000.000 a £. 150.000.000, definanziato per £. 450.000.000, fatta salva la maggiore somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

   C.02.01/1 "Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza", il cui stanziamento, a seguito di riprogrammazione, è ridotto da £. 25.955.600.000 a £. 19.356.600.000, e definanziato per £. 6.599.000.000;

   C.02.03/1 "Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza" il cui stanziamento, a seguito di riprogrammazione, è ridotto da £. 13.500.184.000 a £. 11.237.993.000 e definanziato per £. 2.262.191.000;

   E.01.19 "Sedi di zona ed aree intermedie attrezzate (Roma). Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Saxa Rubra (1 lotto funzionale)" non realizzabile ed il cui stanziamento è ridotto da £. 3.000.000.000 a £. 150.000.000, definanziato per £. 2.850.000.000, fatta salva la maggiore somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

   E.01.20 Sedi di zona ed aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) Via Zucchelli, il cui stanziamento, a seguito di riprogrammazione, è ridotto da £. 6.000.000.000 a £. 670.000.000, definanziato per £. 5.330.000.000, fatta salva la maggiore somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

4. *4. Le risorse disponibili sono, pertanto, determinate in complessive £. 179.112.233.705, pari alla somma dei seguenti importi:*

£. 683.678.787	*Risorse residue non assegnate con D.M. del 16 luglio 1998*
£.158.437.363.918	*Risorse rivenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento di cui al punto 1*
£. 2.500.000.000	*Risorse rivenienti da definanziamenti totali di cui al punto 2*
£. 17.491.191.000	*Risorse rivenienti da definanziamenti parziali di cui al punto 3*

5. *Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1 della legge n. 651/96, i cambi di titolo e di soggetto beneficiario, le aggregazioni e disaggregazioni di interventi, come indicato nell'allegato B;*

6. *In via confermativa ed integrativa della statuizione di cui al D.M. del 18 aprile 1997 gli interventi sottoindicati, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari, sono definanziati ed espunti dal Piano, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:*

   B. 13.53 "Chiesa S. Andrea in via Flaminia – (Roma) Restauro", perché realizzato con fondi propri del soggetto titolare;

   B.12.07 "Arsenale Pontificio (Roma). Restauro completo dell'immobile per utilizzazione museale", perché non realizzabile;

   B.13.37 "Chiesa della SS Annunziata (Roma). Restauro della facciata", perché riprogrammato;

B.18.15 "Riqualificazione del comprensorio della Mentorella (Capranica)", in quanto incorporato nell'intervento rubricato con codice C.18.02;

B.19.11 "Monastero di S. Scolastica (Subiaco RM). Restauro", in quanto incorporato nell'intervento rubricato con codice B.18.16.

7. *Sono assentite le integrazioni di finanziamento indicate nell'allegato B, per un ammontare complessivo di £. 109.140.021.000.*

8. *Sono inclusi nel Piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo, gli interventi indicati nell'allegato C, per un importo complessivo di £. 53.604.911.000;*

9. *Le assegnazioni finanziarie degli interventi sottoindicati sono integrate delle somme a fianco di ciascuno indicate, relative alle minori occorrenze finanziarie risultanti da economie di gara e portate in detrazione sia con D.M.dell'8 maggio 1998 che con D.M del 16 maggio 1998:*

D.14.01 "Strada provinciale Ardeatina. Manutenzione straordinaria dal Km 9,600 al Km. 23.100" £ 1.794.168.005

D.14.02 "Strada provinciale Laurentina. Scavi archeologici lungo il tracciato" £ 256.227.845

D.14.04 "Strada provinciale Tiberina. (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0,00 al Km 18,00 £ 1.591.680.001;

per un ammontare complessivo di £. 3.642.075.851;

10. *Sono accantonate £. 12.725.225.854, quale fondo per far fronte alla eventuale corresponsione di premi di accelerazione previsti negli atti di gara e nei relativi contratti, in favore degli esecutori di interventi compresi nel piano che ultimino i lavori in anticipo rispetto ai termini contrattuali, nonché per provvedere alle esigenze connesse alle eventuali varianti in corso d'opera di cui all'art. 25 della legge n. 109/94 e successive modificazioni.*

11. *Le risorse finanziarie rivenienti da successivi ribassi d'asta, sono destinate, alla realizzazione degli interventi afferenti i seguenti settori, indicati in ordine di priorità.*

    1. *Sicurezza*
    2. *Trasporti e mobilità (ATAC e COTRAL)*
    3. *Accoglienza assistita e sanità*
    4. *Integrazioni della provincia di Roma e viabilità delle province del Lazio*
    5. *Farmacop (come da delibera comunale)*
    6. *ACEA*

    Integrazioni finanziarie per l'autostrada Roma-Fiumicino (ANAS)

    Servizi igienici mobili

    Cattedrale di Anagni e chiesa di Tor Tre Teste

    Area dei grandi eventi di Tor Vergata.

12. *L'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi è incaricato di svolgere ulteriori accertamenti istruttori, per le successive determinazioni della Commissione, in ordine alle richieste di inclusione nel Piano presentate da soggetti privati ai soli fini della fruizione di procedure acceleratorie di cui all'art. 1, c. 6 della legge n. 270/97.*

13. *Dopo il punto 5 della "Normativa di riferimento per l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano", di cui all'allegato A del DPCM 11 dicembre 1996 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente punto 6: "Per i lavori il cui costo di realizzazione sia superiore a 5.000.000 di ECU, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono a nominare una commissione di collaudo, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i lavori di importo inferiore a 5.000.000 di ECU e superiore a 1.000.000 di ECU, in luogo della commissione di collaudo viene, di norma, nominato un singolo collaudatore; per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di ECU, che non rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 28,*

c. 7, della citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori";

14. *Dopo il punto 1.15 degli "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano" di cui all'allegato A del DPCM 11 dicembre 1996 e successive modificazioni, è inserito il seguente punto:*

1.15 bis: "Le risorse finanziarie destinate agli incentivi per la manutenzione edilizia, il decoro cittadino ed i parcheggi pertinenziali sono trasferite in unica soluzione, su richiesta del Comune di Roma, dietro presentazione del relativo programma di utilizzo e delle convenzioni stipulate con i vari istituti di credito. Sono altresì trasferiti in unica soluzione, i contributi a favore delle imprese giovanili e per la promozione di occupazione connessa alle attività giubilari, su richiesta del soggetto beneficiario, alla presentazione della delibera di approvazione dei progetti ammessi."

Roma, lì 7 gennaio 1999

Il Ministro

Enrico Micheli

Registrato alla Corte dei Conti il 5 febbraio 1999
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 60

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

1. Le modifiche al Piano degli interventi secondo i vari Decreti

PAGINA BIANCA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

GIUBILEO LAZIO - TUTTI I DECRETI - aggiornato al 31 dicembre 1998

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
A 01 01	Centri diurni per persone senza fissa dimora (Roma).Allestimento delle strutture presso gli ospedali Santo Spirito e Spallanzani.	Comune di Roma	Costo Stimato 900.000.000 Risorse DL 349 900.000.000 Altre risorse Temp. ist. d) feb-97 Temp. ist. c) dic-96 Temp. ist. d) giu-97 Costo Stimato 900.000.000 Risorse DL 651 900.000.000 Altre risorse Temp. ist. c) mar-98 Temp. ist. d) ott-98	212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 dic-96 giu-97 212.000.000 212.000.000 dic-97 ott-98	212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 dic-96 giu-97 212.000.000 212.000.000 dic-97 ott-98	7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 dic-97 nov-99	dic-99 gen-99 7.000.000.000 7.000.000.000	1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 nov-98 gen-99	1.500.000.000 1.500.000.000
A 01 02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d)	212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 dic-96 giu-97 212.000.000 212.000.000 dic-97 ott-98	212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 dic-96 giu-97 212.000.000 212.000.000 dic-97 ott-98	7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 dic-97 nov-99	dic-99 gen-99 7.000.000.000 7.000.000.000	1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 nov-98 gen-99	1.500.000.000 1.500.000.000
A 01 03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d)	212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 dic-96 giu-97 212.000.000 212.000.000 dic-97 ott-98	212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 dic-96 giu-97 212.000.000 212.000.000 dic-97 ott-98	7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 dic-97 nov-99	dic-99 gen-99 7.000.000.000 7.000.000.000	1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 nov-98 gen-99	1.500.000.000 1.500.000.000
A 01 04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S.Margherita " - Roma	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d)	212.000.000 212.000.000 Definanziato 212.000.000 212.000.000 dic-96 giu-97 212.000.000 212.000.000 dic-97 ott-98	212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 dic-96 giu-97 212.000.000 212.000.000 dic-97 ott-98	7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 dic-97 nov-99	dic-99 gen-99 7.000.000.000 7.000.000.000	1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 nov-98 gen-99	1.500.000.000 1.500.000.000
A 01 05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma). Ristrutturazione dell'edificio dell'IPAB "S. Giuseppe Doria"	IPAB "S.Francesca Romana" - Roma	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d)	212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 dic-96 giu-97 212.000.000 212.000.000 dic-97 ott-98	212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 dic-96 giu-97 212.000.000 212.000.000 dic-97 ott-98	7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 dic-97 nov-99	dic-99 gen-99 7.000.000.000 7.000.000.000	1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 nov-98 gen-99	1.500.000.000 1.500.000.000
A 01	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma).Ristrutturazione dell'edificio dell'IPAB "S. Francesca Romana"	Comune di Roma	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d) Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Temp. ist. c) Temp. ist. d)	212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 dic-96 giu-97 212.000.000 212.000.000 dic-97 ott-98	212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 212.000.000 dic-96 giu-97 212.000.000 212.000.000 dic-97 ott-98	7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 dic-97 nov-99	dic-99 gen-99 7.000.000.000 7.000.000.000	1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 nov-98 gen-99	1.500.000.000 1.500.000.000

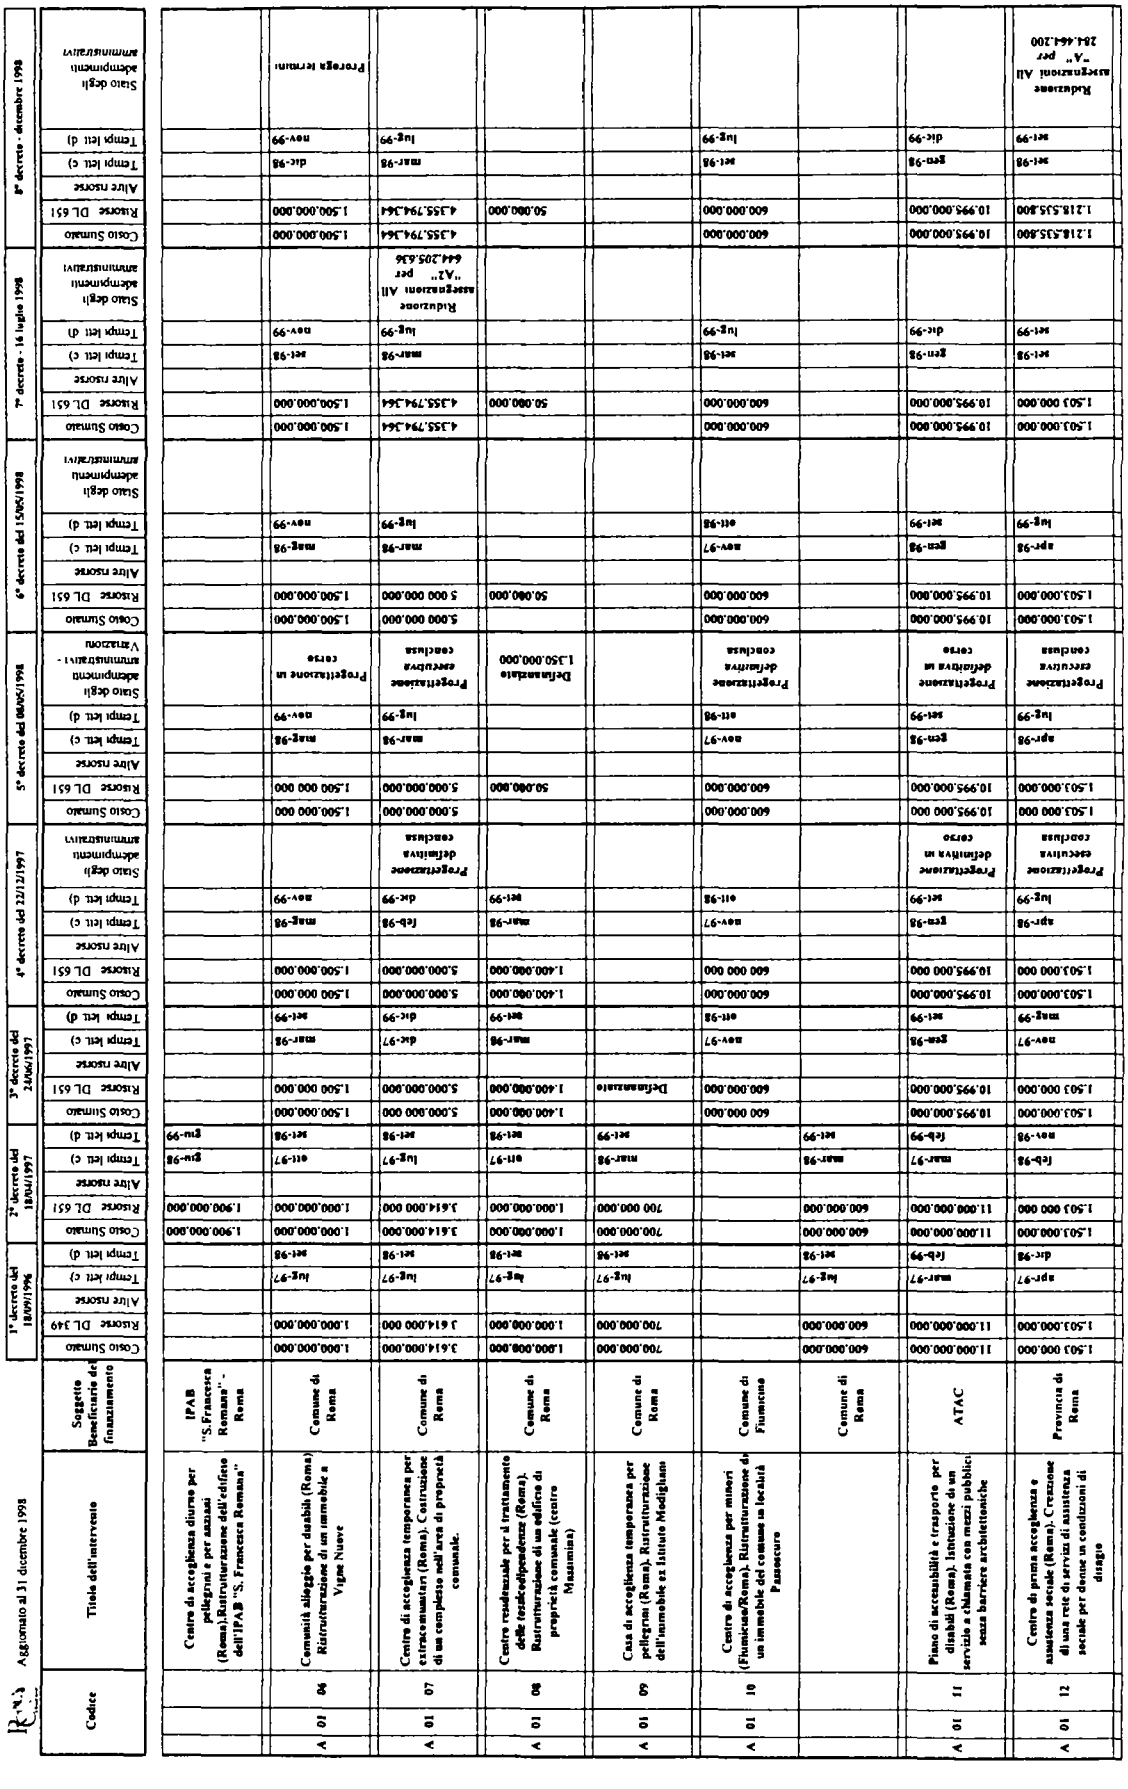

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
A 01			Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Riduzione autorizzazioni All "A" per 264.464.200
A 01			1.503.000.000	1.503.000.000	1.503.000.000	1.503.000.000	1.503.000.000	1.503.000.000	1.503.000.000	set-98
A 01			11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	10.995.000.000	10.995.000.000	10.995.000.000	10.995.000.000	set-99
A 01	01	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma).Ristrutturazione dell'edificio dell'IPAB "S. Francesco Romana"	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	1.218.535.800
A 01	02	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma).Ristrutturazione dell'edificio dell'IPAB "S. Francesco Romana" - Roma	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Costo Sumano
A 01	03	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma).Ristrutturazione dell'edificio dell'IPAB "S. Francesco Romana" - Roma	1.000.000.000	1.900.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	Risorse DL 651
A 01	04	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma).Ristrutturazione dell'edificio dell'IPAB "S. Francesco Romana" - Roma	3.614.000.000	3.614.000.000	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	Altre risorse
A 01	05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma).Ristrutturazione dell'edificio dell'IPAB "S. Francesco Romana" - Roma	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Temp lett c)
A 01	06	Comunità alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove	3.614.000.000	3.614.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	Temp lett d)
A 01	07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.	3.614.000.000	3.614.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	Stato degli adempimenti amministrativi
A 01	08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimina)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	Risorse DL 651
A 01	09	Casa di accoglienza temporanea per pellegrini (Roma). Ristrutturazione dell'immobile ex Istituto Modigliani	700.000.000	700.000.000	700.000.000	Definanziato	Definanziato 1.350.000.000	50.000.000	50.000.000	Altre risorse
A 01	10	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune in località Passoscuro	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Progettazione definitiva conclusa	600.000.000	600.000.000	Temp lett c)
A 01			600.000.000	600.000.000	600.000.000	600 000 000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Temp lett d)
A 01	11	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAC	11.000.000.000	11.000.000.000	10.995.000.000	Progettazione definitiva in corso	10.995.000.000	10.995.000.000	Stato degli adempimenti amministrativi
A 01	12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	11.000.000.000	11.000.000.000	10.995.000.000	Progettazione esecutiva conclusa	10.995.000.000	10.995.000.000	Riduzione autorizzazioni All "A" per 264.464.200

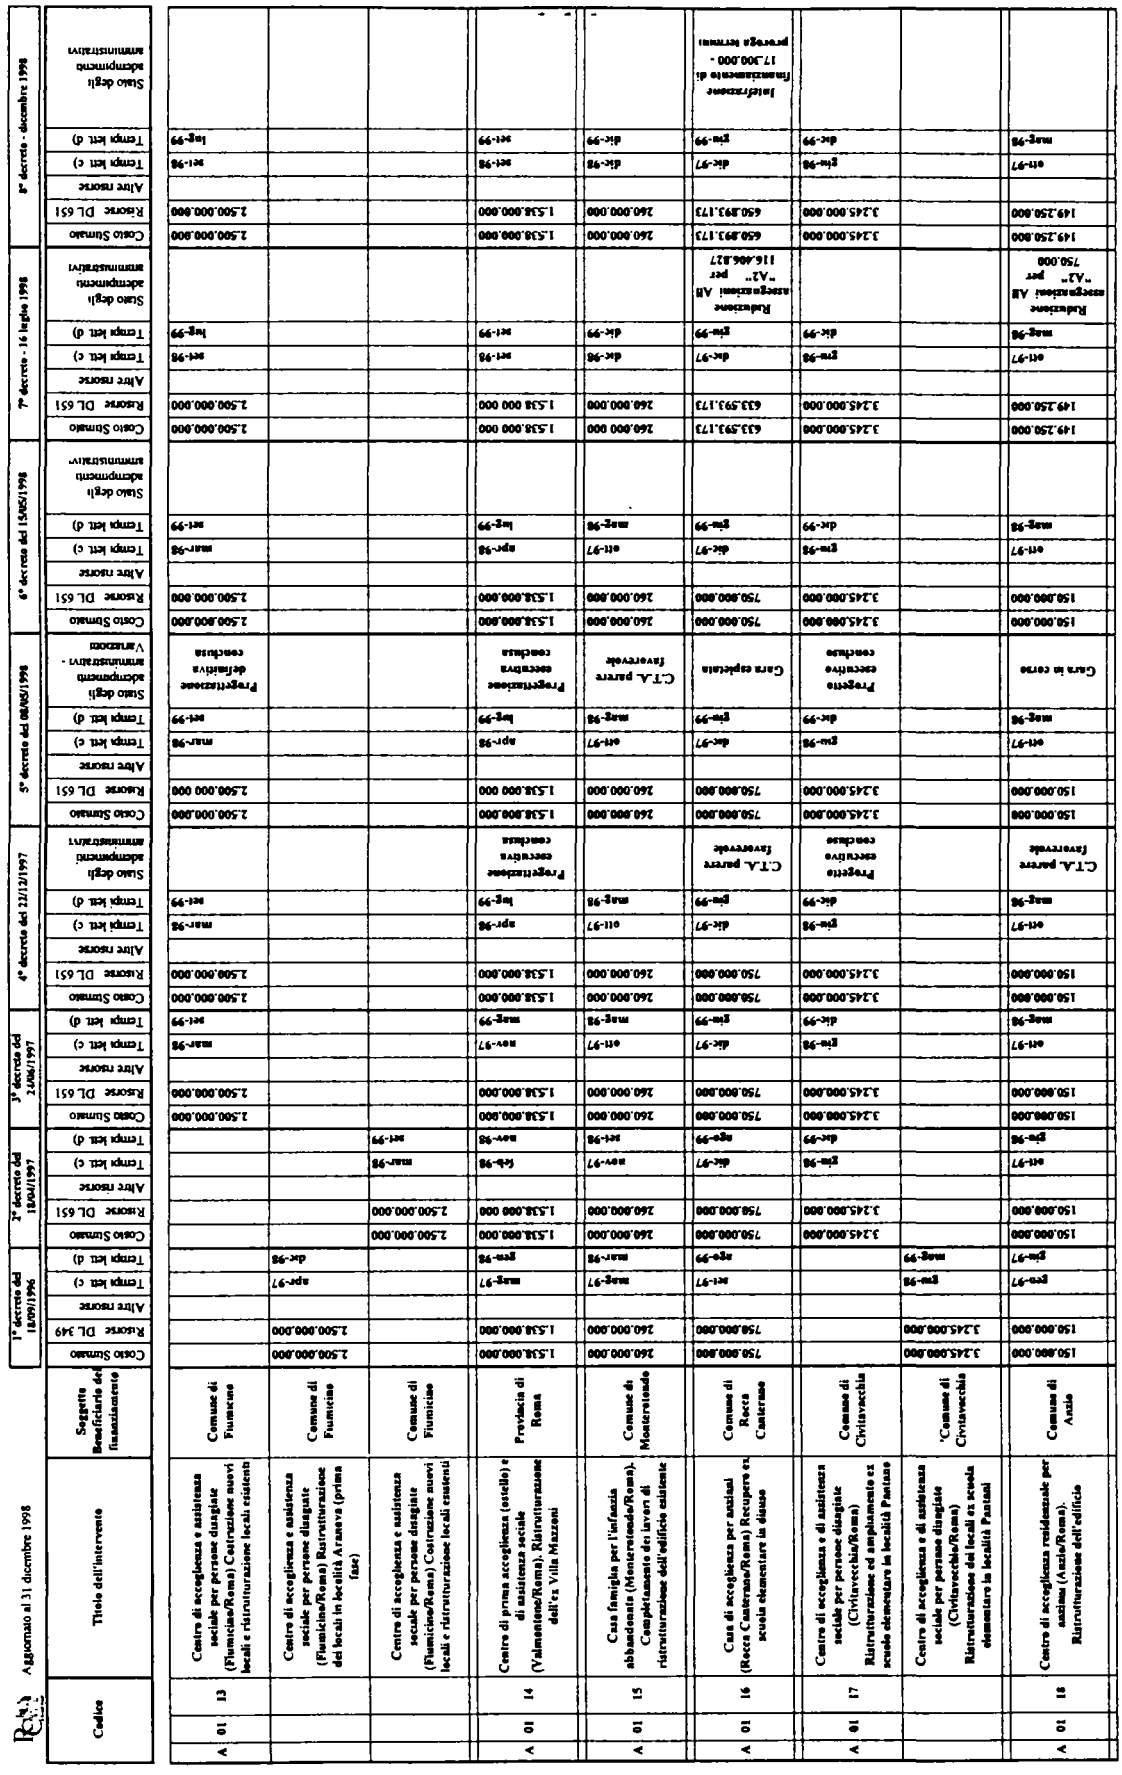

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
A 01 13	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Fiumicino	Costo Stimato	1.500.000.000	1.245.000.000	750.000.000	1.245.000.000	750.000.000	1.245.000.000	750.000.000
			Risorse DL 349	1.500.000.000						
			Altre risorse							
			Tempi Istr. c)	apr-97	mag-97	nov-97	mar-98	mar-98		
			Tempi Istr. d)	dic-98						
	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Ristrutturazione dei locali in località Aranova (prima fase)	Comune di Fiumicino	Costo Stimato	1.500.000.000	1.245.000.000	750.000.000	1.245.000.000	750.000.000	1.245.000.000	750.000.000
			Risorse DL 651	1.500.000.000						
			Altre risorse							
			Tempi Istr. c)	mar-98	feb-98	nov-97	dic-97	dic-97		
			Tempi Istr. d)	set-99	nov-98	set-98	ago-99	ago-99		
	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Fiumicino	Costo Stimato		1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000
			Risorse DL 651		1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000
			Altre risorse							
			Tempi Istr. c)		mag-97	ott-97	apr-98	ott-97	ott-97	
			Tempi Istr. d)		mag-99	mag-98	lug-99	mag-98	mag-98	
A 01 14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	Costo Stimato	1.538.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000
			Risorse DL 651	1.538.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000
			Altre risorse							
			Tempi Istr. c)		feb-98	nov-97	apr-98	ott-97	ott-97	
			Tempi Istr. d)		nov-98	set-98	lug-99	mag-98	mag-98	
	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	Costo Stimato							
			Risorse DL 651							
			Altre risorse							
			Tempi Istr. c)							
			Tempi Istr. d)							
A 01 15	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Monterotondo	Costo Stimato	1.500.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000
			Risorse DL 651	1.500.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000
			Altre risorse							
			Tempi Istr. c)	mar-98	mag-97	ott-97	dic-97	dic-97		
			Tempi Istr. d)	set-99	mag-99	mag-98	giu-99	giu-99		
	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Monterotondo	Costo Stimato	2.500.000.000						
			Risorse DL 651	2.500.000.000						
			Altre risorse							
			Tempi Istr. c)							
			Tempi Istr. d)							
A 01 16	Case di accoglienza per anziani (Rocca Cencrano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Cencrano	Costo Stimato	1.500.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000
			Risorse DL 651	1.500.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000
			Altre risorse							
			Tempi Istr. c)		apr-98	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	
			Tempi Istr. d)		lug-98	mag-98	giu-99	giu-99	giu-99	
A 01 17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma) Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantane	Comune di Civitavecchia	Costo Stimato	1.500.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000
			Risorse DL 651	1.500.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000
			Altre risorse							
			Tempi Istr. c)		feb-98	nov-97	dic-97	dic-97	dic-97	
			Tempi Istr. d)		nov-98	set-98	ago-99	ago-99	giu-99	
	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma) Ristrutturazione dei locali ex scuola elementare in località Pantani	'Comune di Civitavecchia	Costo Stimato	1.500.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000
			Risorse DL 651	1.500.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000	1.538.000.000	1.260.000.000
			Altre risorse							
			Tempi Istr. c)							
			Tempi Istr. d)							
A 01 18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio	Costo Stimato	1.500.000.000	1.245.000.000	750.000.000	1.245.000.000	750.000.000	1.245.000.000	750.000.000
			Risorse DL 651	1.500.000.000						
			Altre risorse							
			Tempi Istr. c)		mag-97	ott-97	dic-97	dic-97	dic-97	
			Tempi Istr. d)		mag-99	mag-98	giu-99	giu-99	giu-99	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
A 01	19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	Provincia di Roma	1.416.000.000 Costo Sumano 1.416.000.000 Risorse DL 349 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni	3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	1.562.000.000 1.562.000.000 1.562.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	3.438.000.000 3.438.000.000 3.438.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi
A 01	20	Casa di accoglienza ebraica per anziani "Ricovero Israelitico" (Roma). Recupero del complesso del S. Ambrogio della Massima	Comune di Roma	5.000.000.000 5.000.000.000 1.416.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	apr-97 apr-97 ago-99 set-97 apr-98 feb-98 nov-99 nov-98	Definanziato 1.416.000.000 1.416.000.000 1.416.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	apr-98 apr-98 nov-99 nov-97 mag-99 Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	Riduzione assegnazioni All "A" per 250.934 200 Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)			
A 01	21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola.	Comune di Roma	5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	apr-97 apr-98 apr-98 nov-99 nov-99 Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	Progettazione in corso Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni	5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	proroga termini Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)			
A 01	22	Segnalatori acustici per non vedenti sui mezzi pubblici	ATAC	5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	dic-98 dic-98 dic-99 dic-99 dic-99 Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi				
A 01	23	Progetto strutture infanzia	Comune di Roma	3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	gen-99 gen-99 dic-99 dic-99 dic-99 Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi				
A 01	23/1	Allestimento di centri di accoglienza per bambini nei musei comunali	Comune di Roma	1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	proroga termini Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)			
A 01	23/2	Ristrutturazione servizi di accettazione e pronto soccorso clinica pediatrica	Univ. La Sapienza Policl. Umberto I	2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	dic-99 dic-99 dic-99 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)			
A 01	24	Sistemazione del Centro Accoglienza Italiani nel Mondo (CAIM) presso la chiesa di S. Giovanni della Pigna e locali annessi	Chiesa di S. Giovanni della Pigna	1.288.700.400 1.288.700.400 1.288.700.400 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	1.288.700.400 1.288.700.400 1.288.700.400 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	1.288.700.400 1.288.700.400 1.288.700.400 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	1.288.700.400 1.288.700.400 1.288.700.400 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	Riduzione assegnazioni All "A" per 73.299 600 Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)			
A 01	25	Riqualificazione di una struttura conventuale	Congregazione Suore Francescane del Sacro Cuore	1.165.063.800 1.165.063.800 1.165.063.800 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	proroga termini Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	Riduzione assegnazioni All "A" per 73.299 600 Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	3.438.000.000 3.438.000.000 3.438.000.000 Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d) Stato degli adempimenti amministrativi

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996					2° decreto del 18/04/1997					3° decreto del 24/06/1997					4° decreto del 22/12/1997					5° decreto del 08/05/1998					6° decreto del 15/05/1998					7° decreto - 16 luglio 1998					8° decreto - dicembre 1998				
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)
A 01 26	Progetto di ristrutturazione e completamento architettonico e funzionale del complesso sito in via delle Isole	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida																						4.361.000.000	4.361.000.000															
A 01 26/1	Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in via delle Isole	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida																												2.181.000.000	2.181.000.000		mag-98	set-99		2.549.442.000	2.549.442.000		ott-98	ott-99	Interru-zione finanziamento di 168.441.000 - prevede termini
A 01 26/2	Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in via Casina	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida																												2.180.000.000	2.180.000.000		mag-98	set-99		1.922.090.625	1.922.090.625		set-98	ott-99	Riduzione autorizzazioni AP "A" per 257.909.375 - prevede termini
A 01 27	Centro di accoglienza permanente per pellegrini portatori di Handicap (primo stralcio)	Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo - Opera Don Orione																												16.000.000.000	16.000.000.000		ott-98	dic-99		16.000.000.000	16.000.000.000		ott-98	dic-99	
A 01 28	Zona ricettiva - Casa per ferie	Direzione Generale Opere Don Bosco																												3.000.000.000	3.000.000.000		dic-98	ott-99		3.000.000.000	3.000.000.000		dic-98	ott-99	prevede termini
A 01 29	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disagiate	Congregazione Figlie della Misericordia del Divino Amore																												6.909.800.000	1.800.800.000	5.909.800.000	dic-98	dic-98		1.800.800.000	3.000.000.000	5.909.800.000	dic-98	dic-99	prevede termini
A 04 01	Complesso del Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero funzionale dell'edificio	Comune di Roma					dic-97																																		
				20.000.000.000	5.773.000.000	set-97																																				
	Restauro del complesso del Buon Pastore. Complesso del Buon Pastore (Roma). Restauro e recupero funzionale dell'edificio	Comune di Roma		25.773.000.000	20.000.000.000					5.773.000.000																														
					25.773.000.000					20.000.000.000					5.773.000.000																										
										25.773.000.000					20.000.000.000					5.773.000.000																					
															25.773.000.000					20.000.000.000					5.773.000.000															
																				25.773.000.000					20.000.000.000					5.773.000.000									
																									25.773.000.000					20.000.000.000					5.773.000.000				
																														25.773.000.000					20.000.000.000				
																																				25.773.000.000				
A 04 01/1	Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma																																		2.200.000.000	2.200.000.000		apr-99	nov-99

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice				Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	Riduzione autorizzazioni AB "A" per 3.120.833.586
A	04	01/2		Complesso Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero funzionale del corpo secentesco	Comune di Roma	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	10.000.000.000
						Risorse DL 349	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	10.000.000.000
						Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	
						Tempi Istr. c)	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. c)	ott-97
						Tempi Istr. d)	Tempi Istr. d)	Tempi Istr. d)	Tempi Istr. d)	Tempi Istr. d)	Tempi Istr. d)	Tempi Istr. d)	Tempi Istr. d)	dic-99
A	05	01		Centro di accoglienza temporanea per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione complesso dell'ex Ospedale psichiatrico S.Maria della Pietà (1° stralcio funzionale)	Regione Lazio, Comune di Roma, USL RM-E	dic-98								
						Tempi Istr. c)	dic-97							ott-97
						Altre risorse								
						Risorse DL 651	25.000.000.000							10.000.000.000
						Costo Sumano	25.000.000.000							10.000.000.000
						Tempi Istr. d)	dic-99							dic-99
				Centro di accoglienza temporanea per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione complesso dell'ex Ospedale psichiatrico S.Maria della Pietà (1° stralcio funzionale)	USL RM E	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	10.000.000.000
						Risorse DL 651	25.000.000.000	9.800.000.000	9.800 000 000	9.800.000.000	9.800.000.000	9.800.000.000	9.800.000.000	10.000.000.000
						Altre risorse								
						Tempi Istr. c)	dic-97							ott-97
						Tempi Istr. d)	dic-99							dic-99
A	05	01/1		Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Razionamento parco)	USL RM E	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	prerogat terreni	10.000.000.000
						Risorse DL 651	2.000.000.000	9.800.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	10.000.000.000
						Altre risorse								
						Tempi Istr. c)	dic-97						mag-98	
						Tempi Istr. d)	set-99						set-98	
A	05	01/2		Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)	USL RM E	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	prerogat terreni	10.000.000.000
						Risorse DL 651	2.000.000.000	9.800.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1 000.000.000	1.000.000.000	10.000.000.000
						Altre risorse								
						Tempi Istr. c)	dic-97	dic-97	mar-98	mar-98	mar-98	mar-98	gen-99	mar-98
						Tempi Istr. d)	set-99	dic-99	lug-99	dic-99	dic-99	lug-99	lug-99	dic-99
A	05	01/3		Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Sistemaz. Manutenz. Padigl. Direzione)	USL RM E	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano		10.000.000.000
						Risorse DL 651	2.000.000.000	9.800.000.000	1.000.000.000	5.086.000.000	5.086.000.000	5.086.800.000		10.000.000.000
						Altre risorse								
						Tempi Istr. c)	dic-97	dic-97	dic-97	mar-98	mar-98	mar-98		mar-98
						Tempi Istr. d)	set-99	dic-99	lug-99	dic-99	dic-99	dic-99		dic-99
A	05	01/4		Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenz. ord. cappella e 3 padigl)	USL RM E	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano		10.000.000.000
						Risorse DL 651	2.000.000.000	9.800.000.000	1.000.000.000	5.086.000.000	5.086.000.000	5.086.800.000		10.000.000.000
						Altre risorse								
						Tempi Istr. c)	dic-97	dic-97	dic-97	mar-98	mar-98	mar-98		mar-98
						Tempi Istr. d)	set-99	dic-99	lug-99	dic-99	dic-99	dic-99		dic-99
A	05	01/5		Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)	USL RM E	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano		10.000.000.000
						Risorse DL 651	2.000.000.000	9.800.000.000	1.000.000.000	5.086.000.000	5.086.000.000	5.086.800.000		10.000.000.000
						Altre risorse								
						Tempi Istr. c)	dic-97	dic-97	dic-97	mar-98	mar-98	mar-98		mar-98
						Tempi Istr. d)	set-99	dic-99	lug-99	dic-99	dic-99	dic-99		dic-99
A	05	01		Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	Comune di Roma	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	10.000.000.000
						Risorse DL 651	25.000.000.000	9.800.000.000	1.000.000.000	5.086.000.000	5.086.000.000	5.086.800.000	9.800.000.000	10.000.000.000
						Altre risorse								
						Tempi Istr. c)	apr-98	feb-98	mar-98	mar-98	mar-98	mar-98	apr-98	mar-98
						Tempi Istr. d)	dic-99	dic-99	lug-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99
						Stato degli adempimenti amministrativi	Progettazione definitiva cantierata	Progettazione definitiva cantierata	Progettazione definitiva cantierata	Progettazione definitiva cantierata	Progettazione definitiva cantierata	Progettazione definitiva cantierata		Progettazione definitiva cantierata
											Cont. di Servizi su progetto definitivo (approvato)			
											Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni			

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
A 06 01	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma	Costo Stimato	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
			Risorse DL 349	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000			
			Altre risorse							
			Temp. Istr. c)	ecn-97	mar-97	mar-97	mar-97			
			Temp. Istr. d)	ott-99	ott-99	ott-98	ott-98	ago-98		
A 06 02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipab e Ieep) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.	Regione Lazio	Costo Stimato	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	
			Risorse DL 651	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000			
			Altre risorse							
			Temp. Istr. c)	ecn-98	ecn-98	ecn-98	ecn-98			
			Temp. Istr. d)	ott-99	ott-99	ott-99	ott-99	ott-99		
A 07 01	Centro di accoglienza turistica e convitto (Roma) Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario C. Garibaldi	Provincia di Roma	Costo Stimato	9.000.000.000	9.000.000.000	6.750.000.000	6.750.000.000	6.750.000.000	6.973.315.293	
			Risorse DL 651	6.750.000.000	6.750.000.000	6.750.000.000	6.750.000.000			
			Altre risorse	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000			
			Temp. Istr. c)	ecn-97	ecn-97	ecn-97	ecn-97			
			Temp. Istr. d)	ott-98	ott-98	ott-99	ott-99	ott-99		
A 07 02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma). Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi"	Provincia di Roma	Costo Stimato	450.000.000	450.000.000	338.000.000	338.000.000	338.000.000		
			Risorse DL 651	338.000.000	338.000.000	338.000.000	338.000.000			
			Altre risorse	112.000.000	112.000.000	112.000.000	112.000.000			
			Temp. Istr. c)	ecn-98	ecn-98	ecn-98	ecn-98			
			Temp. Istr. d)	ott-98	ott-98	dic-98	dic-98	ecn-98		
A 07 03	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	Costo Stimato	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000		
			Risorse DL 651	338.000.000	338.000.000	338.000.000	338.000.000			
			Altre risorse	112.000.000	112.000.000	112.000.000	112.000.000			
			Temp. Istr. c)	mar-98	mar-98	mar-98	mar-98			
			Temp. Istr. d)	ott-99	ott-99	dic-98	dic-98	ecn-98		
A 07 04	Ostello della gioventù (Campino/Roma)	Comune di Campino	Costo Stimato	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000		
			Risorse DL 651	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000			
			Altre risorse	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000			
			Temp. Istr. c)	mar-97	mar-97	mar-97	mar-98			
			Temp. Istr. d)	ott-98	ott-98	ott-98	ott-98	ott-98		
A 07 05	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	Comune di Albano Laziale	Costo Stimato	500.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	3.538.201.290	
			Risorse DL 651	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000		2.538.201.290	
			Altre risorse	125.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000		1.000.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	dic-97	dic-97	dic-97		mar-98	
			Temp. Istr. d)	ott-98	feb-99	feb-99	feb-99		ott-98	
A 07 06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	Costo Stimato	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.110.000.000	
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	
			Altre risorse	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	ott-98	ott-98	ott-98	ott-98	ott-98	nov-98	
A 07 07	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva e ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	Costo Stimato	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6.973.315.293	20.800.000.000
			Risorse DL 651	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000		16.900.000	
			Altre risorse	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		1.743.828.893	
			Temp. Istr. c)	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97		gen-97	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98		ott-98	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
A 07 08	Ostello della gioventù (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Francesco	Comune di Monterotondo	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 09	Ostello della gioventù (Nettuno/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Francesco	Comune di Nettuno	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 10	Ostello della gioventù (Subiaco/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Scolastica	Comune di Subiaco	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 11	Ostello della gioventù (Tivoli/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Giovanni	Comune di Tivoli	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 12	Ostello della gioventù (Velletri/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Francesco	Comune di Velletri	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 13	Ostello della gioventù (Civitavecchia/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Civitavecchia	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 14	Ostello della gioventù (Ostia/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Roma	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 15	Ostello della gioventù (Fiumicino/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Fiumicino	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 16	Ostello della gioventù (Anzio/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Anzio	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 17	Ostello della gioventù (Ladispoli/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Ladispoli	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 18	Ostello della gioventù (Fiuggi/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Fiuggi	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 19	Ostello della gioventù (Genzano/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Genzano	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 20	Ostello della gioventù (Ariccia/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Ariccia	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 21	Ostello della gioventù (Rocca di Papa/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Rocca di Papa	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 22	Ostello della gioventù (Grottaferrata/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Grottaferrata	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 23	Ostello della gioventù (Monte Porzio Catone/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Monte Porzio Catone	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 24	Ostello della gioventù (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Monterotondo	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 25	Ostello della gioventù (Nettuno/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Nettuno	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 26	Ostello della gioventù (Subiaco/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Subiaco	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 27	Ostello della gioventù (Tivoli/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Tivoli	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 28	Ostello della gioventù (Velletri/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Velletri	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 29	Ostello della gioventù (Civitavecchia/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Civitavecchia	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 30	Ostello della gioventù (Ostia/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Roma	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 31	Ostello della gioventù (Fiumicino/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Fiumicino	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 32	Ostello della gioventù (Anzio/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Anzio	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 33	Ostello della gioventù (Ladispoli/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Ladispoli	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 34	Ostello della gioventù (Fiuggi/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Fiuggi	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 35	Ostello della gioventù (Genzano/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Genzano	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 36	Ostello della gioventù (Ariccia/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Ariccia	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 37	Ostello della gioventù (Rocca di Papa/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Rocca di Papa	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 38	Ostello della gioventù (Grottaferrata/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Grottaferrata	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 39	Ostello della gioventù (Monte Porzio Catone/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Monte Porzio Catone	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 40	Ostello della gioventù (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Monterotondo	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000.000.000
			Risorse DL 651	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		676.000.000	10.000.000.000
			Altre risorse	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		434.000.000	
			Temp. Istr. c)	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97		ott-98	
			Temp. Istr. d)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	ott-98	nov-98	
A 07 41	Ostello della gioventù (Nettuno/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento di S. Maria della Pace	Comune di Nettuno	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	10.000

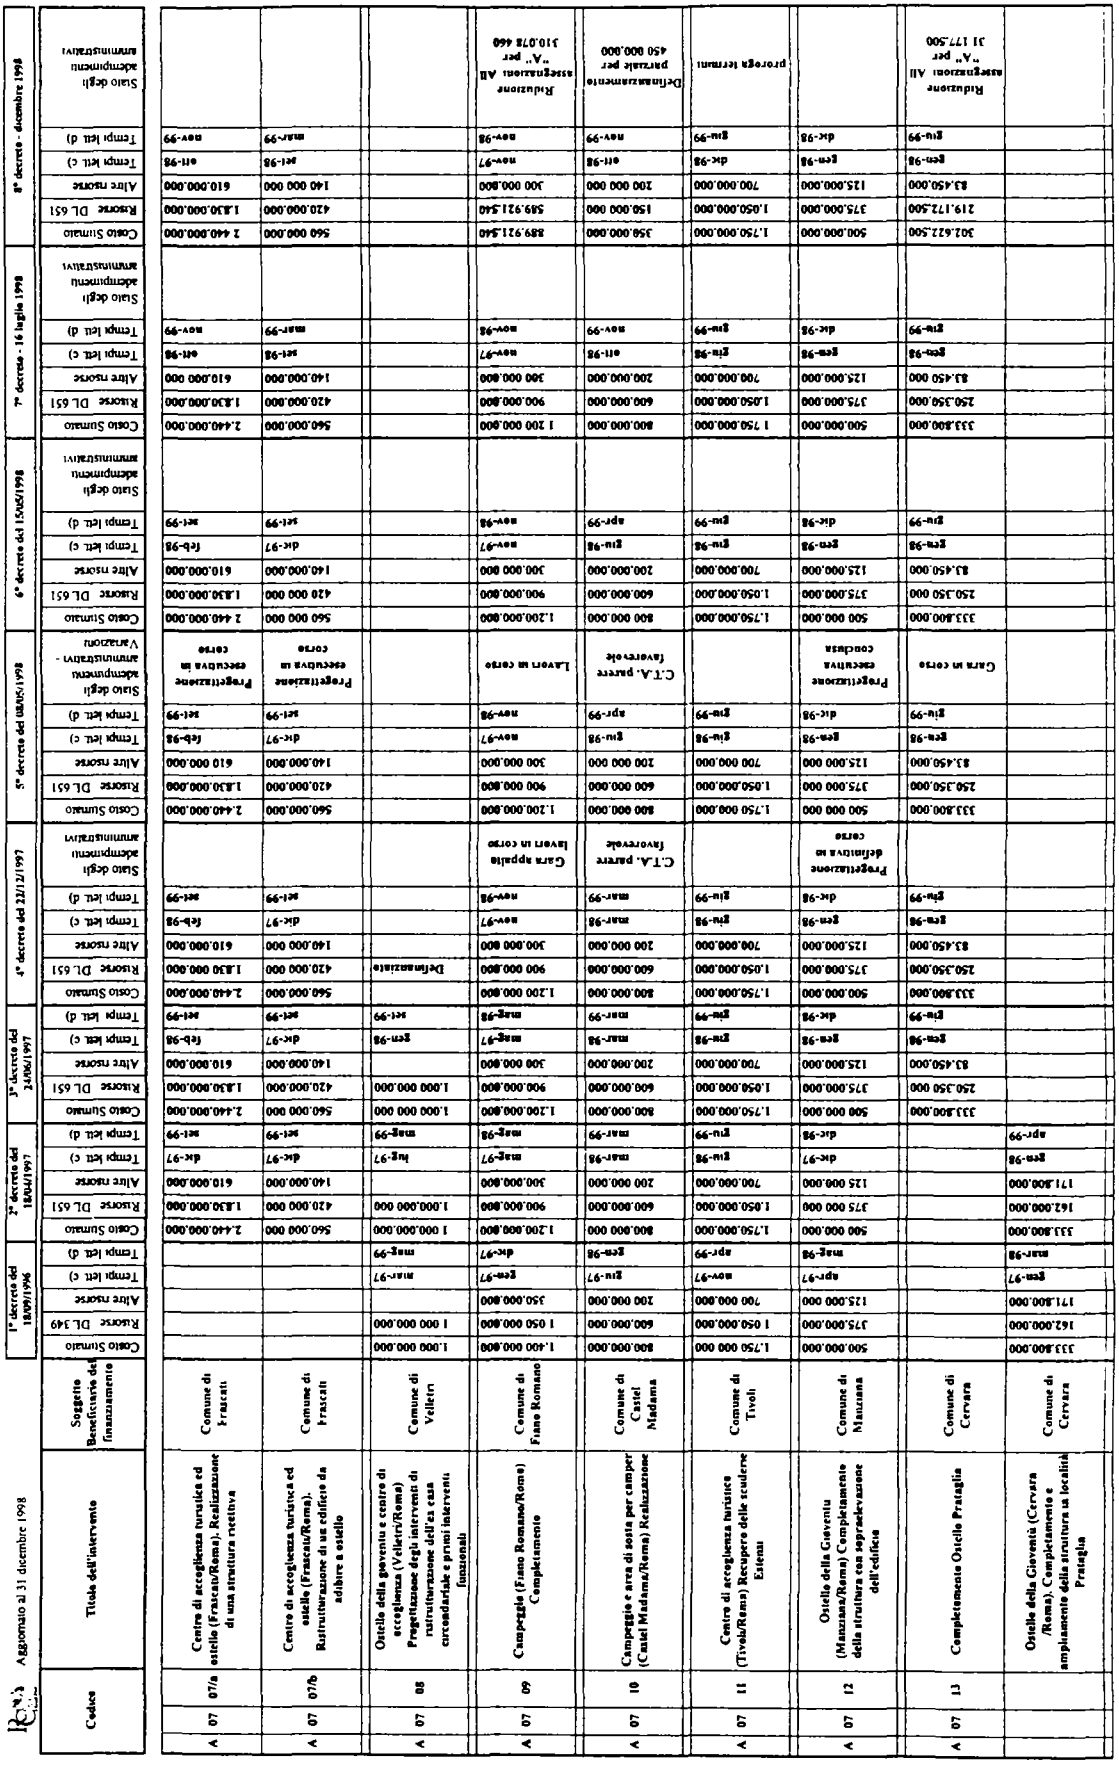

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 18/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
A	07	07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	Costo Stimato	333.800.000	333.800.000	333.800.000	333.800.000	333.800.000	333.800.000	333.800.000
					Risorse DL 349	162.000.000	162.000.000	162.000.000	162.000.000	250.350.000	250.350.000	250.350.000
					Altre risorse	171.800.000	171.800.000	171.800.000	171.800.000	83.450.000	83.450.000	83.450.000
					Tempi lett. c)	apr-97	nov-97	mar-98	mar-98	mar-98	mar-98	mar-98
					Tempi lett. d)	mar-99	apr-99	dic-98	dic-98	dic-98	dic-98	dic-98
A	07	07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	Costo Stimato	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000
					Risorse DL 651	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000
					Altre risorse	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000
					Tempi lett. c)	dic-97	dic-97	feb-98	feb-98	feb-98	feb-98	feb-98
					Tempi lett. d)	set-99	set-99	set-99	set-99	set-99	set-99	set-99
					Siato degli adempimenti amministrativi				Progettazione esecutiva in corso	Progettazione esecutiva in corso		
A	07	08	Ostello della gioventù e centro di accoglienza (Velletri/Roma) Progettazione degli interventi di ristrutturazione dell'ex casa circondariale e primi interventi funzionali	Comune di Velletri	Costo Stimato	1.000 000.000	1.000 000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
					Risorse DL 651	1 000 000.000	1.000.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000
					Altre risorse	1.400 000.000	1.000.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
					Tempi lett. c)	mar-97	mag-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-98
					Tempi lett. d)	mag-99	mag-99	mag-98	mag-98	nov-98	nov-98	nov-98
					Siato degli adempimenti amministrativi			Gara appalto lavori in corso	Lavori in corso			Riduzione assegnazioni All "A" per 310.078 660
A	07	09	Campeggio (Fiano Romano/Roma) Completamento	Comune di Fiano Romano	Costo Stimato	1.400 000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	358.000.000
					Risorse DL 651	1 050 000.000	900.000.000	900.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	589.921.540
					Altre risorse	350.000.000	300.000.000	300.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200 000.000
					Tempi lett. c)	gen-97	mag-97	mag-97	mar-98	gen-98	gen-98	nov-97
					Tempi lett. d)	dic-97	mag-98	mag-98	mar-99	mar-99	mar-99	nov-98
					Siato degli adempimenti amministrativi			C.T.A. parere favorevole	C.T.A. parere favorevole			Deliberazione parziale per 450 000.000
A	07	10	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama	Costo Stimato	1.750 000.000	1.750.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	1.750.000.000
					Risorse DL 651	1.050 000.000	1.050.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	1.050.000.000
					Altre risorse	700.000.000	700.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	700.000.000
					Tempi lett. c)	gen-98	gen-98	mar-98	mar-98	gen-98	gen-98	gen-98
					Tempi lett. d)	dic-98	gen-99	gen-99	mar-99	gen-99	gen-99	gen-99
					Siato degli adempimenti amministrativi							proroga lavori
A	07	11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	Costo Stimato	1.750 000 000	1.750.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	1.750.000.000
					Risorse DL 651	1.050 000 000	1.050.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	1.050.000.000
					Altre risorse	700 000.000	700.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	700.000.000
					Tempi lett. c)	dic-97	gen-98	mar-98	mar-98	gen-98	gen-98	gen-98
					Tempi lett. d)	dic-98	gen-99	gen-99	mar-99	gen-99	gen-99	gen-99
					Siato degli adempimenti amministrativi							
A	07	12	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	Costo Stimato	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500 000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
					Risorse DL 651	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000 000	375.000.000	375.000.000	375.000.000
					Altre risorse	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125 000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000
					Tempi lett. c)	apr-97	nov-97	gen-98	dic-98	gen-98	gen-98	gen-98
					Tempi lett. d)	mag-98	dic-98	dic-98	dic-98	dic-98	dic-98	dic-98
					Siato degli adempimenti amministrativi							Riduzione assegnazioni All "A" per 31 177.500
A	07	13	Completamento Ostello Pratoglia	Comune di Cervara	Costo Stimato	302.622.500	302.622.500	302.622.500	302.622.500	302.622.500	302.622.500	302.622.500
					Risorse DL 651	219.172.500	219.172.500	219.172.500	219.172.500	219.172.500	219.172.500	219.172.500
					Altre risorse	83.450.000	83.450.000	83.450.000	83.450.000	83.450.000	83.450.000	83.450.000
					Tempi lett. c)	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98
					Tempi lett. d)	lug-99	lug-99	lug-99	lug-99	lug-99	lug-99	lug-99
					Siato degli adempimenti amministrativi							
A	07		Ostello della Gioventù (Cervara /Roma). Completamento e ampliamento della struttura su località Pratoglia	Comune di Cervara	Costo Stimato	333.800.000	333.800.000	333.800.000	333.800.000	333.800.000	333.800.000	333.800.000
					Risorse DL 651	250.350.000	250.350.000	250.350.000	250.350.000	250.350.000	250.350.000	250.350.000
					Altre risorse	83.450.000	83.450.000	83.450.000	83.450.000	83.450.000	83.450.000	83.450.000
					Tempi lett. c)	gen-97	apr-97	nov-97	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98
					Tempi lett. d)	mar-98	mar-98	mar-98	dic-98	dic-98	dic-98	dic-98
					Siato degli adempimenti amministrativi				Progettazione definitiva in corso	Progettazione esecutiva conclusa	Gara in corso	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	Stato degli adempimenti amministrativi
A 07 14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anticoli Corrado	Costo Stimato 874.500.000 Risorse DL 349 656.000.000 Altre risorse 218.500.000 Tempi lett. c) dic-96 Tempi lett. d) feb-99	Costo Stimato 874.500.000 Risorse DL 651 656.000.000 Altre risorse 218.500.000 Tempi lett. c) ott-97 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 874.500.000 Risorse DL 651 656.000.000 Altre risorse 218.500.000 Tempi lett. c) mar-97 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 874.500.000 Risorse DL 651 656.000.000 Altre risorse 218.500.000 Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mar-99	Stato degli adempimenti amministrativi - Variazione Costo Stimato: Presentazione cartolina in corso Risorse DL 651: Presentazione cartolina in corso Altre risorse: Presentazione cartolina in corso Tempi lett. c): apr-98 Tempi lett. d): mar-99	Costo Stimato 874.500.000 Risorse DL 651 656.000.000 Altre risorse 218.500.000 Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 874.500.000 Risorse DL 651 656.000.000 Altre risorse 218.500.000 Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 874.500.000 Risorse DL 651 656.000.000 Altre risorse 218.500.000 Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mar-99	Stato degli adempimenti amministrativi Costo Stimato: prerogativa terminata Risorse DL 651: prerogativa terminata Altre risorse: prerogativa terminata Tempi lett. c): ott-98 Tempi lett. d): nov-99
A 07 15	Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma). Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Aule San Filippo Neri e forniture arredi	Comune di Arsoli	Costo Stimato 1.600.000.000 Risorse DL 349 600.000.000 Altre risorse 1.000.000.000 Tempi lett. c) apr-97 Tempi lett. d) apr-99	Costo Stimato 1.545.100.000 Risorse DL 651 600.000.000 Altre risorse 945.100.000 Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) apr-99	Costo Stimato 1.545.100.000 Risorse DL 651 600.000.000 Altre risorse 945.100.000 Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 1.545.100.000 Risorse DL 651 600.000.000 Altre risorse 945.100.000 Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato: Presentazione cartolina in corso Risorse DL 651: Presentazione cartolina in corso Altre risorse: Presentazione cartolina in corso Tempi lett. c): apr-98 Tempi lett. d): mar-99	Costo Stimato 1.545.100.000 Risorse DL 651 600.000.000 Altre risorse 945.100.000 Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 1.545.100.000 Risorse DL 651 600.000.000 Altre risorse 945.100.000 Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 1.545.100.000 Risorse DL 651 600.000.000 Altre risorse 945.100.000 Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato: prerogativa terminata Risorse DL 651: prerogativa terminata Altre risorse: prerogativa terminata Tempi lett. c): apr-98 Tempi lett. d): nov-99
A 07 16	Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Purgus	Comune di S. Marinella	Costo Stimato 800.000.000 Risorse DL 349 600.000.000 Altre risorse 200.000.000 Tempi lett. c) ott-97 Tempi lett. d) apr-99	Costo Stimato 800.000.000 Risorse DL 651 600.000.000 Altre risorse 200.000.000 Tempi lett. c) ott-97 Tempi lett. d) apr-99	Costo Stimato 800.000.000 Risorse DL 651 600.000.000 Altre risorse 200.000.000 Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) apr-99	Costo Stimato 800.000.000 Risorse DL 651 600.000.000 Altre risorse 200.000 000 Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) apr-99	Costo Stimato: Presentazione cartolina in corso Risorse DL 651: Presentazione cartolina in corso Altre risorse: Presentazione cartolina in corso Tempi lett. c): apr-98 Tempi lett. d): apr-99	Costo Stimato 800.000.000 Risorse DL 651 600.000.000 Altre risorse 200.000.000 Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) apr-99	Costo Stimato 962.706.000 Risorse DL 651 600.000.000 Altre risorse 362.706.000 Tempi lett. c) gen-98 Tempi lett. d) gen-99	Costo Stimato 962.706.000 Risorse DL 651 600.000.000 Altre risorse 362.706.000 Tempi lett. c) gen-98 Tempi lett. d) gen-99	Costo Stimato: prerogativa terminata Risorse DL 651: prerogativa terminata Altre risorse: prerogativa terminata Tempi lett. c): gen-98 Tempi lett. d): gen-99
A 07 17	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Ristrutturazione dell'edificio ex Divina Provvidenza	Comune di Nettuno	Costo Stimato 3.600.000.000 Risorse DL 349 2.700.000.000 Altre risorse 900.000.000 Tempi lett. c) ott-97 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 3.600.000.000 Risorse DL 651 2.700.000.000 Altre risorse 900.000.000 Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) lug-99	Costo Stimato 3.600.000.000 Risorse DL 651 2.700.000.000 Altre risorse 900.000.000 Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) lug-99	Costo Stimato 3.600.000.000 Risorse DL 651 2.700.000.000 Altre risorse 900.000.000 Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) nov-99	Costo Stimato: Presentazione definitiva in corso Risorse DL 651: Presentazione definitiva in corso Altre risorse: Presentazione definitiva in corso Tempi lett. c): mar-98 Tempi lett. d): nov-99	Costo Stimato 3.600.000.000 Risorse DL 651 2.700.000.000 Altre risorse 900.000.000 Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) nov-99	Costo Stimato Definanziato Risorse DL 651 Per 2.700.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) gen-99	Costo Stimato 962.706.000 Risorse DL 651 600.000.000 Altre risorse 362.706.000 Tempi lett. c) gen-98 Tempi lett. d) gen-99	Costo Stimato: prerogativa terminata Risorse DL 651: prerogativa terminata Altre risorse: prerogativa terminata Tempi lett. c): gen-98 Tempi lett. d): gen-99
A 07 18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e forniture arredi	Comune di Nettuno	Costo Stimato 400.000.000 Risorse DL 349 300.000.000 Altre risorse 100.000.000 Tempi lett. c) ott-97 Tempi lett. d) nov-98	Costo Stimato 400.000.000 Risorse DL 651 300.000.000 Altre risorse 100.000.000 Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) nov-98	Costo Stimato 400.000.000 Risorse DL 651 300.000.000 Altre risorse 100.000.000 Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) nov-98	Costo Stimato 400.000.000 Risorse DL 651 300.000.000 Altre risorse 100.000.000 Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) feb-99	Costo Stimato: Presentazione definitiva in corso Risorse DL 651: Presentazione definitiva in corso Altre risorse: Presentazione definitiva in corso Tempi lett. c): mar-98 Tempi lett. d): feb-99	Costo Stimato 400.000.000 Risorse DL 651 300.000.000 Altre risorse 100.000.000 Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) nov-98	Costo Stimato 400.000.000 Risorse DL 651 300.000.000 Altre risorse 100.000.000 Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) gen-99	Costo Stimato 400.000.000 Risorse DL 651 300.000.000 Altre risorse 100.000.000 Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) nov-98	Costo Stimato: prerogativa terminata Risorse DL 651: prerogativa terminata Altre risorse: prerogativa terminata Tempi lett. c): apr-98 Tempi lett. d): nov-99
A 07 19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento	Provincia di Viterbo	Costo Stimato 2.000.000.000 Risorse DL 349 1.389.000.000 Altre risorse 611.000.000 Tempi lett. c) ott-97 Tempi lett. d) lug-98	Costo Stimato 2.000.000.000 Risorse DL 651 1.389.000.000 Altre risorse 611.000.000 Tempi lett. c) mar-97 Tempi lett. d) lug-98	Costo Stimato 2.000.000.000 Risorse DL 651 1.389.000.000 Altre risorse 611.000.000 Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) lug-99	Costo Stimato 2.000.000.000 Risorse DL 651 1.389.000.000 Altre risorse 611.000.000 Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) nov-99	Costo Stimato: Presentazione definitiva in corso Risorse DL 651: Presentazione definitiva in corso Altre risorse: Presentazione definitiva in corso Tempi lett. c): mar-98 Tempi lett. d): nov-99	Costo Stimato 2.000.000.000 Risorse DL 651 1.389.000.000 Altre risorse 611.000.000 Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) nov-99	Costo Stimato 2.000.000.000 Risorse DL 651 1.389.000.000 Altre risorse 611.000.000 Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) nov-99	Costo Stimato 2.000.000.000 Risorse DL 651 1.389.000.000 Altre risorse 611.000.000 Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) nov-99	Costo Stimato: prerogativa terminata Risorse DL 651: prerogativa terminata Altre risorse: prerogativa terminata Tempi lett. c): mar-98 Tempi lett. d): nov-99
A 07		Comune di S.Martino al Cimino	Costo Stimato 2.000.000.000 Risorse DL 349 1.389.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mar-97 Tempi lett. d) lug-98								Riduzione risorse Atti "A" per 323.098.477
A 07 20	Ostello della Gioventù (Viterchiane/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° stralcio funzionale)	Comune di Viterchiane	Costo Stimato 1.000.000.000 Risorse DL 349 750.000.000 Altre risorse 250.000.000 Tempi lett. c) ott-97 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 1.000.000.000 Risorse DL 651 750.000.000 Altre risorse 250.000.000 Tempi lett. c) ott-97 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 1.000.000.000 Risorse DL 651 750.000.000 Altre risorse 250.000.000 Tempi lett. c) mar-97 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 1.000.000.000 Risorse DL 651 750.000.000 Altre risorse 250.000.000 Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato: Presentazione cartolina in corso Risorse DL 651: Presentazione cartolina in corso Altre risorse: Presentazione cartolina in corso Tempi lett. c): apr-98 Tempi lett. d): mar-99	Costo Stimato 1.000.000.000 Risorse DL 651 750.000.000 Altre risorse 250.000.000 Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 1.000.000.000 Risorse DL 651 750.000.000 Altre risorse 250.000.000 Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 1.000.000.000 Risorse DL 651 750.000.000 Altre risorse 250.000.000 Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato: prerogativa terminata Risorse DL 651: prerogativa terminata Altre risorse: prerogativa terminata Tempi lett. c): apr-98 Tempi lett. d): mar-99
A 07 21	Ostello della Gioventù "Tarquinia" (Tuscania/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi	Asilo infantile di Tuscania	Costo Stimato 500.000.000 Risorse DL 349 338.000.000 Altre risorse 162.000.000 Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 500.000.000 Risorse DL 651 338.000.000 Altre risorse 162.000.000 Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 500.000.000 Risorse DL 651 338.000.000 Altre risorse 162.000.000 Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 500.000.000 Risorse DL 651 338.000.000 Altre risorse 162.000.000 Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) mar-99	C.T.A. parere favorevole Lavori in corso Costo Stimato: 1.000.000.000 Risorse DL 651: 750.000.000 Altre risorse: 250.000.000 Tempi lett. c): mar-98 Tempi lett. d): mar-99	Costo Stimato 500.000.000 Risorse DL 651 338.000.000 Altre risorse 162.000.000 Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) mar-99	Costo Stimato 991.502.620 Risorse DL 651 741.502.620 Altre risorse 250.000.000 Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) feb-99	Costo Stimato 991.502.620 Risorse DL 651 741.502.620 Altre risorse 250.000.000 Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) feb-99	Riduzione risorse Atti "A2" per 8.497.380 Costo Stimato: prerogativa terminata Risorse DL 651: prerogativa terminata Altre risorse: prerogativa terminata Tempi lett. c): dic-97 Tempi lett. d): mar-99

Riduzione risorse Atti "A" per 164.700 000 - cessato richiesta a cofinanz. richiesta a 200.000 000

A.R.B. - Ulteriori finanz. di 800 000.000 - cofinanz. richiesta a 200.000 000

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/04/1997		3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998	
				Costo Sumano	Risorse DL 349	Altre risorse	Temp. lett. c)	Temp. lett. d)	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. lett. c)	Temp. lett. d)	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. lett. c)	Temp. lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. lett. c)	Temp. lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. lett. c)	Temp. lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
A 07	22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monastero delle Clarisse di S. Rosa di Viterbo	1.333.000.000	1.000.000.000	333.000.000	mar-97	mar-99	1.333.000.000	1.000.000.000	333.000.000	mar-97	mar-99	1.333.000.000	1.000.000.000	333.000.000	mar-97	mar-99	Lavori in corso	1.333.000.000	1.000.000.000	333.000.000	mar-97	mar-99	Rideterminazione dell'importo a seguito di gara	1.333.000.000	1.000.000.000	333.000.000	mar-97	mar-99	Rideterminazione dell'importo a seguito di gara
A 07	23	Centro di accoglienza (Castiglione/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Castiglione	2.200.000.000	1.650.000.000	550.000.000	apr-98	giu-99	2.200.000.000	1.650.000.000	550.000.000	apr-98	giu-99	2.200.000.000	1.650.000.000	550.000.000	apr-98	giu-99	C.T.A. parere favorevole	2.200.000.000	1.650.000.000	550.000.000	apr-98	giu-99	C.T.A. parere favorevole	2.100.000.000	1.650.000.000	550.000.000	apr-98	giu-99	C.T.A. parere favorevole
A 07	24	Casa di accoglienza-ostello della gioventù in edifici storici - a) Residenza Abati di Farfa - b) ex albergo (Montopoli/Rieti)	Comune di Montopoli	800.000.000	600.000.000	200.000.000	gen-98	lug-99	800.000.000	600.000.000	200.000.000	gen-98	lug-99	800.000.000	600.000.000	200.000.000	gen-98	lug-99		800.000.000	600.000.000	200.000.000	gen-98	lug-99		800.000.000	600.000.000	200.000.000	gen-98	lug-99	
		Casa di accoglienza-ostello della gioventù (Montopoli/Rieti) Recupero di una villa storica	Comune di Montopoli						800.000.000	600.000.000	200.000.000	gen-98	lug-99																	
A 07	25	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione del complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	6.000.000.000	4.500.000.000	1.500.000.000	feb-98	mag-99	6.000.000.000	4.500.000.000	1.500.000.000	apr-98	nov-99	6.000.000.000	4.500.000.000	1.500.000.000	gen-98	nov-99		6.000.000.000	4.500.000.000	1.500.000.000	gen-98	nov-99		6.000.000.000	4.500.000.000	1.500.000.000	gen-98	nov-99	
A 07	26	Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di palazzo Sbraccia	Comune di Poggio Mirteto	972.000.000	729.000.000	243.000.000	mar-97	mag-99	972.000.000	729.000.000	243.000.000	mar-97	mag-99	972.000.000	729.000.000	243.000.000	mar-98	mag-99	C.T.A. parere favorevole definitiva condizionata	972.000.000	729.000.000	243.000.000	mar-98	mag-99	Rettificazione definitiva condizionata	972.000.000	729.000.000	243.000.000	mar-98	mag-99	Rettificazione definitiva condizionata
		Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di un palazzetto comunale in Piazza Mario Dottori																													
A 07	27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	1.600.000.000	1.200.000.000	400.000 000	mar-97	mag-99	1.600.000.000	1.200.000.000	400.000.000	mar-97	mag-99	1.600.000.000	1.200.800.000	400.000.000	mar-98	mag-99	C.T.A. parere favorevole	1.600.000.000	1.200.000.000	400.000.000	mar-98	mag-99	C.T.A. parere favorevole	1.600.000.000	1.200.000.000	400.000.000	mar-98	mag-99	C.T.A. parere favorevole

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/04/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998	
				Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse
A	07	28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria della Grazie	Comune di Magliano Sabina	2.700.000.000	2.025.000.000	675.000.000	2.700.000.000	2.025.000.000	675.000.000	2.700.000.000	2.025.000.000	675.000.000	2.700.000.000	2.025.000.000	675.000.000	2.700.000.000	2.025.000.000	675.000.000	2.700.000.000	2.025.000.000	675.000.000	2.700.000.000	2.025.000.000	675.000.000	2.700.000.000	2.025.000.000	675.000.000
						mar-97			mar-97			mar-97			mar-97			mar-97			mar-97			mar-97		
						nov-97			gen-98			nov-97			mar-98			mar-98			mar-98			mar-98		

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 12/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
			Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio
			Risorse DL 349	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651
			Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse
			Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)
			Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)
			Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi - Varianzioni	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi
A 07	36	Comune di Marezza	500.000.000 375.000.000 125.000.000 mar-97 mar-97 mar-99							
A 07	37	Comune di Bassiano	200.000.000 150.000.000 50.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	200.000.000 150.000.000 50.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	200.000.000 150.000.000 50.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	200.000.000 150.000.000 50.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	200.000.000 150.000.000 50.000.000 mar-98 mar-98 mar-99	200.000.000 150.000.000 50.000.000 mar-98 mar-98 mar-99	200.000.000 150.000.000 50.000.000 mar-98 mar-98 mar-99	200.000.000 150.000.000 50.000.000 mar-98 mar-98 mar-99
A 07	38	Comune di Sermoneta	1.600.000.000 1.200.000.000 400.000.000 apr-97 apr-97 lug-99	1.600.000.000 1.200.000.000 400.000.000 apr-97 apr-97 lug-99	1.600.008.000 1.200.008.000 400.008.000 apr-97 apr-97 lug-99	1.600.008.000 1.200.008.000 400.008.000 apr-97 apr-97 lug-99	C.T.A. parere favorevole Certificazione 400.008.000 apr-97 apr-97 lug-99	1.600.008.000 1.200.008.000 400.008.000 apr-97 apr-97 lug-99	1.600.008.000 1.200.008.000 400.008.000 apr-97 apr-97 lug-99	Riduzione economie Atti "A" per 257.989.127 1.342.010.873 942.010.873 apr-97 apr-97 lug-99
A 07	38	Ostello della Gioventù (Norma/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico (1° stralcio funzionale)	1.600.000.000 1.200.000.000 400.000.000 dic-97 dic-97 lug-99	1.600.000.000 1.200.000.000 400.000.000 mar-98 mar-98 lug-99	1.600.000.000 1.200.000.000 400.000.000 mar-98 mar-98 lug-99	1.600.000.000 1.200.000.000 400.000.000 mar-98 mar-98 lug-99	1.600.000.000 1.200.000.000 400.000.000 mar-98 mar-98 lug-99	Definanziato 1.600.000.000 1.200.000.000 400.000.000 mar-98 mar-98 lug-99	Definanziato (del. Per 1.200.000.000 1.200.000.000 400.008.000 apr-97 apr-97 lug-99	
A 07	39	Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)	2.667.000.000 2.000.000.000 667.000.000 mar-97 mar-97 lug-99	2.667.000.000 2.000.000.000 667.000.000 apr-97 apr-97 lug-99	2.667.000.000 2.000.000.000 667.000.000 apr-97 apr-97 lug-99	2.667.000.000 2.000.000.000 667.000.000 apr-97 apr-97 lug-99	2.667.000.000 2.000.000.000 667.000.000 apr-97 apr-97 lug-99	2.667.000.000 2.000.000.000 667.000.000 apr-97 apr-97 lug-99	2.667.000.000 2.000.000.000 667.000.000 ott-99 ott-99 lug-99	2.667.000.000 2.000.000.000 667.000.000 ott-99 ott-99 lug-99
A 07	40	Centro di accoglienza (Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-97 mar-97 nov-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 feb-98 feb-98 ott-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 feb-98 feb-98 ott-99	1.734.800.000 1.300.800.000 434.000.000 feb-98 feb-98 ott-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 feb-98 feb-98 ott-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 feb-98 feb-98 ott-99	1.995.703.000 961.703.000 434.000.000 giu-98 giu-98 nov-99	Riduzione economie Atti "A" per 338.297.000 1.995.703.000 961.703.000 434.000.000 giu-98 giu-98 nov-99
A 07	41	Centro di accoglienza (Caserma/Latina)	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-98 mar-98 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-98 mar-98 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-98 mar-98 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-98 mar-98 mar-99
A 07	42	Centro di accoglienza (Caserma/Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-98 mar-98 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-98 mar-98 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-98 mar-98 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-98 mar-98 mar-99
A 07	43	Centro di accoglienza (Caserma/Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-97 mar-97 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-98 mar-98 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-98 mar-98 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-98 mar-98 mar-99	1.734.000.000 1.300.000.000 434.000.000 mar-98 mar-98 mar-99

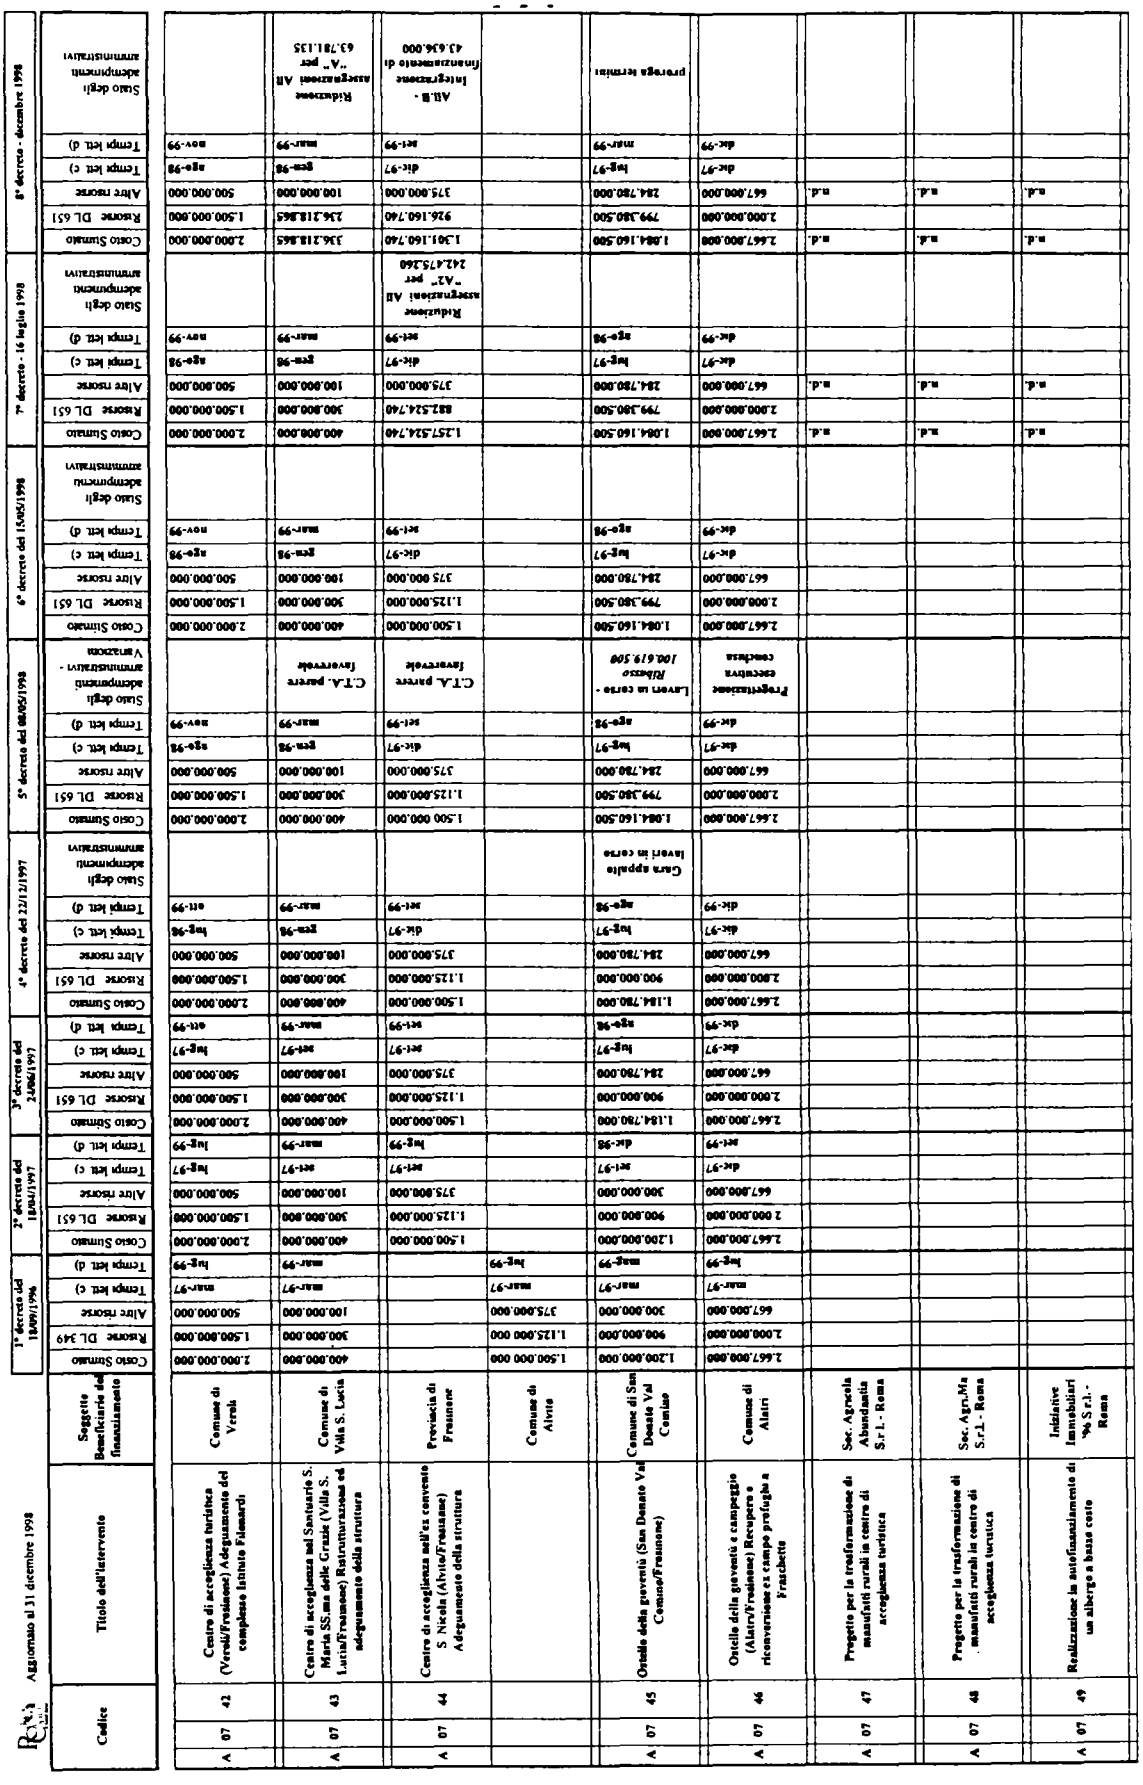

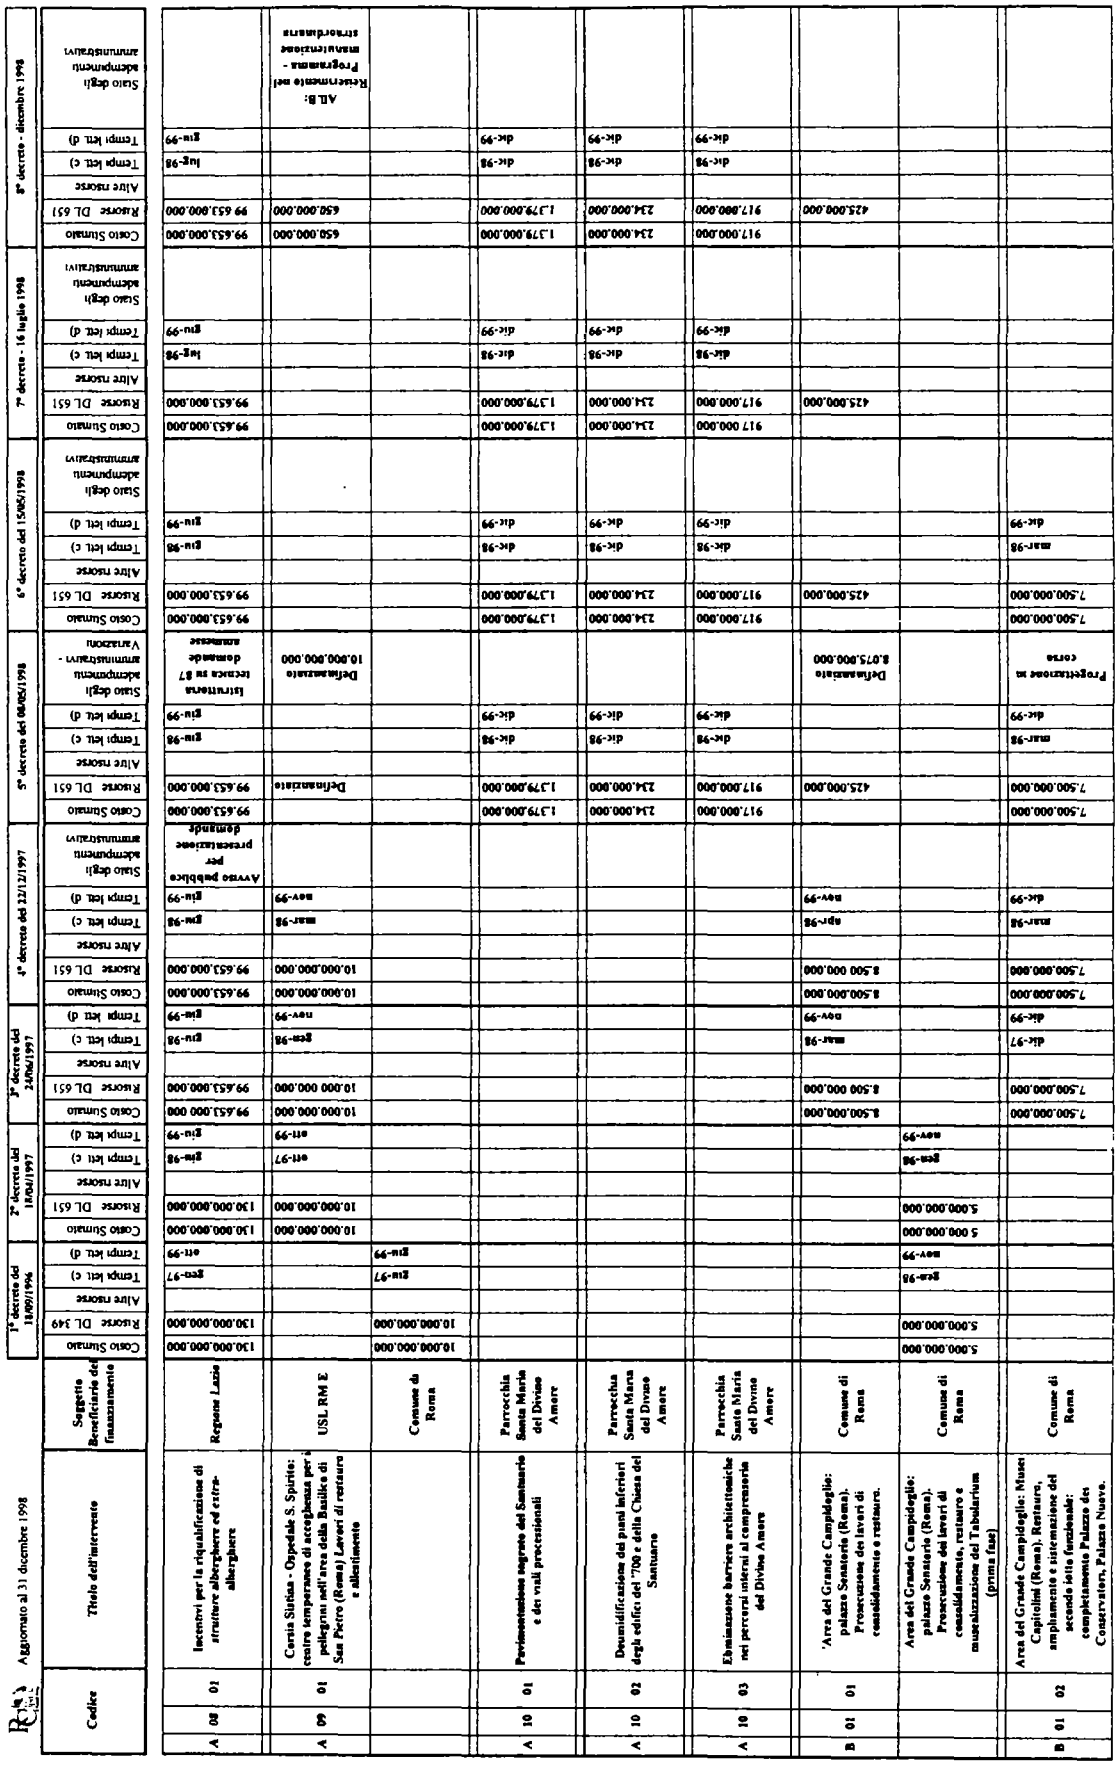

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
				Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Stato degli adempimenti amministrativi
				Risorse DL 349	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	
				Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	
				Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	
				Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	
				Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi - Varianti	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	
				Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651					
				Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse					
				Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	Tempi lett. c)					
				Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	Tempi lett. d)					
				Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato			

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996					2° decreto del 18/04/1997					3° decreto del 24/06/1997					4° decreto del 22/12/1997					5° decreto del 08/05/1998					6° decreto del 15/05/1998					7° decreto - 16 luglio 1998					8° decreto - dicembre 1998				
				Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	02	03	Area del Fori Imperiali, Terra de' Cenci (Roma) Restauri e allestimento del Museo dei Fori Imperiali (prima fase)	Comune di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000			nov-99	15.000.000.000	5.000 000 000			nov-99					nov-99																						
B	02	03	Area archeologica dei Fori Imperiali. Fori di Traiano e Augusto; Fori di Cesare, Nerva e Tempio di Pace Restauri e allestimento del Museo dei Fori Imperiali (prima fase)	Comune di Roma			feb-97	set-98	nov-99	15.000.000.000	5.000 000 000	ott-97	gen-98	nov-99	13.607.000.000	13.607.000.000	nov-97	nov-99	13.607.000.000	13.607.000.000	feb-98	dic-99	5.593.000.000	5.593.000.000	nov-97	nov-99	5.844.358.000	4.283.934.000	3.178.708.000	mar-98	nov-99	5.844.358.000	4.283.934.000	3.178.708.000	mar-98	nov-99	5.844.358.000	4.283.934.000	3.178.708.000	mar-98	nov-99					
B	02	03/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Templum Pacis. (Roma). Scavo restauro e sistemazione delle aree archeologiche	Comune di Roma																	Progettazione preliminare in corso																						
B	02	03/1 a	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Area Foro di Cesare	Comune di Roma																																						
B	02	03/1 b	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Area Tempio della Pace	Comune di Roma																																						
B	02	03/1 c	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Area Foro di Traiano	Comune di Roma																																						
B	02	03/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Templum Pacis. (Roma).	Comune di Roma																																						

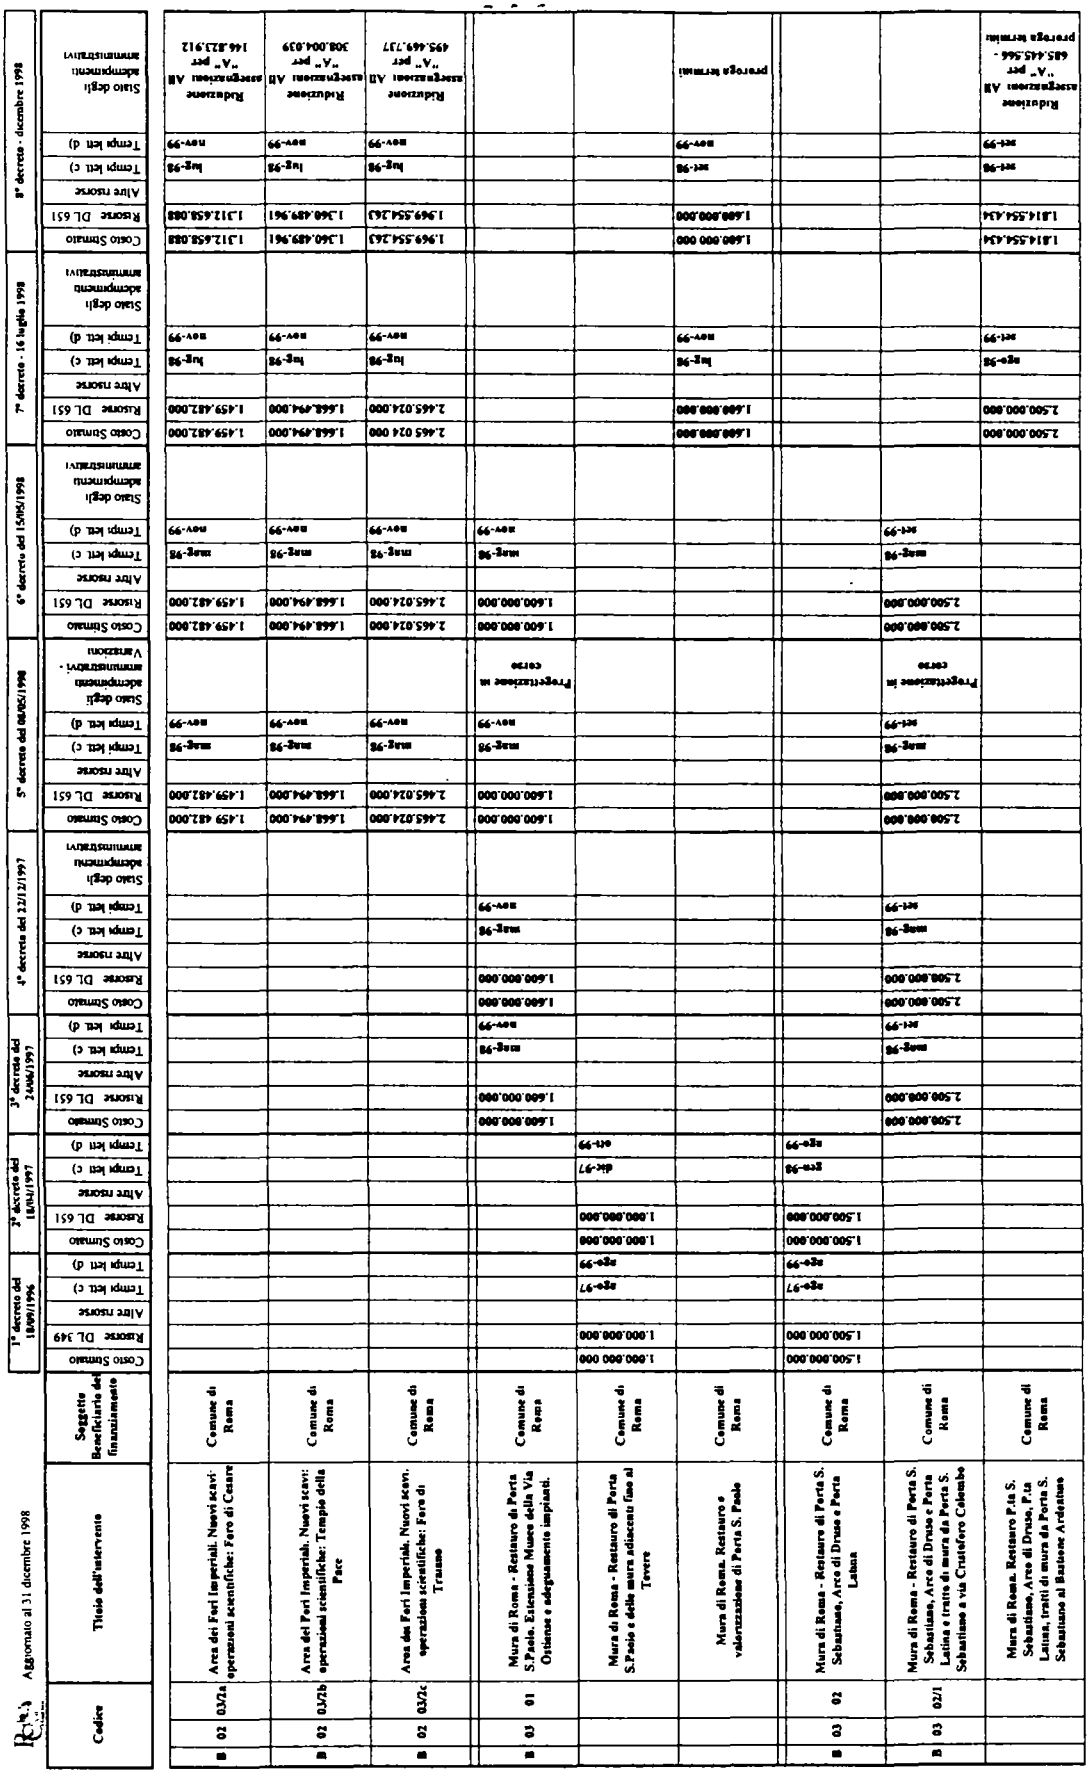

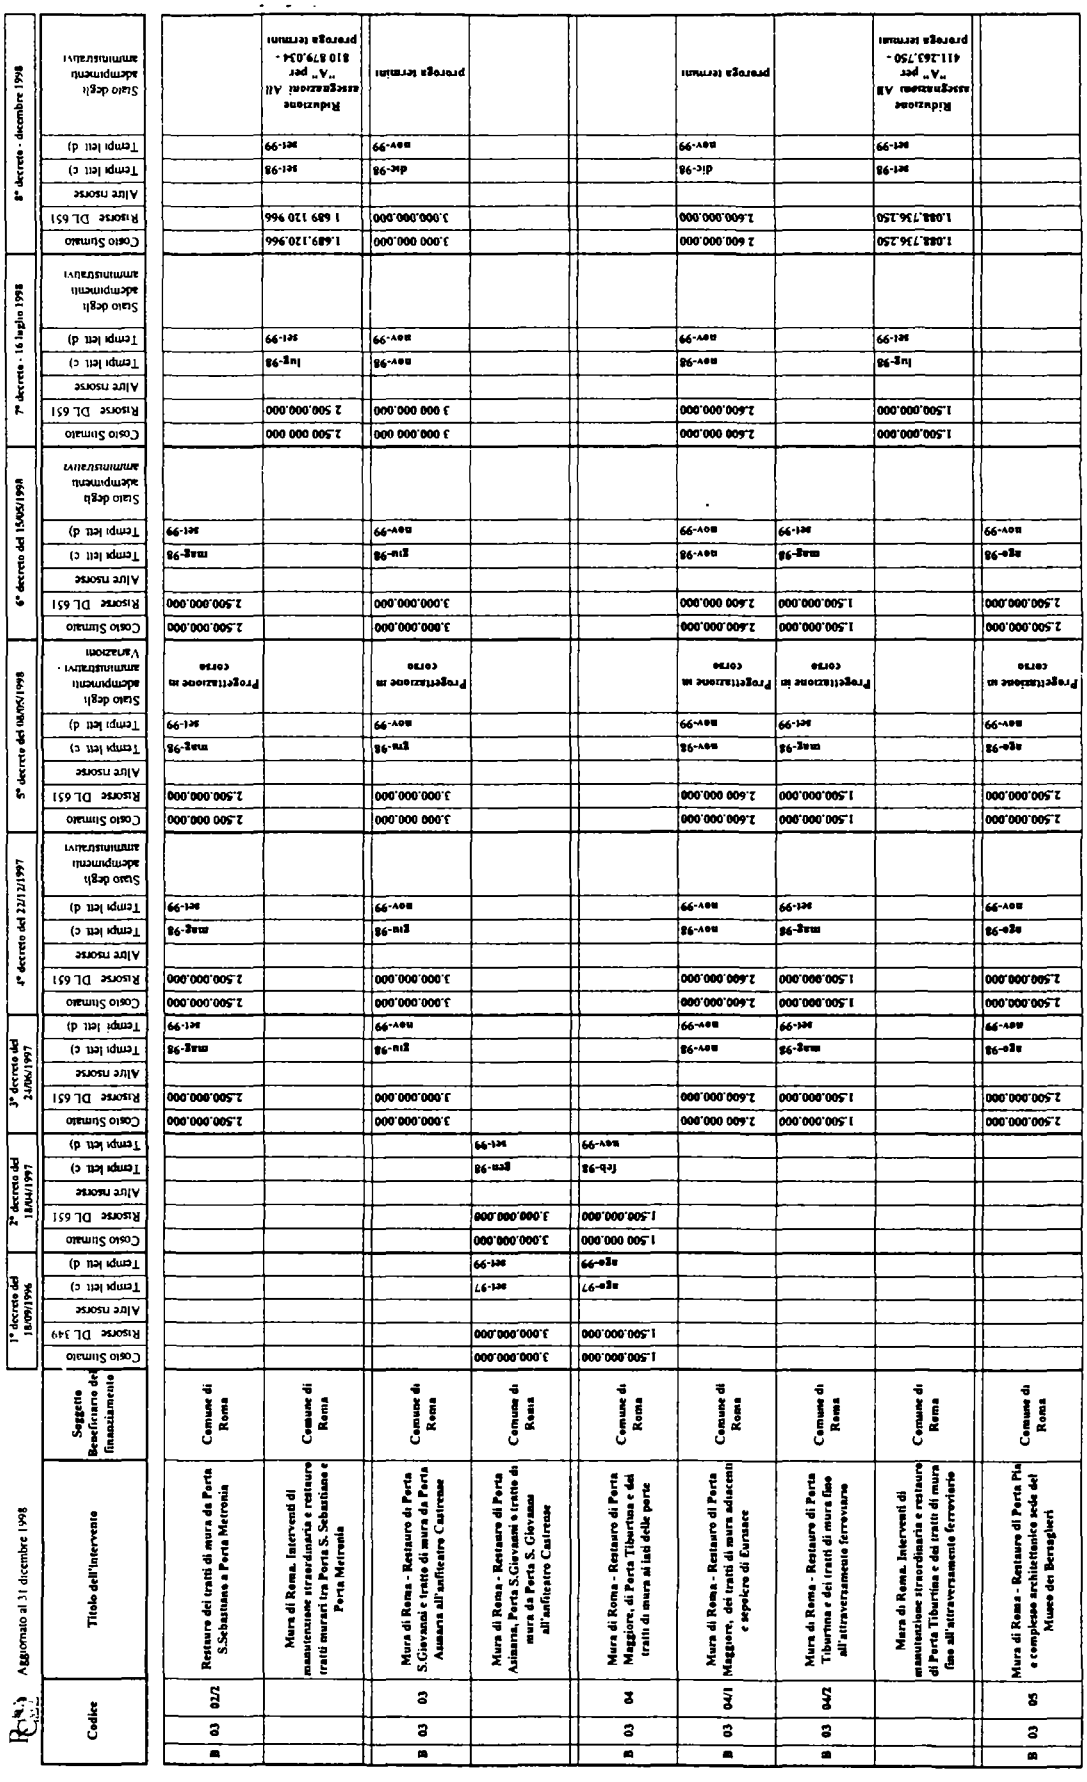

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
B 03 02/2	Restauro dei tratti di mura da Porta S.Sebastiano a Porta Metronia	Comune di Roma	Costo Sumaio Risorse DL 349 Altre risorse Tempi lett c) Tempi lett d)	1.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 set-97 set-99	1.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 feb-98 nov-99	1.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 ago-98 nov-99	1.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 ago-98 nov-99	1.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 ago-98 nov-99	1.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 ago-98 nov-99	1.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 ago-98 nov-99
B 03	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro tratti murari tra Porta S. Sebastiano e Porta Metronia	Comune di Roma	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett c) Tempi lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	2.500.000.000 2.500.000.000 mag-98 set-99 Progettazione in corso	2.500 000 000 2.500.000.000 lug-98 nov-99 Progettazione in corso	2.500 000 000 2.500.000.000 mag-98 set-99 Progettazione in corso	2.500.000.000 2.500.000.000 mag-98 set-99 Progettazione in corso	2.500 000 000 2.500.000.000 mag-98 set-99 Progettazione in corso	2.500 000 000 2.500.000.000 lug-98 set-99 Riduzione ascrizione "A" per 810 879,034 - proroga termini	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett c) Tempi lett d) Stato degli adempimenti amministrativi
B 03 03	Mura di Roma - Restauro di Porta S.Giovanni e tratto di mura da Porta Asinaria all'anfiteatro Castrense	Comune di Roma	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett c) Tempi lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	3.000.000.000 3.000.000.000 lug-98 nov-99 Progettazione in corso	3.000.000.000 3.000.000.000 lug-98 nov-99 Progettazione in corso	3.000.000.000 3.000.000.000 lug-98 nov-99 Progettazione in corso	3.000.000.000 3.000.000.000 lug-98 nov-99 Progettazione in corso	3.000.000.000 3.000.000.000 lug-98 nov-99 Progettazione in corso	3.000.000.000 3.000.000.000 lug-98 nov-99 proroga termini	3.000.000.000 3.000.000.000 lug-98 nov-99 proroga termini
B 03 03	Mura di Roma - Restauro di Porta Asinaria, Porta S.Giovanni e tratto di mura da Porta S. Giovanni all'anfiteatro Castrense	Comune di Roma	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett c) Tempi lett d)	3.000.000.000 3.000.000.000 set-98 set-99	3.000.000.000 3.000.000.000 set-98 set-99	3.000.000.000 3.000.000.000 set-98 set-99	3.000.000.000 3.000.000.000 set-98 set-99	3.000.000.000 3.000.000.000 set-98 set-99	3.000.000.000 3.000.000.000 set-98 set-99	3.000.000.000 3.000.000.000 set-98 set-99
B 03 04	Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, di Porta Tiburtina e dei tratti di mura ai lati delle porte	Comune di Roma	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett c) Tempi lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	2.500.000.000 2.500.000.000 mag-98 set-99 Progettazione in corso	2.500.000.000 2.500.000.000 lug-98 nov-99 Progettazione in corso	2.500.000.000 2.500.000.000 mag-98 set-99 Progettazione in corso	2.500.000.000 2.500.000.000 mag-98 set-99 Progettazione in corso	2.500.000.000 2.500.000.000 mag-98 set-99 Progettazione in corso	2.500.000.000 2.500.000.000 lug-98 nov-99 proroga termini	2.500.000.000 2.500.000.000 lug-98 nov-99 proroga termini
B 03 04/1	Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace	Comune di Roma	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett c) Tempi lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	1.500.000.000 1.500.000.000 mag-98 set-99 Progettazione in corso	1.500.000.000 1.500.000.000 mag-98 set-99 Progettazione in corso	1.500.000.000 1.500.000.000 mag-98 set-99 Progettazione in corso	1.500.000.000 1.500.000.000 mag-98 set-99 Progettazione in corso	1.500.000.000 1.500.000.000 mag-98 set-99 Progettazione in corso	1.500.000.000 1.500.000.000 lug-98 set-99 Riduzione ascrizione "A" per 411.263,750 - proroga termini	1.500.000.000 1.500.000.000 lug-98 set-99 Riduzione ascrizione "A" per 411.263,750 - proroga termini
B 03 04/2	Mura di Roma - Restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett c) Tempi lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	1.088.736.250 1.088.736.250 lug-98 set-99	1.088.736.250 1.088.736.250 lug-98 set-99	1.088.736.250 1.088.736.250 lug-98 set-99	1.088.736.250 1.088.736.250 lug-98 set-99	1.088.736.250 1.088.736.250 lug-98 set-99	1.088.736.250 1.088.736.250 lug-98 set-99	1.088.736.250 1.088.736.250 lug-98 set-99
B 03	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett c) Tempi lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	1.500.000.000 2.500.000.000 mag-98 set-99	1.500.000.000 2.500.000.000 mag-98 set-99	1.500.000.000 2.500.000.000 mag-98 set-99	1.500.000.000 2.500.000.000 mag-98 set-99	1.500.000.000 2.500.000.000 mag-98 set-99	1.500.000.000 2.500.000.000 lug-98 set-99	1.500.000.000 2.500.000.000 lug-98 set-99
B 03 05	Mura di Roma - Restauro di Porta Pia e complesso architettonico sede del Museo dei Bersaglieri	Comune di Roma	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett c) Tempi lett d) Stato degli adempimenti amministrativi	2.500.000.000 2.500.000.000 ago-98 nov-99 Progettazione in corso	2.500.000.000 2.500.000.000 ago-98 nov-99 Progettazione in corso	2.500.000.000 2.500.000.000 ago-98 nov-99 Progettazione in corso	2.500.000.000 2.500.000.000 ago-98 nov-99 Progettazione in corso	2.500.000.000 2.500.000.000 ago-98 nov-99 Progettazione in corso	2.500.000.000 2.500.000.000 ago-98 nov-99 Progettazione in corso	2.500.000.000 2.500.000.000 ago-98 nov-99 Progettazione in corso

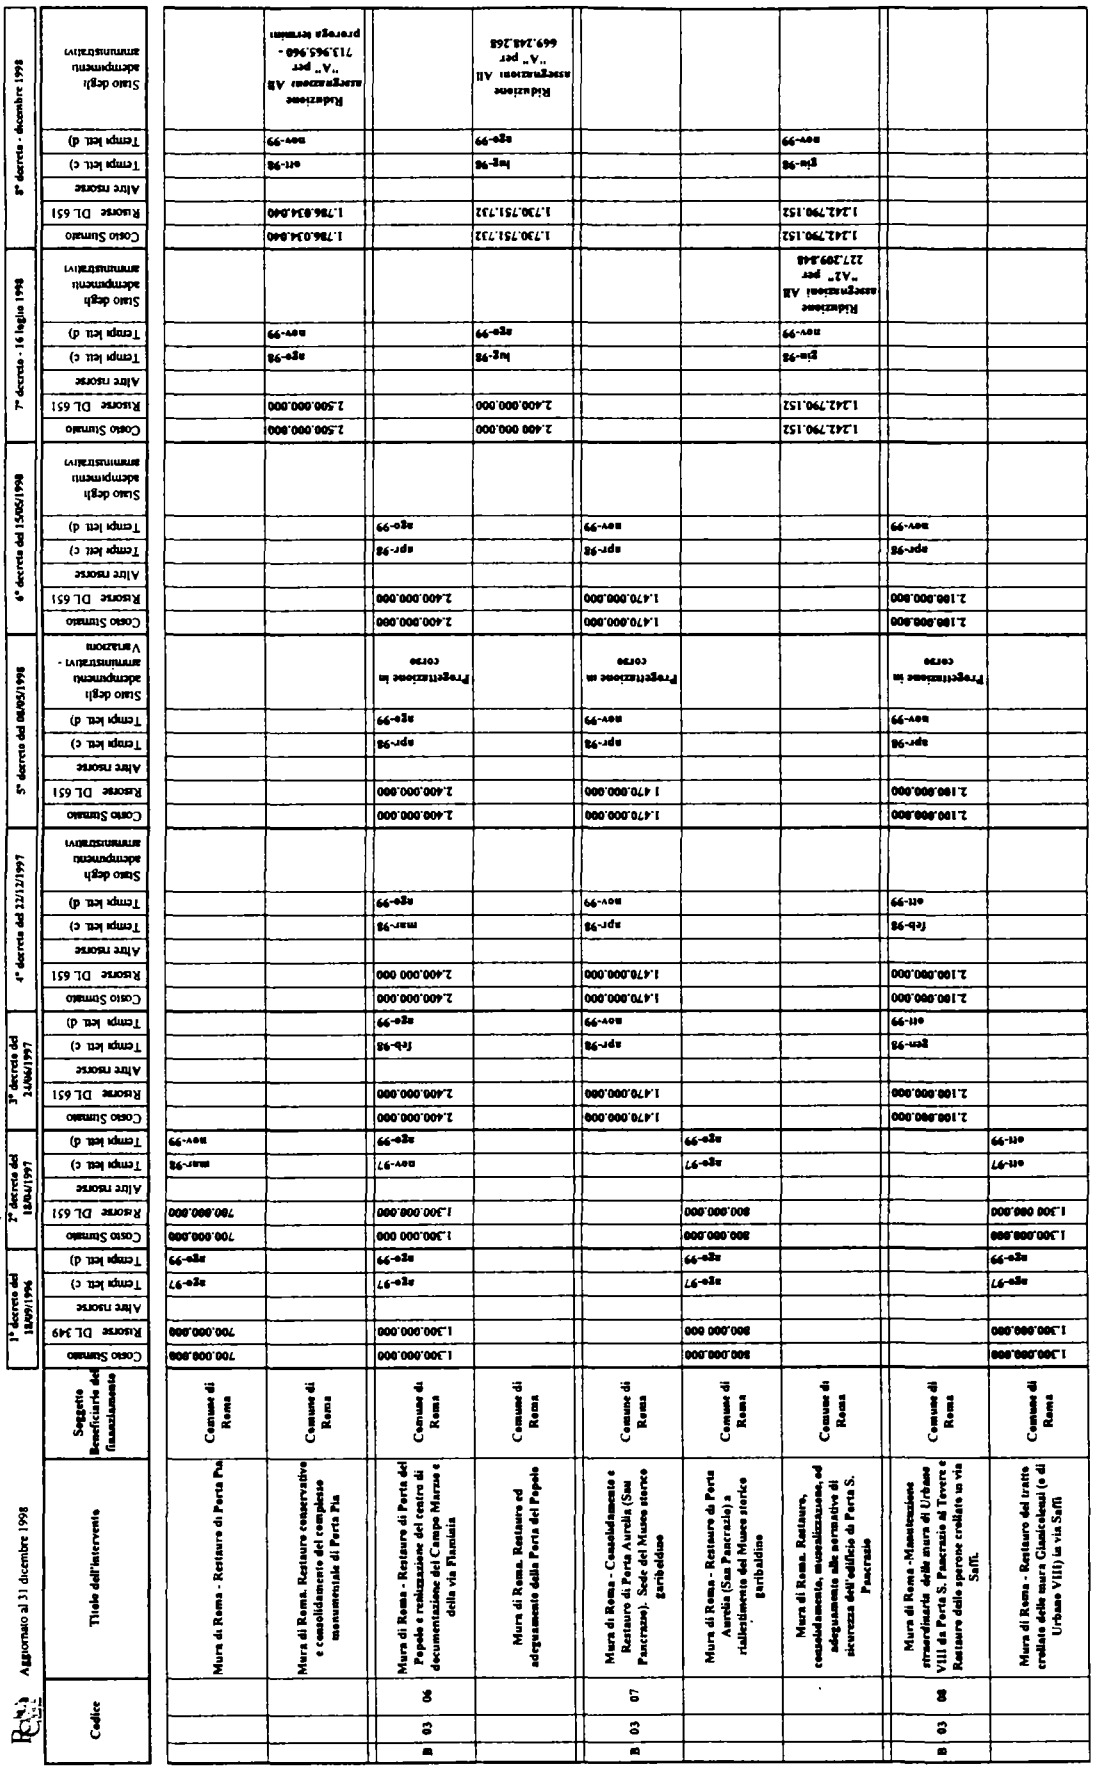

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
			Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano	Costo Sumano
			Risorse DL 349	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651
			Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse
			Temp lett. c)	Temp lett. c)	Temp lett. c)	Temp lett. c)	Temp lett. c)	Temp lett. c)	Temp lett. c)	Temp lett. c)
			Temp lett. d)	Temp lett. d)	Temp lett. d)	Temp lett. d)	Temp lett. d)	Temp lett. d)	Temp lett. d)	Temp lett. d)
			Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi - Valutazioni	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi
06	Mura di Roma - Restauro di Porta Pia	Comune di Roma	700.000.000	700.000.000						
06	Mura di Roma. Restauro conservativo e consolidamento del complesso monumentale di Porta Pia	Comune di Roma								Riduzione autorizzazioni AB "A" per 713.965.960 - proroga termini
06	Mura di Roma - Restauro di Porta del Popolo e realizzazione del centro di documentazione del Campo Marzio e della via Flaminia	Comune di Roma	1.300.000.000	1.300.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	2.500.000.000	1.786.034.000
06	Mura di Roma. Restauro ed adeguamento della Porta del Popolo	Comune di Roma							2.400.000.000	1.730.751.732
07	Mura di Roma - Consolidamento e Restauro di Porta Aurelia (San Pancrazio). Sede del Museo storico garibaldino	Comune di Roma	800.000.000	800.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	2.400.000.000	1.730.751.732
07	Mura di Roma - Restauro da Porta Aurelia (San Pancrazio) a riallestimento del Museo storico garibaldino	Comune di Roma	800.000.000	800.000.000			Progettazione in corso	Progettazione in corso		Riduzione autorizzazioni AB "A" per 669.248.268
03	Mura di Roma. Restauro, consolidamento, musealizzazione, ed adeguamento alle normative di sicurezza dell'edificio di Porta S. Pancrazio	Comune di Roma							Riduzione autorizzazioni AB "A2" per 227.209.848	1.242.790.152
03	Mura di Roma - Manutenzione straordinaria delle mura di Urbano VIII da Porta S. Pancrazio al Tevere e Restauro delle sperone crollate su via Safi.	Comune di Roma	1.300.000.000	1.300.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	1.242.790.152	1.242.790.152
03	Mura di Roma - Restauro del tratto crollato delle mura Gianicolensi (e di Urbano VIII) in via Safi	Comune di Roma	1.300.000.000	1.300.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	1.242.790.152	1.242.790.152

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998			
				Costo Sumaio	Risorse DL 349	Altre risorse	Temp. Ist. c)	Temp. Ist. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. Ist. c)	Temp. Ist. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. Ist. c)	Temp. Ist. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. Ist. c)	Temp. Ist. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. Ist. c)	Temp. Ist. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. Ist. c)	Temp. Ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	03	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Gianicolensi nel tratto Porta S. Pancrazio - Porta Portese	Comune di Roma		3.900.000.000		mar-97	nov-99																										
B	03	09	Mura di Roma - Completamento degli interventi di conservazione dell'intero circuito delle mura urbane	Comune di Roma	3.900.000.000	3.900.000.000		gen-98	nov-99																											
B	03	09/1	Manutenzione straordinaria e restauro delle Mura Aureliane tratti Campo Boario - Piramide e viale Giotto - angolo Ardeatina	Comune di Roma		2.200.000.000		gen-98	ott-99	2.200.000.000																										
B	03		Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Aureliane nel tratto Campo Boario - largo Lazzaroni	Comune di Roma				mag-98																												
B	03	09/2	Mura di Roma Manutenzione straordinaria e restauro delle mura aureliane e Bastione Ardeatino, tratto tra viale Giotto angolo via Ardeatina - via delle Terme di Caracalla e recupero del camminamento	Comune di Roma		2.600.000.000		gen-98	ott-99	2.600.000.000																										
			Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Aureliane nel tratto largo Lazzaroni - Bastione Ardeatino	Comune di Roma				mag-98	nov-99	2.225.208.178	2.225.208.178																										
B	04	01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	Comune di Roma				set-98	nov-99	1.500.000.000	1.500.000.000																									
B			Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro ed adeguamento funzionale e tecnologico	Comune di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000		ott-97	gen-99	1.128.056.575	1.128.056.575																									
B	05	01	Palazzo Braschi (Roma) Adeguamento funzionale e normativo della sede del Museo di Roma	Comune di Roma	36.500.000.000	36.500.000.000		set-97	dic-99	1.774.396.177	1.774.396.177																									
								feb-98	dic-99																											

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 11/04/1997	3° decreto del 24/08/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
B 05 01/1	Restauro di Palazzo Braschi : interventi preliminari.	Comune di Roma	Costo Stimato: 1.000.000.000 Risorse DL 349: 5.000.000.000 Altre risorse: 1.000.000.000 Temp. ist. d): dic-99 Temp. ist. c): mar-97	Costo Stimato: 1.000.000.000 Risorse DL 651: 1.000.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): dic-99	Costo Stimato: 2.500.000.000 Risorse DL 651: 2.500.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): dic-99	Costo Stimato: 2.500.000.000 Risorse DL 651: 2.500.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): dic-99	Costo Stimato: 1.000.000.000 Risorse DL 651: 1.000.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): lug-97 Temp. ist. d): dic-99	Costo Stimato: 1.000.000.000 Risorse DL 651: 1.000.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): dic-99	Costo Stimato: 2.970.686.700 Risorse DL 651: 911.587.600 Altre risorse: Temp. ist. c): Temp. ist. d): set-99	Costo Stimato: 2.970.686.700 Risorse DL 651: 2.979.686.700 Altre risorse: Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): ott-99
B 05 01/2	Restauro di Palazzo Braschi : Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	Comune di Roma	Costo Stimato: 2.000.000.000 Risorse DL 651: 2.000.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): Temp. ist. d):	Costo Stimato: 2.000.000.000 Risorse DL 651: 2.000.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): Temp. ist. d):	Costo Stimato: 2.000.000.000 Risorse DL 651: 2.000.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): ago-99	Costo Stimato: 2.000.000.000 Risorse DL 651: 2.000.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): feb-98 Temp. ist. d): set-99	Costo Stimato: 2.000.000.000 Risorse DL 651: 2.000.000.000 Stato degli adempimenti amministrativi: Preliminare in corso Temp. ist. c): feb-98 Temp. ist. d): nov-99	Costo Stimato: 2.000.000.000 Risorse DL 651: 2.000.000.000 Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni: Preliminare in corso Temp. ist. c): feb-98 Temp. ist. d): nov-99	Costo Stimato: 1.608.000.000 Risorse DL 651: 1.608.000.000 Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI "A2" per 392.000.000 Temp. ist. c): ago-98 Temp. ist. d): nov-99	Costo Stimato: 1.608.000.000 Risorse DL 651: 1.608.000.000 Stato degli adempimenti amministrativi: Temp. ist. c): Temp. ist. d):
B 05 02	Palazzo Altemps (Roma) Scavo e sistemazione carride, allestimento e completamento del Museo antiquario	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Stimato: 7.000.000.000 Risorse DL 349: 5.000.000.000 Altre risorse: 2.000.000.000 Temp. ist. c): mar-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 7.000.000.000 Risorse DL 651: 5.000.000.000 Altre risorse: 2.000.000.000 Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 7.000.000.000 Risorse DL 651: 5.000.000.000 Altre risorse: 2.000.000.000 Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 7.000.000.000 Risorse DL 651: 5.000.000.000 Altre risorse: 2.000.000.000 Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 7.000.000.000 Risorse DL 651: 5.000.000.000 Altre risorse: 2.000.000.000 Stato degli adempimenti amministrativi: Cons. di Servizi in preparo (approvato) Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 13.808.000.000 Risorse DL 651: 13.000.000.000 Altre risorse: 2.000.000.000 Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni: (Gara in corso Temp. ist. c): mar-98 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 6.808.900.000 Risorse DL 651: 4.808.900.000 Altre risorse: 2.000.000.000 Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 191.100.000 Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 18.573.193.647 Risorse DL 651: 10.673.193.647 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A2" per 2.326.806.353 Temp. ist. c): apr-98 Temp. ist. d): nov-99	Costo Stimato: 1.608.000.000 Risorse DL 651: 1.608.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): ago-98 Temp. ist. d): nov-99
B 05 03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medaglere"	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Stimato: 1.500.000.000 Risorse DL 349: 1.500.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): mar-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 1.500.000.000 Risorse DL 651: 1.500.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 1.500.000.000 Risorse DL 651: 1.500.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 1.500.000.000 Risorse DL 651: 1.500.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 1.500.000.000 Risorse DL 651: 1.500.000.000 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Progettazione definitiva cantierata Temp. ist. c): mar-98 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 1.500.000.000 Risorse DL 651: 1.500.000.000 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni: Progettazione definitiva cantierata Temp. ist. c): mar-98 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 4.808.900.000 Risorse DL 651: 4.808.900.000 Altre risorse: 2.000.000.000 Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 191.100.000 Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.167.765.526 Risorse DL 651: 1.167.765.526 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 53.234.474 Temp. ist. c): mar-98 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.367.818.287 Risorse DL 651: 2.367.818.287 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 132.181.713 Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 911.587.600 Risorse DL 651: 911.587.600 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 88.412.400 Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): set-99	Costo Stimato: 800.000.000 Risorse DL 651: 800.000.000 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 29.313.300 Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.970.686.700 Risorse DL 651: 2.979.686.700 Altre risorse: Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): ott-99
B 05 04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Allestimento ed ampliamento del Museo antiquario	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Stimato: 2.200.000.000 Risorse DL 349: 2.100.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): mar-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.200.000.000 Risorse DL 651: 2.100.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.200.000.000 Risorse DL 651: 2.200.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.200.000.000 Risorse DL 651: 2.200.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.200.000.000 Risorse DL 651: 2.200.000.000 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Progettazione definitiva cantierata Temp. ist. c): mar-98 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.200.000.000 Risorse DL 651: 2.200.000.000 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni: Progettazione definitiva cantierata Temp. ist. c): mar-98 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 6.808.900.000 Risorse DL 651: 4.808.900.000 Altre risorse: 2.000.000.000 Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 191.100.000 Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.167.765.526 Risorse DL 651: 2.167.765.526 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 53.234.474 Temp. ist. c): mar-98 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.367.818.287 Risorse DL 651: 2.367.818.287 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 132.181.713 Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 911.587.600 Risorse DL 651: 911.587.600 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 88.412.400 Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): set-99	Costo Stimato: 800.000.000 Risorse DL 651: 800.000.000 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 29.313.300 Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.970.686.700 Risorse DL 651: 2.979.686.700 Altre risorse: Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): ott-99
B 05 05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, riallestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Cinquecento)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Stimato: 2.500.000.000 Risorse DL 349: 2.500.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): mar-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.500.000.000 Risorse DL 651: 2.500.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.500.000.000 Risorse DL 651: 2.500.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.500.000.000 Risorse DL 651: 2.500.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 1.000.000.000 Risorse DL 651: 1.000.000.000 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Lavori in corso Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): set-99	Costo Stimato: 1.000.000.000 Risorse DL 651: 1.000.000.000 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni: Lavori in corso Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): set-99	Costo Stimato: 1.000.000.000 Risorse DL 651: 1.000.000.000 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Progettazione definitiva cantierata Temp. ist. c): lug-97 Temp. ist. d): dic-99	Costo Stimato: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): Temp. ist. d):
B 05 06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Oberdan), completamento restauro Museo delle Cere	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Stimato: 2.100.000.000 Risorse DL 349: 2.100.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): mar-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.100.000.000 Risorse DL 651: 2.100.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.100.000.000 Risorse DL 651: 2.100.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.100.000.000 Risorse DL 651: 2.100.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.100.000.000 Risorse DL 651: 2.100.000.000 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Progettazione definitiva cantierata Temp. ist. c): mar-98 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.100.000.000 Risorse DL 651: 2.100.000.000 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni: Progettazione definitiva cantierata Temp. ist. c): mar-98 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.100.000.000 Risorse DL 651: 2.100.000.000 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 53.234.474 Temp. ist. c): mar-98 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.167.765.526 Risorse DL 651: 2.167.765.526 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 132.181.713 Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 911.587.600 Risorse DL 651: 911.587.600 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 88.412.400 Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): set-99	Costo Stimato: 800.000.000 Risorse DL 651: 800.000.000 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 29.313.300 Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.970.686.700 Risorse DL 651: 2.979.686.700 Altre risorse: Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): ott-99
B 05 07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica - Sale dei Capolavori"	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Stimato: 3.000.000.000 Risorse DL 349: 3.000.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): mar-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Temp. ist. c): nov-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Gara in corso Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni: Gara in corso Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.970.686.700 Risorse DL 651: 2.979.686.700 Altre risorse: Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione ASI per "A" per 29.313.300 Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): ott-99	Costo Stimato: 2.970.686.700 Risorse DL 651: 2.979.686.700 Altre risorse: Temp. ist. c): dic-97 Temp. ist. d): ott-99

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice				Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
						Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Stato degli adempimenti amministrativi
						Risorse DL 349	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	
						Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	
						Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	
						Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	
B	10			Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000
B	10	09		Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	28.222.533.439	28.222.533.439
						6.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	
						mar-97	mar-97	nov-97					
						apr-99	nov-97	nov-97	nov-97	feb-98	feb-98	feb-98	feb-98
B	10	09	01	Restauro del complesso di Palazzo Barberini (Roma) - prima stralcio	Ministero per i Beni e le Attività Culturali					Lavori in corso			
						16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	Progettazione definitiva conclusa				
						10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000					
						dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97
						nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99
				Palazzo Barberini (Roma) Lavori di restauro della Galleria Nazionale d'Arte Antica (prima stralcio)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	Progettazione definitiva conclusa	Progettazione definitiva conclusa	Progettazione definitiva conclusa	Progettazione definitiva conclusa	Progettazione definitiva conclusa
						23.000.000.000							
						mar-97							
						10.000.000.000							
						20.000.000.000							
						mar-97							
						apr-99							
						nov-97							
B	10	01/a		Museo Nazionale di Villa Giulia (Roma) Restauro, adeguamento funzionale e nuovo allestimenti di Villa Giulia. Restauro architettonico della Villa Pontelewski (prima fase).	Ministero per i Beni e le Attività Culturali								
						6.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
						16.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	28.222.533.439	28.222.533.439
						6.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	
						mar-97	mar-97	nov-97					
						apr-99	nov-97	nov-97	nov-97	feb-98	feb-98	feb-98	feb-98
B	10	01/a		Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali					Progettazione definitiva conclusa			
						6.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
						16.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	28.222.533.439	28.222.533.439
						6.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	
						mar-97	mar-97	nov-97					
						apr-99	nov-97	nov-97	nov-97	feb-98	feb-98	feb-98	feb-98
B	10			Villa Giulia	Ministero per i Beni e le Attività Culturali								
						6.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
						16.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	28.222.533.439	28.222.533.439
						6.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	
						mar-97	mar-97	nov-97					
						apr-99	nov-97	nov-97	nov-97	feb-98	feb-98	feb-98	feb-98
B	10	01/b		Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Pontelewski)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali					Gara in corso			
						6.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
						16.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	28.222.533.439	28.222.533.439
						6.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	
						mar-97	mar-97	nov-97					
						apr-99	nov-97	nov-97	nov-97	feb-98	feb-98	feb-98	feb-98
B	10			Villa Pontelewski	Ministero per i Beni e le Attività Culturali								
						6.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
						16.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	28.222.533.439	28.222.533.439
						6.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	
						mar-97	mar-97	nov-97					
						apr-99	nov-97	nov-97	nov-97	feb-98	feb-98	feb-98	feb-98

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998	
					Costo Stralcio	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi fatt. d)	Costo Stralcio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. d)	Costo Stralcio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. d)	Costo Stralcio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. d)	Costo Stralcio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. d)	Costo Stralcio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. d)	Costo Stralcio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	10	01/c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Siebi Fera)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.500.000.000	2.500.000.000		apr-99	1.500.000.000	1.500.000.000		mar-97	1.500.000.000	1.500.000.000		mar-97	1.500.000.000	1.500.000.000		mar-97	1.500.000.000	1.500.000.000		mar-98	1.500.000.000	1.500.000.000		mar-98	1.001.670.860	1.001.670.860		mar-98		
B	11		Villa Siebi Fera	Ministero per i Beni e le Attività Culturali					3.400.000.000	3.400.000.000		mar-97	3.400.000.000	3.400.000.000		mar-97	3.400.000.000	3.400.000.000		mar-97	3.400.000.000	3.400.000.000		mar-98	3.400.000.000	3.400.000.000		mar-98	3.400.000.000	3.400.000.000		mar-98		
B	12	01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	30.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000	nov-99	30.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000	mag-98	30.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000	nov-99	30.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000	ott-99	25.000.000.000	18.000.000.000	15.000.000.000	dic-97	15.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	nov-99	9.124.858.514	9.124.858.514	15.000.000.000	dic-97	Ridotte risorse aggiuntive AB "A" per 875.141.486	mag-98
B	12	01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	600.000.000	600.000.000		gen-99	600.000.000	600.000.000		gen-97	600.000.000	600.000.000		ago-99	600.000.000	600.000.000		gen-99	600.000.000	600.000.000	Lavori in corso	gen-98	600.000.000	600.000.000		gen-99	581.696.931	581.696.931		gen-98	Ridotte risorse aggiuntive AB "A" per 18.303.069	gen-98
B	12	02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.500.000.000	3.500.000.000		ago-99	3.500.000.000	3.500.000.000		nov-97	3.500.000.000	3.500.000.000		nov-97	3.500.000.000	3.500.000.000		ott-99	3.500.000.000	3.500.000.000	Progettazione definitiva conclusa	ott-99	3.500.000.000	3.500.000.000		ott-99	3.103.075.537	3.103.075.537		gen-98	Ridotte risorse aggiuntive AB "A" per 396.924.463	nov-99
B	12	03	Vitorchiano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	10.000.000.000	10.000.000.000		nov-99	10.000.000.000	10.000.000.000		mag-98	10.000.000.000	10.000.000.000		nov-99	10.000.000.000	10.000.000.000		nov-99	10.000.000.000	10.000.000.000	Progettazione conclusa	nov-98	10.000.000.000	10.000.000.000		nov-99	9.676.423.063	9.676.423.063		nov-98	Ridotte risorse aggiuntive AB "A" per 323.576.937	nov-99
B	12	04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.000.000.000	3.000.000.000		ago-99	3.000.000.000	3.000.000.000		nov-97	3.000.000.000	3.000.000.000		ago-99	3.000.000.000	3.000.000.000		ago-99	3.000.000.000	3.000.000.000	Progettazione definitiva conclusa	ago-98	3.000.000.000	3.000.000.000		ago-99	3.000.000.000	3.000.000.000		ago-98		apr-99
B	12	05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e adeguamento del cortile	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.500.000.000	1.500.000.000		giu-97	1.500.000.000	1.500.000.000		nov-97	1.500.000.000	1.500.000.000		nov-97	1.500.000.000	1.500.000.000		mag-99	1.500.000.000	1.500.000.000	Progettazione definitiva conclusa	mag-98	1.500.000.000	1.500.000.000		mag-98	1.001.670.860	1.001.670.860		mag-98	Ridotte risorse aggiuntive AB "A" per 98.329.140	mag-98
B	12	06	Pozzuto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.500.000.000	2.500.000.000		ago-99																										

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998
					Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	12	06/a	Piazzetta di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.700.000.000	1.400.000.000		mar-97	ago-99	3.700.000.000	1.400.000.000		mar-97	ago-99	2.500.000.000	1.400.000.000		mag-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa	2.500.000.000	1.400.000.000		feb-98	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	2.500.000.000	1.400.000.000		feb-98	ott-99	Riduzione aree/pertinenze All "A" per 135.006.818	2.208.104.197	2.264.993.182		feb-98	ott-99	
B	12	06/b	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	Ministero per i Beni e le Attività Culturali				apr-98	dic-99				apr-98	dic-99				apr-98	dic-99	Progettazione definitiva conclusa	300.000.000	300.000.000		apr-98	dic-99	Progettazione definitiva conclusa	300.000.000	300.000.000		apr-98	dic-99	Riduzione aree/pertinenze All "A" per 32.926.664	267.073.356	267.073.356		apr-98	dic-99	
B	12	07	Arsenale Pontificio (Roma) Restauro completo dell'immobile per utilizzazione museale (Museo del Tevere)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		1.500.000.000		mar-97	ott-99	1.500.000.000	Definanziato																									
B	12	08	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		1.800.000.000		mar-97	ott-99	1.800.000.000	1.800.000.000		mag-97	ott-99	1.800.000.000	1.800.000.000		mag-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	1.800.000.000	1.800.000.000		mar-98	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	1.800.000.000	1.800.000.000		mar-98	ott-99	Riduzione aree/pertinenze All "A" per 145.860.137	1.654.139.863	1.654.139.863		mar-98	ott-99	
B	12	09	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		300.000.000		mar-97	giu-99	300.000.000	300.000.000		mag-97	ago-99	300.000.000	300.000.000		mag-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa	300.000.000	300.000.000		gen-98	ago-99	Gara in corso	300.000.000	300.000.000		gen-98	ago-99		300.000.000	300.000.000		gen-98	ago-99	
B	12	10	Appia Antica - Cecilia Metella	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		2.700.000.000		mar-97	ago-99	2.700.000.000	2.700.000.000		mag-97	ago-99	2.700.000.000	2.700.000.000		mag-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa - *Definanziato 700.000.000*	2.000.000.000	2.000.000.000		mar-98	ott-99	Riduzione aree/pertinenze All "A" per 139.441.147	1.860.558.753	1.860.558.753		mar-98	ott-99		1.860.558.753	1.860.558.753		mar-98	ott-99	
B	12		Tomba di Cecilia Metella (Roma) Restauro e sistemazione del complesso monumentale (Parco archeologico dell'Appia Antica)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		2.700.000.000			ago-99	2.700.000.000			mag-97	ago-99																						
B	12	11	Mausoleo di S.Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recupero del complesso monumentale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		1.300.000.000		mar-97	ago-99	1.300.000.000	1.300.000.000		mag-97	ago-99	1.300.000.000	1.300.000.000		mag-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa	1.300.000.000	1.300.000.000		feb-98	ott-99	Riduzione aree/pertinenze All "A" per 93.559.430	2.208.104.197	2.206.440.570		feb-98	ott-99		2.208.104.197	2.206.440.570		feb-98	ott-99	
B	12	12	Mausoleo "Bevilacqua del Prete" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		1.400.000.000		mar-97	ago-99	1.400.000.000	1.400.000.000		mag-97	ago-99	1.400.000.000	1.400.000.000		mag-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa	1.400.000.000	1.400.000.000		feb-98	ott-99	Riduzione aree/pertinenze All "A" per 135.006.818	2.208.104.197	2.264.993.182		feb-98	ott-99	

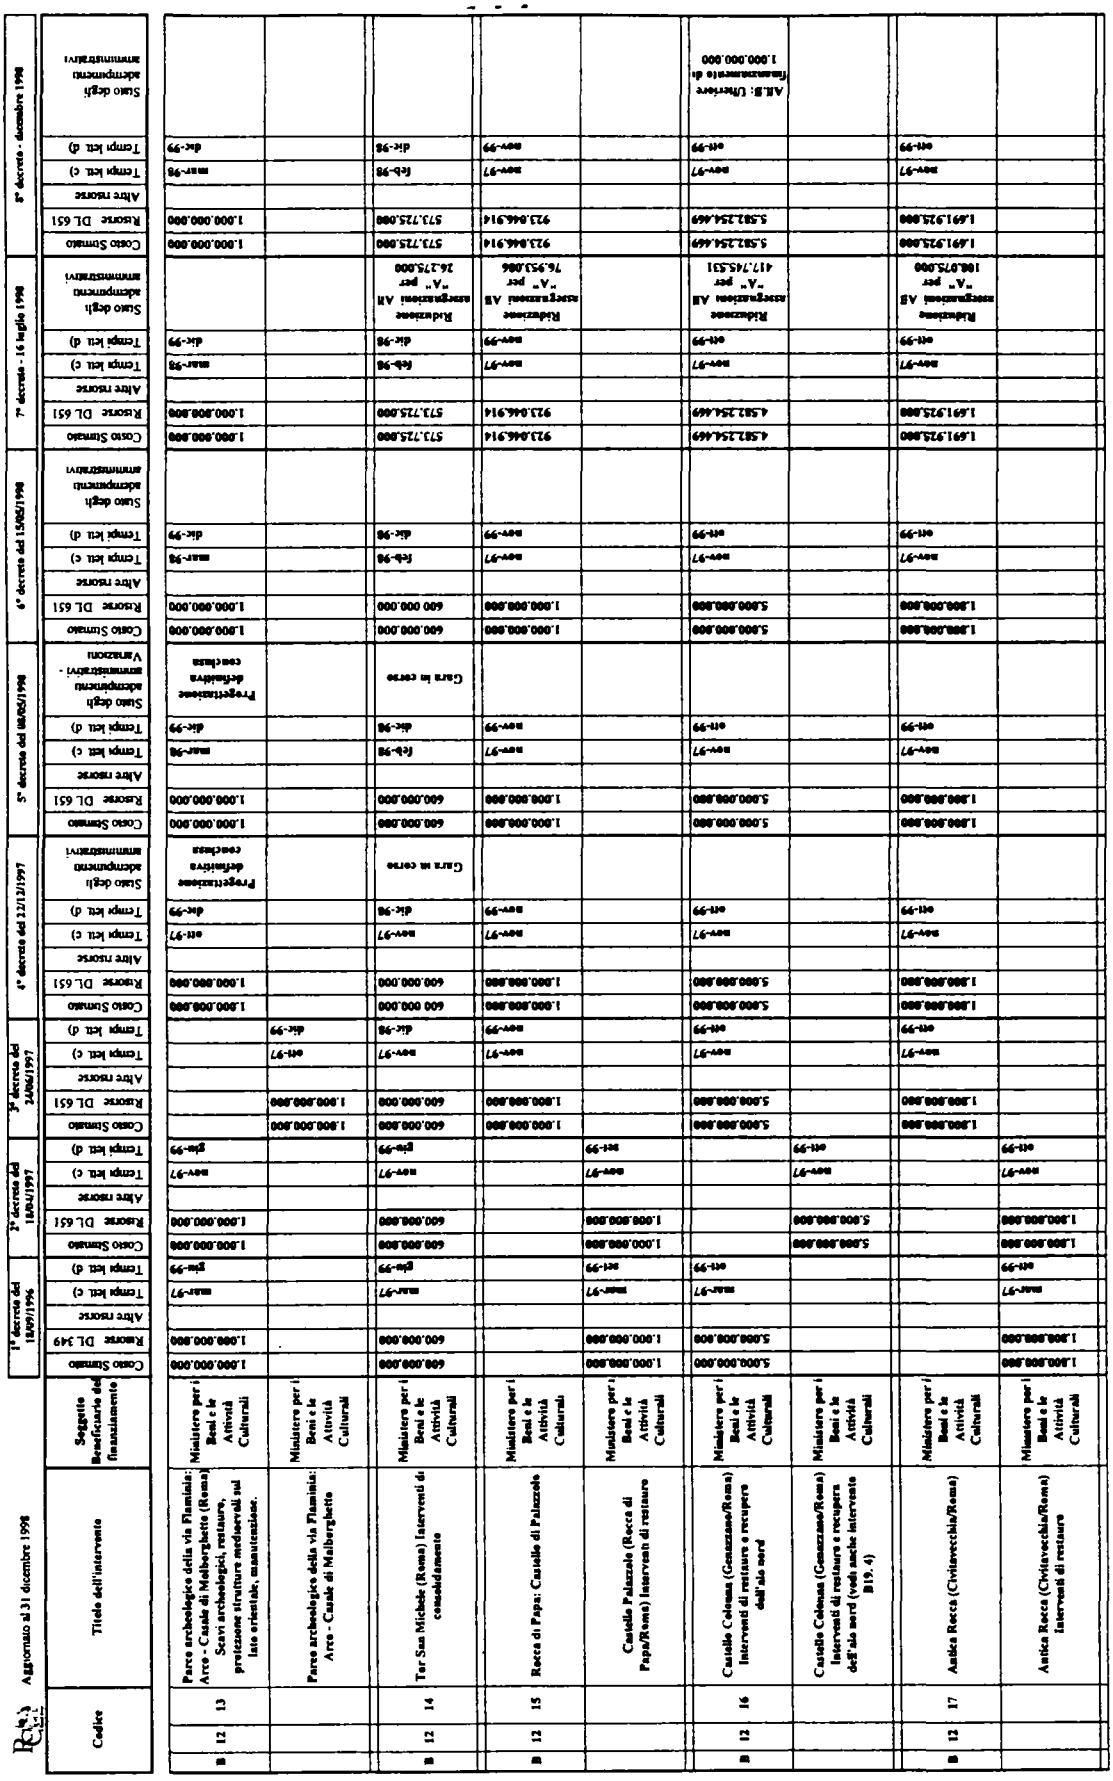

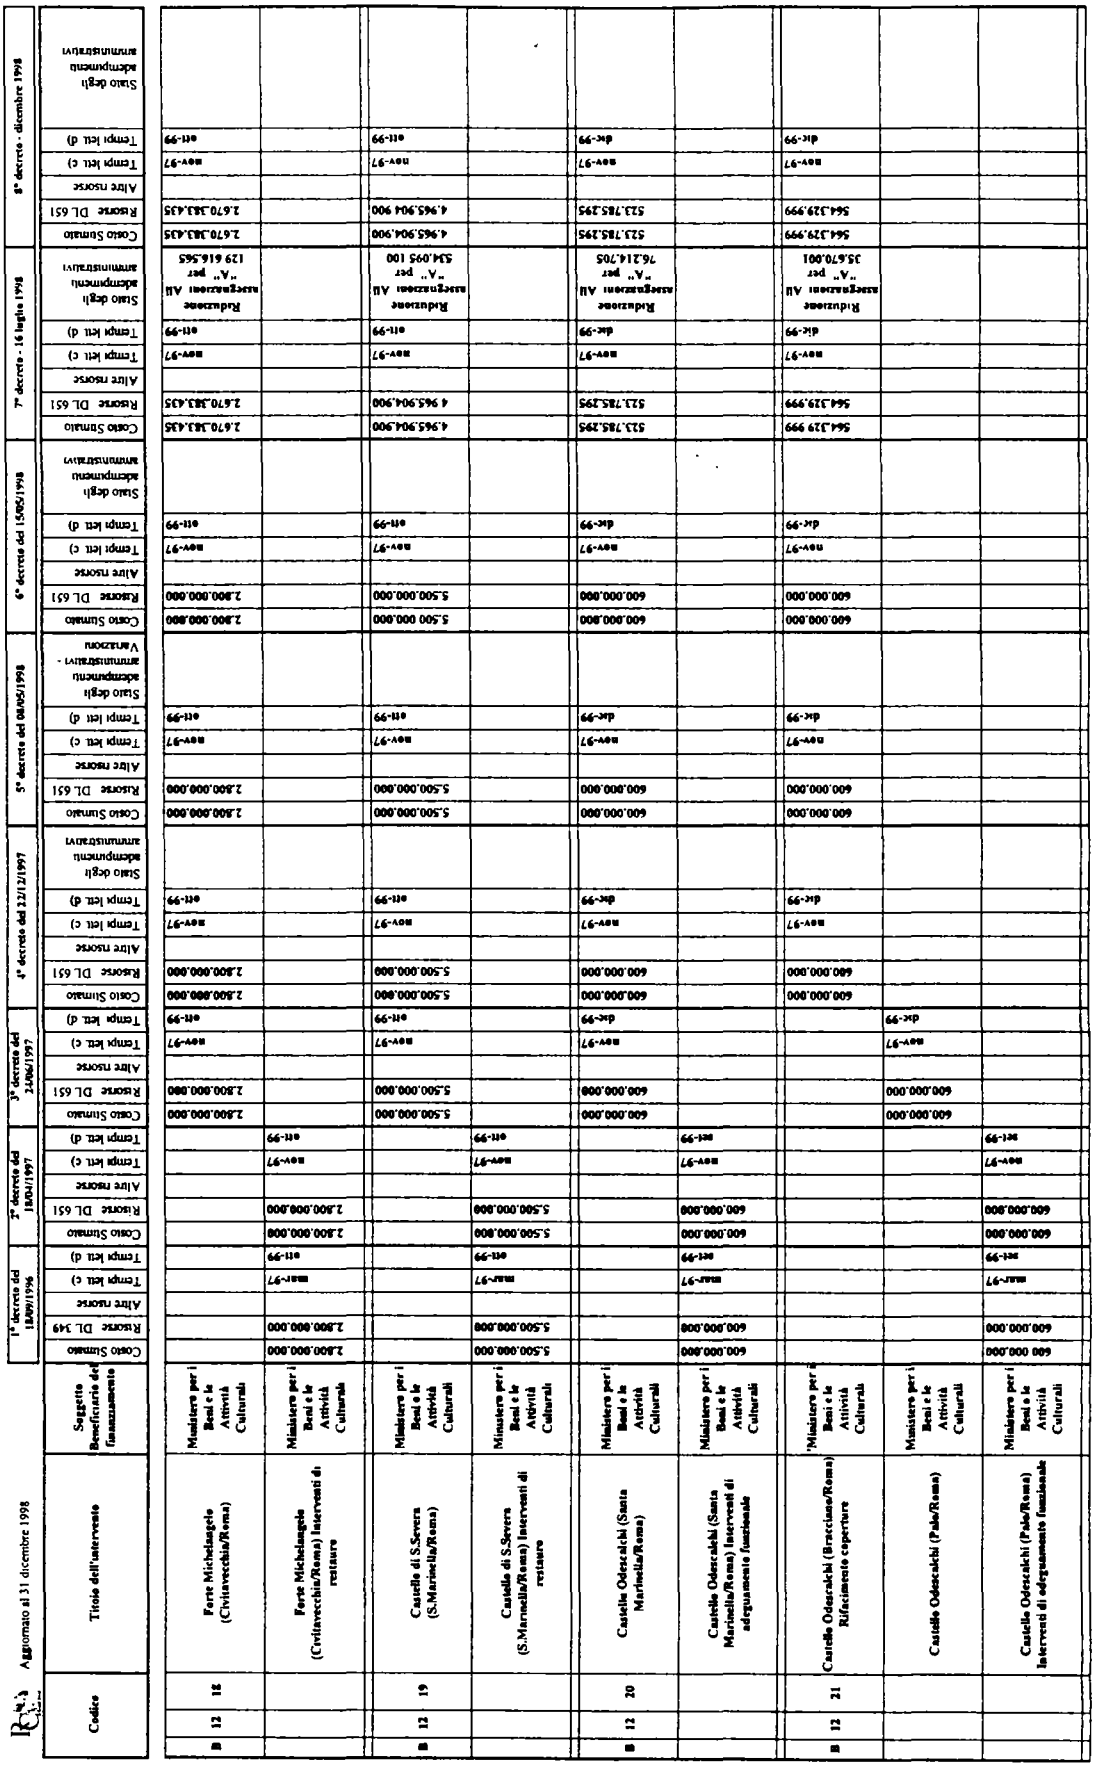

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/08/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
B 12 22	Castello di Mesterone (Ladispoli/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano: 3.000.000.000 Risorse DL 349: 3.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): mar-97 Tempi ist. d): ott-99	Costo Sumano: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): ott-99	Costo Sumano: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): ott-99	Costo Sumano: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi: Preventivazione definitiva conclusa	Costo Sumano: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni: Preventivazione definitiva conclusa	Costo Sumano: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi:	Costo Sumano: 2.820.072.000 Risorse DL 651: 2.820.072.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione risorse proprie Ad "A" per 179.928.000	
B 12 23	Completamento dei lavori di restauro e ripulitura dei prospetti, revisione dei tetti e lavori interni	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Costo Sumano: 1.500.000.000 Risorse DL 651: 1.500.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): giu-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 1.500.000.000 Risorse DL 651: 1.500.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): giu-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 1.500.000.000 Risorse DL 651: 1.500.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): giu-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 1.500.000.000 Risorse DL 651: 1.500.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): giu-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 1.500.000.000 Risorse DL 651: 1.500.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): giu-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 1.500.000.000 Risorse DL 651: 1.500.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): giu-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 1.500.000.000 Risorse DL 651: 1.500.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): giu-98 Tempi ist. d): nov-99	
B 12 24	Ripulitura delle facciate interne ed esterne, revisione e verniciatura dei relativi infissi e sistemazioni varie a Palazzo Chigi	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Costo Sumano: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): set-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): set-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): set-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): set-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): set-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): set-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 3.000.000.000 Risorse DL 651: 3.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): set-98 Tempi ist. d): nov-99	AD.B: Ulteriore finanziamento di 672.000.000
B 12 25	Restauro della casa di S. Brigida in P.zza Farnese	Ordine del SS Salvatore da Santa Brigida	Costo Sumano: 600.000.000 Risorse DL 651: 600.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): dic-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 600.000.000 Risorse DL 651: 600.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): dic-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 600.000.000 Risorse DL 651: 600.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): dic-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 600.000.000 Risorse DL 651: 600.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): dic-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 600.000.000 Risorse DL 651: 600.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): dic-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 600.000.000 Risorse DL 651: 600.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): dic-98 Tempi ist. d): nov-99	Costo Sumano: 600.000.000 Risorse DL 651: 600.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): dic-98 Tempi ist. d): nov-99	
B 12 26	Palazzo di Borgo - Restauro conservativo tratto Piazza Pia - Via del Campanile	Ministero Beni Culturali	Costo Sumano: 1.000.000.000 Risorse DL 651: 1.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): apr-98 Tempi ist. d): nd	Costo Sumano: 1.000.000.000 Risorse DL 651: 1.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): apr-98 Tempi ist. d): nd	Costo Sumano: 1.000.000.000 Risorse DL 651: 1.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): apr-98 Tempi ist. d): nd	Costo Sumano: 1.000.000.000 Risorse DL 651: 1.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): apr-98 Tempi ist. d): nd	Costo Sumano: 1.000.000.000 Risorse DL 651: 1.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): apr-98 Tempi ist. d): nd	Costo Sumano: 1.000.000.000 Risorse DL 651: 1.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): apr-98 Tempi ist. d): nd	Costo Sumano: 1.000.000.000 Risorse DL 651: 1.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): apr-98 Tempi ist. d): nd	
B 12 27	Ex Scuderie Papali al Quirinale - Restauro e risanamento conservativo	Ministero Beni Culturali	Costo Sumano: 8.897.000.000 Risorse DL 651: 8.897.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): ott-98 Tempi ist. d): giu-00	Costo Sumano: 8.897.000.000 Risorse DL 651: 8.897.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): ott-98 Tempi ist. d): giu-00	Costo Sumano: 8.897.000.000 Risorse DL 651: 8.897.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): ott-98 Tempi ist. d): giu-00	Costo Sumano: 8.897.000.000 Risorse DL 651: 8.897.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): ott-98 Tempi ist. d): giu-00	Costo Sumano: 8.897.000.000 Risorse DL 651: 8.897.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): ott-98 Tempi ist. d): giu-00	Costo Sumano: 8.897.000.000 Risorse DL 651: 8.897.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): ott-98 Tempi ist. d): giu-00	Costo Sumano: 8.897.000.000 Risorse DL 651: 8.897.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): ott-98 Tempi ist. d): giu-00	
B 13 01	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano: 5.000.000.000 Risorse DL 349: 5.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): mar-97 Tempi ist. d): ott-99	Costo Sumano: 5.000.000.000 Risorse DL 651: 5.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): ott-99	Costo Sumano: 5.000.000.000 Risorse DL 651: 5.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): ott-99	Costo Sumano: 5.000.000.000 Risorse DL 651: 5.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): ott-99	Costo Sumano: 5.000.000.000 Risorse DL 651: 5.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): ott-99	Costo Sumano: 5.000.000.000 Risorse DL 651: 5.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): ott-99	Costo Sumano: 5.000.000.000 Risorse DL 651: 5.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): ott-99	
B 13 01/1	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano: 4.000.000.000 Risorse DL 651: 4.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): dic-99	Costo Sumano: 4.000.000.000 Risorse DL 651: 4.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): dic-99	Costo Sumano: 4.000.000.000 Risorse DL 651: 4.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): dic-99	Costo Sumano: 4.000.000.000 Risorse DL 651: 4.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): dic-99 Stato degli adempimenti amministrativi: Preventivazione definitiva conclusa	Costo Sumano: 4.000.000.000 Risorse DL 651: 4.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): dic-99 Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni: Preventivazione definitiva conclusa	Costo Sumano: 4.000.000.000 Risorse DL 651: 4.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): dic-99 Stato degli adempimenti amministrativi:	Costo Sumano: 4.000.000.000 Risorse DL 651: 4.000.000.000 Altre risorse: Tempi ist. c): nov-97 Tempi ist. d): dic-99 Stato degli adempimenti amministrativi: Riduzione risorse proprie Ad "A" per 179.928.000	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/05/1994					2° decreto del 18/04/1997					3° decreto del 24/06/1997					4° decreto del 22/12/1997					5° decreto del 08/05/1998					6° decreto del 15/05/1998					7° decreto - 16 luglio 1998					8° decreto - dicembre 1998				
					Costo Sumano	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	01/2	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						1.000.000.000	1.000.000.000		nov-97	dic-99	1.000.000.000	1.000.000.000		nov-97	dic-99	1.000.000.000	1.000.000.000		nov-97	dic-99	Proget.razione definitiva concluse	1.000.000.000	1.000.000.000		mag-98	dic-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mag-98	dic-99	Proget.razione definitiva concluse						
B	13	02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Lavorazione e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante	Ministero per i Beni e le Attività Culturali				mar-97	set-99	400.000.000	400.000.000		dic-97	set-99	400.000.000	400.000.000		nov-97	set-98	400.000.000	400.000.000		nov-97	set-98	Gara in corso	400.000.000	400.000.000		gen-98	set-98	400.000.000	400.000.000		gen-98	set-98	Riduzione assegnazioni All "A" per 15.743.999	384.256.001	384.256.001				
B	13	03	Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata	Ministero per i Beni e le Attività Culturali				mar-97	gen-99	500.000.000	500.000.000		mar-97	gen-99	500.000.000	500.000.000		mar-97	dic-99	500.000.000	500.000.000		mar-97	dic-99	Lavori in corso	500.000.000	500.000.000		mar-98	dic-99	500.000.000	500.000.000		mar-98	dic-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 15.743.999	500.000.000	500.000.000				
B	13		Basilica di S. Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro copertura, prospetto e cassettonato (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali				nov-97	giu-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	giu-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	giu-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	giu-99	Proget.razione definitiva concluse	500.000.000	500.000.000		nov-97	giu-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	giu-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 10.352.799	500.000.000	500.000.000				
B	13	04	Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	Ministero per i Beni e le Attività Culturali				nov-97	giu-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	giu-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	giu-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	giu-99	Proget.razione esecutiva concluse	500.000.000	500.000.000		feb-98	dic-98	500.000.000	500.000.000		feb-98	dic-98	Riduzione assegnazioni All "A" per 10.352.799	489.647.201	489.647.201				
B	13	05	Chiesa SS. Quattro coronati	Ministero per i Beni e le Attività Culturali				mar-97	set-99	500.000.000	500.000.000		set-97	ago-98	500.000.000	500.000.000		set-97	ago-98	500.000.000	500.000.000		set-97	ago-98	Gara in corso	500.000.000	500.000.000		feb-98	dic-98	500.000.000	500.000.000		feb-98	dic-98	Riduzione assegnazioni All "A" per 10.352.799	489.647.201	489.647.201				
B	13		Chiesa SS. Quattro coronati (Roma) Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali				mar-97	set-99	500.000.000	500.000.000		apr-98	set-99	500.000.000	500.000.000																											
B	13	06	S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	Ministero per i Beni e le Attività Culturali				nov-97	ott-99	1.500.000.000	1.500.000.000		nov-97	ott-99	1.500.000.000	1.500.000.000																											
B	13		Basilica di S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																							

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998			
					Costo Stimato	Risorse DL 349	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Altre risorse
B	13	07	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000														
					1.000.000.000				1.000.000.000				1.000.000.000				1.000.000.000				1.000.000.000														
					mar-97				mar-97				mar-97				mar-97				mar-97														
			Tempi tecn. d)		dic-99				giu-99				dic-99				dic-99				dic-99														
			Tempi tecn. e)		mar-97				giu-97				nov-97				nov-97				nov-97														
B	13	08	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000														
					700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000												
					mar-97				mar-97				nov-97				nov-97				dic-97														
			Tempi tecn. d)		dic-99				giu-99				dic-99				dic-99				dic-99														
			Tempi tecn. e)		mar-97				giu-97				nov-97				nov-97				mar-98														
B	13	09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000														
					1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000														
					mar-97				mar-97				apr-97				nov-97				mar-98														
			Tempi tecn. d)		dic-99				giu-99				dic-99				dic-99				dic-99														
			Tempi tecn. e)		mar-97				giu-97				nov-97				nov-97				nov-97														
B	13	10	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000														
					1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000														
					mar-97				mar-97				nov-97				nov-97				nov-97														
			Tempi tecn. d)		dic-99				giu-99				dic-99				dic-99				dic-99														
			Tempi tecn. e)		mar-97				giu-97				nov-97				nov-97				nov-97														
B	13	11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000														
					1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000														
					mar-97				mar-97				nov-97				nov-97				nov-97														
			Tempi tecn. d)		dic-99				giu-99				dic-99				dic-99				dic-99														
			Tempi tecn. e)		mar-97				giu-97				nov-97				nov-97				nov-97														
B	13	12	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000														
					800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000														
					giu-99				giu-99				giu-99				giu-99				giu-99														
			Tempi tecn. d)		dic-99				giu-99				dic-99				dic-99				dic-99														
			Tempi tecn. e)		nov-97				nov-97				nov-97				nov-97				nov-97														
B	13	13	Restauro ed intervento conservativo del presbiterio della chiesa di S. Gregorio al Celio	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000														
					1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000														
					mar-97				mar-97				apr-97				nov-97				mar-98														
			Tempi tecn. d)		dic-99				giu-99				dic-99				dic-99				dic-99														
			Tempi tecn. e)		mar-97				giu-97				nov-97				nov-97				nov-97														
B	13		Chiesa S. Gregorio Magno al Celio (Roma) Restauro della facciata e riqualificazione dell'area annessa	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000														
					1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000		1.000.000.000		200.000.000														
					mar-97				mar-97				apr-97				nov-97				mar-98														
			Tempi tecn. d)		dic-99				giu-99				dic-99				dic-99				dic-99														
			Tempi tecn. e)		mar-97				giu-97				nov-97				nov-97				nov-97														

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/06/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
B	13	14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumaio Risorse DL 349 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d) Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d) Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d) Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d) Stato degli adempimenti amministrativi
					700.000.000 700.000.000 mar-97 set-99	700.000.000 700.000.000 mag-97 set-99	700.000.000 700.000.000 mag-97 dic-99	700.000.000 700.000.000 nov-97 dic-99	700.000.000 700.000.000 mar-98 dic-99 Gara in corso	700.000.000 700.000.000 mar-98 dic-99 Gara in corso	700.000.000 700.000.000 mar-98 dic-99 Riduzione aggiornamenti Atti "A" per 27.463.818	672.536.182 672.536.182 mar-98 dic-99
B	13	15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000 1.000.000.000 mar-97 mar-99	1.000.000.000 1.000.000.000 mag-97 mar-99	1.000.000.000 1.000.000.000 nov-97 giu-99	1.000.000.000 1.000.000.000 nov-97 giu-99	Lavori in corso	1.000.000.000 1.000.000.000 feb-98 dic-98 Gara in corso	1.000.000.000 1.000.000.000 mar-98 dic-98 Gara in corso	1.000.000.000 1.000.000.000 feb-98 dic-98 Gara in corso	1.000.000.000 1.000.000.000 feb-99 dic-99 Gara in corso
B	13	16	Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000 800.000.000 mar-97 giu-99	800.000.000 800.000.000 mag-97 giu-99	800.000.000 800.000.000 nov-97 giu-99	800.000.000 800.000.000 nov-97 giu-99	800.000.000 800.000.000 mar-98 dic-98 Gara in corso	800.000.000 800.000.000 mar-98 dic-98 Gara in corso	800.000.000 800.000.000 mar-98 dic-98 Riduzione aggiornamenti Atti "A" per 1.384.727.272	800.000.000 800.000.000 mar-98 dic-98
B	13	17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.500.000.000 1.500.000.000 mar-97 set-99	1.500.000.000 1.500.000.000 mag-97 set-99	1.500.000.000 1.500.000.000 nov-97 set-99	1.500.000.000 1.500.000.000 nov-97 set-99	1.500.000.000 1.500.000.000 mar-98 set-99 Gara in corso	1.500.000.000 1.500.000.000 mar-98 set-99 Gara in corso	1.500.000.000 1.500.000.000 mar-98 set-99 Riduzione aggiornamenti Atti "A" per 1.384.727.272	1.500.000.000 1.500.000.000 mar-98 set-99
B	13	18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina- protezione del consolidamento e restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	400.000.000 400.000.000 mar-97 set-99	400.000.000 400.000.000 mag-97 set-99	400.000.000 400.000.000 nov-97 set-99	400.000.000 400.000.000 nov-97 set-99	400.000.000 400.000.000 feb-98 set-99 Gara in corso	400.000.000 400.000.000 feb-98 set-99 Gara in corso	394.948.790 394.948.790 feb-98 ago-99 Riduzione aggiornamenti Atti "A" per 5.051.210	394.948.790 394.948.790 feb-98 ago-99
B	13		Chiesa S. Lorenzo in Lucina (Roma) Restauro prospetti esterni	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	400.000.000 400.000.000 mar-97 giu-99	400.000.000 400.000.000 mag-97 giu-99	400.000.000 400.000.000 nov-97 giu-99	400.000.000 400.000.000 nov-97 giu-99	400.000.000 400.000.000 mar-98 giu-99 Gara in corso	400.000.000 400.000.000 mar-98 giu-99 Gara in corso	394.948.790 394.948.790 feb-98 ago-99	394.948.790 394.948.790 feb-98 ago-99
B	13	19	Chiesa S. Agnese in Agone	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.200.000.000 1.200.000.000 mar-97 set-99	1.200.000.000 1.200.000.000 mag-97 set-99	1.200.000.000 1.200.000.000 nov-97 set-99	1.200.000.000 1.200.000.000 nov-97 set-99	1.200.000.000 1.200.000.000 mar-98 set-99 Progettazione definitiva conclusa	1.200.000.000 1.200.000.000 mar-98 set-99 Progettazione definitiva conclusa	1.072.494.418 127.505.582 mar-98 ago-99 Riduzione aggiornamenti Atti "A" per 127.505.582	1.072.494.418 1.072.494.418 mar-98 ago-99
B	13		Chiesa S. Agnese in Agone (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.200.000.000 1.200.000.000 mar-97 set-99	1.200.000.000 1.200.000.000 mag-97 set-99	1.200.000.000 1.200.000.000 nov-97 set-99	1.200.000.000 1.200.000.000 nov-97 set-99	1.200.000.000 1.200.000.000 mar-98 set-99 Progettazione definitiva conclusa	1.200.000.000 1.200.000.000 mar-98 set-99 Progettazione definitiva conclusa	1.072.494.418 1.072.494.418 mar-98 ago-99	1.072.494.418 2.500.000.000 mar-98 ago-99
B	13	20	Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.500.000.000 2.500.000.000 mar-97 set-99	2.500.000.000 2.500.000.000 mag-97 set-99	2.500.000.000 2.500.000.000 nov-97 set-99	2.500.000.000 2.500.000.000 nov-97 set-99	2.500.000.000 2.500.000.000 mar-98 set-99 Gara in corso	2.500.000.000 2.500.000.000 mar-98 set-99 Gara in corso	2.500.000.000 2.500.000.000 mar-98 ago-99 Riduzione aggiornamenti Atti "A" per 1.384.727.272	2.500.000.000 2.500.000.000 mar-98 ago-99

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996					2° decreto del 18/04/1997					3° decreto del 24/06/1997					4° decreto del 22/12/1997					5° decreto del 08/05/1998					6° decreto del 15/05/1998					7° decreto - 16 luglio 1998					8° decreto - dicembre 1998				
					Costo Stanziato	Residuo DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stanziato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stanziato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stanziato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stanziato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stanziato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stanziato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-97	giu-99	1.000.000.000	1.000.000.000		nov-97	feb-99	1.000.000.000	1.000.000.000		nov-97	feb-99	1.000.000.000	1.000.000.000		nov-97	feb-99	Gara in corso	1.000.000.000	1.000.000.000		Gara in corso	feb-99		500.000.000	500.000.000		nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa	500.000.000	500.000.000		nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	22	Chiesa di S. Susanna restauro prospetti ist. rifacimento copertura	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						1.000.000.000	1.000.000.000		nov-97	feb-99	1.000.000.000	1.000.000.000		nov-97	feb-99	1.000.000.000	1.000.000.000		nov-97	feb-99	Progettazione definitiva conclusa	1.000.000.000	1.000.000.000		apr-98	feb-99	Progettazione definitiva conclusa	500.000.000	500.000.000		apr-98	dic-99	Rilevazione acquisizioni AB "A" per 62.522.727	961.300.000	737.477.273		apr-98	dic-99	Rilevazione acquisizioni AB "A" per 38.700.000
B	13		Chiesa S. Susanna (Roma) Interventi di consolidamento e restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						800.000.000	800.000.000																															
B	13	23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle semicalotte ed interventi sulla copertura	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000	500.000.000		mar-97	giu-99	1.300.000.000	500.000.000		ott-97	apr-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	mag-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	mag-99	Progettazione esecutiva conclusa	500.000.000	500.000.000		Lavori in corso	mag-99		500.000.000	500.000.000		nov-97	dic-99	Rilevazione acquisizioni AB "A" per 160.520.196	961.300.000	737.477.273		apr-98	dic-99	Rilevazione acquisizioni AB "A" per 38.700.000
B	13	24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000	500.000.000		mar-97	giu-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	mag-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	mag-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	mag-99	Gara in corso	500.000.000	500.000.000		Gara in corso	mag-99		500.000.000	500.000.000		nov-97	dic-99	Rilevazione acquisizioni AB "A" per 160.520.196	961.300.000	737.477.273		apr-98	dic-99	Rilevazione acquisizioni AB "A" per 38.700.000
B	13		Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma) Restauro dell'apparato decorativo interno, interventi di risanamento	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						500.000.000	500.000.000		nov-97	apr-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	apr-99																									
B	13	25	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altemps e della cappella Avila e indagini archeologiche	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000	500.000.000		mar-97	giu-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	giu-99																													
B	13	25/1	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro cappella Altemps e indagini archeologiche	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000	500.000.000		mar-97	dic-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	dic-99																													
B	13	25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altemps e della cappella Avila.Scavo archeologico e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	300.000.000	300.000.000		mar-98	dic-99	300.000.000	300.000.000		nov-97	dic-99																													

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998	
				Costo Sumano	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	26	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-97	set-99	800.000.000	800.000.000		mar-97	set-99	600.000.000	600.000.000		mar-97	set-99		200.000.000	200.000.000		apr-98	feb-99		800.000.000	800.000.000		gen-98	gen-99	Gara in corso	800.000.000	800.000.000		gen-98	gen-99	Gara in corso
B	13	27	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-97	set-99	800.000.000	800.000.000		mar-97	set-99	600.000.000	600.000.000		mar-97	set-99		200.000.000	200.000.000		apr-98	feb-99		800.000.000	800.000.000		gen-98	gen-99	Gara in corso	800.000.000	800.000.000		gen-98	gen-99	Gara in corso
B	13	28	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		nov-97	set-99	800.000.000	800.000.000		nov-97	set-99	600.000.000	600.000.000		ott-97	set-99		200.000.000	200.000.000		mar-98	feb-99		800.000.000	800.000.000		gen-98	gen-99	Lavori in corso	800.000.000	800.000.000		gen-98	gen-99	Gara in corso
B	13	29	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		nov-97	set-99	800.000.000	800.000.000		nov-97	set-99	600.000.000	600.000.000		ott-97	set-99		200.000.000	200.000.000		apr-98	feb-99		800.000.000	800.000.000		apr-98	feb-99	Gara in corso	800.000.000	800.000.000		apr-98	feb-99	Gara in corso
B	13	30	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						800.000.000	800.000.000		nov-97	set-99	600.000.000	600.000.000		ott-97	set-99		200.000.000	200.000.000		mar-99	mar-99		800.000.000	800.000.000		gen-98	mar-99	Gara in corso	800.000.000	800.000.000		gen-98	mar-99	Gara in corso
B	13	31	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-97	set-99	800.000.000	800.000.000		mar-97	set-99	600.000.000	600.000.000		mar-97	set-99		200.000.000	200.000.000		apr-98	feb-99		800.000.000	800.000.000		gen-98	feb-99	Gara in corso	800.000.000	800.000.000		gen-98	feb-99	Gara in corso
		Oratorio del Caravita (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	761.914.618	761.914.618		feb-98	dic-99	761.914.618	761.914.618		feb-98	dic-99	761.914.618	761.914.618		feb-98	dic-99	Riduzione stanziamenti All "A" per 38.085.382	761.914.618	761.914.618		feb-98	dic-99		761.914.618	761.914.618		feb-98	dic-99		761.914.618	761.914.618		feb-98	dic-99	
		Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000	800.000.000		mar-97	set-99	800.000.000	800.000.000		mar-97	set-99	600.000.000	600.000.000		mar-97	set-99		200.000.000	200.000.000		apr-98	feb-99		800.000.000	800.000.000		gen-98	feb-99		800.000.000	800.000.000		gen-98	feb-99	
		Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000	800.000.000		nov-97	set-99	800.000.000	800.000.000		nov-97	set-99	600.000.000	600.000.000		ott-97	set-99		200.000.000	200.000.000		apr-98	feb-99		800.000.000	800.000.000		apr-98	feb-99		800.000.000	800.000.000		apr-98	feb-99	
		Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000	800.000.000		nov-97	set-99						800.000.000	800.000.000		ott-97	set-99		200.000.000	200.000.000		mar-99	mar-99		800.000.000	800.000.000		gen-98	mar-99		800.000.000	800.000.000		gen-98	mar-99	
		Chiesa S. Maria in Campitelli (Roma) Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000	800.000.000		mar-97	set-99						800.000.000	800.000.000		ott-97	set-99		200.000.000	200.000.000		gen-98	mar-99		800.000.000	800.000.000		gen-98	mar-99		800.000.000	800.000.000		gen-98	mar-99	
		Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-97	set-99	1.000.000.000	1.000.000.000		nov-97	set-99	1.000.000.000	1.000.000.000		nov-97	set-99		800.000.000	800.000.000		mar-98	feb-99		1.000.000.000	1.000.000.000		mar-98	feb-99		1.000.000.000	1.000.000.000		mar-98	feb-99	
		Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma) Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						1.000.000.000	1.000.000.000		nov-97	set-99	1.000.000.000	1.000.000.000		nov-97	set-99		800.000.000	800.000.000		mar-98	feb-99		1.000.000.000	1.000.000.000		mar-98	feb-99		1.000.000.000	1.000.000.000		mar-98	feb-99	
		Restauro, bonifica e rifacimento tetti Chiesa S. Eustachio (Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						800.000.000	800.000.000		nov-97	set-99	800.000.000	800.000.000		nov-97	set-99		800.000.000	800.000.000		mar-98	feb-99		800.000.000	800.000.000		mar-98	feb-99		800.000.000	800.000.000		mar-98	feb-99	
		Chiesa S. Eustachio (Roma) Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						800.000.000	800.000.000		mar-97	set-99	600.000.000	600.000.000		mar-97	set-99		200.000.000	200.000.000		apr-98	feb-99		800.000.000	800.000.000		gen-98	feb-99		800.000.000	800.000.000		gen-98	feb-99	
		Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																	
		Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																	
		Chiesa S. Maria in Campitelli (Roma) Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																	
		Oratorio del Caravita (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/08/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
			Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Stato degli adempimenti amministrativi
			Risorse DL 349	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	
			Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	
			Temp. ist. c)	Temp. ist. c)	Temp. ist. c)	Temp. ist. c)	Temp. ist. c)	Temp. ist. c)	Temp. ist. c)	Temp. ist. c)
			Temp. ist. d)	Temp. ist. d)	Temp. ist. d)	Temp. ist. d)	Temp. ist. d)	Temp. ist. d)	Temp. ist. d)	Temp. ist. d)
B 13	32	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000	800.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	416.992.500	416.992.500	416.992.500
					450.000.000	450.000.000	450.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998	
					Costo Sumaio	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	37	Chiesa della SS. Annunziata (Roma) Restauro della facciata	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000	500.000.000		mar-97	giu-99	500.000.000	Definanziato		may-97	giu-99	500.000.000	500.000.000		may-97	may-99	500.000.000	500.000.000		may-97	may-99	Gara in corso	500.000.000	500.000.000		feb-98	may-99		449.172.727	449.172.727		feb-98	may-99	
B	13	38	Chiesa di S. Bartolomeo de Insula (Roma) Restauro del prospetti	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						500.000.000	500.000.000		may-97	giu-99	500.000.000	500.000.000		may-97	may-99	500.000.000	500.000.000		may-97	may-99	Gara in corso	500.000.000	500.000.000		feb-98	may-99	Riduzione assegnazioni Al1 "A" per 50.727.273	449.172.727	449.172.727		feb-98	may-99	
B	13	39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetto e bassifica fondale.	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						550.000.000	550.000.000		may-97	apr-99	550.000.000	550.000.000		may-97	apr-99	550.000.000	550.000.000		mar-98	apr-99	Gara in corso	550.000.000	550.000.000		mar-98	apr-99	Riduzione assegnazioni Al1 "A" per 31.543.100	518.456.900	518.456.900		mar-98	apr-99	
			Chiesa di S. Biagio e Maria del Divino Amore (Roma) Restauro architettonico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali				may-97	giu-99	550.000.000	550.000.000		may-97	feb-99	800.000.000	800.000.000		may-97	giu-99	800.000.000	800.000.000		may-97	giu-99	Progettazione esecutiva conclusa	800.000.000	800.000.000		mar-98	giu-99		713.805.802	713.805.802		mar-98	giu-99	
B	13	40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro fontane (Roma) Restauro degli internni e delle finiture	Ministero per i Beni e le Attività Culturali				may-97	jul-99	800.000.000	800.000.000		may-97	feb-99	800.000.000	800.000.000		may-97	jul-99	800.000.000	800.000.000		may-97	jul-99	Progettazione esecutiva conclusa	800.000.000	800.000.000		mar-98	jul-99	Riduzione assegnazioni Al1 "A" per 86.194 198	713.805.802	713.805.802		mar-98	jul-99	
B	13	41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						560.000.000	560.000.000		may-97	gen-99	560.000.000	560.000.000		may-97	gen-99	560.000.000	560.000.000		feb-98	gen-99	Progettazione definitiva conclusa	560.000.000	560.000.000		feb-98	gen-99	Riduzione assegnazioni Al1 "A" per 65.667.746	494.332.254	494.332.254		feb-98	gen-99	
			Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma) Restauro del prospetti, del Battistero paleocristiano e sistemazione museale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						560.000.000	560.000.000		mar-97	apr-99	560.000.000	560.000.000																					
B	13	42	Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	100.000.000	100.000.000		may-97	may-99	100.000.000	100.000.000		may-97	may-99	100.000.000	100.000.000		may-97	may-99	100.000.000	100.000.000		may-97	may-99	Gara in corso	100.000.000	100.000.000		may-97	may-99	Riduzione assegnazioni Al1 "A" per 5.126.050	94.873.950	94.873.950		dic-97	mar-99	apr-98
B	13	43	Chiesa dei SS. Domenico e Sisto	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																					Progettazione definitiva conclusa							700.000.000	94.873.950		dic-97	mar-99	apr-98

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998		
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B 13 44	Chiesa del SS. Domenico e Sisto (Roma) Restauro del prospetto	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	700.000.000	700.800.000		mar-97	gio-99	700.800.000		mag-97	gio-99	700.000.000																
B 13 44	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.800.800.000		mar-97	gio-99	1.000.000.000		nov-97	gio-99	640.000.000	640.000.000		nov-97	dic-99	Lavori in corso	640.000.000	640.000.000		nov-97	dic-99		640.000.000	640.000.000		nov-97	dic-99	
B 13 44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni e le Attività Culturali										640.000.000	640.000.000		nov-97	dic-99	Lavori in corso	640.000.000	640.000.000		nov-97	dic-99		640.000.000	640.000.000		nov-97	dic-99	
B 13 44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni e le Attività Culturali										360.000.000	360.000.000		mar-98	dic-99	Gara in corso	360.000.000	360.000.000		mar-98	dic-99	Riduzione esecutiva "A" per 49.503.400	310.496.600	310.496.600		mar-98	dic-99	
B 13 45	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami, S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	700.000.000	700.000.000		mar-97	set-99	700.000.000		nov-97	set-99	700.000.000	700.000.000		nov-97	set-99		700.000.000	700.000.000		nov-97	set-99		700.000.000	700.000.000		nov-97	set-99	
B 13 45/1	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni e le Attività Culturali										700.000.000	300.000.000		nov-97	dic-99	Lavori in corso	300.000.000	300.000.000		nov-97	dic-99		300.000.000	300.000.000		nov-97	dic-99	
B 13 45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni e le Attività Culturali										400.000.000	400.000.000		nov-97	dic-99	Gara esplicitata	400.000.000	400.000.000		nov-97	dic-99		400.000.000	400.000.000		nov-97	dic-99	
B 13 46	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone, S. Maria alle Fornaci, S. Maria dei Miracoli e S. Maria di Monte Santo (Roma) Restauro portici e facciate	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.600.000.000	2.600.000.000		mar-98	ago-99	2.600.000.000		mar-98	ago-99																	
B 13 46/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	Ministero per i Beni e le Attività Culturali															Gara in corso	500.000.000	500.000.000		mar-98	nov-99	Riduzione esecutiva "A" per 29.350.000	470.650.000	470.650.000		mar-98	nov-99	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
B 13 462	Chiesa di S. Maria alle Fornaci: Restauro parziali e facciate	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano Risorse DL 349 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	750.000.000 750.000.000 mag-97 dic-98	750.000.000 750.000.000 mag-97 dic-98	Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d) Stato degli adempimenti amministrativi Cura in corso	750.000.000 750.000.000 feb-98 dic-98	Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d) Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione aspettative AB "A" per 38.664.381	Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d) Stato degli adempimenti amministrativi
B 13 463	Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali			700.000.000 700.000.000 mag-97 dic-98	700.000.000 700.000.000 mag-97 dic-98	700.000.000 700.000.000 mag-98 dic-98 Progettazione conclusa	700.000.000 700.000.000 mag-98 dic-98		
B 13 464	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	Ministero per i Beni e le Attività Culturali			800.000.000 800.000.000 gen-97 feb-99 Progettazione definitiva conclusa	800.000.000 800.000.000 gen-97 feb-99 Progettazione definitiva conclusa	800.000.000 800.000.000 mar-98 feb-99 Progettazione definitiva conclusa	800.000.000 800.000.000 mar-98 feb-99	724.740.182 724.740.182 Riduzione aspettazioni AB "A" per 75.259.818	
B 13 47	Chiese di S. Maria sopra Minerva, S. Maria dei Monti, S. Maria in Trivio, S. Silvestro al Quirinale e S. Vitale (Roma) Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.555.000.000 2.555.000.000 2.555.000.000 mar-97 apr-99							
B 13 47/1	Chiese di S. Maria sopra Minerva. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali			550.000.000 550.000.000 nov-97 dic-99	550.000.000 550.000.000 nov-97 dic-99 Lavori in corso	550.000.000 550.000.000 nov-97 dic-99 Lavori in corso	550.000.000 550.000.000 nov-97 dic-99	724.740.182 724.740.182 Riduzione aspettazioni AB "A" per 75.259.818	
B 13 47/2	Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali			1.235.000.000 1.235.000.000 nov-97 apr-99 Progettazione definitiva conclusa	1.235.000.000 1.235.000.000 nov-97 apr-99 Progettazione definitiva conclusa	1.235.000.000 1.235.000.000 feb-98 apr-99 Progettazione definitiva conclusa	1.235.000.000 1.235.000.000 feb-98 apr-99	1.235.008.000 1.235.008.000 feb-98 apr-99	
B 13 47/3	Chiese di S. Maria in Trivio. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali			350.000.000 350.000.000 nov-97 dic-99 Progettazione definitiva conclusa	350.000.000 350.000.000 nov-97 dic-99 Progettazione definitiva conclusa	350.000.000 350.000.000 feb-98 dic-99 Cura in corso	350.000.000 350.000.000 feb-98 dic-99	350.000.000 350.000.000 feb-98 dic-99	
B 13 47/4	Chiese di S. Silvestro al Quirinale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali			220.000.000 220.000.000 nov-97 dic-99 Progettazione definitiva conclusa	220.000.000 220.000.000 nov-97 dic-99 Progettazione definitiva conclusa	220.000.000 220.000.000 nov-97 dic-99 Lavori in corso	220.000.000 220.000.000 nov-97 dic-99	220.000.000 220.000.000 nov-97 dic-99	
B 13 47/5	Chiese di S.Vitale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali			200.000.000 200.000.000 nov-97 dic-99 Progettazione definitiva conclusa	200.000.000 200.000.000 nov-97 dic-99 Progettazione definitiva conclusa	200.000.000 200.000.000 nov-97 dic-99 Lavori in corso	200.000.000 200.000.000 nov-97 dic-99	200.000.000 200.000.000 nov-97 dic-99	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 16/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	
B 13	48	Chiese di S. Maria dell'orto, S. Maria in porta Paradisi, S. Maria in Publicolis, S. Maria della Scala, S. Maria dei Sette Dolori e S. Maria in Trapontina (Roma) Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	3.000.000.000	3.000.000.000		mar-97	ago-99	3.000.000.000	3.000.000.000		feb-98	ago-99	250.000.000	250.000.000		nov-97	dic-99		550.000.000	550.000.000		feb-98	dic-99		550.000.000	550.000.000		feb-98	dic-99		550.000.000	550.000.000		feb-98	dic-99	
B 13	48/1	Chiese di S. Maria dell'Orto. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali					400.000.000	400.000.000			feb-99	400.000.000	400.000.000		nov-97	feb-99		400.000.000	400.000.000		mar-98	feb-99		400.000.000	400.000.000		mar-98	feb-99		400.000.000	400.000.000		mar-98	feb-99	
B 13	48/2	Chiese di S. Maria in Porta Paradisi. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali					500.000.000	500.000.000		nov-97	dic-99	500.000.000	500.000.000		nov-97	dic-99	Progettazione definitiva cantierata	500.000.000	500.000.000		mag-98	dic-99	Progettazione definitiva cantierata	500.000.000	500.000.000		mag-98	dic-99	Riduzione aspettative "A" per 25.084.000	374.916.000	374.916.000		mar-98	feb-99	
B 13	48/3	Chiese di S. Maria in Publicolis. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali					400.000.000	400.000.000		nov-97	dic-99	400.000.000	400.000.000		nov-97	dic-99	Gara in corso	400.000.000	400.000.000		feb-98	dic-99	Progettazione definitiva cantierata	400.000.000	400.000.000		feb-98	dic-99	Riduzione aspettative AB per 18.872.728	381.127.272	381.127.272		feb-98	dic-99	
B 13	48/4	Chiese di S. Maria dei Sette Dolori. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali					600.000.000	600.000.000		nov-97	dic-98	300.000.000	300.000.000		dic-97	dic-98	Gara in corso	600.000.000	600.000.000		dic-97	dic-98	Gara in corso	600.000.000	600.000.000		dic-97	dic-98	Gara in corso	600.000.000	600.000.000		mag-98	set-99	
B 13	48/5	Chiese di S. Maria dell'Orto.Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali					600.000.000	600.000.000		nov-97	set-98	600.000.000	600.000.000																						
B 13	48/6	Chiesa di S. Maria della Scala: restauro della facciata e del retro prospetto											250.000.000	250.000.000					550.000.000	550.000.000		dic-97	dic-98		300.000.000	300.000.000		dic-97	dic-98		300.000.000	300.000.000		dic-97	dic-98	
B 13	48/7	Chiesa di S. Maria in Trapontina. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali										250.000.000	250.000.000		nov-97	dic-99		550.000.000	550.000.000		feb-98	dic-99		550.000.000	550.000.000		feb-98	dic-99		550.000.000	550.000.000		feb-98	dic-99	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998	
			Costo Sumaio	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
	Chiesa di S. Maria in Trapentina. Restauro dell'apparato decorativo delle cappelle (prima fase)																															
B 13 49	Chiese di S. Michele, S. Nicola in carcere, S. Pantaleo, S. Pietro in Montorio, S. Prisca, S. Salvatore in Lauro e S. Spirito in Sassia (Roma) Restauro globale (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.000.000.000	3.000.000.000		mar-97	ott-99																										
B 13 49/1	Chiese di S. Michele, S. Pantaleo, S. Pietro in Montorio, S. Prisca, S. Salvatore in Lauro e S. Spirito in Sassia (Roma) Restauro globale (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		3.000.000.000			ott-99	3.000.000.000			dic-97	ott-99																					
B 13 49/2	Chiesa di S. Michele. Restauro della cripta	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						400.000.000	400.000.000		nov-97	ott-97	400.000.000	400.000.000		nov-97	ott-97		400.000.000	400.000.000				Lavori in corso	400.000.000	400.000.000				Progettazione definitiva conclusa	400.000.000	400.000.000			
B 13 49/3	Chiesa di S. Pietro in Montorio. Restauro Globale (1° fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						400.000.000	400.000.000		nov-97	dic-99	400.000.000	400.000.000		nov-97	dic-99	Gara in corso	400.000.000	400.000.000				Progettazione definitiva conclusa	400.000.000	400.000.000				Progettazione definitiva conclusa	400.000.000	400.000.000			
B 13 49/4	Chiesa di S. Prisca	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						300.000.000	300.000.000		nov-97	dic-99	300.000.000	300.000.000		nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa	300.000.000	300.000.000				Progettazione definitivo conclusa	300.000.000	300.000.000				Progettazione definitiva conclusa	300.000.000	300.000.000			
B 13 49/5	Chiesa di S. Salvatore in Lauro-Restauro Globale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						500.000.000	500.000.000		dic-97	feb-99	500.000.000	500.000.000		dic-97	feb-99	Gara in corso	500.000.000	500.000.000				Gara in corso	500.000.000	500.000.000				Progettazione definitiva conclusa	500.000.000	500.000.000			
B 13 49/6	Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento: Restauro Globale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						1.000.000.000	979.794.059		nov-97	dic-99	1.000.000.000	979.794.059		nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa	1.000.000.000	979.794.059				Progettazione definitiva conclusa	1.000.000.000	979.794.059				Riduzione assegnazioni All "A" per 20.205.941	1.000.000.000	979.794.059			
									230.610.433		apr-98	nov-99	230.610.433	230.610.433		apr-98	nov-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 19.389.567	230.610.433	230.610.433		apr-98	nov-99		250.000.000	250.000.000		apr-98	nov-99		250.000.000	250.000.000		apr-98	nov-99	
											mar-97	feb-99				mar-97	feb-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 19.763.181				mar-98	feb-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 19.763.181				mar-98	feb-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 19.763.181				mar-98	feb-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 19.763.181
											mag-98	dic-99				mag-98	dic-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 31.655.898				mag-98	dic-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 31.655.898				mag-98	dic-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 31.655.898				mag-98	dic-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 31.655.898
											mar-98	dic-99				mar-98	dic-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 40.717.463				mar-98	dic-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 40.717.463				mar-98	dic-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 40.717.463				mar-98	dic-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 40.717.463
											gen-98	set-99				gen-98	set-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 14.085.000				mar-98	set-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 14.085.000				mar-98	set-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 14.085.000				mar-98	set-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 14.085.000
									230.610.433		apr-98	nov-99	230.610.433	230.610.433		apr-98	nov-99		230.610.433	230.610.433		apr-98	nov-99		250.000.000	250.000.000		apr-98	nov-99		250.000.000	250.000.000		apr-98	nov-99	
									979.794.059		mar-98	feb-99	979.794.059	979.794.059		mar-98	feb-99		979.794.059	979.794.059		mar-98	feb-99		1.000.000.000	1.000.000.000		mar-98	feb-99		1.000.000.000	1.000.000.000		mar-98	feb-99	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 23/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
												Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	50	Chiesa di S. Tommaso in Parione (Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario		400.000.000	400.000.000	1.500.000.000	400.000.000	1.372.432.827	
					Risorse DL 349						1.372.432.827	
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)				mag-97		mag-98	
					Temp. ist. d)				ago-99		ago-99	
B	13		Chiesa di S. Tommaso in Parione (Roma) Restauro della facciata	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario		400.000.000	400.000.000	1.500.000.000	400.000.000	1.372.432.827	
					Risorse DL 651		400.000.000	400.000.000	1.500.000.000	400.000.000	1.372.432.827	
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)	dic-97	mag-97	mag-97	mag-97		mag-98	
					Temp. ist. d)				ago-99		ago-99	
B	13	51	Basilica cattedralizia di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario		400.000.000	400.000.000	1.500.000.000	400.000.000	1.372.432.827	
					Risorse DL 651		400.000.000	400.000.000	1.500.000.000	400.000.000	1.372.432.827	
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)		mag-97	mag-97	mag-97		apr-98	
					Temp. ist. d)				ago-99		ago-99	
B	13	52	Chiesa della Annunziatella Consolidamento e restauro del complesso	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario		400.000.000	400.000.000	800.000.000	800.000.000	687.983.480	
					Risorse DL 651		400.000.000	400.000.000	800.000.000	800.000.000	687.983.480	
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)		mag-97	mag-97	mag-97		apr-98	
					Temp. ist. d)				ago-99		ago-99	
					Costo Sommario				800.000.000	800.000.000	687.983.480	
					Risorse DL 651				800.000.000	800.000.000	687.983.480	
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)				mag-97		apr-98	
					Temp. ist. d)				ago-99		ago-99	
B	13	53	Chiesa S. Andrea in via Flaminia (Roma) Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario		400.000.000	400.000.000	800.000.000	400.000.000	1.372.432.827	
					Risorse DL 349		400.000.000	400.000.000	800.000.000	400.000.000	1.372.432.827	
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)		mag-97	mag-97	mag-97		apr-98	
					Temp. ist. d)				ago-99		ago-99	
B	13	54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cosiddetto ligneo seicentesco muraneiro e reti nella Chiesa di S. Pancrazio	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario		900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	828.881.683	
					Risorse DL 651		900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	828.881.683	
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)		mag-97	mag-97	feb-98		feb-98	
					Temp. ist. d)				feb-99		feb-99	
B	13		Chiesa di S. Pancrazio (Roma) Restauro conservativo, consolidamento strutturale, rifacimento tetti, ripresa intonaci.	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario		900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	828.881.683	
					Risorse DL 651		900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	828.881.683	
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)		mag-97	mag-97	feb-98		feb-98	
					Temp. ist. d)				feb-99		feb-99	
B	13	55	Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario		6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	5.572.952.500	
					Risorse DL 651		6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	5.572.952.500	
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)		mag-97	mag-97	feb-98		feb-98	
					Temp. ist. d)				feb-99		feb-99	
					Costo Sommario				6.000.000.000	6.000.000.000	5.572.952.500	
					Risorse DL 651		6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	5.572.952.500	
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)		mag-97	mag-97	Cassa in corso		Cassa in corso	
					Temp. ist. d)				feb-99		feb-99	

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 23/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
												Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	50	Chiesa di S. Tommaso in Parione (Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario		400.000.000	400.000.000	Proiettazione definitiva conclusa		Ridazione aseprazioni AB "A" per 45.900.000	
					Risorse DL 349							
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)				mag-98			
					Temp. ist. d)				ago-99			
B	13		Chiesa di S. Tommaso in Parione (Roma) Restauro della facciata	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario							
					Risorse DL 651							
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)							
					Temp. ist. d)							
B	13	51	Basilica cattedralizia di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario		400.000.000	400.000.000	Proiettazione definitiva conclusa		Ridazione aseprazioni AB "A" per 127.567.173	
					Risorse DL 651		400.000.000	400.000.000				
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)							
					Temp. ist. d)							
B	13	52	Chiesa della Annunziatella Consolidamento e restauro del complesso	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario		400.000.000	400.000.000	Proiettazione conclusa		Ridazione aseprazioni AB "A" per 112.016.520	
					Risorse DL 651		400.000.000	400.000.000				
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)							
					Temp. ist. d)							
					Costo Sommario							
					Risorse DL 651							
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)							
					Temp. ist. d)							
B	13	53	Chiesa S. Andrea in via Flaminia (Roma) Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario							
					Risorse DL 349							
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)							
					Temp. ist. d)							
B	13	54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cosiddetto ligneo seicentesco muraneiro e reti nella Chiesa di S. Pancrazio	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario				Cassa in corso			
					Risorse DL 651							
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)							
					Temp. ist. d)							
B	13		Chiesa di S. Pancrazio (Roma) Restauro conservativo, consolidamento strutturale, rifacimento tetti, ripresa intonaci.	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario							
					Risorse DL 651							
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)							
					Temp. ist. d)							
B	13	55	Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sommario							
					Risorse DL 651							
					Altre risorse							
					Temp. ist. c)							
					Temp. ist. d)							

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/04/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998		
				Costo Sumaio	Risorse DL 349	Altre risorse	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse
B 13	56	Complesso Abbaziale delle Tre Fontane (Roma) Restauro complessivo	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	6.000.000.000	6.000.000.000		6.000.000.000	6.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
				mar-97			mar-97																			
B 13	57	Chiesa di S. Zaccaria - Catacombe (Roma) Scavi, restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
				mar-98			mar-98																			
B 13| 57	Convento di San Francesco (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	898.720.655		1.000.000.000	898.720.655		1.000.000.000	898.720.655		1.000.000.000	898.720.655		1.000.000.000	898.720.655		1.000.000.000	898.720.655		1.000.000.000	898.720.655	
				nov-97			nov-97																			
B 13	58	Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.296.693.377		2.500.000.000	2.296.693.377	
				nov-97			nov-97																			
B 13	59	Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000	500.000.000		500.000.000	500.000.000		500.000.000	500.000.000		500.000.000	500.000.000		500.000.000	500.000.000		500.000.000	500.000.000		500.000.000	458.901.756		500.000.000	458.901.756	
				dic-99			dic-99																			
				nov-97			nov-97																			
B 13	59	Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma) Restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																					Riduzione stanziamenti All "A" per 41.098.244		458.901.756	877.562.470	
B 13	60	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																					Riduzione stanziamenti All "A" per 122.437.530		877.562.470	877.562.470	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996					2° decreto del 18/04/1997					3° decreto del 24/06/1997					4° decreto del 22/12/1997					5° decreto del 08/05/1998					6° decreto del 15/05/1998					7° decreto - 16 luglio 1998					8° decreto - dicembre 1998				
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B 13	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento di Palazzola (Rocca di Papa/Roma) Restauro globale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99																																	
B 13	Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						1.200.000.000	1.200.000.000		mag-97	gen-99	1.200.000.000	1.200.000.000		mag-97	gen-99	1.200.000.000	1.200.000.000		mag-97	gen-99	1.200.000.000	1.200.000.000		mag-97	gen-99	1.200.000.000	1.200.000.000		mag-97	gen-99	1.200.000.000	1.200.000.000		mag-97	gen-99	1.122.388.686	1.122.388.686		mag-97	gen-99	
B 13	Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma) Restauro, consolidamento e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						1.200.000.000	1.200.000.000		mag-97	gen-99																													
B 13	Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano Romano/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						3.000.000.000	3.000.000.000		mag-97	gen-99	3.000.000.000	3.000.000.000		mag-97	gen-99	3.000.000.000	3.000.000.000		mag-97	gen-99	3.000.000.000	3.000.000.000		mag-97	gen-99	3.000.000.000	3.000.000.000		mag-97	gen-99	2.859.922.890	2.859.922.890		mag-97	gen-99						Redazione esecutiva AB "A" per 140.077.910
B 13	Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano Romano/Roma) Restauro del complesso abbaziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						3.000.000.000	3.000.000.000		mag-97	gen-99																													
B 13	Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99	958.897.396	958.897.396		mag-97	gen-99						Redazione esecutiva AB "A" per 41.102.604
B 13	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99	890.516.477	890.516.477		mag-97	gen-99						Redazione esecutiva AB "A" per 109.483.523
B 13	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma) Restauro del monastero ed adeguamento funzionale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99																													
B 13	Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mag-97	gen-99	929.344.460	929.344.460		mag-97	gen-99						Redazione esecutiva AB "A" per 70.655.540

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996					2° decreto del 18/04/1997					3° decreto del 24/06/1997					4° decreto del 22/12/1997					5° decreto del 08/05/1998					6° decreto del 15/05/1998					7° decreto - 16 luglio 1998					8° decreto - dicembre 1998	
			Costo Sumaio	Risorse DL 549	Altre risorse	Temp Ieri c)	Temp Ieri d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp Ieri c)	Temp Ieri d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp Ieri c)	Temp Ieri d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp Ieri c)	Temp Ieri d)	Stato degli adempimenti amministrativi - Varianti	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp Ieri c)	Temp Ieri d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp Ieri c)	Temp Ieri d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp Ieri c)	Temp Ieri d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B 13	66 Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma) Restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-97	set-99	1 000 000 000	1.000.000.000		mar-97	set-99	2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	set-99	2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	set-99		2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	set-99		1.700.000.000	1.700.000.000		nov-97	set-99		1.700.000.000	1.700.000.000		nov-97	set-99	
B 13	67 Eremo della Trinità (Albumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000	2.000.000.000		mar-97	nov-97	2.000.000.000	2.000.000.000		mar-97	nov-97	2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	ott-99	2.000.000 000	2.000.000.000		nov-97	ott-99		2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	ott-99		2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	ott-99		1.890.886.900	1.890.886.900		nov-97	ott-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 109.113.100
B 13	67 Santuario della Madonna di Cibona (Albumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						2.000.000.000	2.000.000.000				2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	ott-99	2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	ott-99		2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	ott-99		2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	ott-99		1.791.998.016	1.791.998.016		nov-97	ott-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 208 001.984
	Santuario della Madonna di Cibona (Albumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento e delle aree pertinenti	Ministero per i Beni e le Attività Culturali							2.000.000.000																														
B 13	68 Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						1.000.000.000	1 000 000.000		nov-97	ago-99	1.000.000.000	1 000 000.000		nov-97	ago-99	1 000.000.000	1 000 000.000		nov-97	ago-99		1 000.000.000	1 000 000.000		nov-97	ago-99		936 685.000	936 685.000		nov-97	ago-99		936 685.000	936 685.000		nov-97	ago-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 63.315.000
	Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma) Restauro dei prospetti	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						1.000.000.000	1.000.000.000		mar-97	giu-99																												
B 13	69 Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		2.000.000.000		mar-97	set-99	2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	set-99	2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	set-99	2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	set-99		2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	set-99		1.888.045.480	1.888.045.480		nov-97	set-99		1.888.045.480	1.888.045.480		nov-97	set-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 111.954.520
	Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiumicino/Roma) Restauro globale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		2 000.000 000		nov-97	set-99																																
B 13	70 Restauro edicole sacre	Comune di Roma	2 000.000 000																																				

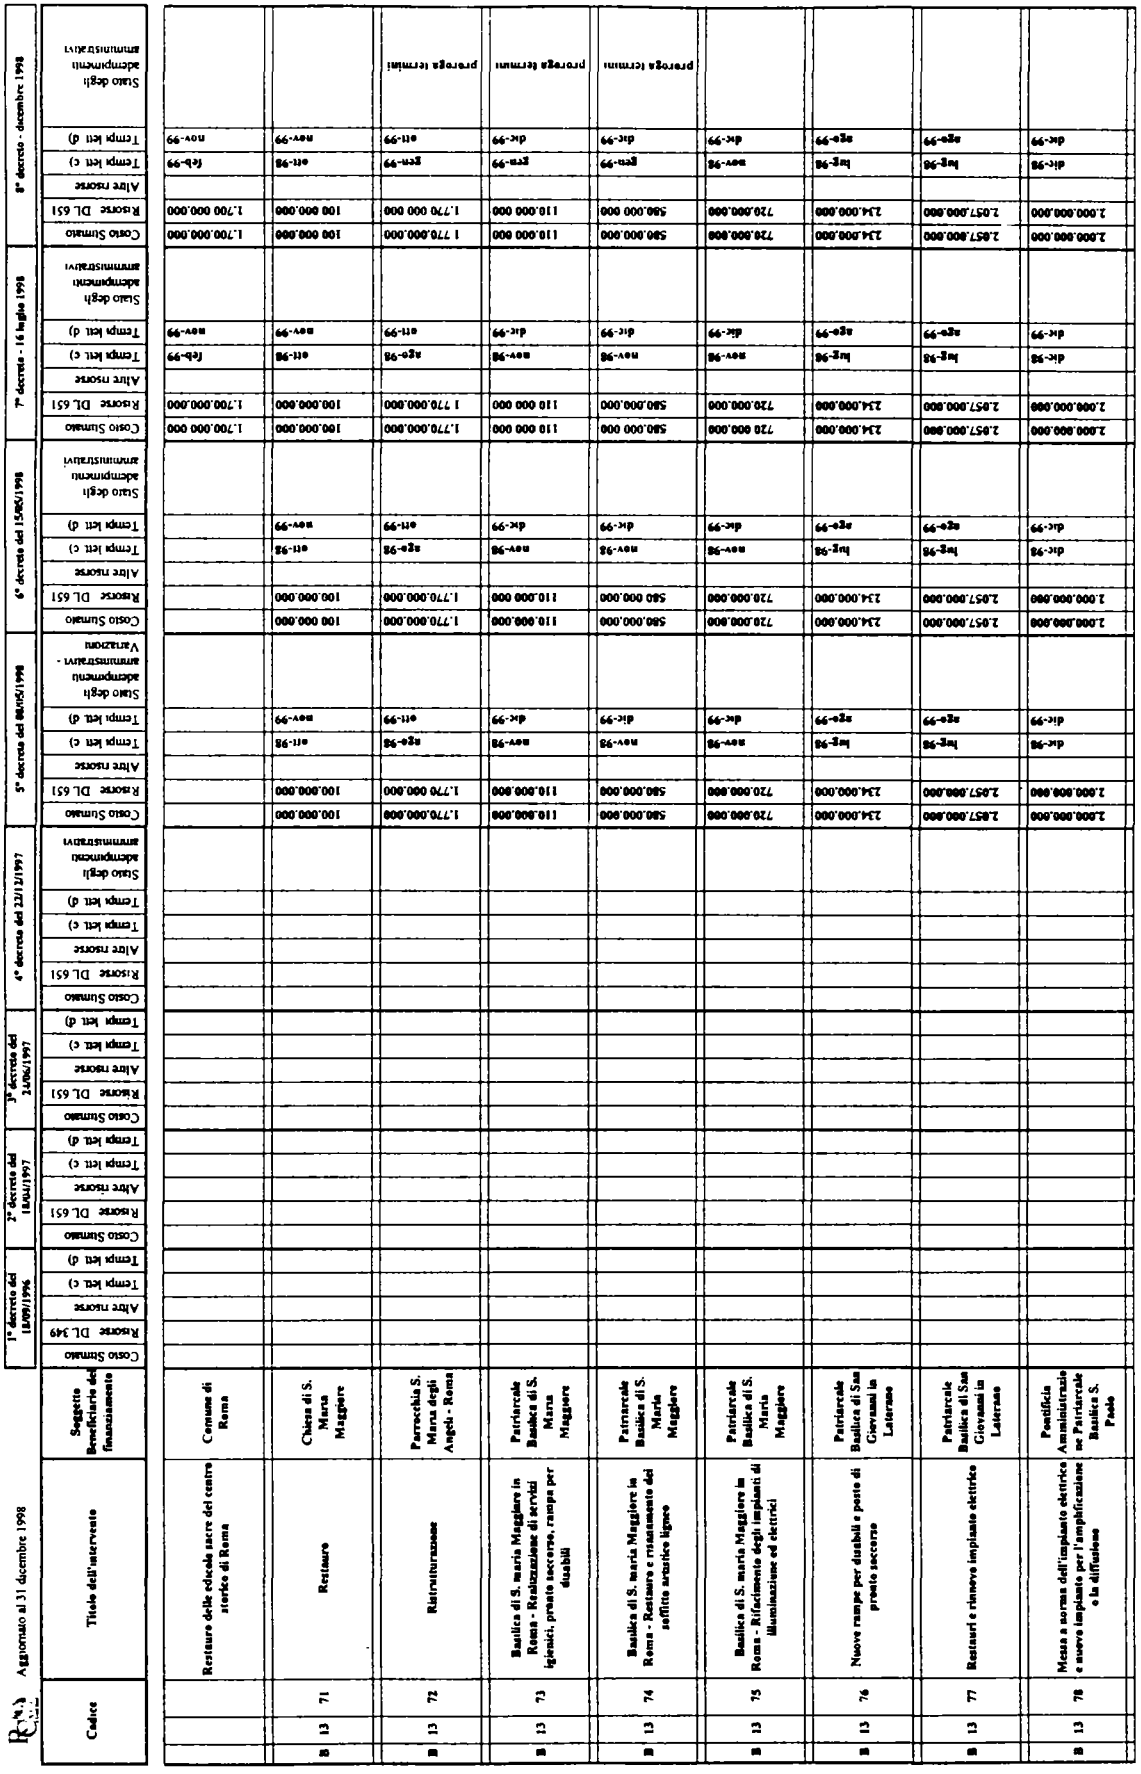

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996						2° decreto del 18/04/1997						3° decreto del 24/06/1997						4° decreto del 22/12/1997						5° decreto del 08/05/1998						6° decreto del 15/05/1998						7° decreto - 16 luglio 1998						8° decreto - dicembre 1998					
			Costo Sumano	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi - Varianti	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
	Restauro delle edicole sacre del centro storico di Roma	Comune di Roma																																													
B 13 71	Restauro	Chiesa di S. Maria Maggiore						100.000.000	100.000.000															100.000.000	100.000.000																							
B 13 72	Ristrutturazione	Parrocchia S. Maria degli Angeli - Roma						1.770.000.000	1.770.000.000														preroga ternini	1.770.000.000	1.770.000.000																							
B 13 73	Basilica di S. maria Maggiore in Roma - Realizzazione di servizi igienici, presto soccorso, rampa per disabili	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore						110.000.000	110.000.000														preroga ternini	110.000.000	110.000.000																							
B 13 74	Basilica di S. maria Maggiore in Roma - Restauro e risanamento del soffitto ancorico ligneo	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore						580.000.000	580.000.000														preroga ternini	580.000.000	580.000.000																							
B 13 75	Basilica di S. maria Maggiore in Roma - Rifacimento degli impianti di illuminazione ed elettrici	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore						720.000.000	720.000.000															720.000.000	720.000.000																							
B 13 76	Nuove rampe per disabili e posto di presto soccorso	Patriarcale Basilica di San Giovanni in Laterano						234.000.000	234.000.000															234.000.000	234.000.000																							
B 13 77	Restauri e rinnovo impianto elettrico	Patriarcale Basilica di San Giovanni in Laterano						2.057.000.000	2.057.000.000															2.057.000.000	2.057.000.000																							
B 13 78	Messa a norma dell'impianto elettrico e nuovo impianto per l'amplificazione e la diffusione	Pontificia Amministrazione Patriarcale Basilica S. Paolo						2.000.000.000	2.000.000.000															2.000.000.000	2.000.000.000																							

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998	
														Stato degli adempimenti amministrativi
B	14	79	Restauro dell'organo di Giovanni Corrado Verlé	Ordine Cistercense SS Vincenzo e Anastasio	Costo Stimato									
					Risorse DL 349									
					Altre risorse									
					Tempi lett. d)	Tempi lett. c)								
B	13	80	Cappella S. Maria del Popolo	Ministero Beni Culturali	Costo Stimato									
					Risorse DL 651									
					Altre risorse									
					Tempi lett. c)									
					Tempi lett. d)									
B	14	01	Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova sede dell'Ist. Naz della Grafica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Stimato									
					Risorse DL 651									
					Altre risorse									
					Tempi lett. c)									
					Tempi lett. d)									
			Complesso monumentale Palazzo Poli e Calcografia (Roma) Restauro funzionale per l'allestimento della nuova sede museale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		Costo Stimato								
						Risorse DL 651								
						Altre risorse								
						Tempi lett. c)								
						Tempi lett. d)								
B	14	02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Stimato									
					Risorse DL 651									
					Altre risorse									
					Tempi lett. c)									
					Tempi lett. d)									
B	14	03	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		Costo Stimato								
						Risorse DL 651								
						Altre risorse								
						Tempi lett. c)								
						Tempi lett. d)								
			Galleria Accademia di S. Luca (Roma) Recupero e patrimonio	Ministero per i Beni e le Attività Culturali			Costo Stimato							
							Risorse DL 651							
							Altre risorse							
							Tempi lett. c)							
							Tempi lett. d)							
B	14	04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano	Ministero per i Beni e le Attività Culturali				Costo Stimato						
								Risorse DL 651						
								Altre risorse						
								Tempi lett. c)						
								Tempi lett. d)						
			Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Stimato									
					Risorse DL 651									
					Altre risorse									
					Tempi lett. c)									
					Tempi lett. d)									

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998	
														Stato degli adempimenti amministrativi
B	14	79	Restauro dell'organo di Giovanni Corrado Verlé	Ordine Cistercense SS Vincenzo e Anastasio	Costo Stimato									
					Risorse DL 349									
					Altre risorse									
					Tempi lett. c)									
					Tempi lett. d)

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 12/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998	
					Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	14	05	Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.500.000.000					1.500.000.000	1.500.000.000		nov-97	ott-99	1.500.000.000	1.500.000.000		nov-97	ott-99	1.500.000.000	1.500.000.000		nov-97	ott-99	Lavori in corso	1.500.000.000	1.500.000.000		nov-97	ott-99		1.500.000.000	1.500.000.000		nov-97	ott-99	
B	14		Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali				mar-97	ott-99	1.500.000.000	1.500.000.000		nov-97	ott-99	1.500.000.000	1.500.000.000		nov-97	ott-99	1.500.000.000	1.500.000.000		nov-97	ott-99												
B	14	06	Museo delle navi romane (Nemi/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali						800.000.000	800.000.000		nov-97	set-99	800.000.000	800.000.000		nov-97	set-99	800.000.000	800.000.000		nov-97	set-99	Gara in corso											
B	14		Museo delle navi romane (Nemi/Roma) Valorizzazione museale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	308.000.000			mar-97	mag-99	308.000.000	308.000.000		mar-97	mag-99																						
B	14	07	Museo d'Arte Sacra	Parrocchia S. Giovanni dei Fiorentini																700.000.000			ott-98	lug-99												
B	14	08	Completamento "Museo del fiume"	Comune di Nazzano																900.000.000		Nuovi Interventi All C	gen-99	ott-99												
B	15	01	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	4.000.000.000	4.000.000.000		mar-97	ott-99	4.000.000.000	4.000.000.000		mar-97	ott-99	4.000.000.000	4.000.000.000		mar-97	ott-99	4.000.000.000	4.000.000.000		mar-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	4.000.000.000	4.000.000.000		mar-97	ott-99		4.000.000.000	4.000.000.000		mar-97	ott-99	
B	15	02	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	7.000.000.000	7.000.000.000		gen-97	dic-99	7.000.000.000	7.000.000.000		gen-97	dic-99	7.000.000.000	7.000.000.000		gen-97	dic-99	7.000.000.000	7.000.000.000		gen-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa	7.000.000.000	7.000.000.000		gen-97	dic-99		7.000.000.000	7.000.000.000		nov-97	dic-99	
B	15	03	Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	ago-99	2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	ago-99	2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	ago-99	2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa	2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	ago-99		2.000.000.000	2.000.000.000		nov-97	ago-99	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996					2° decreto del 18/04/1997					3° decreto del 24/06/1997					4° decreto del 22/12/1997					5° decreto del 08/05/1998					6° decreto del 15/05/1998					7° decreto - 16 luglio 1998					8° decreto - dicembre 1998				
					Costo Sumaio	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi - Varianti	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	15	04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000	2.000.000.000		mar-97	otr-99	2.000.000.000	2.000.000.000		mar-97	otr-99	2 000 000 000	2.000.000.000		mar-97	otr-99	2.000.000.000	2.000.000.000		set-97	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	2.000.000.000	2.500.000.000		feb-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	2.000.000.000	2.500.000.000		mar-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	2.000.000.000	2.500.000.000		feb-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa
B	15	05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000	2.000.000.000		mar-97	otr-99	2.000.000.000	2.000.000.000		set-97	otr-99	2.000.000.000	2.000.000.000		set-97	otr-99	2.000.000.000	2.000.000.000		set-97	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	2.000.000.000	2.000.000.000		set-97	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	2.000.000.000	2.000.000.000		set-97	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	2.000.000.000	2.000.000.000		set-97	otr-99	Preliminare definitiva conclusa
B	15	06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e viabi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000	2.000.000.000		mar-97	otr-99	2.000.000.000	2.000.000.000		gen-98	otr-99	2.000.000.000	2.000.000.000		gen-98	otr-99	2.000.000.000	2.000.000.000		gen-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	2.000.000.000	2.000.000.000		gen-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	2.000.000.000	2.000.000.000		gen-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	2.000.000.000	2.000.000.000		gen-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa
B	15	07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.500.000.000	1.500.000.000		mar-97	otr-99	1.500.000.000	1.500.000.000		mar-97	otr-99	1.500.000.000	1.500.000.000		mar-97	otr-99	1.500.000.000	1.500.000.000		mar-97	otr-99	Gara in corso	1.500.000.000	1.500.000.000		gen-97	otr-99	Gara in corso	1.500.000.000	1.500.000.000		gen-97	otr-99		1.500.000.000	1.500.000.000		gen-97	otr-99	
B	16	01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-97	otr-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-97	otr-99	1 000 000 000	1.000.000.000		mar-97	otr-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-97	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	893.928.572	893.928.572		mar-98	otr-99	Riduzione autorizzazioni di cassa "A" per 106.071.428
B	16	02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	5.000.000.000	5.000.000.000		mar-97	otr-99	5.000.000.000	5.000.000.000		mar-97	otr-99	5.000.000.000	5.000.000.000		mar-97	otr-99	5.000.000.000	5.000.000.000		mar-97	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	5.000.000.000	5.000.000.000		mar-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	5.000.000.000	5.000.000.000		mar-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	4.672.784.441	4.672.784.441		mar-98	otr-99	Riduzione autorizzazioni di cassa "A" per 327.215.559
B	16	03	Palatino - Foro Romano (Roma) Area di Settimio Severo Completamento restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.200.000.000	1.200.000.000		mar-97	otr-99	1.200.000.000	1.200.000.000		mar-97	otr-99	1.200.000.000	1.200.000.000		mar-97	otr-99	1.200.000.000	1.200.000.000		mar-97	otr-99	Gara in corso	1.200.000.000	1.200.000.000		gen-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	1.200.000.000	1.200.000.000		gen-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	1.180.799.560	1.180.799.560		gen-98	otr-99	Riduzione autorizzazioni di cassa "A" per 19.200.440
B	16	04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.500.000.000	2.500.000.000		mar-97	otr-99	2.500.000.000	2.500.000.000		mar-97	otr-99	2.500.000.000	2.500.000.000		mar-97	otr-99	2.500.000.000	2.500.000.000		mar-97	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	2.500.000.000	2.500.000.000		mar-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	2.500.000.000	2.500.000.000		mar-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	2.339.254.745	2.339.254.745		mar-98	otr-99	Riduzione autorizzazioni di cassa "A" per 160.745.255
B	16	05	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000	2.000.000.000		mar-97	otr-99	2.000.000.000	2.000.000.000		mar-97	otr-99	2.000.000.000	2.000.000.000		mar-97	otr-99	2.000.000.000	2.000.000.000		mar-97	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	2.000.000.000	2.000.000.000		feb-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	2.000.000.000	2.000.000.000		feb-98	otr-99	Preliminare definitiva conclusa	1.886.029.019	1.886.029.019		feb-98	otr-99	Riduzione autorizzazioni di cassa "A" per 113.970 981

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
B 16 06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano 4.000.000.000 Risorse DL 349 400.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mar-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 1.300.000.000 Risorse DL 651 400.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 400.000.000 Risorse DL 651 400.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 400.000.000 Risorse DL 651 400.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) nov-99	Costo Sumano 400.000.000 Risorse DL 651 400.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Preliminare definitiva conclusa	Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 1.650.672	Costo Sumano 398.319.328 Risorse DL 651 398.319.328 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi
B 16 07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e ristrutturazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Portico Adriano sottostante	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano 400.000.000 Risorse DL 651 400.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 1.300.000.000 Risorse DL 651 1.300.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 1.300.000.000 Risorse DL 651 1.300.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 1.300.000.000 Risorse DL 651 1.300.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Preliminare definitiva conclusa	Costo Sumano 1.300.000.000 Risorse DL 651 1.300.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi - Varianti Opera in corso	Costo Sumano 2.117.285.925 Risorse DL 651 2.117.285.925 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 182.714.075	Costo Sumano 2.117.285.925 Risorse DL 651 2.117.285.925 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 182.714.075	Costo Sumano 398.319.328 Risorse DL 651 398.319.328 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi
B 16 08	Palatino - Foro Romano (Roma) Cleva della Vittoria Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano 800.000.000 Risorse DL 651 800.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) giu-99	Costo Sumano 800.000.000 Risorse DL 651 800.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) giu-99	Costo Sumano 800.000.000 Risorse DL 651 800.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) giu-99	Costo Sumano 800.000.000 Risorse DL 651 800.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Preliminare definitiva conclusa	Costo Sumano 800.000.000 Risorse DL 651 800.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) feb-98 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Preliminare definitiva conclusa	Costo Sumano 800.000.000 Risorse DL 651 800.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) feb-98 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 78.107.914	Costo Sumano 721.892.086 Risorse DL 651 721.892.086 Altre risorse Tempi lett. c) feb-98 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 78.107.914	Costo Sumano 721.892.086 Risorse DL 651 721.892.086 Altre risorse Tempi lett. c) feb-98 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 78.107.914
B 16 09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano 3.000.000.000 Risorse DL 651 3.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 3.000.000.000 Risorse DL 651 3.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 3.000.000.000 Risorse DL 651 3.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 3.000.000.000 Risorse DL 651 3.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Preliminare definitiva conclusa	Costo Sumano 3.000.000.000 Risorse DL 651 3.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) feb-98 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Opera in corso	Costo Sumano 3.000.000.000 Risorse DL 651 3.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) feb-98 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 254.546.291	Costo Sumano 2.745.453.709 Risorse DL 651 2.745.453.709 Altre risorse Tempi lett. c) feb-98 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 254.546.291	Costo Sumano 2.745.453.709 Risorse DL 651 2.745.453.709 Altre risorse Tempi lett. c) feb-98 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 254.546.291
B 16 10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S.Maria Antiqua a S.Anastasia e a via di S.Gregorio Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano 2.000.000.000 Risorse DL 651 2.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 2.000.000.000 Risorse DL 651 2.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 2.000.000.000 Risorse DL 651 2.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 2.000.000.000 Risorse DL 651 2.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Preliminare definitiva conclusa	Costo Sumano 2.000.000.000 Risorse DL 651 2.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Preliminare definitiva conclusa	Costo Sumano 1.780.173.676 Risorse DL 651 1.780.173.676 Altre risorse Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 219.826.324	Costo Sumano 1.780.173.676 Risorse DL 651 1.780.173.676 Altre risorse Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 219.826.324	Costo Sumano 1.780.173.676 Risorse DL 651 1.780.173.676 Altre risorse Tempi lett. c) mar-98 Tempi lett. d) nov-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 219.826.324
B 16 11	Palatino - Foro Romano (Roma) Arcate Severiane e Terme Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano 2.000.000.000 Risorse DL 651 2.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 2.000.000.000 Risorse DL 651 2.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 2.000.000.000 Risorse DL 651 2.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 2.000.000.000 Risorse DL 651 2.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Preliminare definitiva conclusa	Costo Sumano 2.000.000.000 Risorse DL 651 2.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Opera in corso	Costo Sumano 2.000.000.000 Risorse DL 651 2.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 184.841.452	Costo Sumano 1.815.958.548 Risorse DL 651 1.815.958.548 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 184.841.452	Costo Sumano 1.815.958.548 Risorse DL 651 1.815.958.548 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 184.841.452
B 16 12	Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberini Ulteriori restauri	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano 3.400.000.000 Risorse DL 651 3.400.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mar-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 3.400.000.000 Risorse DL 651 3.400.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 3.400.000.000 Risorse DL 651 3.400.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 3.400.000.000 Risorse DL 651 3.400.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Preliminare definitiva conclusa	Costo Sumano 3.400.000.000 Risorse DL 651 3.400.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Opera in corso	Costo Sumano 3.400.000.000 Risorse DL 651 3.400.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 216.116.810	Costo Sumano 3.183.883.190 Risorse DL 651 3.183.883.190 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 216.116.810	Costo Sumano 3.183.883.190 Risorse DL 651 3.183.883.190 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 216.116.810
B 16 13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano 1.000.000.000 Risorse DL 651 1.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 1.000.000.000 Risorse DL 651 1.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 1.000.000.000 Risorse DL 651 1.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) set-99	Costo Sumano 1.000.000.000 Risorse DL 651 1.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Preliminare definitiva conclusa	Costo Sumano 1.000.000.000 Risorse DL 651 1.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Opera in corso	Costo Sumano 1.000.000.000 Risorse DL 651 1.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 97.740.259	Costo Sumano 902.259.741 Risorse DL 651 902.259.741 Altre risorse Tempi lett. c) feb-98 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 97.740.259	Costo Sumano 902.259.741 Risorse DL 651 902.259.741 Altre risorse Tempi lett. c) feb-98 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 97.740.259
B 16 14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e ristrutturazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano 4.000.000.000 Risorse DL 349 4.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mar-97 Tempi lett. d) ott-99	Costo Sumano 4.000.000.000 Risorse DL 651 4.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99	Costo Sumano 4.000.000.000 Risorse DL 651 4.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99	Costo Sumano 4.000.000.000 Risorse DL 651 4.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Preliminare definitiva conclusa	Costo Sumano 4.000.000.000 Risorse DL 651 4.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Preliminare definitiva conclusa	Costo Sumano 4.000.000.000 Risorse DL 651 4.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) nov-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 301.953.706	Costo Sumano 3.698.046.294 Risorse DL 651 3.698.046.294 Altre risorse Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 301.953.706	Costo Sumano 3.698.046.294 Risorse DL 651 3.698.046.294 Altre risorse Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) ott-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione assegnazioni AB "A" per 301.953.706

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/04/1997		3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/09/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998
					Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Stato degli adempimenti amministrativi
B	16	15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		600.000.000	600.000.000		551.079.219	551.079.219		
B	16	16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		150.000.000	150.000.000		139.394.913	139.394.913		
B	16	17	Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	300.000.000	300.000.000		300.000.000	300.000.000		300.000.000	300.000.000		300.000.000	300.000.000		300.000.000	300.000.000		150.000.000	150.000.000		97.922.410	97.922.410		
B	16	18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	7.000.000.000	7.000.000.000		7.000.000.000	7.000.000.000														274.975.000	274.975.000		apr-99
B	16	18.01	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma Giardino di Palazzo Barberini: scavo e restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	850.000.000	850.000.000	nov-97	850.000.000	850.000.000	nov-97	850.000.000	850.000.000	nov-97	850.000.000	850.000.000	nov-97	850.000.000	850.000.000	nov-97	100.000.000	100.000.000	nov-97	100.000.000	100.000.000	nov-97	792.577.857	792.577.857	mar-98
B	16	18.02	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		dic-99
B	16	18.03	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di copertura.	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		97.922.410	97.922.410		mar-99
B	16	18.04	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbone	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	150.000.000	150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000	150.000.000		139.394.913	139.394.913		nov-97
B	16	18.05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Carcere Mamertino	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	600.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000		551.079.219	551.079.219		

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B 16 15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.800.000.000	1.000.000.000		mar-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa	2.500.000.000	1.000.000.000		mar-98	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	2.500.000.000	1.000.000.000		mar-98	nov-99	Progettazione definitiva conclusa	2.500.000.000	1.000.000.000		mar-98	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B 16 16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa	2.500.000.000	2.500.000.000		mar-98	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	2.500.000.000	2.500.000.000		mar-98	nov-99	Progettazione definitiva conclusa	2.500.000.000	2.500.000.000		mar-98	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B 16 17	Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	300.000.000	300.000.000		mar-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa	300.000.000	300.000.000		feb-98	apr-99	Progettazione definitiva conclusa	300.000.000	300.000.000		feb-98	apr-99	Progettazione definitiva conclusa	300.000.000	300.000.000		feb-98	apr-99	Progettazione definitiva conclusa
B 16 18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	7.000.000.000	7.000.000.000		nov-97	apr-99																			
B 16 18.01	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma Giardino di Palazzo Barberini: scavo e restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	850.000.000	850.000.000	nov-97	nov-97	apr-99	Progettazione definitiva conclusa	850.000.000	850.000.000	nov-97	nov-97	apr-99	Progettazione definitiva conclusa	850.000.000	850.000.000	nov-97	nov-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa	850.000.000	850.000.000	nov-97	nov-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa
B 16 18.02	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	100.000.000	100.000.000		ott-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa	100.000.000	100.000.000		ott-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa	100.000.000	100.000.000		ott-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa	100.000.000	100.000.000		ott-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa
B 16 18.03	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di copertura.	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	100.000.000	100.000.000		ott-97	mar-99	Progettazione definitiva conclusa	100.000.000	100.000.000		ott-97	mar-99	Progettazione definitiva conclusa	100.000.000	100.000.000		nov-97	mar-99	Carta in corso	100.000.000	100.000.000		nov-97	mar-99	Carta in corso
B 16 18.04	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbone	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	150.000.000	150.000.000		nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	150.000.000	150.000.000		nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	150.000.000	150.000.000		nov-97	ott-99	Carta in corso	150.000.000	150.000.000		nov-97	ott-99	Carta in corso
B 16 18.05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Carcere Mamertino	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	600.000.000	600.000.000		nov-97	apr-99	Progettazione definitiva conclusa	600.000.000	600.000.000		nov-97	apr-99	Progettazione definitiva conclusa	600.000.000	600.000.000		nov-97	apr-99	Carta in corso	600.000.000	600.000.000		nov-97	apr-99	Carta in corso

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Riduzione stanziamenti All "A" per 48.920.781	Riduzione stanziamenti All "A" per 10.605.087	Riduzione stanziamenti All "A" per 2.077.590	Riduzione stanziamenti All "A" per 57.422.143	Riduzione stanziamenti All "A" per 25.025.000	Riduzione stanziamenti All "A" per 256.536.470	Riduzione stanziamenti All "A" per 106.537.311	Stato degli adempimenti amministrativi
B 16 15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	ott-99	ott-99	mar-99	apr-99	apr-99	ott-99	nov-99	
B 16 16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	nov-97	nov-97	mar-98	feb-98	mar-98	mar-98	
B 16 17	Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	ott-99	ott-99	mar-99	apr-99	apr-99	ott-99	nov-99	
B 16 18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali								
B 16 18.01	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma Giardino di Palazzo Barberini: scavo e restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali								
B 16 18.02	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali								
B 16 18.03	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di copertura.	Ministero per i Beni e le Attività Culturali								
B 16 18.04	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbone	Ministero per i Beni e le Attività Culturali								
B 16 18.05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Carcere Mamertino	Ministero per i Beni e le Attività Culturali								

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996					2° decreto del 18/04/1997					3° decreto del 23/08/1997					4° decreto del 22/12/1997					5° decreto del 08/05/1998					6° decreto del 15/05/1998					7° decreto - 16 luglio 1998					8° decreto - dicembre 1998	
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B 16 18/06	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana località Casal Bianco	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																			
B 16 18/07	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana sul giardino meridionale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																			
B 16 18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Mitreo di S. Stefano Rotondo	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																			
B 16 18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																			
B 16 18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ruderi in Piazza Iside	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																			
B 16 18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																			
B 16 18/12	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa del Sette Bassi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																			
B 16 18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura integrata del territorio	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																			
B 16 18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																			
B 16 18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																			

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/01/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 18/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998	
			Costo Sumaio	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B 16	18/16	Ministero per i Beni e le Attività Culturali											135.000.000	135.000.000		lug-97	feb-98	135.000.000	135.000.000		gen-98	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	135.000.000	135.000.000		gen-98	ott-99	Gara in corso	135.000.000	135.000.000		gen-98	ott-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 12.897.525
B 16	18/17	Ministero per i Beni e le Attività Culturali											750.000.000	750.000.000		mag-97	ott-99	750.000.000	750.000.000		mar-98	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	750.000.000	750.000.000		mar-98	ott-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 74.484.500	675.515.500	675.515.500		mar-98	ott-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 74.484.500
B 16	18/18	Ministero per i Beni e le Attività Culturali											100.000.000	100.000.000		nov-97	nov-99	100.000.000	100.000.000		feb-98	nov-99	Gara in corso	100.000.000	100.000.000		feb-98	nov-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 6.815.673	93.184.327	93.184.327		feb-98	nov-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 6.815.673
B 16	18/19	Ministero per i Beni e le Attività Culturali											25.000.000	25.000.000		nov-97	nov-99	25.000.000	25.000.000		mar-98	nov-99	Progettazione definitiva conclusa	25.000.000	25.000.000		mar-98	nov-99		25.000.000	25.000.000		mar-98	nov-99	
B 16	18/20	Ministero per i Beni e le Attività Culturali											600.000.000	600.000.000		nov-97	ott-99	600.000.000	600.000.000		mar-98	nov-99	Progettazione definitiva conclusa	600.000.000	600.000.000		mar-98	nov-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 23.071.256	576.928.744	576.928.744		mar-98	nov-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 23.071.256
B 16	18/21	Ministero per i Beni e le Attività Culturali											500.000.000	500.000.000		nov-97	ott-99	500.000.000	500.000.000		feb-98	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	500.000.000	500.000.000		feb-98	ott-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 29.607.713	470.392.287	470.392.287		feb-98	ott-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 29.607.713
B 16	18/22	Ministero per i Beni e le Attività Culturali											900.000.000	900.000.000		set-97	nov-99	900.000.000	900.000.000		dic-97	nov-99	Gara in corso	900.000.000	900.000.000		dic-97	nov-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 68.766.047	831.233.953	831.233.953		dic-97	nov-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 68.766.047
B 16	18/23	Ministero per i Beni e le Attività Culturali											100.000.000	100.000.000		nov-97	set-99	100.000.000	100.000.000		mar-98	ott-99	Progettazione definitiva in corso	100.000.000	100.000.000		mar-98	ott-99		100.000.000	100.000.000		mar-98	ott-99	
B 16	18/24	Ministero per i Beni e le Attività Culturali											300.000.000	300.000.000		nov-97	ott-99	300.000.000	300.000.000		mar-98	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	300.000.000	300.000.000		mar-98	ott-99		300.000.000	300.000.000		mar-98	ott-99	
B 16	18/25	Ministero per i Beni e le Attività Culturali											130.000.000	130.000.000		nov-97	ott-99	130.000.000	130.000.000		mar-98	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	130.000.000	130.000.000		mar-98	ott-99		130.000.000	130.000.000		mar-98	ott-99	

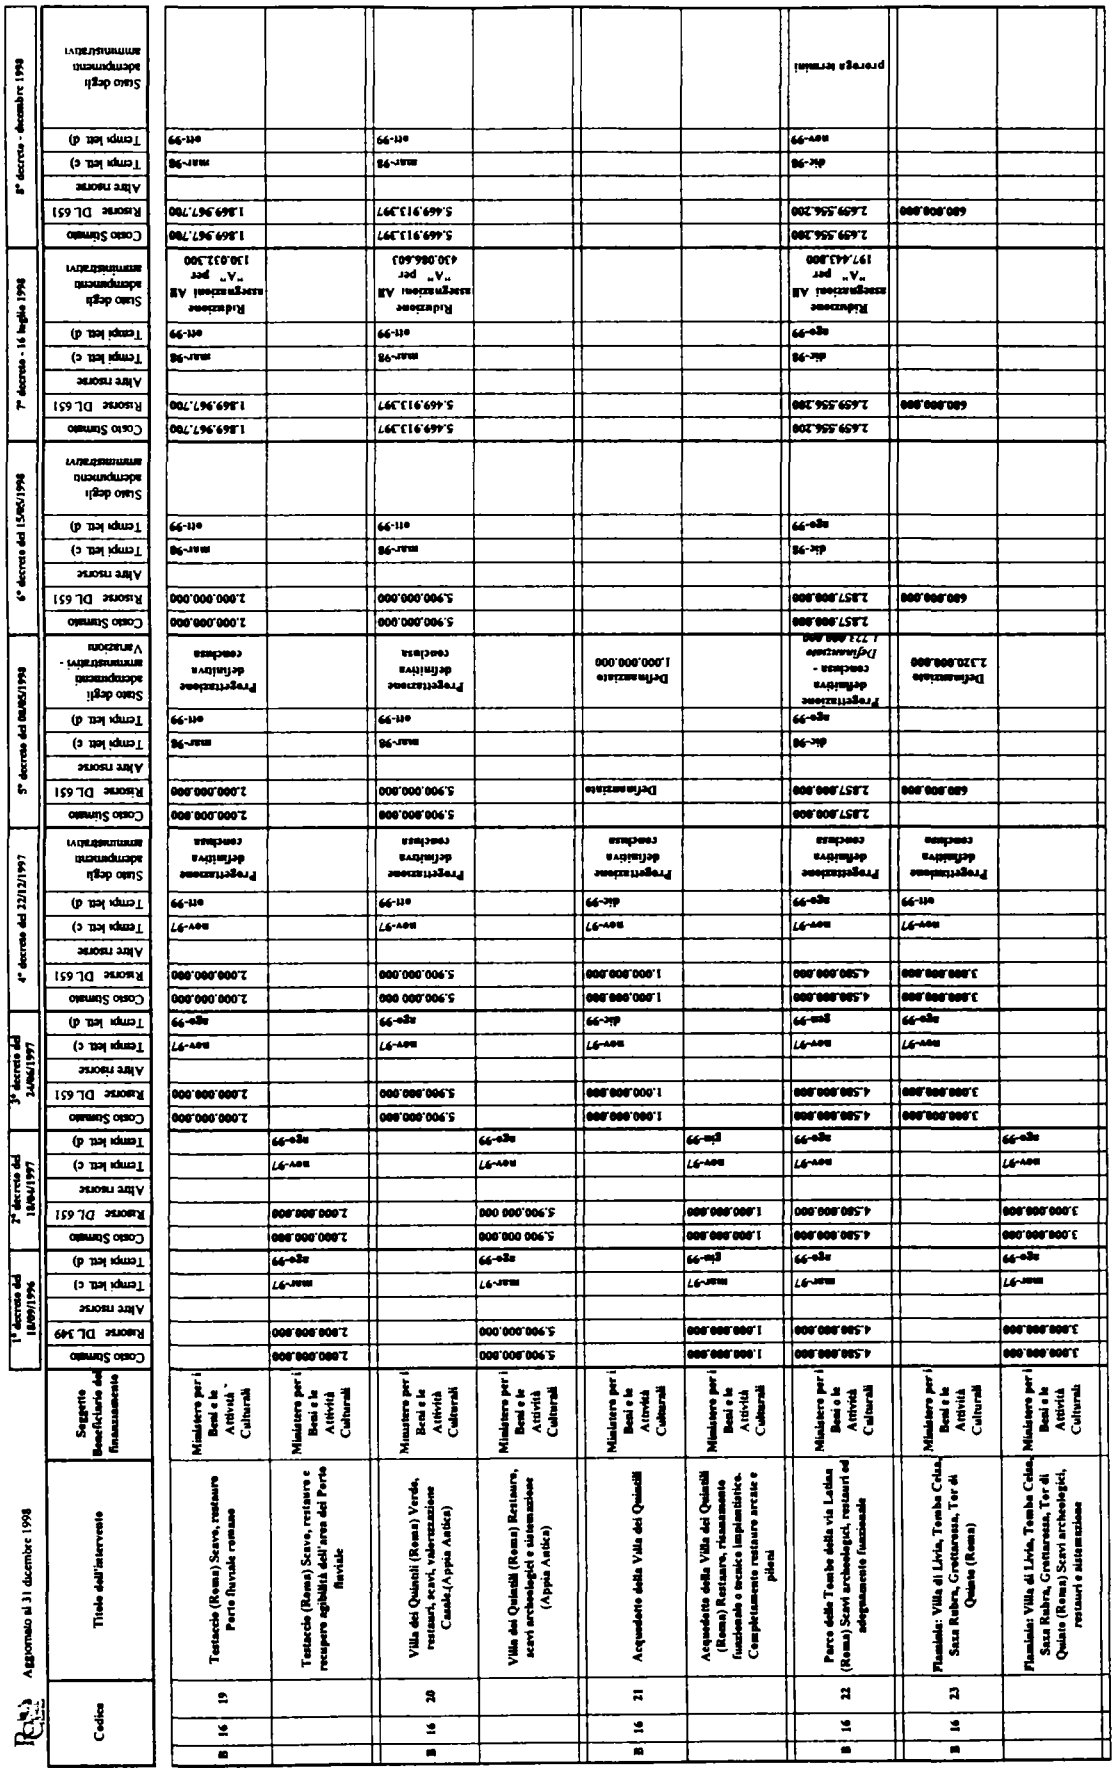

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
			1° decreto del 18/09/1996					2° decreto del 18/04/1997					3° decreto del 24/06/1997					4° decreto del 22/12/1997					5° decreto del 08/05/1998					6° decreto del 15/05/1998					7° decreto - 16 luglio 1998					8° decreto - dicembre 1998
B 16 19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Parte fluviale romana	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	4.500.000.000		mar-97	apr-99	1.000.000.000	4.500.000.000		mar-97	apr-99	1.000.000.000	4.500.000.000		mar-97	apr-99	1.000.000.000	4.500.000.000		mar-97	apr-99	1.000.000.000	4.500.000.000		nov-97	apr-99	1.000.000.000	4.500.000.000		nov-97	apr-99	1.000.000.000	4.500.000.000		nov-97	apr-99	1.000.000.000	4.500.000.000		nov-97	apr-99	
B 16 20	Testaccio (Roma) Scavo, restauro e recupero agibilità dell'area del Porto fluviale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000	2.000.000.000				2.000.000.000	2.000.000.000				2.000.000.000	2.000.000.000				2.000.000.000	2.000.000.000				2.000.000.000	2.000.000.000				2.000.000.000	2.000.000.000				1.869.967.700	1.869.967.700				
B 16	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale (Appia Antica)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	5.900.000.000	5.900.000.000				5.900.000.000	5.900.000.000				5.900.000.000	5.900.000.000				5.900.000.000	5.900.000.000				5.900.000.000	5.900.000.000				5.900.000.000	5.900.000.000				5.469.913.397	5.469.913.397				
B 16	Villa dei Quintili (Roma) Restauro, scavi archeologici e sistemazione (Appia Antica)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																																Riduzione stanziamenti A8 "A" per 430.086.603				
B 16 21	Acquedotto della Villa dei Quintili	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000			mar-97	dic-99	1.000.000.000			mar-97	dic-99	1.000.000.000			nov-97	dic-99	1.000.000.000			nov-97	dic-99	1.000.000.000	Definanziato			nov-97	dic-99											
B 16	Acquedotto della Villa dei Quintili (Roma) Restauro, risanamento funzionale e tecnico impiantistico. Completamento restauro arcate e piloni	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000			mar-97	gen-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-97	gen-99	1.000.000.000			nov-97	gen-99																						
B 16 22	Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	4.500.000.000	4.500.000.000		mar-97	apr-99	4.500.000.000	4.500.000.000		mar-97	apr-99	4.500.000.000	4.500.000.000		nov-97	apr-99	4.500.000.000	4.500.000.000		nov-97	apr-99	Progettazione definitiva conclusa - Definanziato 1.721.000.000	2.857.000.000		dic-98	apr-99	2.857.000.000	2.857.000.000		dic-98	apr-99	2.469.556.200	2.469.556.200		dic-98	apr-99	proroga termini
B 16 23	Planimio: Villa di Livia, Tombe Celsa, Sasa Rubra, Grottaversa, Tor di Quinto (Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																						2.320.000.000	680.000.000				680.000.000				680.000.000					
B 16	Planimio: Villa di Livia, Tombe Celsa, Sasa Rubra, Grottaversa, Tor di Quinto (Roma) Scavi archeologici, restauri e sistemazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																														Riduzione stanziamenti A8 "A" per 197.443.800					

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	Stato degli adempimenti amministrativi
B	16	24	Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
					Risorse DL 349	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)	mar-97	mar-97	mar-97	mag-98	nov-97	nov-97	gen-98	
					Tempi ist. d)	ago-99	gen-99	ago-99	gen-99	apr-99	apr-99	mag-98	
B	16	25	Parco archeologico di Veji (Roma) Sistemazione area archeologica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	
					Risorse DL 349	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)	mar-97	mar-97	mar-97	mag-98	nov-97	nov-97	gen-98	
					Tempi ist. d)	ago-99	gen-99	ago-99	gen-99	apr-99	apr-99	mag-98	
B	16	26	Antica città di Gabii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del canale di Carigliano e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	
					Risorse DL 349	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)	mar-97	nov-97	nov-97	mar-98	nov-97	nov-97	mar-98	
					Tempi ist. d)	ago-99	dic-99	ago-99	dic-99	apr-99	apr-99	dic-98	
B	16	27	Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
					Risorse DL 349	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)	mar-97	nov-97	nov-97	feb-98	nov-97	nov-97	feb-98	
					Tempi ist. d)	ago-99	gen-99	ago-99	gen-99	apr-99	apr-99	gen-99	
B	16	28	Antro delle Sorti (Palestrina/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	
					Risorse DL 349	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)	mar-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	
					Tempi ist. d)	ago-99	gen-99	ago-99	gen-99	apr-99	apr-99	gen-99	
			Antro delle Sorti (Palestrina/Roma) Recupero e valorizzazione dell'area archeologica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano	560.000.000	560.000.000						
					Risorse DL 349	560.000.000	560.000.000						
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)	mar-97	nov-97						
					Tempi ist. d)	ago-99	gen-99						
B	16	29	Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Terra di Roccabruna e Cento Camerelle	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	
					Risorse DL 349	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)	mar-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	
					Tempi ist. d)	ago-99	apr-99	ago-99	apr-99	apr-99	apr-99	apr-99	
B	16	30	Recupero del "Barco Borghese" e delle sistemazioni della Villa Romana	Comune di Monte Porzio Catone	Costo Sumano						3.000.000.000	3.000.000.000	Nuovi interventi All C
					Risorse DL 651						3.000.000.000	3.000.000.000	
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)						gen-99	gen-99	
					Tempi ist. d)						dic-99	dic-98	
B	18	01	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Ninfeo del Santuario	Comune di Albano Laziale	Costo Sumano	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
					Risorse DL 651	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)	mar-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	gen-98	
					Tempi ist. d)	ago-99	gen-99	ago-99	gen-99	apr-99	apr-99	dic-98	

Stato degli adempimenti amministrativi	8° decreto - dicembre 1998	7° decreto - 16 luglio 1998	6° decreto del 15/05/1998	5° decreto del 08/05/1998	4° decreto del 22/12/1997	3° decreto del 24/06/1997	2° decreto del 18/04/1997	1° decreto del 18/09/1996
Costo Sumano		8.076.283.107	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000
Risorse DL 651	8.076.283.107	8.076.283.107	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000
Altre risorse								
Tempi ist. c)	nov-97	nov-97	nov-97	mag-98	nov-97	nov-97	nov-97	mar-97
Tempi ist. d)	ott-99	ott-99	ott-99	ott-99	ott-99	ago-99	ago-99	ago-99
Costo Sumano		600.000.000						
Risorse DL 651	8.076.283.107	8.076.283.107						
Altre risorse								
Tempi ist. c)	nov-97	nov-97						
Tempi ist. d)	ott-99	ott-99						
Costo Sumano		4.705.714.979						
Risorse DL 651	4.705.714.979	4.705.714.979						
Altre risorse								
Tempi ist. c)	mar-98	mar-98						
Tempi ist. d)	ago-99	ago-99						
Costo Sumano		1.458.180.311						
Risorse DL 651	1.458.180.311	1.458.180.311						
Altre risorse								
Tempi ist. c)	feb-98	feb-98						
Tempi ist. d)	ott-99	ott-99						
Costo Sumano		560.000.000						
Risorse DL 651	560.000.000	560.000.000						
Altre risorse								
Tempi ist. c)	nov-97	nov-97						
Tempi ist. d)	gen-99	gen-99						
Costo Sumano								
Risorse DL 651								
Altre risorse								
Tempi ist. c)								
Tempi ist. d)								
Costo Sumano		1.060.000.000						
Risorse DL 651	1.060.000.000	1.060.000.000						
Altre risorse								
Tempi ist. c)	nov-97	nov-97						
Tempi ist. d)	apr-99	apr-99						
Costo Sumano		3.000.000.000						
Risorse DL 651	3.000.000.000							
Altre risorse								
Tempi ist. c)	gen-99							
Tempi ist. d)	dic-99							
Costo Sumano		500.000.000						
Risorse DL 651	500.000.000	500.000.000						
Altre risorse								
Tempi ist. c)	gen-98							
Tempi ist. d)	dic-98							

Soggetto Beneficiario del finanziamento	Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano	8.700.000.000	8.700.000.000	8.076.283.107	
	Risorse DL 651	8.700.000.000	8.700.000.000	8.076.283.107	8.076.283.107
	Altre risorse				
	Tempi ist. c)	nov-97	nov-97	nov-97	
	Tempi ist. d)	ott-99	ott-99	ott-99	
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano	600.000.000	600.000.000	600.000.000	
	Risorse DL 651	8.700.000.000	8.700.000.000	8.076.283.107	8.076.283.107
	Altre risorse				
	Tempi ist. c)	mag-98	mag-98	nov-97	
	Tempi ist. d)	dic-99	dic-99	ott-99	
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano	5.000.000.000	5.000.000.000	4.705.714.979	
	Risorse DL 651	5.000.000.000	5.000.000.000	4.705.714.979	4.705.714.979
	Altre risorse				
	Tempi ist. c)	mar-98	mar-98	mar-98	
	Tempi ist. d)	ago-99	ago-99	ago-99	
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano	1.500.000.000	1.500.000.000	1.458.180.311	
	Risorse DL 651	1.500.000.000	1.500.000.000	1.458.180.311	1.458.180.311
	Altre risorse				
	Tempi ist. c)	feb-98	feb-98	feb-98	
	Tempi ist. d)	ott-99	ott-99	ott-99	
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano	560.000.000	560.000.000	560.000.000	
	Risorse DL 651	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000
	Altre risorse				
	Tempi ist. c)	nov-97	nov-97	nov-97	
	Tempi ist. d)	gen-99	gen-99	gen-99	
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano				
	Risorse DL 651				
	Altre risorse				
	Tempi ist. c)				
	Tempi ist. d)				
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Costo Sumano	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	
	Risorse DL 651	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000
	Altre risorse				
	Tempi ist. c)	nov-97	nov-97	nov-97	
	Tempi ist. d)	apr-99	apr-99	apr-99	
Comune di Monte Porzio Catone	Costo Sumano				Nuovi interventi All C
	Risorse DL 651				3.000.000.000
	Altre risorse				
	Tempi ist. c)				gen-99
	Tempi ist. d)				dic-99
Comune di Albano Laziale	Costo Sumano	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
	Risorse DL 651	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Altre risorse				
	Tempi ist. c)	nov-97	nov-97	nov-97	
	Tempi ist. d)	gen-99	gen-99	apr-99	

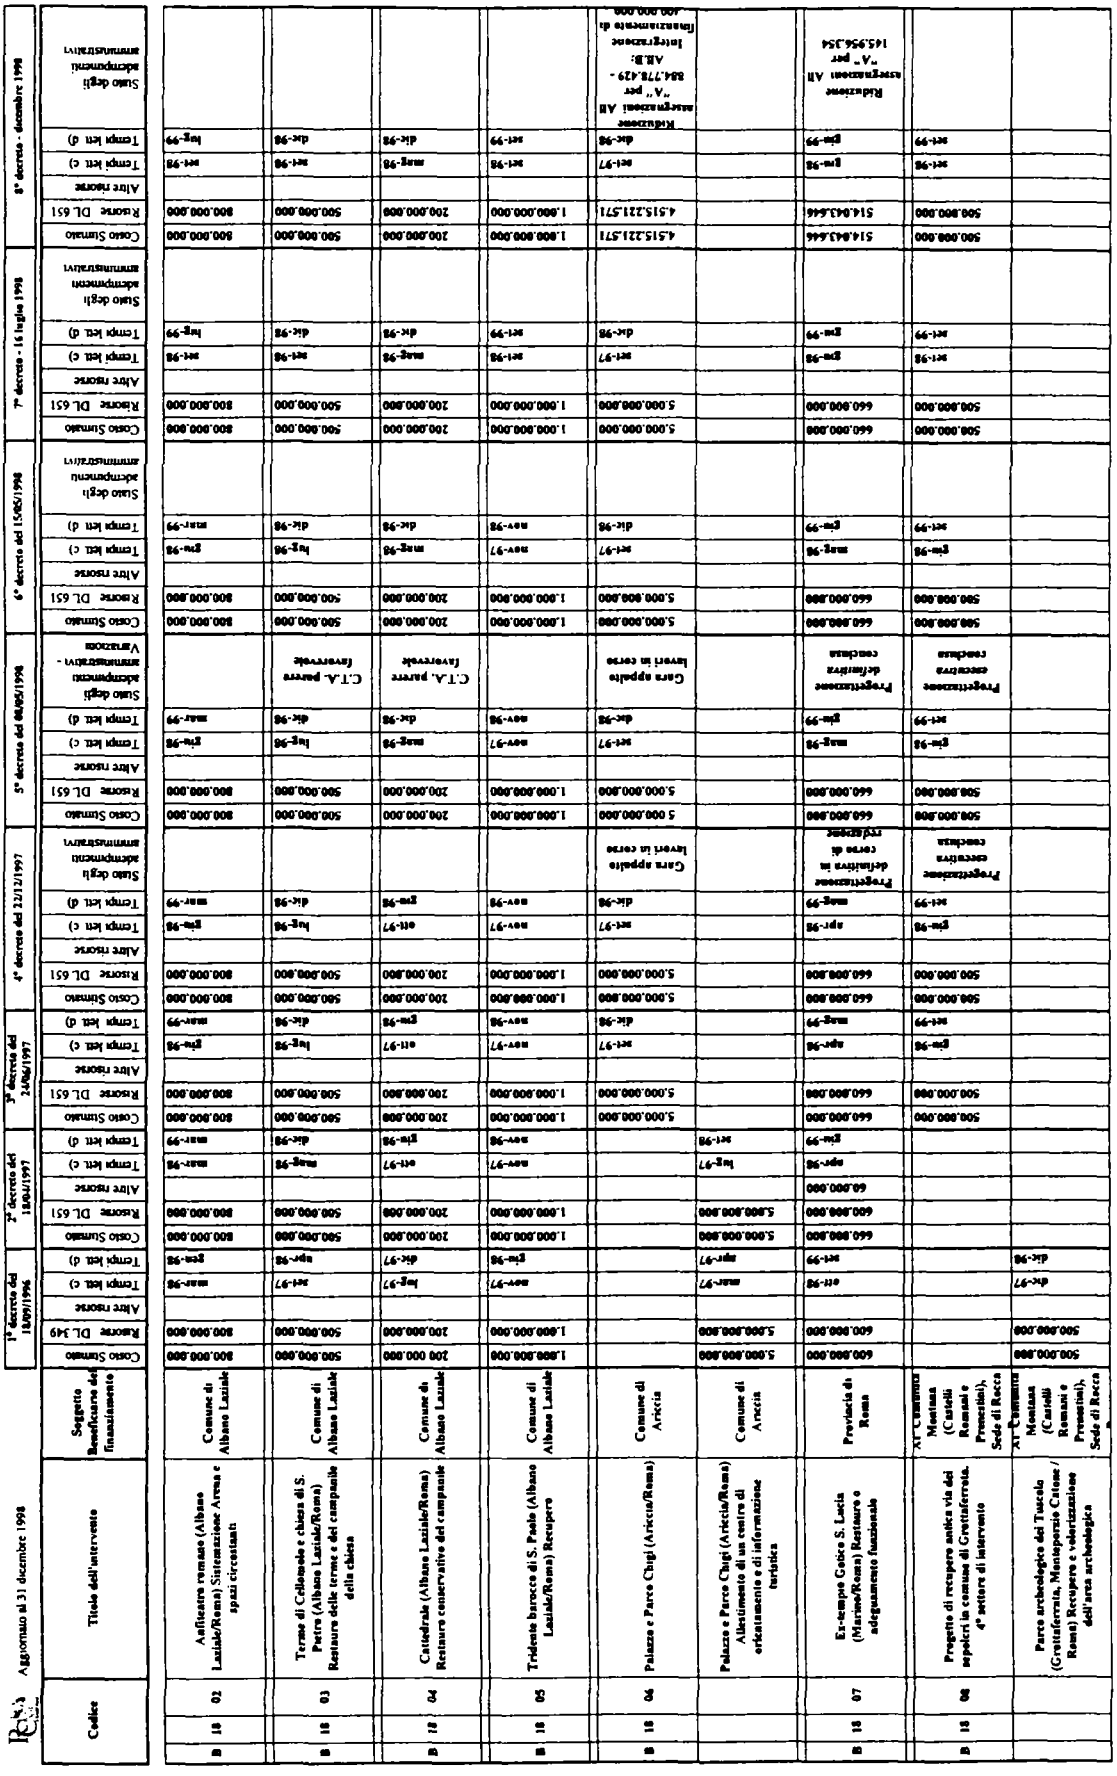

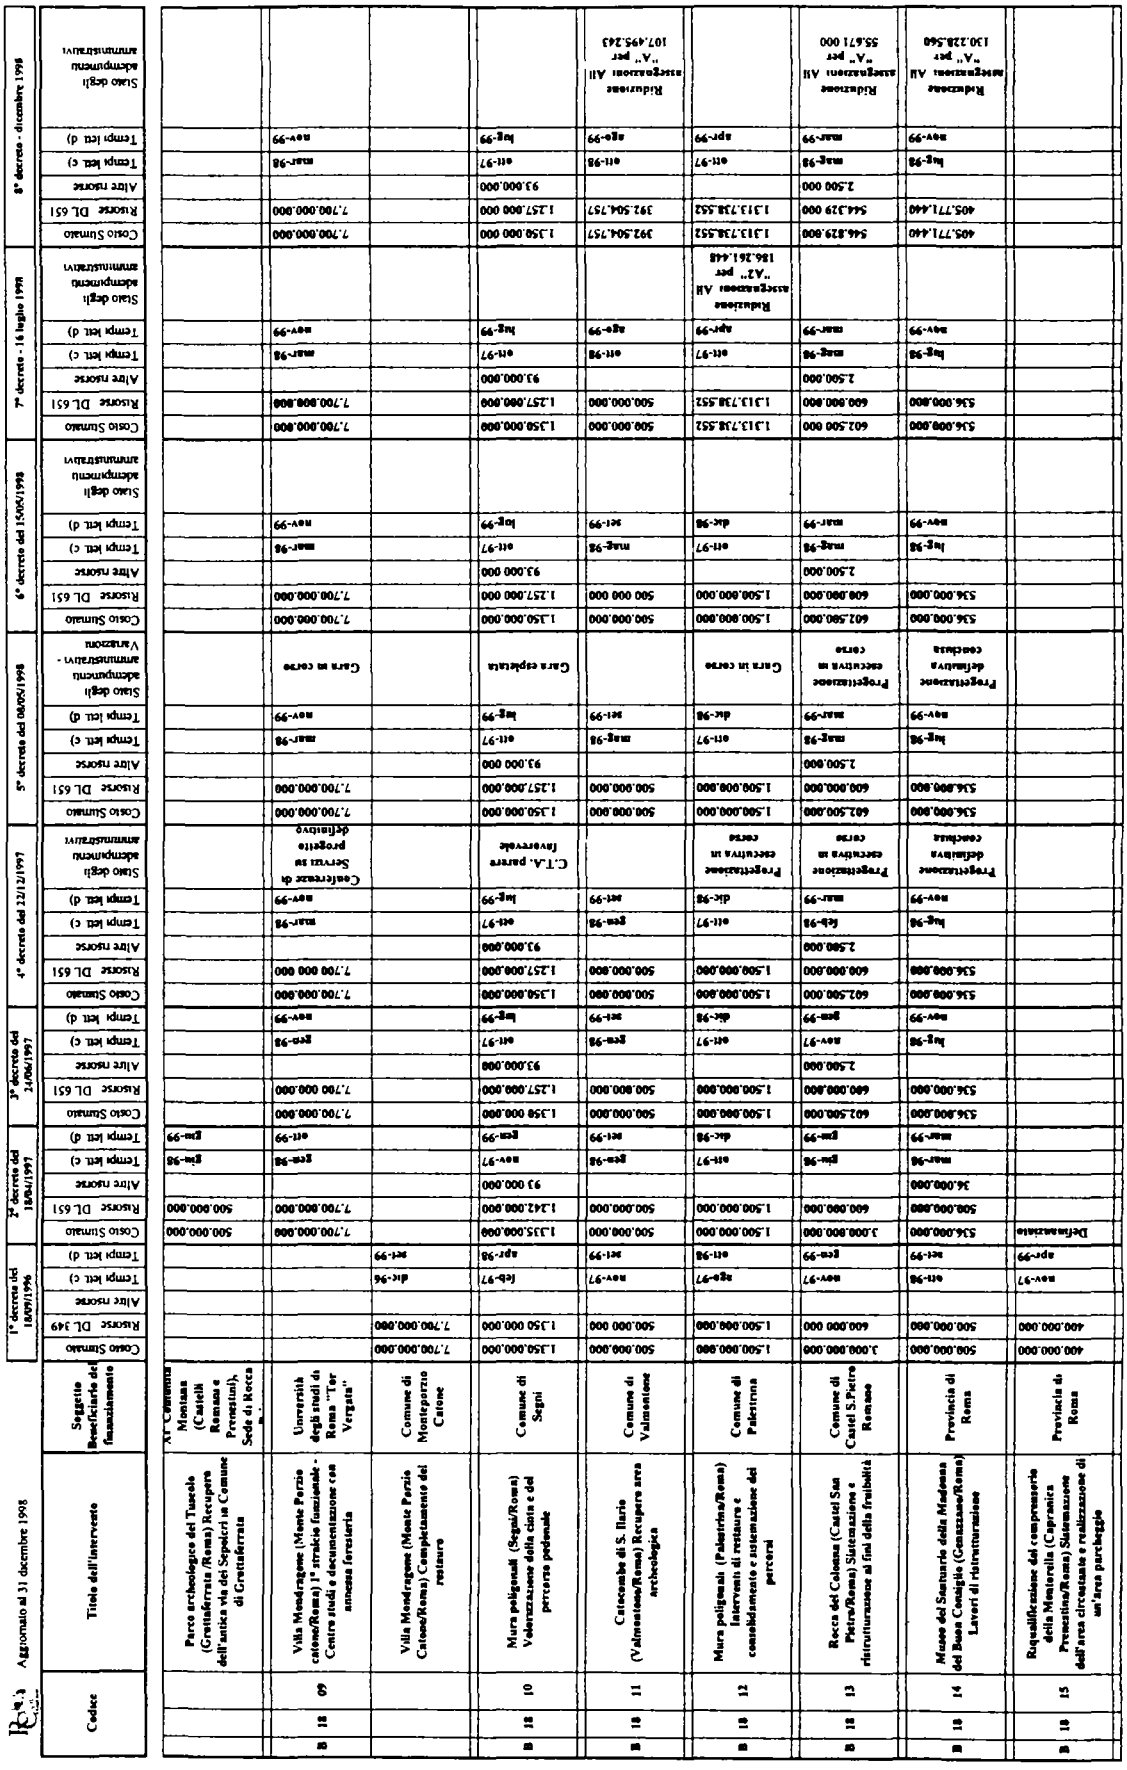

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998			
					Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi Istr. C)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. C)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. C)	Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. C)	Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. C)	Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	15	16 Museo dell'Abbazia di S.Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione	Provincia di Roma	700.000.000	435.000.000	700.000.000		feb-94	gen-99	2.700.000.000	2.700.000.000		feb-94	gen-99	2.700.000.000	2.700.000.000		2.700.000.000	2.700.000.000		feb-94	gen-99	Riduzione aree per "A" per 740.362.752	2.700.000.000	2.700.000.000		feb-94	gen-99	Riduzione aree per "A" per 740.362.752	2.700.000.000	2.700.000.000		feb-94	gen-99	Riduzione aree per "A" per 740.362.752
B	15	17 Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	435.000.000	435.000.000	435.000.000		feb-94	gen-99	2.700.000.000	2.700.000.000		feb-94	gen-99	2.700.000.000	2.700.000.000		2.700.000.000	2.700.000.000		feb-94	gen-99	Riduzione aree per "A" per 1143146.549	2.700.000.000	2.700.000.000		feb-94	gen-99	Riduzione aree per "A" per 1143146.549	2.700.000.000	2.700.000.000		feb-94	gen-99	Riduzione aree per "A" per 1143146.549
B	15	18 Rocca Abbaziale - ideazione benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000	1.030.000.000		set-96	ott-99	1.030.000.000	1.030.000.000		set-96	ott-99	1.030.000.000	1.030.000.000		1.030.000.000	1.030.000.000		set-96	ott-99	Riduzione aree per "A" per 288.118.777	1.030.000.000	1.030.000.000		set-96	ott-99	Riduzione aree per "A" per 288.118.777	1.030.000.000	1.030.000.000		set-96	ott-99	Riduzione aree per "A" per 288.118.777
B	15	19 Ex chiesa di S.Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	Provincia di Roma	450.000.000	450.000.000	450.000.000		mar-99	mar-99	480.000.000	1.000.000.000		dic-97	mar-99	480.000.000	480.000.000		359.792.498	Cura conclusa - Rilascio 128.207.502		dic-97	mar-99	Integrazione finanziamento di 30.000.000	359.792.498	389.792.498		dic-97	mar-99	Integrazione finanziamento di 30.000.000	359.792.498	389.792.498		dic-97	mar-99	Integrazione finanziamento di 30.000.000
B	15	20 Chiesa di S. Maria in Trapposte (Fiano Romano/Roma) Restauro	Comune di Fiano Romano	150.000.000	150.000.000	150.000.000		dic-97	set-98	150.000.000	150.000.000		mag-97	set-98	150.000.000	150.000.000		150.000.000	150.000.000		dic-97	set-98		150.000.000	150.000.000		dic-97	set-98		150.000.000	150.000.000		dic-97	set-98	
B	15	21 Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro	Comune di Civitella S.Paolo	300.000.000	300.000.000	300.000.000		mar-97	apr-98	300.000.000	300.000.000		ott-97	dic-98	300.000.000	300.000.000		C.T.A. presso l'avvocato	C.T.A. presso l'avvocato		ott-97	dic-98	Riduzione aree per "A" per 45.800.000	254.200.000	254.200.000		ott-97	dic-98	Riduzione aree per "A" per 45.800.000	254.200.000	254.200.000		ott-97	dic-98	Riduzione aree per "A" per 45.800.000
B	15	22 Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	300.000.000	300.000.000	300.000.000		feb-97	gen-99	300.000.000	300.000.000		feb-97	gen-99	300.000.000	300.000.000		Lavori in corso	Lavori in corso		feb-97	gen-99	Riduzione aree per "A" per 25.007.114	300.000.000	300.000.000		feb-97	gen-99	Riduzione aree per "A" per 25.007.114	300.000.000	300.000.000		feb-97	gen-99	Riduzione aree per "A" per 25.007.114
B	15	23 Area archeologica della Villa Norniana (Anzio/Roma) Recupero	Comune di Anzio	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	30.000.000	mar-97	feb-98	1.400.000.000	1.400.000.000	77.000.000	mag-97	feb-98	1.400.000.000	1.400.000.000		Lavori in corso	Lavori in corso		mag-98	feb-98		1.330.000.000	1.330.000.000		mag-98	feb-98		1.330.000.000	1.330.000.000		mag-98	feb-98	
B	15	24 Sistemazione area parcheggio adiacente Parco Chigi e risanamento Parco Privati	Comune di Ariccia																																	

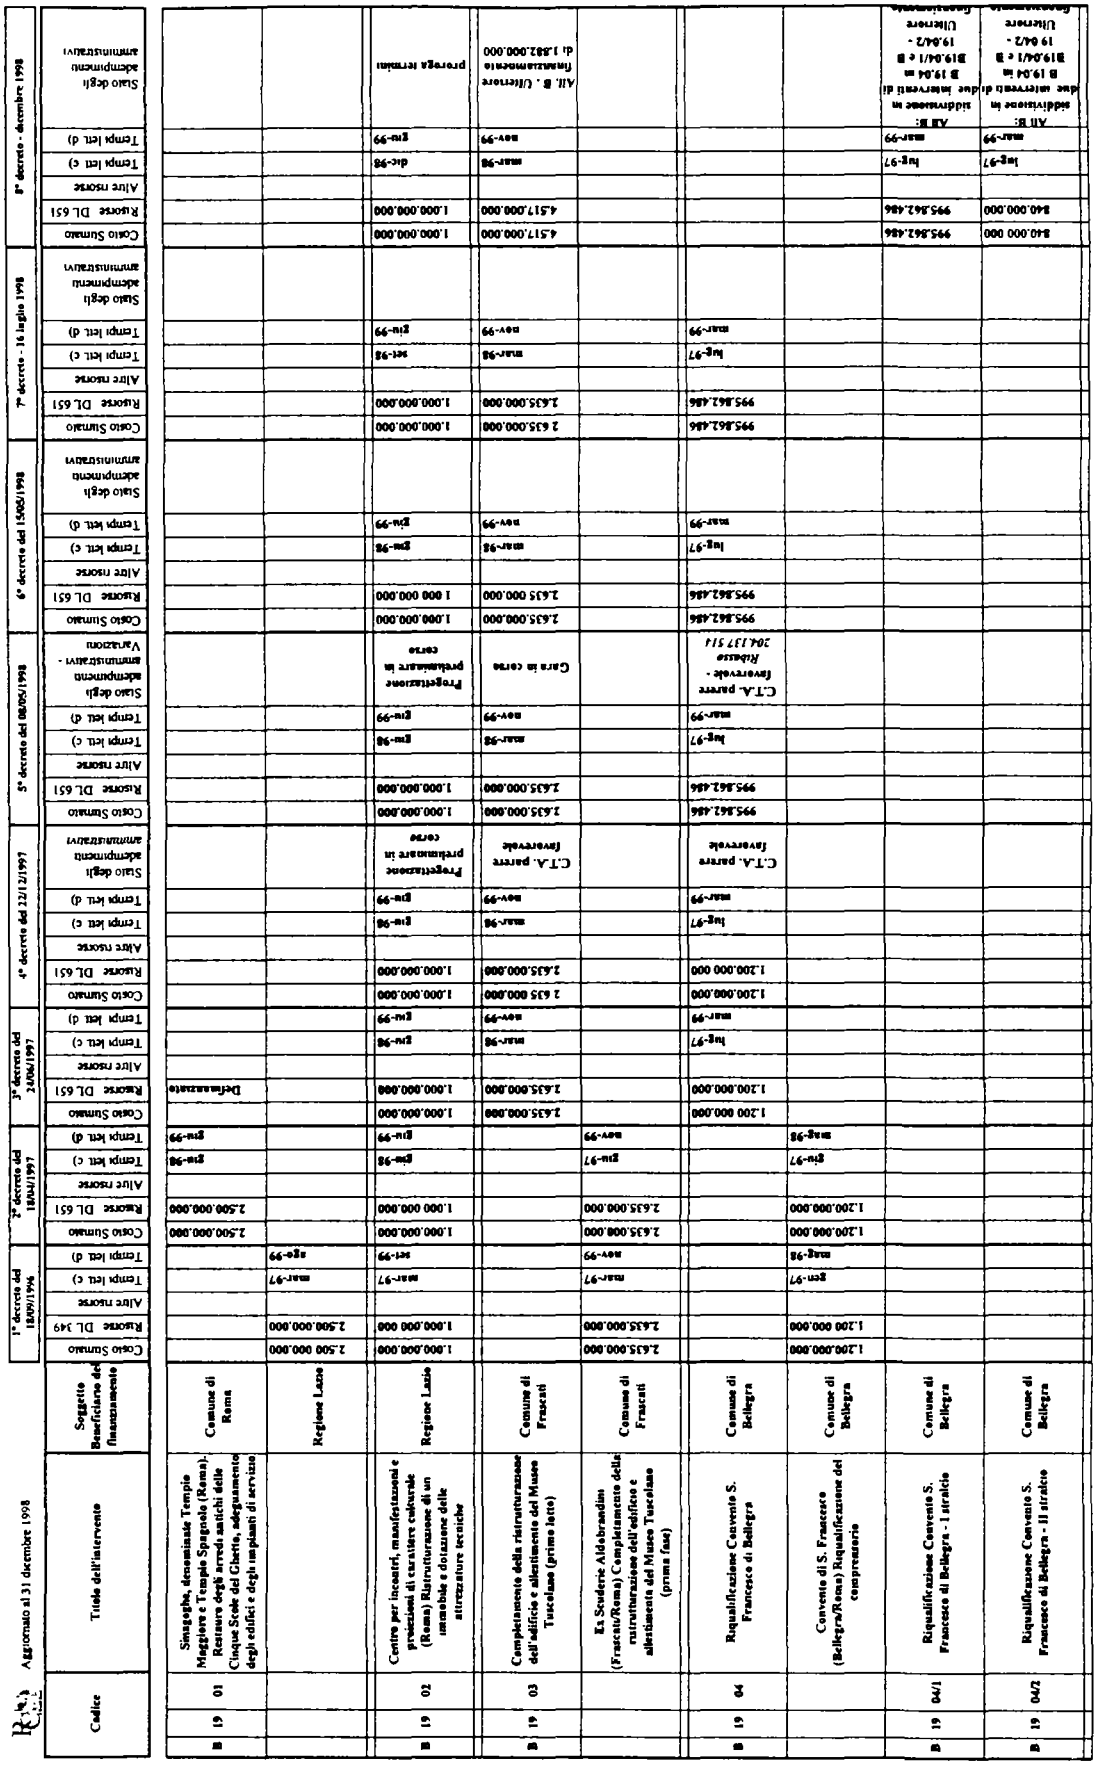

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	Stato degli adempimenti amministrativi
B 19 05	Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S.M. Novella	Comune di Bracciano	Costo Stimato	1.000.000.000	400.000.000	1.000.000.000	6.000.000.000	650.000.000	100.000.000		Richiesta assegnazioni ALI "A" per 249.887.124
			Risorse DL 349	1.400.000.000	400.000.000	1.000.000.000	6.000.000.000	650.000.000	100.000.000		
			Altre risorse								
			Temp. ist. c)	mar-97	mar-97	mar-97	mar-97	mar-97	mar-97		
			Temp. ist. d)	ago-99	giu-99	ott-99	nov-99	giu-99	giu-99		
B 19 06	Convento Agostiniani (Bracciano/Roma) Ristrutturazione	Comune di Bracciano	Costo Stimato	3.412.000.000	400.000.000	1.000.000.000	6.000.000.000	650.000.000	100.000.000		
			Risorse DL 651	1.400.000.000	400.000.000	1.000.000.000	6.000.000.000	650.000.000	100.000.000		
			Altre risorse	2.012.000.000							
			Temp. ist. c)	lug-97	ago-97	lug-97	dic-97	giu-98	ago-97		
			Temp. ist. d)	ago-99	giu-99	ott-99	nov-99	giu-99	giu-99		
B 19 07	Restauro conservativo della Cappella votiva di S. Bellardino	Comune di Treviglianno	Costo Stimato	402.000.000	402.000.000	1.000.000.000	6.000.000.000	650.000.000	100.000.000		
			Risorse DL 651	402.000.000	402.000.000	1.000.000.000	6.000.000.000	650.000.000	100.000.000		
			Altre risorse								
			Temp. ist. c)	nov-97	nov-97	set-97	dic-97	dic-97	dic-97		
			Temp. ist. d)	ott-98	ott-98	dic-98	dic-99	giu-99	giu-99		
B 19 08	Chiesa di San Bernardino (Treviglianno/Roma) Consolidamento strutturale e restauro conservativo	Comune di Treviglianno	Costo Stimato	402.000.000	402.000.000	1.000.000.000	6.000.000.000	650.000.000	100.000.000		
			Risorse DL 651	402.000.000	402.000.000	1.000.000.000	6.000.000.000	650.000.000	100.000.000		
			Altre risorse								
			Temp. ist. c)	nov-97	nov-97	set-97	dic-97	dic-97	dic-97		
			Temp. ist. d)	ott-98	ott-98	dic-98	dic-99	giu-99	giu-99		
B 19 09	Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima fase)	Comune di Anguillara Sabazia	Costo Stimato	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	6.000.000.000	650.000.000	100.000.000		Richiesta assegnazioni ALI "A" per 55.630.924 - ALI B: Integrazione finanziamento di 50.665.000
			Risorse DL 651	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	6.000.000.000	650.000.000	100.000.000		
			Altre risorse								
			Temp. ist. c)	mar-97	apr-98	set-97	dic-97	dic-97	dic-97		
			Temp. ist. d)	ott-99	giu-99	dic-98	dic-99	giu-99	giu-99		
B 19 08	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi	Comune di Genazzano	Costo Stimato	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	650.000.000	100.000.000		
			Risorse DL 651	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	650.000.000	100.000.000		
			Altre risorse								
			Temp. ist. c)	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97		
			Temp. ist. d)	nov-99	nov-99	dic-99	dic-99	giu-99	giu-99		
B 19 09	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi, prima fase (vedi anche intervento B 12.16)	Comune di Genazzano	Costo Stimato								
			Risorse DL 651								
			Altre risorse								
			Temp. ist. c)								
			Temp. ist. d)								
B 19 09	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	Costo Stimato	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	100.000.000		Richiesta assegnazioni ALI "A" per 101.170.647
			Risorse DL 651	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	100.000.000		
			Altre risorse								
			Temp. ist. c)	mar-98	mar-98	set-98	set-98	set-98	set-98		
			Temp. ist. d)	ott-99	ott-99	apr-99	apr-99	apr-99	apr-99		
B 19 10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	Costo Stimato								
			Risorse DL 651								
			Altre risorse								
			Temp. ist. c)								
			Temp. ist. d)								

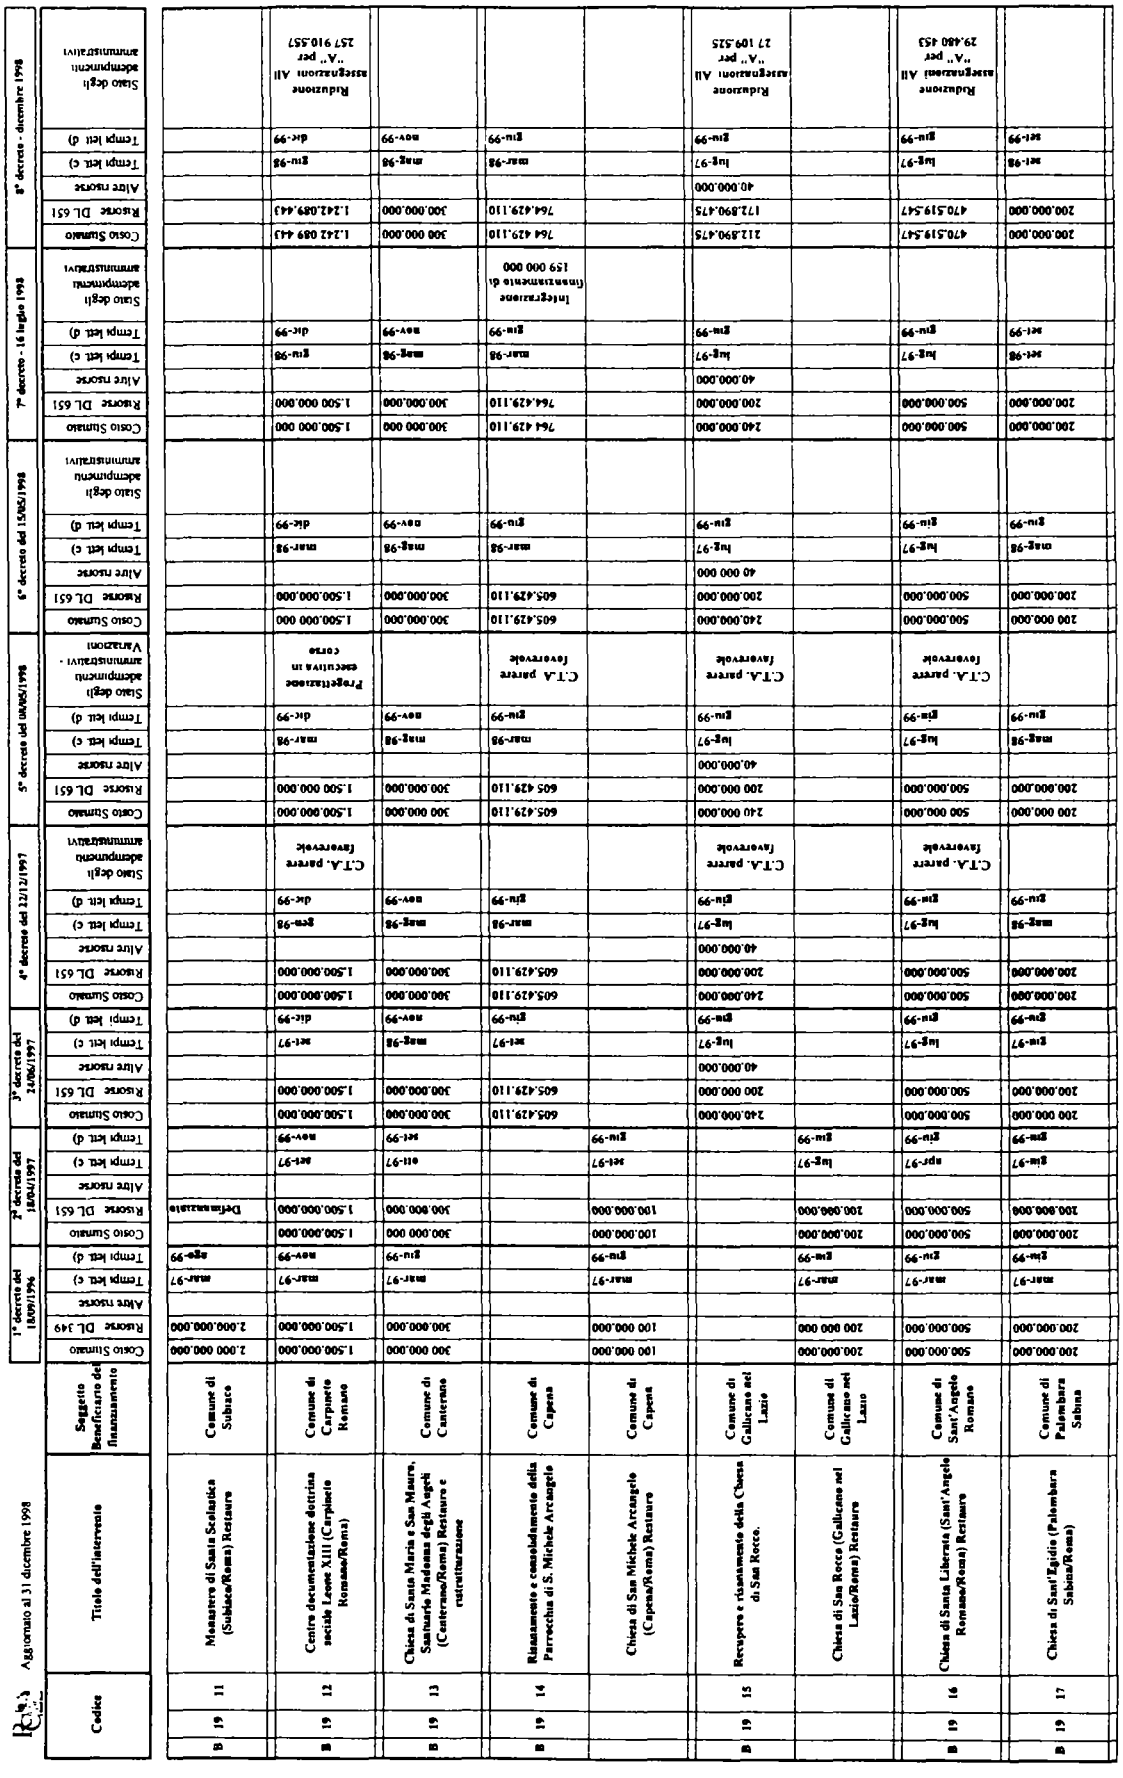

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996					2° decreto del 18/04/1997					3° decreto del 24/06/1997					4° decreto del 22/12/1997					5° decreto del 08/05/1998					6° decreto del 15/06/1998					7° decreto - 16 luglio 1998					8° decreto - dicembre 1998				
					Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	19	18	Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche	Comune di Vicovaro		150.000.000		mar.-97	gen-99	150.000.000			mar.-97	gen-99	150.000.000			mar.-98	mag-98	150.000.000			mar.-98	mag-98	Progettazione definitiva	150.000.000			mar.-98	mag-98													
B	19		Orsi francescana di San Cosimato (Vicovaro/Roma) Restauro del convento	Comune di Vicovaro		150.000.000		gen-97	gen-99	150.000.000			lug-97	gen-99	150.000.000			gen-97	gen-99	150.000.000			gen-97	gen-99		150.000.000			gen-97	gen-99													
B	19	19	Santuario di Vallepietra (Vallepietra/Roma) Centro di documentazione	Comune di Vallepietra		65.000.000		gen-97	dic-98	65.000.000			gen-97	dic-98	65.000.000			gen-97	dic-98	65.000.000			gen-97	dic-98		65.000.000			gen-97	dic-98		65.000.000			lug-98	dic-98		65.000.000			dic-98	nov-98	
B	19	20	Chiese e palazzi lungo la via Francigena (Capranica/Viterbo) Restauro delle chiese e delle opere d'arte e ristrutturazione degli immobili (prima fase)	Comune di Capranica		3.700.000.000		dic-97	sep-99	3.700.000.000			dic-97	sep-99	3.700.000.000																												
B	19		Chiese e palazzi lungo la via Francigena (Capranica/Viterbo) *Restauro delle chiese e delle opere d'arte e ristrutturazione degli immobili*	Comune di Capranica		3.700.000.000			sep-99	3.700.000.000																																
B	19	20/1	Restauro della Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica																402.274.000	712.504.000	518.246.000	920.925.000																				
B	19	20/2	Restauro della Chiese di S. Terenziano (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica																402.274.000	712.504.000	518.246.000	920.925.000																				
B	19	20/3	Pavimentazione del Corso Petrarca ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capranica/ Viterbo)	Comune di Capranica																372.274.000	627.504.000	445.246.000	820.925.000																				
B	19	20/4	Sistemazione di Via della Mattesara (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica																372.274.000	627.504.000	445.246.000	820.925.000																				

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	Stato degli adempimenti amministrativi
B 19 20/5	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	Costo Sumaio			Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	
			Risorse DL 349			Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	
						Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	
			Tempi lett c)			Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	
			Tempi lett d)			Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	
B 19 20/6	Sistemazione dell piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	Costo Sumaio			Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	
			Risorse DL 651			Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	
						Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	
			Tempi lett c)			Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	
			Tempi lett d)			Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	
B 19 21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesiano	Diocesi di Viterbo	Costo Sumaio			Risorse DL 651	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	
						Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	
			Tempi lett c)			Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	
			Tempi lett d)			Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	
		Provincia di Viterbo									
		Provincia di Viterbo									
B 19 22	Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Gesù	Costo Sumaio			Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	
			Risorse DL 349			Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	
						Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	
			Tempi lett c)			Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	
			Tempi lett d)			Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	
		Provincia di Viterbo									
B 19 23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo	Costo Sumaio			Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	
			Risorse DL 349			Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	
						Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	
			Tempi lett c)			Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	
			Tempi lett d)			Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	
		Provincia di Viterbo									
B 19	Museo della cristianità viterbese (Viterbo) Restauro e ristrutturazione dei locali e dei materiali espositivi (prima fase)	Comune di Viterbo	Costo Sumaio			Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	
			Risorse DL 349			Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	
						Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	
			Tempi lett c)			Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	
			Tempi lett d)			Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	Stato degli adempimenti amministrativi
B 19 20/5	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica					Progettazione esecutiva in corso				
B 19 20/6	Sistemazione dell piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica					Progettazione esecutiva in corso				
B 19 21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesiano	Diocesi di Viterbo					C.T.A. parere favorevole			Riduzione assegnazioni All "A" per 429.895.640	
		Provincia di Viterbo									
		Provincia di Viterbo									
B 19 22	Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Gesù				C.T.A. parere favorevole	Gara in corso		Riduzione assegnazioni All "A2" per 33.046.692		
		Provincia di Viterbo									
B 19 23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo				Conferenze di Servizi su progetti definitivi	Conferenze di Servizi su progetti definitivi		Riduzione assegnazioni All "A2" per 121.188.522	All B: Interessamento di finanziamento di 249.600.000	
B 19	Museo della cristianità viterbese (Viterbo) Restauro e ristrutturazione dei locali e dei materiali espositivi (prima fase)	Comune di Viterbo									

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	Stato degli adempimenti amministrativi
B 19 20/5	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.878.811.478	1.128.411.478	
			2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.366.953.308	2.366.953.308	
			dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	
			dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	
B 19 20/6	Sistemazione dell piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.878.811.478	1.128.411.478	
			2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.366.953.308	2.366.953.308	
			dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	
			dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	
B 19 21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesiano	Diocesi di Viterbo	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.878.811.478	1.128.411.478	
			2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.366.953.308	2.366.953.308	
			dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	
			dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	
		Provincia di Viterbo									
		Provincia di Viterbo									
B 19 22	Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Gesù	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.878.811.478	1.128.411.478	
			2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.366.953.308	2.366.953.308	
			dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	
			dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	
		Provincia di Viterbo									
B 19 23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.878.811.478	1.128.411.478	
			2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.366.953.308	2.366.953.308	
			dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	
			dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	
		Provincia di Viterbo									
B 19	Museo della cristianità viterbese (Viterbo) Restauro e ristrutturazione dei locali e dei materiali espositivi (prima fase)	Comune di Viterbo	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.878.811.478	1.128.411.478	
			2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.366.953.308	2.366.953.308	
			dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	dic-97	
			dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	Stato degli adempimenti amministrativi
B 19 20/5	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica									
B 19 20/6	Sistemazione dell piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica									
B 19 21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesiano	Diocesi di Viterbo									
		Provincia di Viterbo									
		Provincia di Viterbo									
B 19 22	Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Gesù									
		Provincia di Viterbo									
B 19 23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo									
		Provincia di Viterbo									
B 19	Museo della cristianità viterbese (Viterbo) Restauro e ristrutturazione dei locali e dei materiali espositivi (prima fase)	Comune di Viterbo									

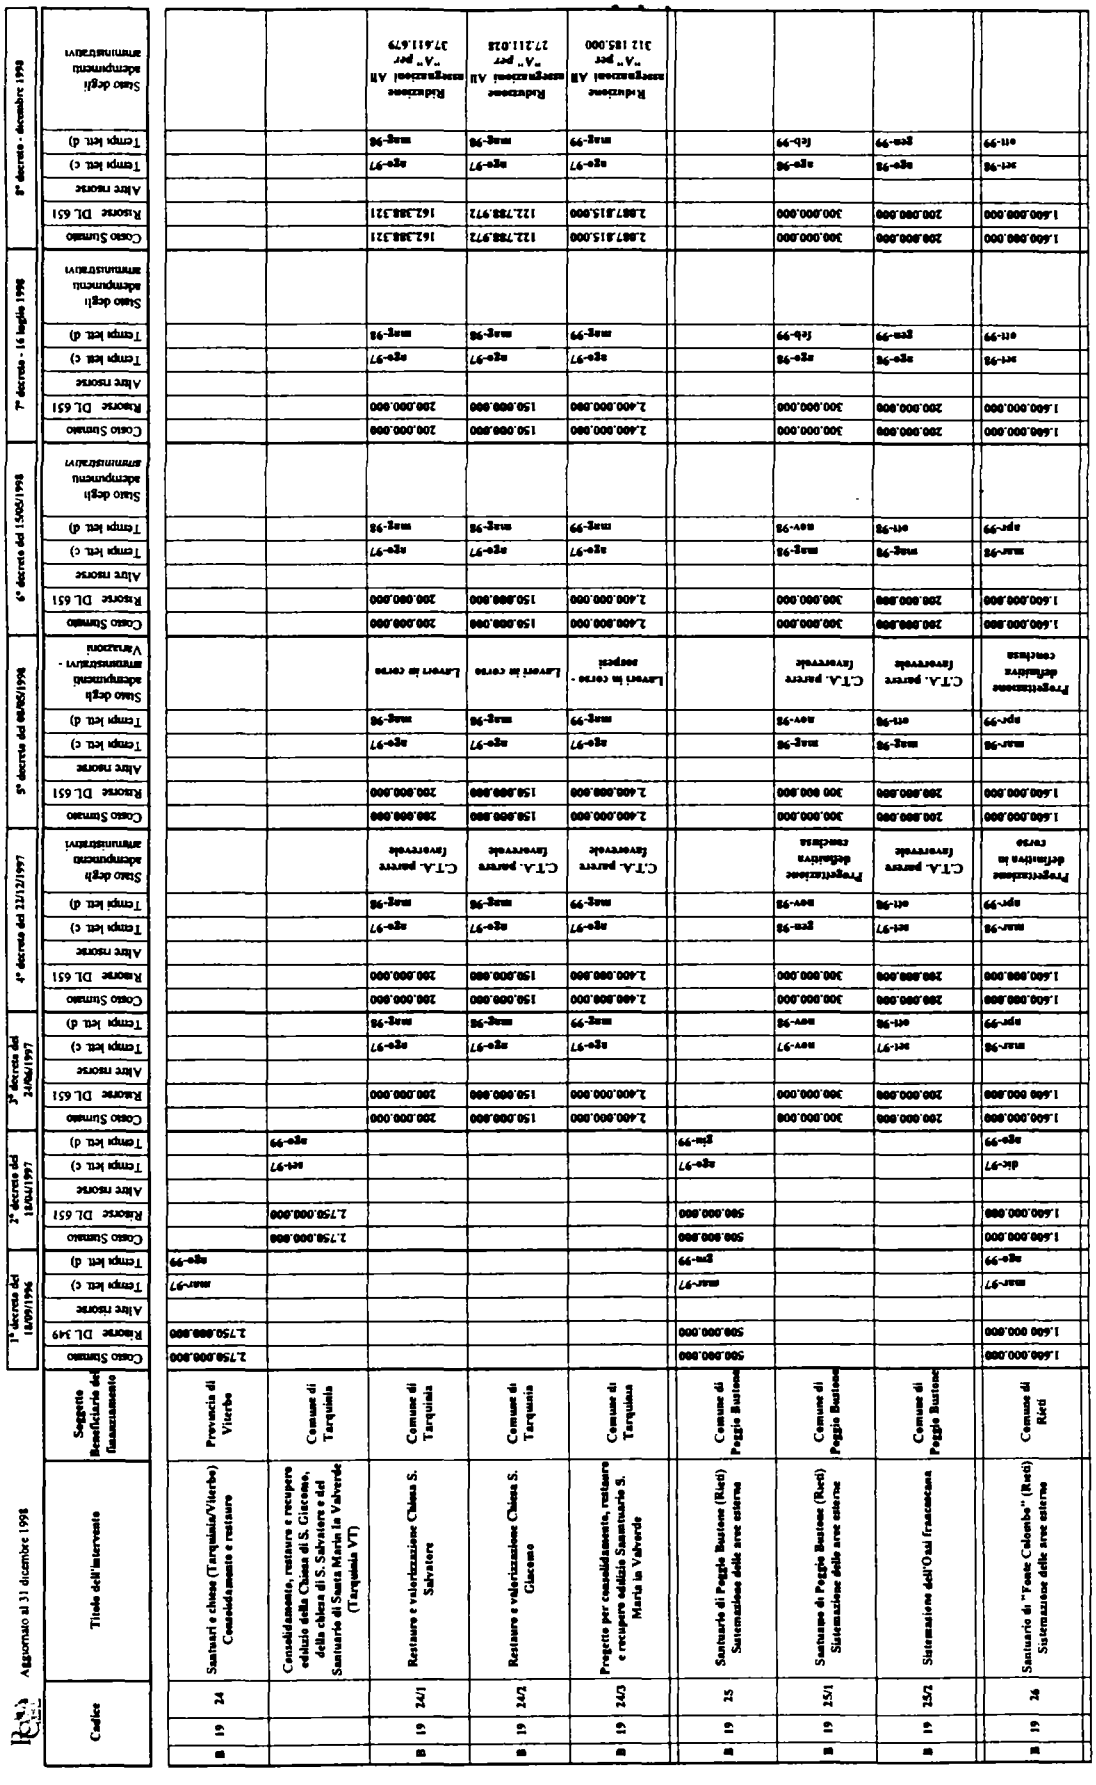

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
B 19 24	Santuari e chiese (Tarquinia/Viterbo) Consolidamento e restauro	Provincia di Viterbo								Stato degli adempimenti amministrativi
	Altre risorse									
	Tempi ist. c)									
	Tempi ist. d)									
	Risorse DL 349		2.750.000.000							
	Costo Sommario		2.750.000.000							
B 19 24/1	Consolidamento, restauro e recupero edilizio della Chiesa di S. Giacomo, della chiesa di S. Salvatore e del Santuario di Santa Maria in Valverde (Tarquinia VT)	Comune di Tarquinia								
	Altre risorse									
	Tempi ist. c)									
	Tempi ist. d)									
	Risorse DL 651		2.750.000.000							
	Costo Sommario		2.750.000.000							
B 19 24/2	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	Comune di Tarquinia								Riduzione aspettative "A" per 37.611.679
	Altre risorse									
	Tempi ist. c)									
	Tempi ist. d)									
	Risorse DL 651									
	Costo Sommario									
B 19 24/3	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Tarquinia								Riduzione aspettative "A" per 27.311.028
	Altre risorse									
	Tempi ist. c)									
	Tempi ist. d)									
	Risorse DL 651									
	Costo Sommario									
B 19 24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edilizio Santuario S. Maria in Valverde	Comune di Tarquinia								Riduzione aspettative "A" per 312.185.000
	Altre risorse									
	Tempi ist. c)									
	Tempi ist. d)									
	Risorse DL 651									
	Costo Sommario									
B 19 25	Santuario di Peggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Peggio Bustone								
	Altre risorse									
	Tempi ist. c)									
	Tempi ist. d)									
	Risorse DL 651									
	Costo Sommario									
B 19 25/1	Santuario di Peggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Peggio Bustone								
	Altre risorse									
	Tempi ist. c)									
	Tempi ist. d)									
	Risorse DL 651									
	Costo Sommario									
B 19 25/2	Sistemazione dell'Oasi francescana	Comune di Peggio Bustone								
	Altre risorse									
	Tempi ist. c)									
	Tempi ist. d)									
	Risorse DL 651									
	Costo Sommario									
B 19 26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti								
	Altre risorse									
	Tempi ist. c)									
	Tempi ist. d)									
	Risorse DL 651									
	Costo Sommario									

Aggiornato al 31 dicembre 1998

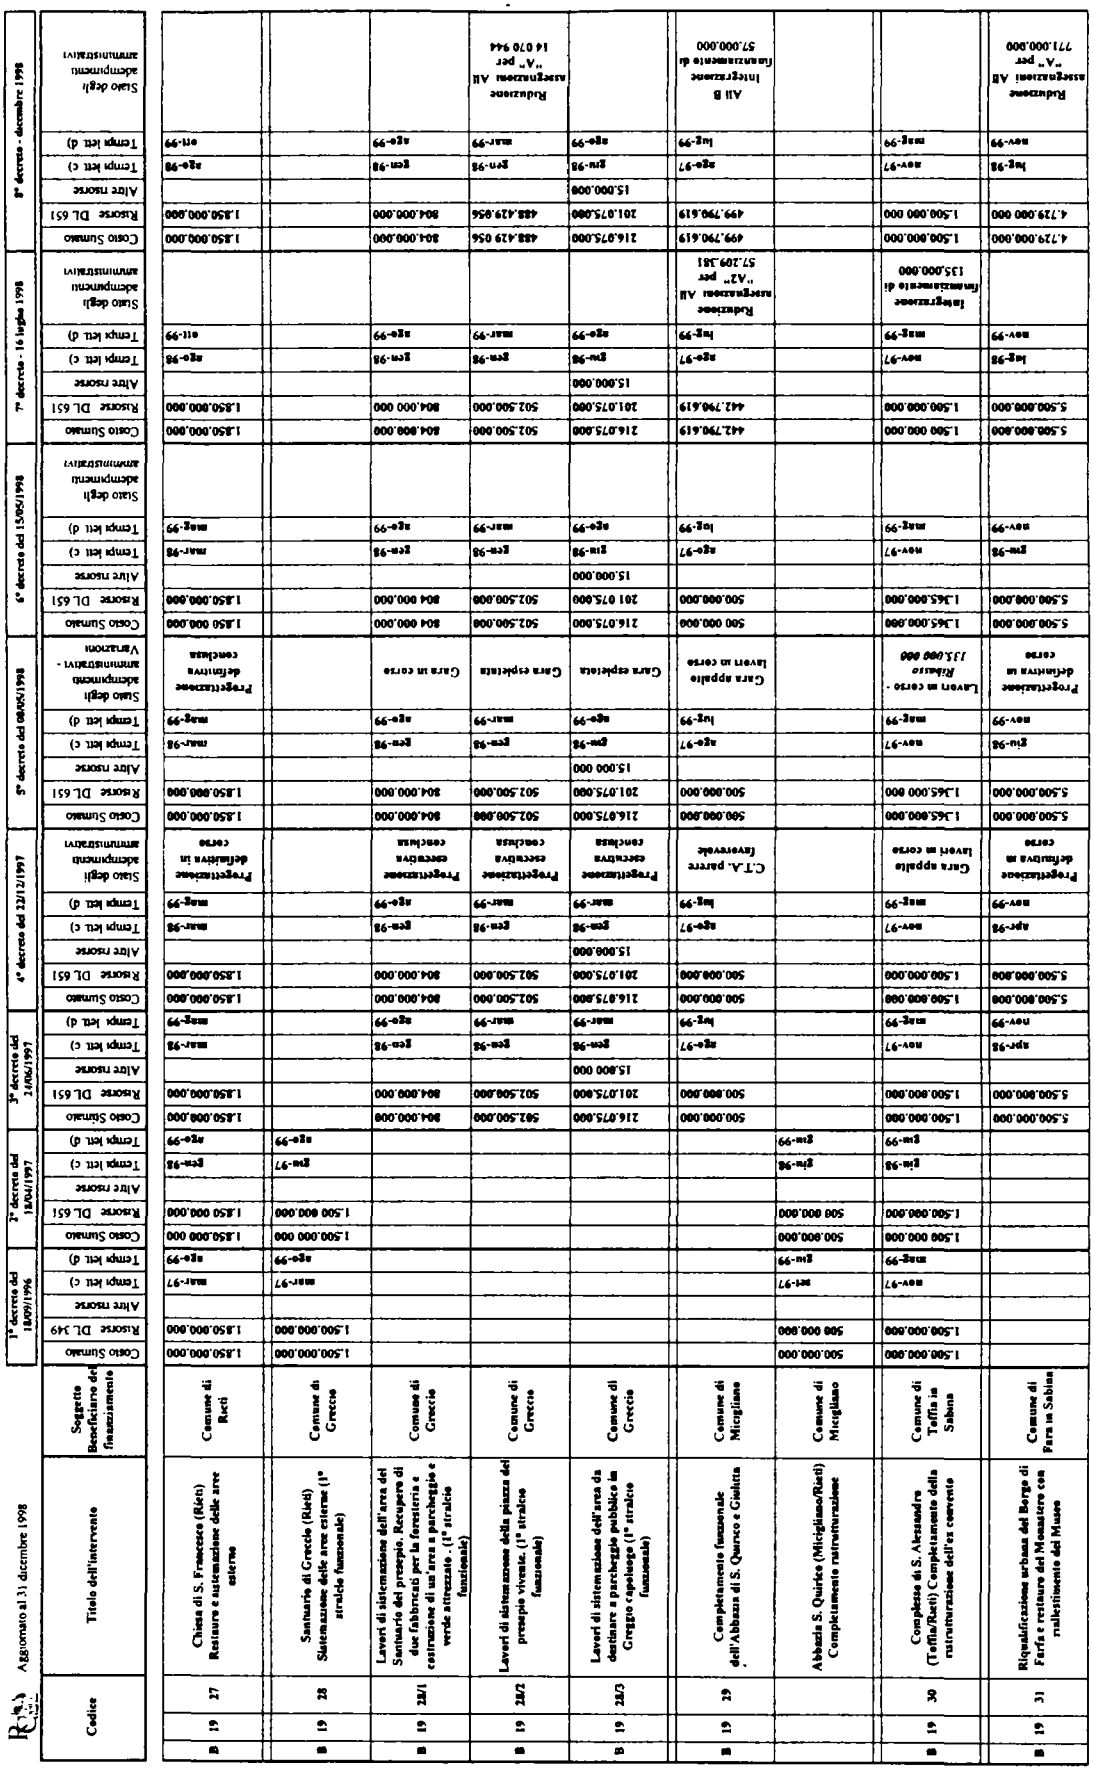

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/08/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
			Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi
B 19 32	Abbazia di Farfa (Fara in Sabina/Rieti) Restauro del monastero, riallestimento del museo e riqualificazione urbanistica del Borgo	Comune di Fara in Sabina								
	Costo Comune		5.500.000.000	400.000.000			400.000.000			
	Risorse DL 249		5.500.000.000	400.000.000			400.000.000			
	Altre risorse									
	Costo Stimato		nov-97	mar-97		mar-97				
	Tempi Ist. d)		mag-99	giu-99		giu-99				
B 19 33	S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S.Carlo da Sezze	Comune di Sezze								
	Costo Stimato		5.500.000.000	400.000.000			400.000.000			
	Risorse DL 651		5.500.000.000	400.000.000			400.000.000			
	Altre risorse									
	Tempi Ist. c)		feb-98	lug-97						
	Tempi Ist. d)		mag-99	giu-99						
B 19 33	Monastero della Clarisse (Sezze/Latina) Completamento della ristrutturazione (prima fase)	Provincia di Latina								
	Costo Stimato						2.000.000.000			
	Risorse DL 651						2.000.000.000			
	Altre risorse						3.000.000.000			
	Tempi Ist. c)						dic-98			
	Tempi Ist. d)						dic-99			
B 19 33		Comune di Sezze								
	Costo Stimato						2.000.000.000			
	Risorse DL 651						2.000.000.000			
	Altre risorse						3.000.000.000			
	Tempi Ist. c)						dic-98			
	Tempi Ist. d)						dic-99			
B 19 34	Lavori di consolidamento restauro Chiesa S. Maria della Pietà collegiata	Comune di Cori								
	Costo Stimato						1.000.000.000			
	Risorse DL 651						1.000.000.000			
	Altre risorse						3.000.000.000			
	Tempi Ist. c)						dic-97			
	Tempi Ist. d)						mag-99			
	Costo Stimato						1.000.000.000			
	Risorse DL 651						1.000.000.000			
	Altre risorse						3.000.000.000			
	Tempi Ist. c)						dic-98			
	Tempi Ist. d)						dic-99			
B 19 34	Chiesa di S. Maria della Pietà (Cori/Latina) Ristrutturazione (prima fase)	Comune di Cori								
	Costo Stimato						1.000.000.000			
	Risorse DL 651						1.000.000.000			
	Altre risorse									
	Tempi Ist. c)						mar-97			
	Tempi Ist. d)						giu-99			
B 19 35	Itinerario storico naturalistico P.R.U.M.O. Comune di Gaeta ambito area marittima aperta della Città Vecchia di Gaeta e del promontorio di Monte Orlando	Comune di Gaeta								
	Costo Stimato						1.000.000.000			
	Risorse DL 651						1.000.000.000			
	Altre risorse									
	Tempi Ist. c)						giu-97			
	Tempi Ist. d)						mar-99			
B 19 35	Parco Monte Orlando (Gaeta/Latina) Realizzazione di un itinerario storico naturalistico (1° stralcio funzionale)	Comune di Gaeta								
	Costo Stimato						1.000.000.000			
	Risorse DL 651						1.000.000.000			
	Altre risorse									
	Tempi Ist. c)						mar-97			
	Tempi Ist. d)						giu-99			
B 19 36	Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina) Sistemazione via e parcheggio	Comune di Fondi								
	Costo Stimato						1.000.000.000			
	Risorse DL 651						1.000.000.000			
	Altre risorse									
	Tempi Ist. c)						apr-94			
	Tempi Ist. d)						giu-99			

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
											Stato degli adempimenti amministrativi
				Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio
				375.000.000	375.000.000	125.000.000	125.000.000	105.593.680	105.593.680	105.593.680	105.593.680
				Risorse DL 346	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651
				250.000.000	250.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	130.642.227	130.642.227
				250.000.000	250.000.000	235.000.000	235.000.000	235.000.000	235.000.000	224.855.727	224.855.727
				683.400.000	683.400.000	683.400.000	683.400.000	683.400.000	683.400.000	683.400.000	683.400.000
				1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
				200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
				1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
				mar-97	mar-97						
				mar-97	mar-97						

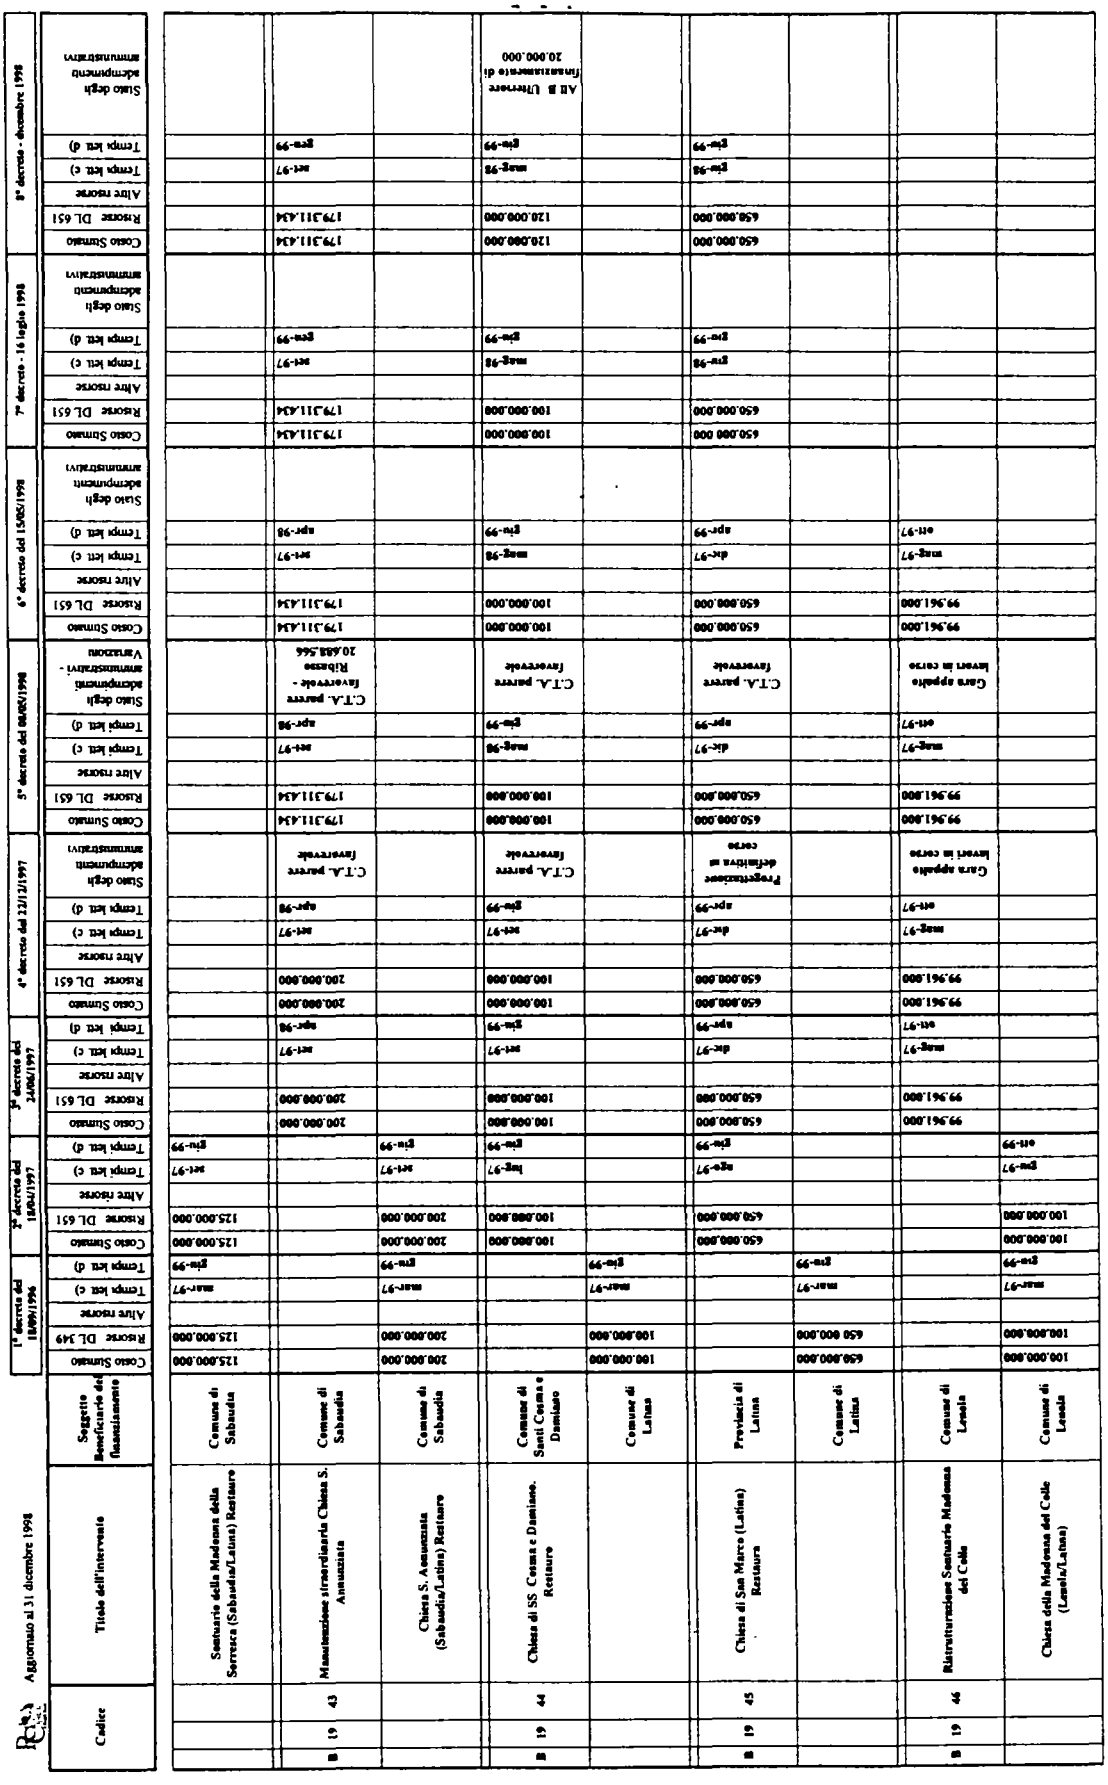

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 23/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
			Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato
			Risorse DL 349	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651
			Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse
			Tempi Istr. c)	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. c)
			Tempi Istr. d)	Tempi Istr. d)	Tempi Istr. d)	Tempi Istr. d)	Tempi Istr. d)	Tempi Istr. d)	Tempi Istr. d)	Tempi Istr. d)
			Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi
19	Santuario della Madonna della Sorresca (Sabaudia/Latina) Restauro	Comune di Sabaudia	125.000.000	125.000.000	200.000.000	Gara appalto lavori in corso	99.961.000	99.961.000		
			125.000.000	125.000.000	200.000.000	99.961.000	99.961.000	99.961.000		
19	Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata	Comune di Sabaudia			200.000.000	C.T.A. parere favorevole	C.T.A. parere favorevole - Ribasso 20.688.566	179.311.434	179.311.434	179.311.434
					200.000.000	C.T.A. parere favorevole	C.T.A. parere favorevole	179.311.434	179.311.434	179.311.434
19	Chiesa S. Annunziata (Sabaudia/Latina) Restauro	Comune di Sabaudia		200.000.000	200.000.000	Frequentazione dell'aula in corso	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000
				200.000.000	200.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000
19	Chiesa di SS. Cosma e Damiano. Restauro	Comune di Santi Cosma e Damiano		100.000.000	100.000.000	C.T.A. parere favorevole	C.T.A. parere favorevole	100.000.000	100.000.000	120.000.000
				100.000.000	100.000.000	C.T.A. parere favorevole	C.T.A. parere favorevole	100.000.000	100.000.000	120.000.000
19	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro	Provincia di Latina								
19	Ristrutturazione Santuario Madonna del Colle	Comune di Lenola								
19	Chiesa della Madonna del Colle (Lenola/Latina)	Comune di Lenola								

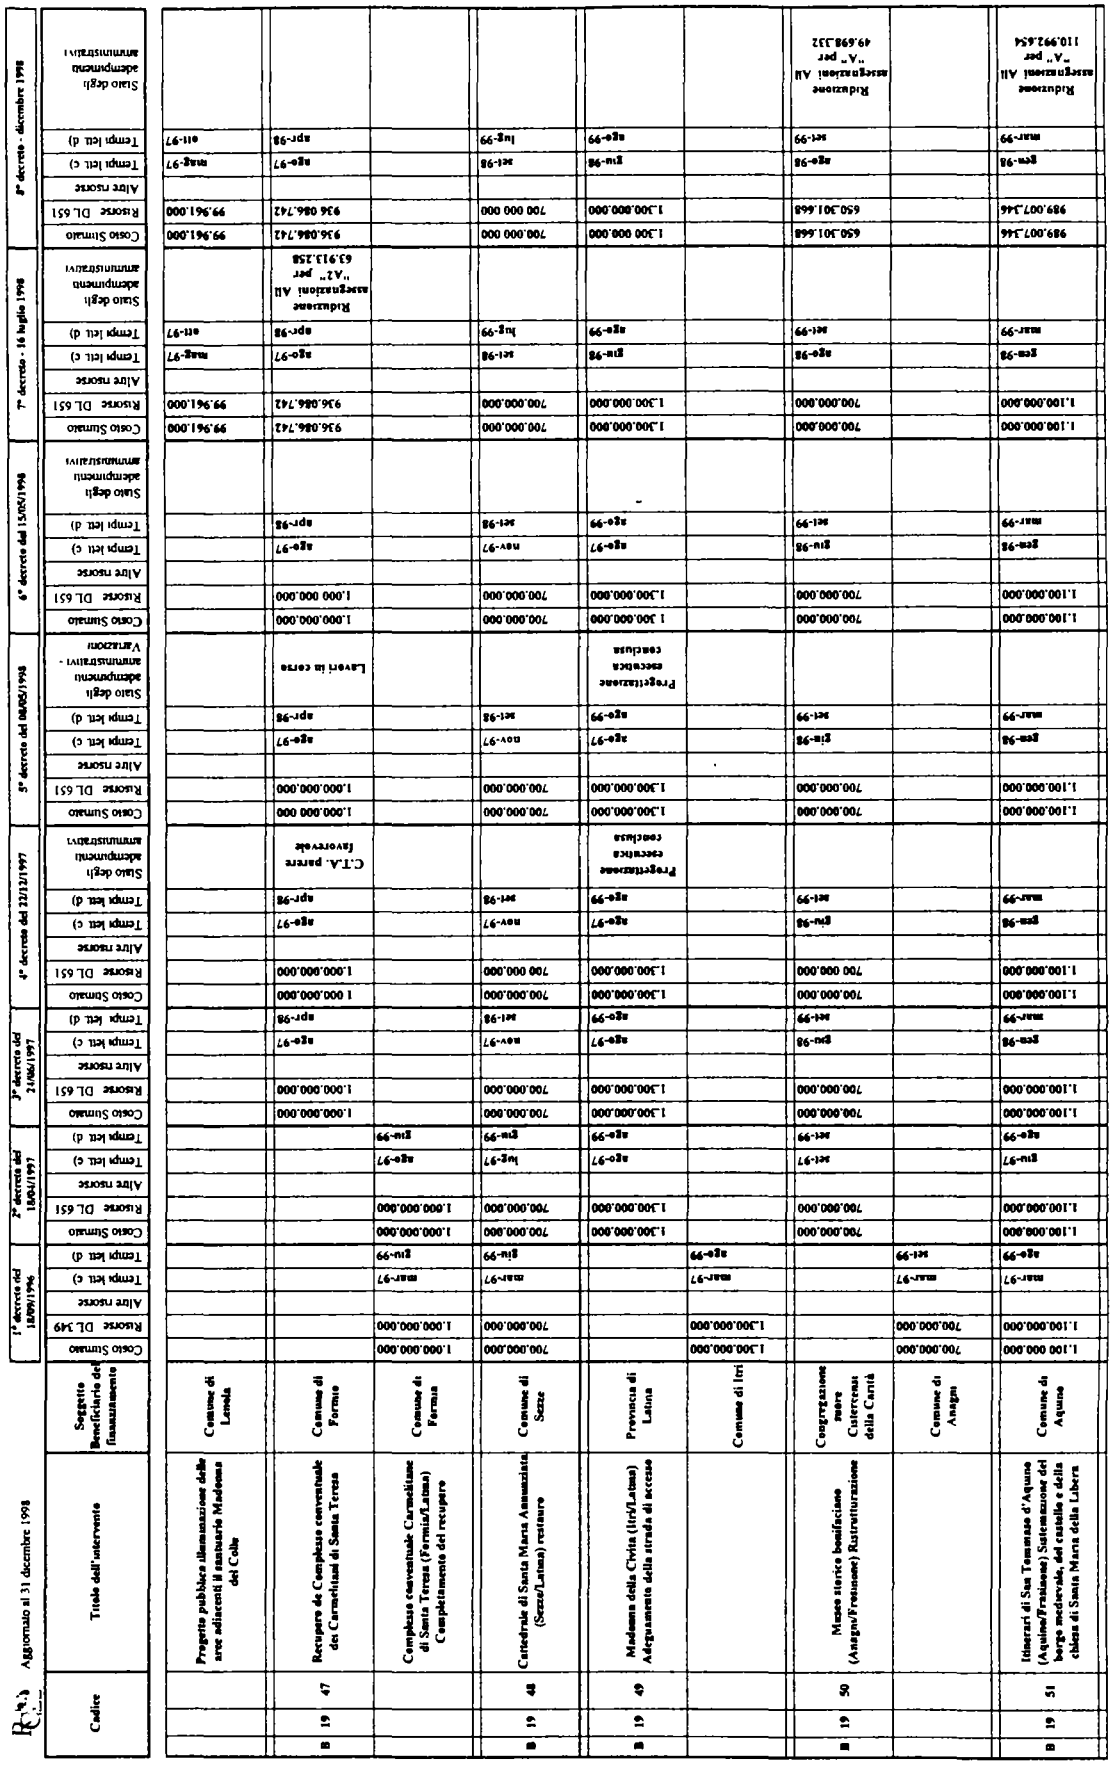

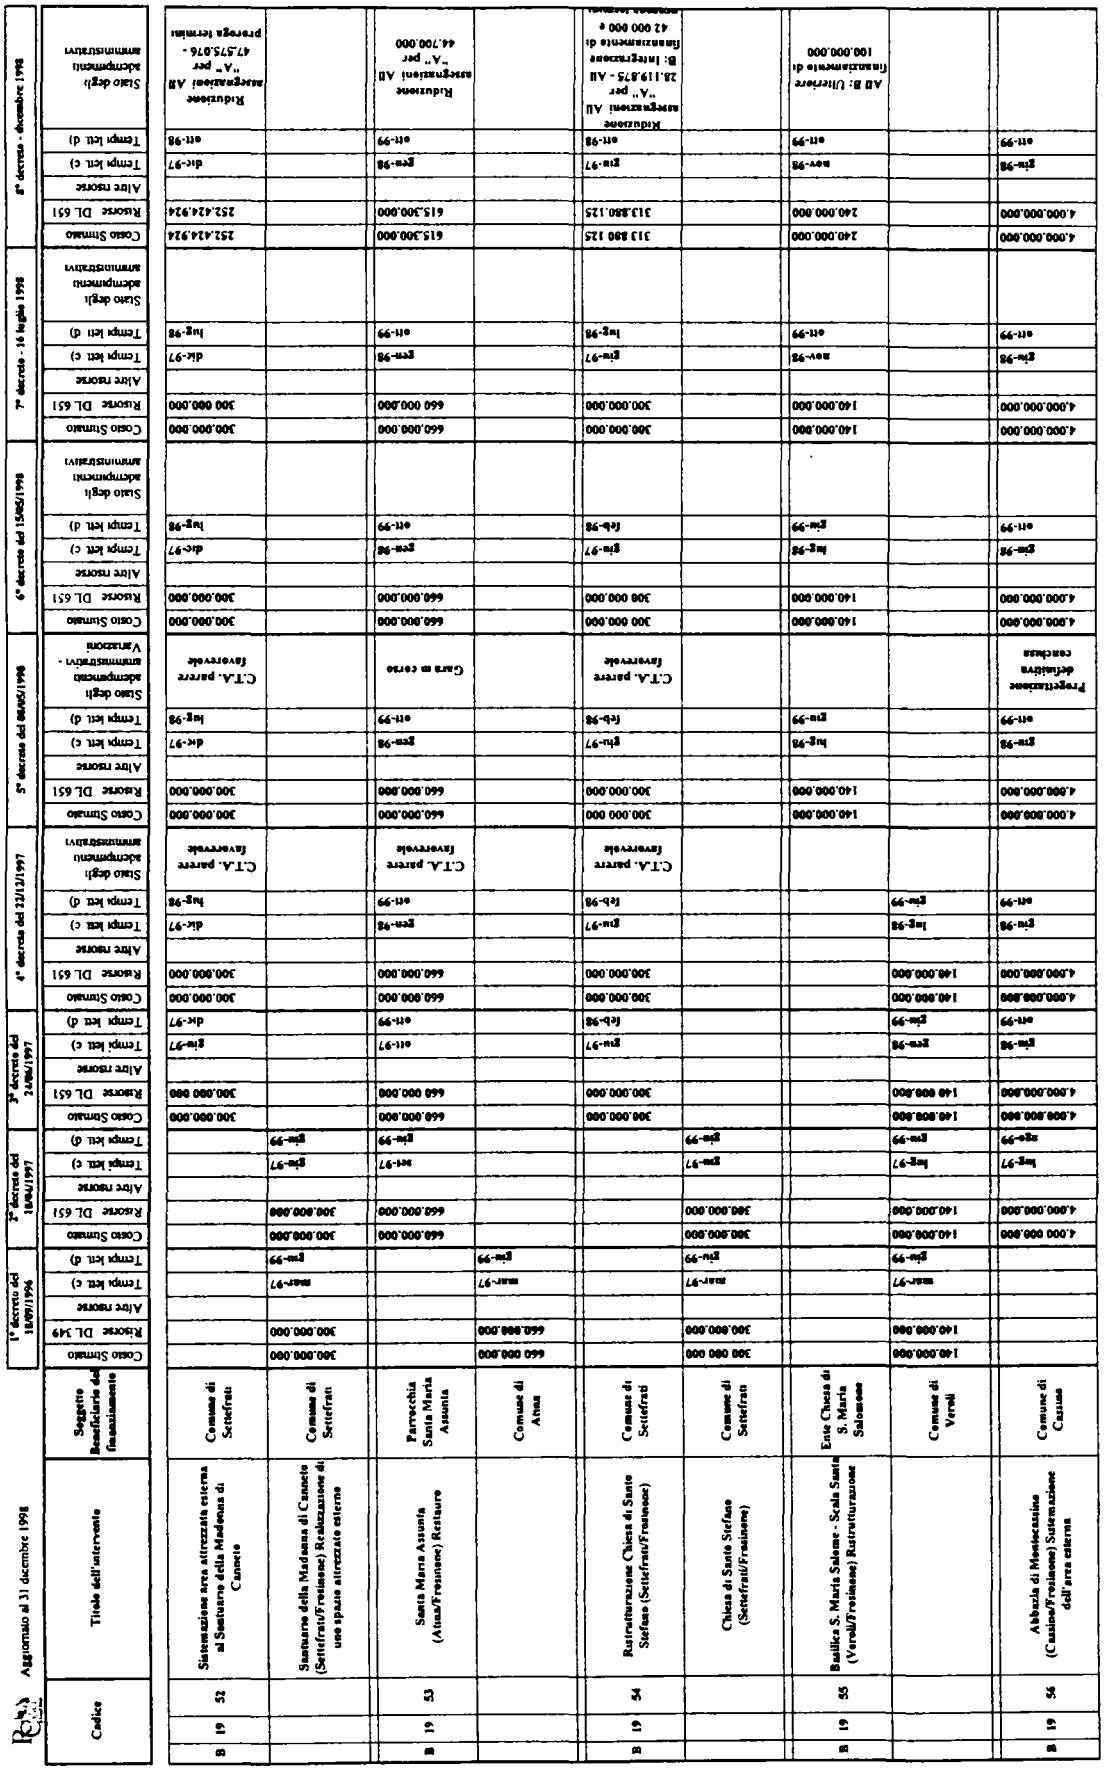

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/06/1998	6° decreto del 15/06/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
B 19 52	Sistemazione area attrezzata esterna al Santuario della Madonna di Canneto	Comune di Settefrati	Costo Stimato Risorse DL 349 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione autorizzazioni A.U. "A" per 47.575.076 - proroga termini
B 19 53	Santuario della Madonna di Canneto (Settefrati/Frosinone) Realizzazione di uno spazio attrezzato esterno	Comune di Settefrati	300.000.000 300.000.000 mar-97 gen-99	300.000.000 300.000.000 gen-97 gen-99	660.000.000 660.000.000 gen-97 gen-99	C.T.A. parere favorevole 660.000.000 gen-98 gen-99	Gara in corso 660.000.000 gen-98 gen-99	660.000.000 660.000.000 gen-98 gen-99	615.300.000 615.300.000 gen-98 gen-99	
B 19 53	Santa Maria Assunta (Alvito/Frosinone) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	660.000.000 660.000.000 mar-97	660.000.000 660.000.000 gen-97	660.000.000 660.000.000 gen-97	C.T.A. parere favorevole 660.000.000 gen-98 gen-99	Gara in corso 660.000.000 gen-98 gen-99	660.000.000 660.000.000 gen-98 gen-99	615.300.000 615.300.000 gen-98 gen-99	Riduzione autorizzazioni A.U. "A" per 44.700.000
		Comune di Alvito								
B 19 54	Ristrutturazione Chiesa di Santo Stefano (Settefrati/Frosinone)	Comune di Settefrati	300.000.000 300.000.000 mar-97 gen-99	300.000.000 300.000.000 gen-97 gen-99	300.000.000 300.000.000 gen-97 feb-98	C.T.A. parere favorevole 300.000.000 feb-98 gen-99	C.T.A. parere favorevole 300.000.000 feb-98 gen-99	300.000.000 300.000.000 feb-98 gen-99	313.880.125 313.880.125 gen-98 gen-99	Riduzione autorizzazioni A.U. "A" per 28.119.875 - A.U. B: Integrazione finanziamento di 42.000.000 €
		Comune di Settefrati								
B 19 55	Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	Ente Chiesa di S. Maria Salomone	140.000.000 140.000.000 mar-97 gen-99	140.000.000 140.000.000 gen-97 gen-99	140.000.000 140.000.000 gen-97 gen-99	140.000.000 140.000.000 gen-98 gen-99	140.000.000 140.000.000 gen-98 gen-99	140.000.000 140.000.000 gen-98 gen-99	240.000.000 240.000.000 nov-98 ott-99	A.U. B: Ulteriore finanziamento di 100.000.000
		Comune di Veroli								
B 19 56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	140.000.000 140.000.000 mar-97 gen-99	140.000.000 140.000.000 gen-97 gen-99	140.000.000 140.000.000 gen-97 gen-99	140.000.000 140.000.000 gen-98 gen-99	140.000.000 140.000.000 gen-98 gen-99	140.000.000 140.000.000 gen-98 gen-99	240.000.000 240.000.000 nov-98 ott-99	252.424.924 252.424.924 gen-98 ott-98

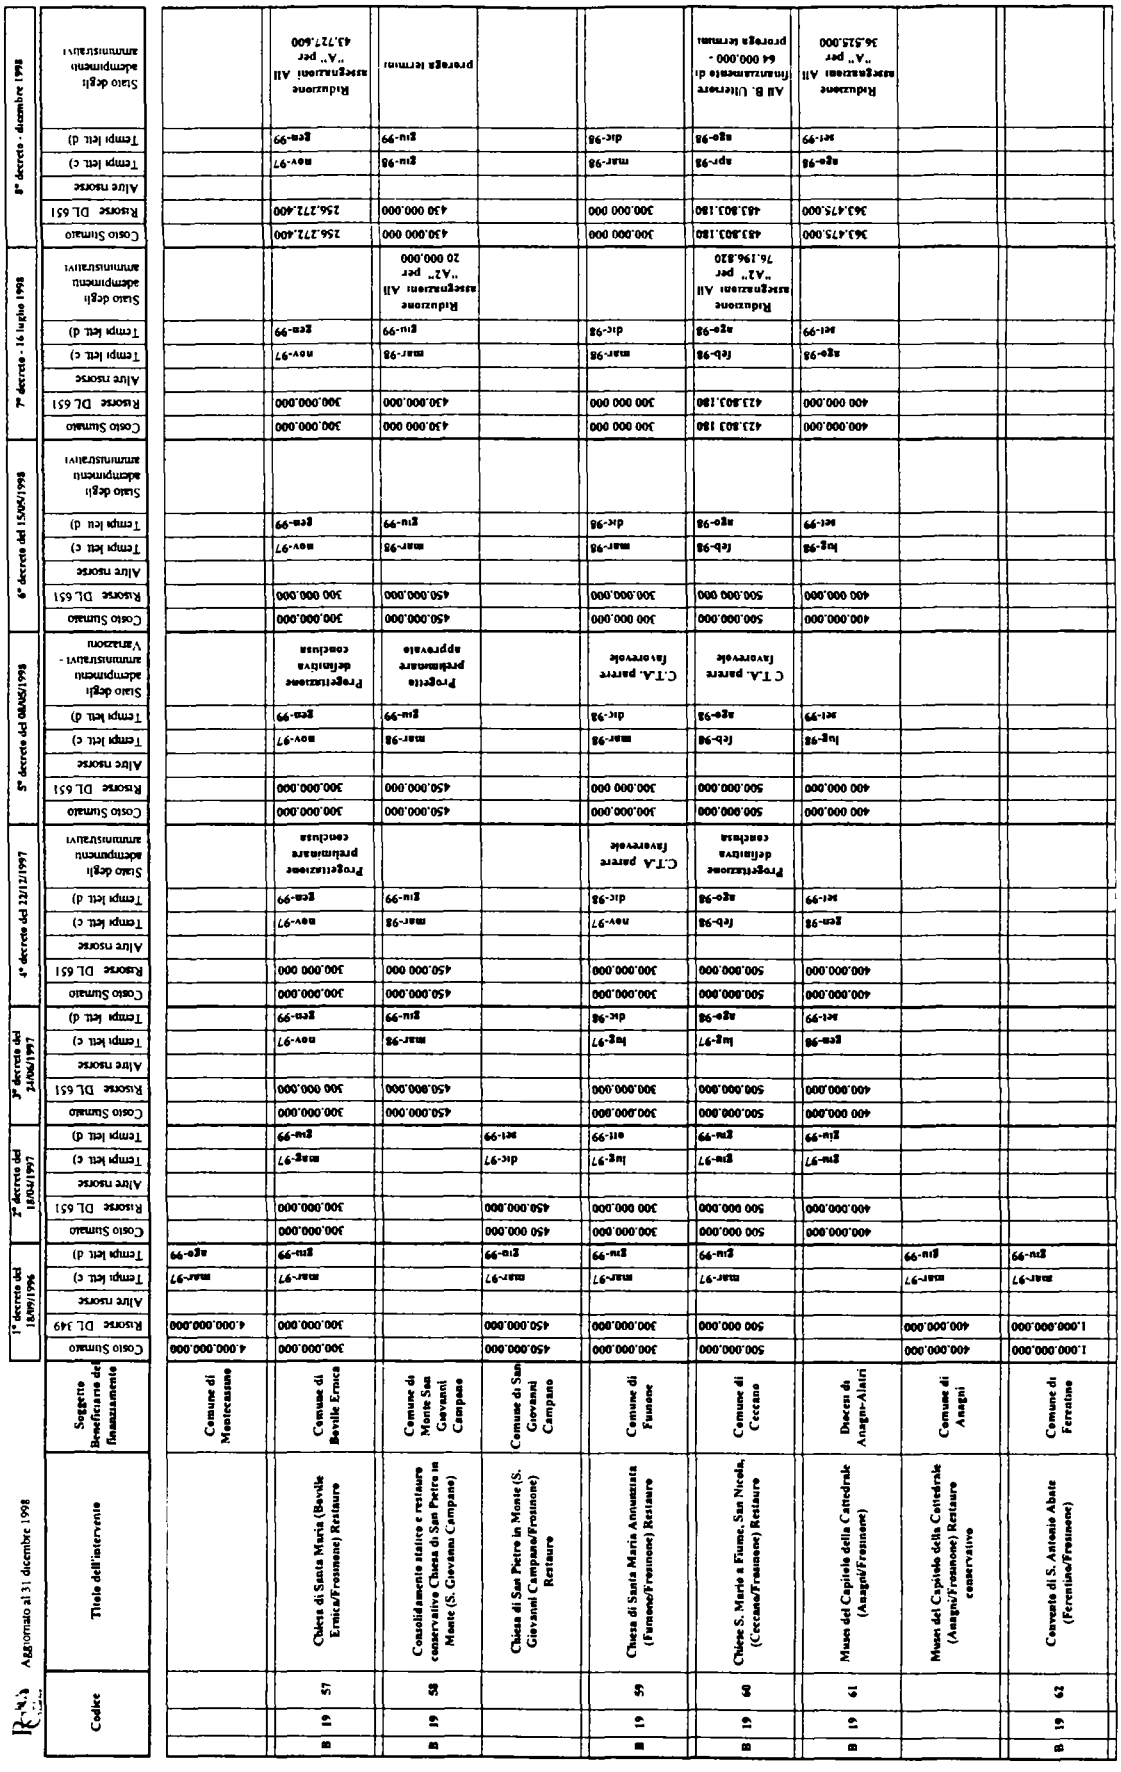

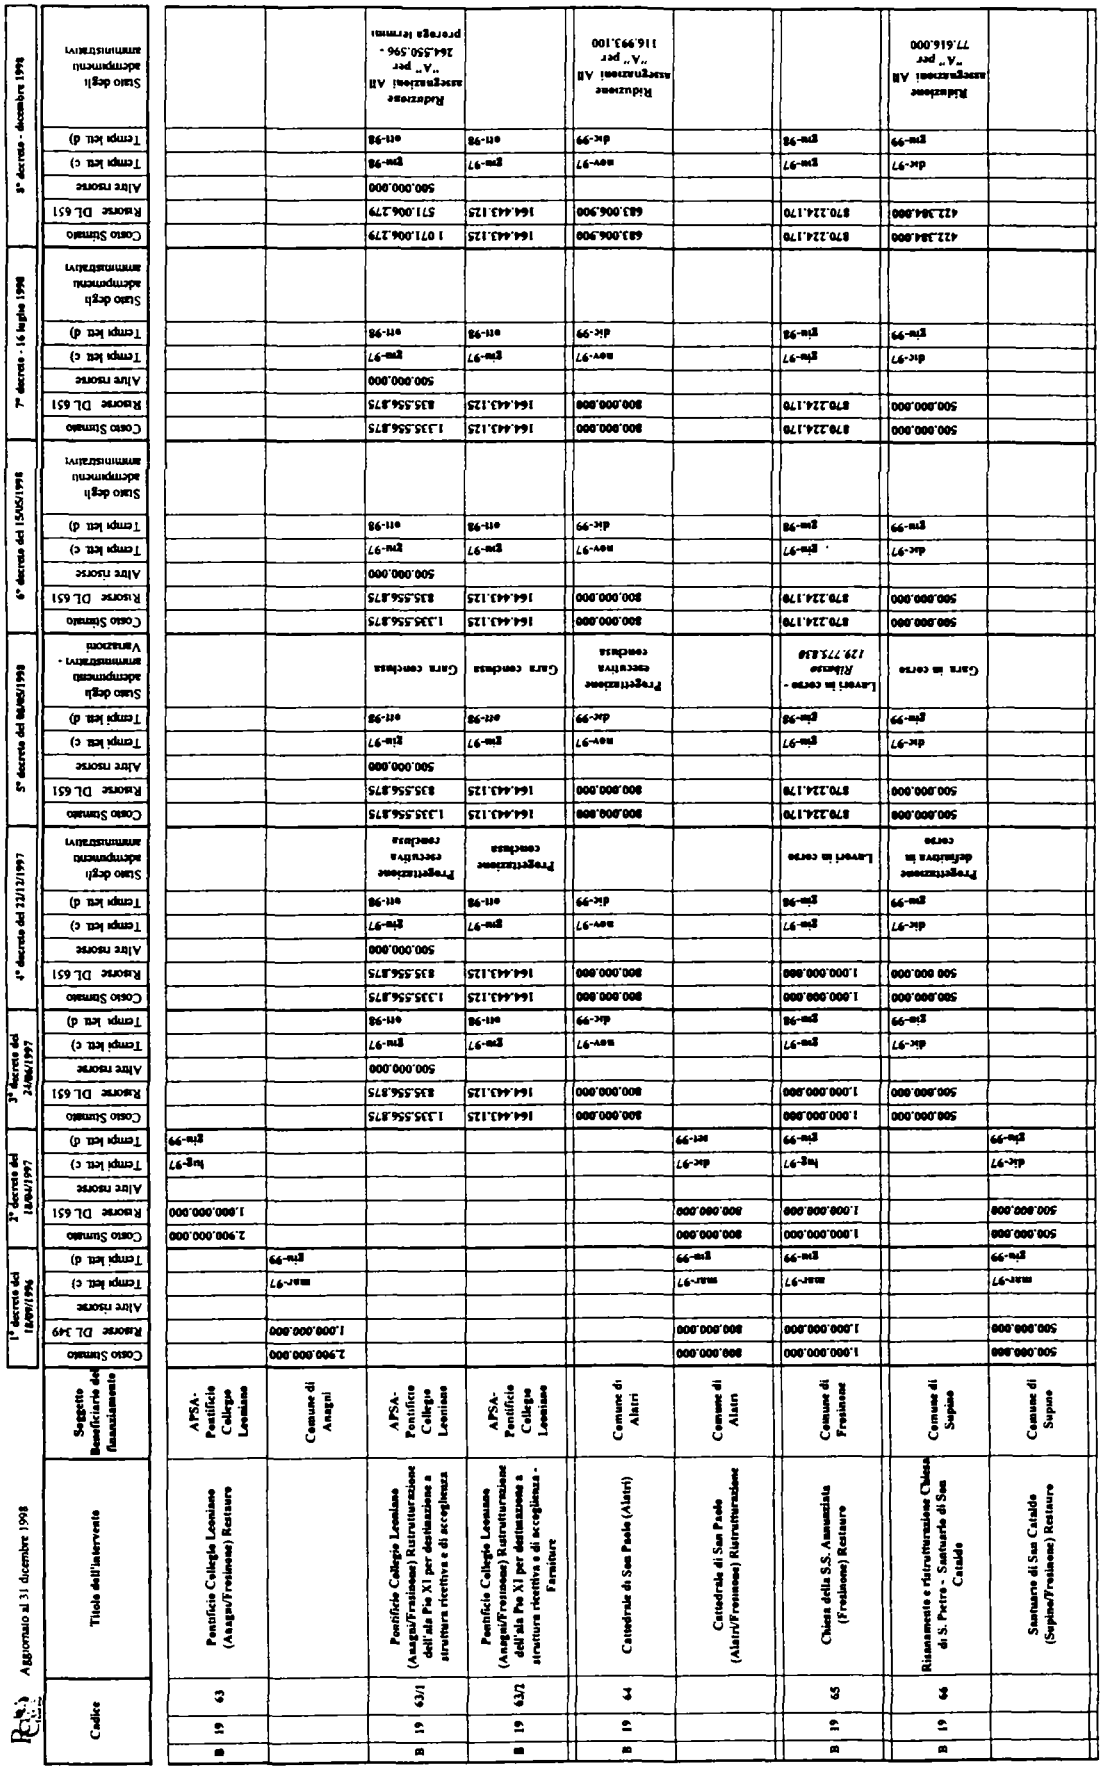

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
B	19	63	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Restauro	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	Costo Stimato	2.900.000.000	1.335.556.875	1.335.556.875	1.335.556.875	1.335.556.875	1.335.556.875	1.071.006.279
					Ribasso DL 349	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	571.006.279
					Altre risorse							500.000.000
					Tempi ist. c)	mar-97						
					Tempi ist. d)	lug-99						
B	19	63/1	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	Costo Stimato		1.335.556.875	1.335.556.875	Preventivazione esecutiva conclusa	Gara conclusa	1.335.556.875	1.071.006.279
					Ribasso DL 651		835.556.875	835.556.875	835.556.875	835.556.875	835.556.875	571.006.279
					Altre risorse		500.000.000			500.000.000		500.000.000
					Tempi ist. c)		lug-97	lug-97	nov-97	lug-97	lug-97	lug-98
					Tempi ist. d)		ott-98	ott-98	dic-99	ott-98	ott-98	ott-98
B	19	63/2	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza - Foresteria	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	Costo Stimato		1.335.556.875	Preventivazione conclusa	Gara conclusa	Preventivazione esecutiva conclusa	1.335.556.875	1.071.006.279
					Ribasso DL 651		835.556.875	835.556.875	835.556.875	835.556.875	835.556.875	683.006.900
					Altre risorse		500.000.000			500.000.000		500.000.000
					Tempi ist. c)		lug-97	lug-97	nov-97	lug-97	lug-97	nov-97
					Tempi ist. d)		ott-98	ott-98	dic-99	ott-98	ott-98	dic-99
B	19	64	Cattedrale di San Paolo (Alatri)	Comune di Alatri	Costo Stimato		1.000.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	683.006.900
					Ribasso DL 651		1.000.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	683.006.900
					Altre risorse							
					Tempi ist. c)		mar-97	mar-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
					Tempi ist. d)		lug-99	lug-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99
			Cattedrale di San Paolo (Alatri/Frosinone) Ristrutturazione	Comune di Alatri	Costo Stimato		1.000.000.000	800.000.000				
					Ribasso DL 349		1.000.000.000	800.000.000				
					Altre risorse							
					Tempi ist. c)		mar-97	mar-97				
					Tempi ist. d)		lug-99	lug-99				
B	19	65	Chiesa della S.S. Annunziata (Frosinone) Restauro	Comune di Frosinone	Costo Stimato		1.000.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	683.006.900
					Ribasso DL 651		1.000.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	683.006.900
					Altre risorse							500.000.000
					Tempi ist. c)		mar-97	lug-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
					Tempi ist. d)		lug-99	lug-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99
B	19	66	Risanamento e ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - Santuario di San Cataldo	Comune di Supino	Costo Stimato		500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	422.384.000
					Ribasso DL 651		500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	422.384.000
					Altre risorse							
					Tempi ist. c)		dic-97	dic-97	nov-97	lug-97	lug-97	dic-97
					Tempi ist. d)		lug-99	lug-99	dic-99	lug-99	lug-99	lug-99
			Santuario di San Cataldo (Supino/Frosinone) Restauro	Comune di Supino	Costo Stimato		500.000.000					
					Ribasso DL 651		500.000.000					
					Altre risorse							
					Tempi ist. c)		dic-97					
					Tempi ist. d)		lug-99					

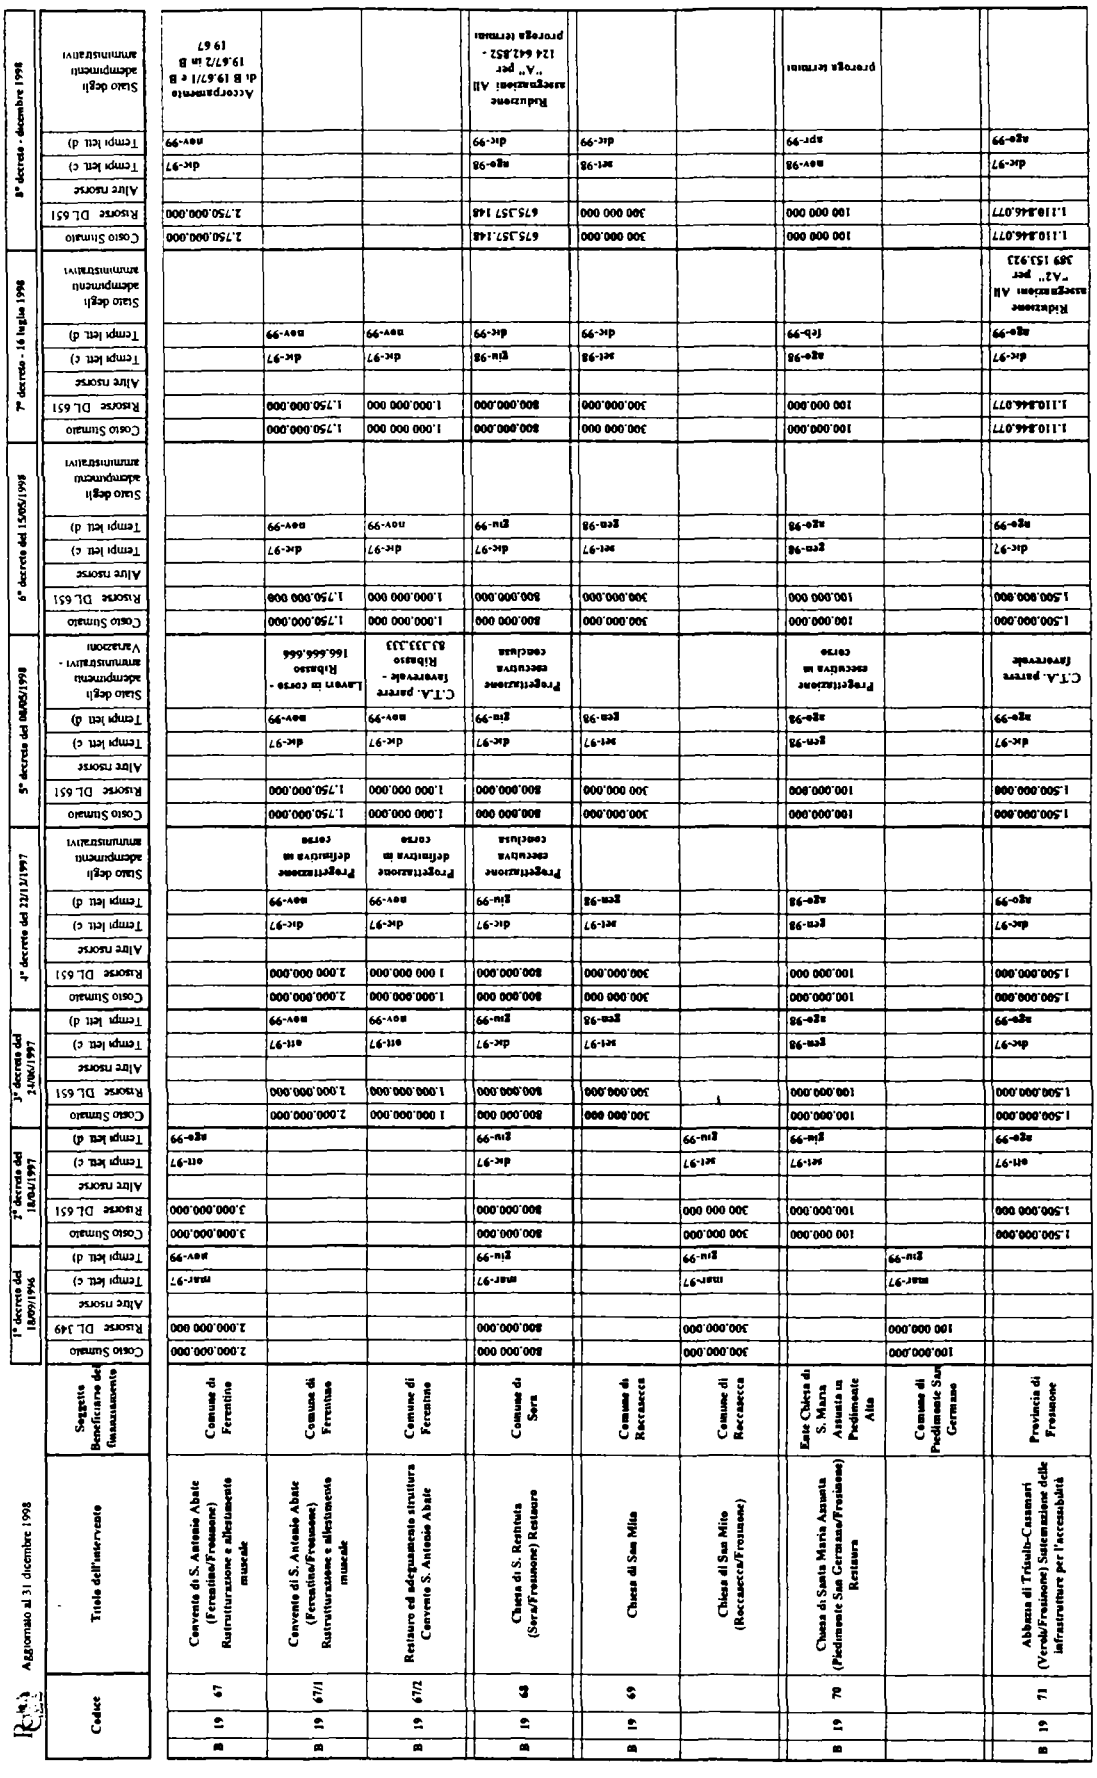

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 15/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	
													Stato degli adempimenti istruttori
				Comune di Verolì	Costo Stimato	1.500.000.000							
					Risorse DL 349	1.500.000.000							
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)	mar-97							
					Tempi ist. d)	apr-99							
B	19	72	Ampliamento della Chiesa su lec. Grimaldo facente parte della Parrocchia di S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	Costo Stimato				20.000.000.000	60.000.000			
					Risorse DL 651				20.000.000.000	60.000.000			
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)				dic-97	gen-98			
					Tempi ist. d)				dic-98	gen-99			
B	19	73	Rifacimento copertura, Facciata esterna e Sistemaz. area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	Costo Stimato				20.000.000.000	100.000.000			
					Risorse DL 651				20.000.000.000	100.000.000			
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)				dic-97	gen-98			
					Tempi ist. d)				dic-98	gen-99			
B	19	74	Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo. Parrocchia S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	Costo Stimato				20.000.000.000	40.000.000			
					Risorse DL 651				20.000.000.000	40.000.000			
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)				dic-97	gen-98			
					Tempi ist. d)				dic-98	gen-99			
B	19	75	Abbazia di Casmari	Ordine Cisterense	Costo Stimato				20.000.000.000	40.806.000			
					Risorse DL 651				20.000.000.000	40.000.000			
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)				dic-97	gen-98			
					Tempi ist. d)				dic-98	gen-99			
B	20	01	Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse con il Giubileo	Comune di Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio	Costo Stimato				20.000.000.000	100.000.000			
					Risorse DL 651				20.000.000.000	100.000.000			
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)				dic-97	gen-98			
					Tempi ist. d)				dic-98	gen-99			
B	20	01.1	Opera lirica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Teatro dell'opera di Roma	Costo Stimato				20.000.000.000	60.000.000			
					Risorse DL 651				20.000.000.000	60.000.000			
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)				dic-97	gen-98			
					Tempi ist. d)				dic-98	gen-99			
B	20	01.2	Musica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Accademia di S. Cecilia di Roma	Costo Stimato				20.000.000.000	60.000.000			
					Risorse DL 651				20.000.000.000	60.000.000			
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)				dic-97	gen-98			
					Tempi ist. d)				dic-98	gen-99			
B	20	01.3	Prosa. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Teatro Roma	Costo Stimato				20.000.000.000	60.000.000	15.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
					Risorse DL 651				20.000.000.000	60.000.000	15.000.000.000	7.000.000.000	
					Altre risorse								
					Tempi ist. c)				dic-97	gen-98	dic-98	gen-98	
					Tempi ist. d)				dic-98	gen-99		gen-99	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Nuovi Interventi AB C		Differenza finanziamento o di disponibilità 0 - 30.01.	Differenza finanziamento di B 20.01- 30.01.	Differenza finanziamento di 30.000.000.000 - disponibilità di B 20.01- cambio peggiorativo beneficiario
B 19 72	Ampliamento della Chiesa su lec. Grimaldo facente parte della Parrocchia di S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	n.d.	gen-99	gen-99	gen-99	gen-99
B 19 73	Rifacimento copertura, Facciata esterna e Sistemaz. area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	n.d.	gen-98	gen-98	gen-98	gen-98
B 19 74	Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo. Parrocchia S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	n.d.	gen-99	gen-99	gen-99	gen-99
B 19 75	Abbazia di Casmari	Ordine Cisterense	n.d.				
B 20 01	Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse con il Giubileo	Comune di Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio					
B 20 01.1	Opera lirica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Teatro dell'opera di Roma					
B 20 01.2	Musica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Accademia di S. Cecilia di Roma					
B 20 01.3	Prosa. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Teatro Roma					

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996					2° decreto del 18/04/1997					3° decreto del 24/06/1997					4° decreto del 22/12/1997					5° decreto del 08/05/1998					6° decreto del 15/05/1998					7° decreto - 16 luglio 1998					8° decreto - dicembre 1998				
					Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	20	01.4	Mostre. Programma di esposizioni d'arte da svolgersi nelle Scuderie Papali di Roma	Agenzia Romana per il Giubileo																																							
B	20	01.5	Convegno internazionale	Agenzia Romana per il Giubileo																																							
B	20	01.6	Concorsi finalizzati all'arricchimento del patrimonio culturale (di Comune, Provincia e Regione)	Agenzia Romana per il Giubileo																																							
B	20	01.7	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale di Roma	Comune di Roma																																							
B	20	01.8	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma																																							
B	20	01.9	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Regione Lazio	Regione Lazio																																							
B	20	02	Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Peccolomini - Villa del Sale	Fondazione Niccolò Piccolomini																																							
C	01	01	Ponti Regina Margherita, Cavour, Umberto I, Vitt. Emanuele II.	Comune di Roma																					Conferenza di Servizi su preliminare definitivo						Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)													
			Ponti Regina Margherita, Cavour, Umberto I, Vitt. Emanuele II, Mazzini, Principe Amedeo (Roma) Interventi di restauro conservativo (prima fase)	Comune di Roma	8.200.000.000				feb-98	8.200.000.000				dic-99																															
			Restauro conservativo dei ponti Vittorio Emanuele II, Umberto I, Regina Margherita e Cavour	Comune di Roma	8.200.000.000				dic-99	7.009.951.740				mar-98	7.009.951.740				dic-99	7.009.951.740				mar-98	7.009.951.740				dic-99	8.200.000.000				nov-98	8.200.000.000				gen-98	8.200.000.000				gen-98	8.200.000.000				gen-98

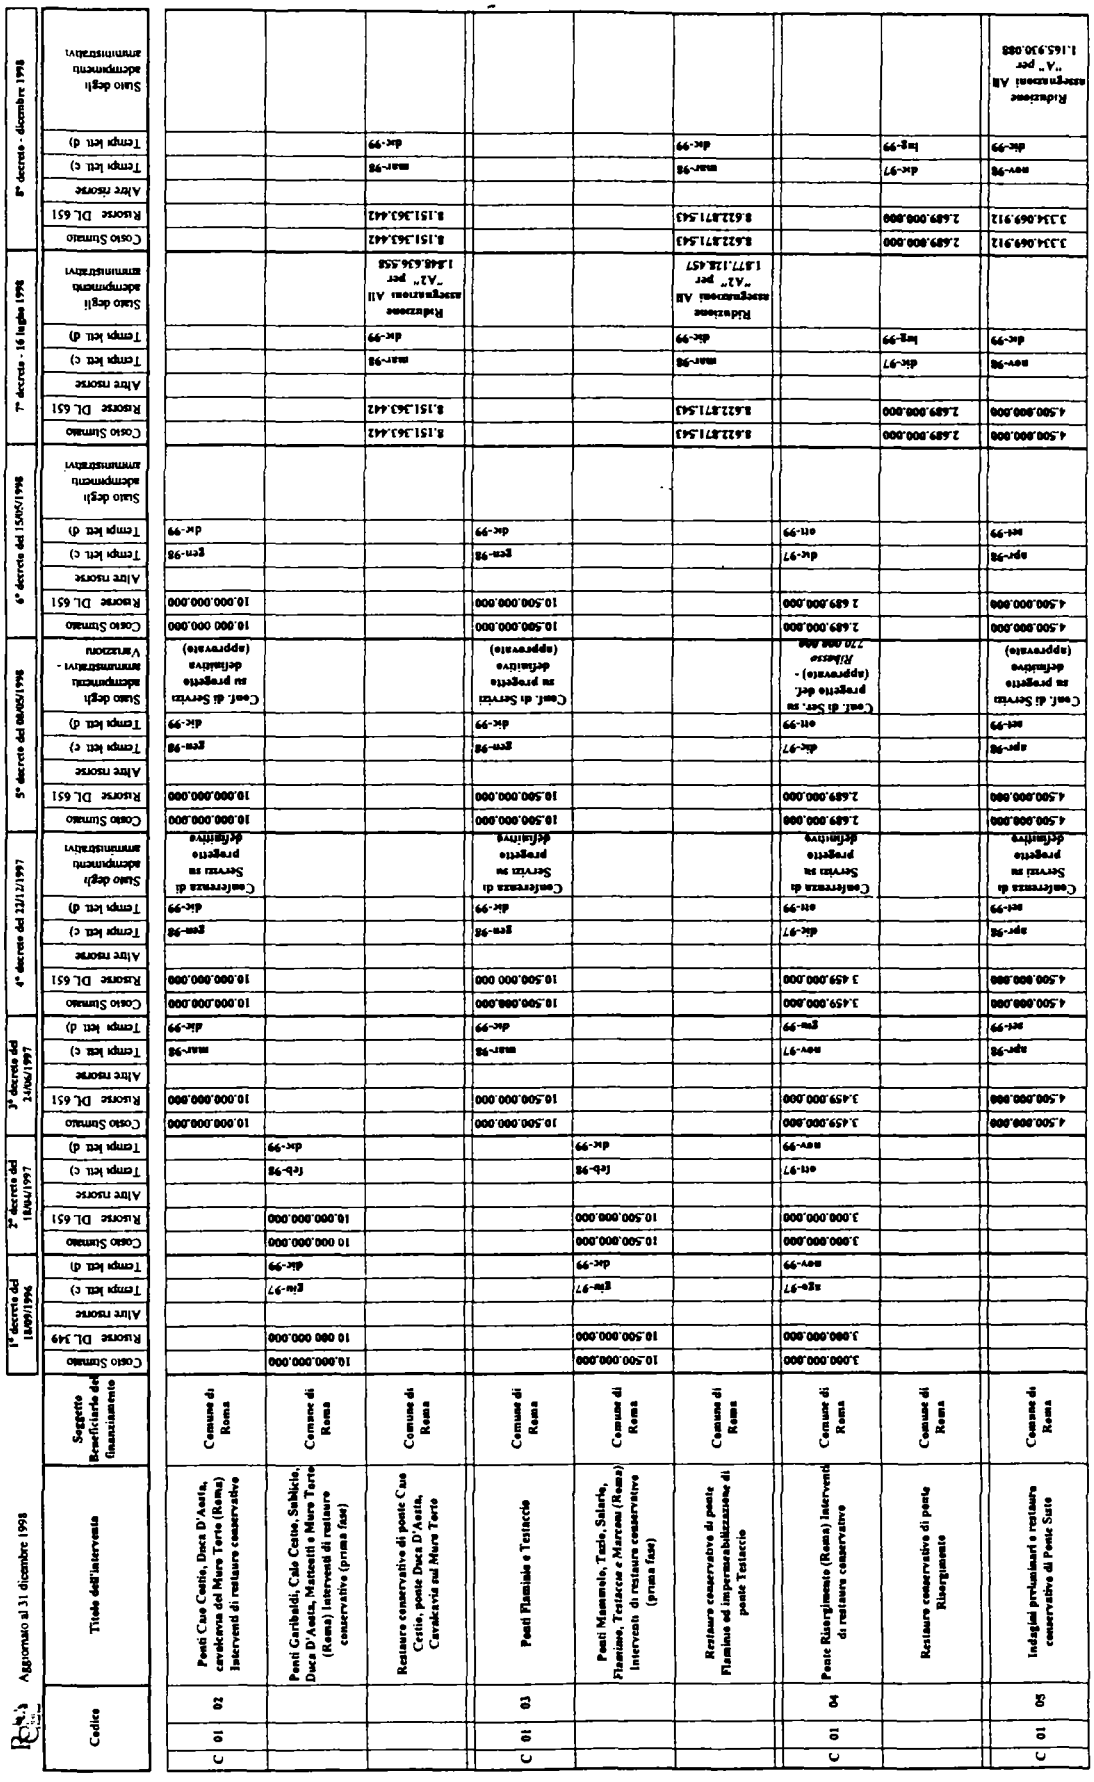

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
										Stato degli adempimenti amministrativi
			Costo Sumaio	9.000.000.000	12.000.000.000	3.650.000.000	12.000.000.000	3.682.000.000	9.000.000.000	
			Risorse DL 349	9.000.000.000		3.650.000.000		3.682.000.000		
			Altre risorse							
			Temp lett c)	ago-97		ago-97				
			Temp lett d)	nov-99		nov-99		nov-99		
C 01	05	Ponte Sisto (Roma) Interventi di restauro conservativo	Costo Sumaio	9.000.000.000	12.000.000.000	3.682.000.000	12.000.000.000	3.682.000.000	9.000.000.000	
			Risorse DL 651	9.000.000.000		3.650.000.000		3.682.000.000		
			Altre risorse							
			Temp lett c)	dic-97		ott-97		ott-97		
			Temp lett d)	nov-99		nov-99		nov-99		
			Costo Sumaio		12.000.000.000	3.650.000.000	12.000.000.000	3.682.000.000		
			Risorse DL 651			3.650.000.000		3.682.000.000		
			Altre risorse							
			Temp lett c)		nov-97	nov-97		mag-99		
			Temp lett d)		nov-99	nov-99		mag-99		
C 01	06	Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo	Costo Sumaio		12.000.000.000	3.650.000.000	12.000.000.000	3.682.000.000		
			Risorse DL 651			3.650.000.000		3.682.000.000		
			Altre risorse							
			Temp lett c)		ott-97	dic-97		ott-97		
			Temp lett d)		nov-99	nov-99		nov-99		
			Costo Sumaio			3.650.000.000		3.682.000.000		
			Risorse DL 651			3.650.000.000		3.682.000.000		
			Altre risorse							
			Temp lett c)			dic-97		dic-97		
			Temp lett d)			nov-99		nov-99		
			Costo Sumaio			3.650.000.000		3.682.000.000		
			Risorse DL 651			3.650.000.000		3.682.000.000		
			Altre risorse							
			Temp lett c)			dic-97		dic-97		
			Temp lett d)			nov-99		nov-99		
C 01	07	Ponte Nomentano (Roma) Interventi di restauro conservativo su prospetti, intradossi e torre (prima fase)	Costo Sumaio			3.650.000.000		3.682.000.000		
			Risorse DL 651			3.650.000.000		3.682.000.000		
			Altre risorse							
			Temp lett c)			nov-97		nov-97		
			Temp lett d)			giu-99		giu-99		
			Costo Sumaio			3.650.000.000		3.682.000.000		
			Risorse DL 651			3.650.000.000		3.682.000.000		
			Altre risorse							
			Temp lett c)			dic-97		dic-97		
			Temp lett d)			ott-99		ott-99		
			Costo Sumaio			3.650.000.000		3.682.000.000		
			Risorse DL 651			3.650.000.000		3.682.000.000		
			Altre risorse							
			Temp lett c)			dic-97		dic-97		
			Temp lett d)			ott-99		ott-99		
			Costo Sumaio			2.935.000.000		3.192.000.000		
			Risorse DL 651			2.935.000.000		3.192

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 12/04/1997	3° decreto del 23/06/1997	4° decreto del 23/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
C	01	10	P.za S.Pietro in Vincoli, S.Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riqualificazione ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati	Comune di Roma	Costo Stimato	5.000.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	11.500.000.000	4.500.000.000
					Risorse DL 349	5.000.000.000		3.000.000.000	4.000.000.000		11.500.000.000	
					Altre risorse							
					Tempi lavori (c)	ott-97		feb-98	dic-97		apr-98	
					Tempi lavori (d)	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99		dic-99	
					Costo Stimato	5.000.000.000		3.000.000.000	4.000.000.000		11.500.000.000	
					Risorse DL 651		5.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000		11.500.000.000	
					Altre risorse							
					Tempi lavori (c)		ott-97	feb-98	dic-97		apr-98	
					Tempi lavori (d)		dic-99	dic-99	dic-99		dic-99	
C	01	11	Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Cleobe, via Grahame (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	Costo Stimato	5.000.000.000		3.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	11.500.000.000	
					Risorse DL 651	5.000.000.000		3.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	11.500.000.000	
					Altre risorse							
					Tempi lavori (c)	mar-98		apr-98	mar-98	mag-98		
					Tempi lavori (d)	ott-99		nov-99	apr-99	mag-98	ott-99	
					Costo Stimato	5.000.000.000		3.000.000.000	4.000.000.000		11.500.000.000	
					Risorse DL 651	5.000.000.000		3.000.000.000	4.000.000.000		11.500.000.000	
					Altre risorse							
					Tempi lavori (c)	feb-98		feb-98	mar-98		apr-98	
					Tempi lavori (d)	nov-99		nov-99	apr-99		ott-99	
C	01	12	Viale Trastevere, via Marsala, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	Costo Stimato	5.000.000.000		3.000.000.000	4.000.000.000		11.500.000.000	
					Risorse DL 651	5.000.000.000		3.000.000.000	4.000.000.000		11.500.000.000	
					Altre risorse							
					Tempi lavori (c)	mar-98		mar-98	mar-98		apr-98	
					Tempi lavori (d)	ott-99		ott-99	ott-99		ott-99	
			Progetto per interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Percorso "C": v.le Trastevere, via Morosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo	Comune di Roma	Costo Stimato	5.000.000.000		3.000.000.000	4.000.000.000		11.500.000.000	
					Risorse DL 651	5.000.000.000		3.000.000.000	4.000.000.000		11.500.000.000	
					Altre risorse							
					Tempi lavori (c)		ott-97	feb-98	dic-97		apr-98	
					Tempi lavori (d)		dic-99	dic-99	dic-99		dic-99	
					Costo Stimato		5.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000		11.500.000.000	
					Risorse DL 651		5.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000		11.500.000.000	
					Altre risorse							
					Tempi lavori (c)		ott-97	feb-98	dic-97		apr-98	
					Tempi lavori (d)		dic-99	dic-99	dic-99		dic-99	
C	01	13	Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublicio a Porta Metronia e via Marmorata (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	Costo Stimato						11.500.000.000	
					Risorse DL 651						11.500.000.000	
					Altre risorse							
					Tempi lavori (c)						apr-98	
					Tempi lavori (d)						dic-99	
C	01	13	Lungotevere di sinistra e di destra, via Marmorata (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	Costo Stimato						11.500.000.000	
					Risorse DL 651						11.500.000.000	
					Altre risorse							
					Tempi lavori (c)						apr-98	
					Tempi lavori (d)						dic-99	
C	01	13	Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. I.re di sinistra e di destra da ponte Sublicio a ponte Matteotti	Comune di Roma	Costo Stimato							4.500.000.000
					Risorse DL 651							4.500.000.000
					Altre risorse							
					Tempi lavori (c)						mag-98	
					Tempi lavori (d)						nov-99	
C	01	13/1	Lungotevere di sinistra e destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti. Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Ristrutturazione marciapiedi, sistema fognante superficiale e arredo	Comune di Roma	Costo Stimato							Suddivisione di C.01.13 in C.01.13/1 e C.01.13/2 - prenot. ternani
					Risorse DL 651							nov-99
					Altre risorse							
					Tempi lavori (c)							gen-99
					Tempi lavori (d)							nov-99
					Costo Stimato					1.105.374.534 - prenot. ternani	2.894.625.466	2.228.821.726	3.245.965.090	Riduzione stanziamenti All "A" per 1.754.034.910 - prenot. ternani
					Risorse DL 651						2.894.625.466	2.228.821.726	3.245.965.090	
					Altre risorse									
					Tempi lavori (c)					act-98		apr-98		oct-98
					Tempi lavori (d)					lug-99		nov-99		nov-99
C	01	13/2	Lungotevere di sinistra e destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti. Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Ristrutturazione marciapiedi, sistema fognante superficiale e arredo	Comune di Roma	Costo Stimato							Riduzione stanziamenti All "A2" per 771.178.274		
					Risorse DL 651									
					Altre risorse									
					Tempi lavori (c)									
					Tempi lavori (d)									
					Costo Stimato						4.000.000.000	2.228.821.726	5.000.000.000	
					Risorse DL 651						4.000.000.000	2.228.821.726	5.000.000.000	
					Altre risorse									
					Tempi lavori (c)						lug-98	apr-98	mag-98	
					Tempi lavori (d)						lug-99	nov-99	nov-99	
C	01	14	Lungotevere di sinistra e destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti. Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Ristrutturazione marciapiedi, sistema fognante superficiale e arredo	Comune di Roma	Costo Stimato						11.500.000.000			
					Risorse DL 651						11.500.000.000			
					Altre risorse									
					Tempi lavori (c)						mag-98			
					Tempi lavori (d)						nov-99			
C	01	15	Lungotevere di sinistra e destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti. Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Ristrutturazione marciapiedi, sistema fognante superficiale e arredo	Comune di Roma	Costo Stimato						11.500.000.000			
					Risorse DL 651						11.500.000.000			
					Altre risorse									
					Tempi lavori (c)						mag-98			
					Tempi lavori (d)						nov-99			
C	01	16	Lungotevere di sinistra e destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti. Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Ristrutturazione marciapiedi, sistema fognante superficiale e arredo	Comune di Roma	Costo Stimato						11.500.000.000			
					Risorse DL 651						11.500.000.000			
					Altre risorse									
					Tempi lavori (c)						mag-98			
					Tempi lavori (d)						nov-99			
C	01	17	Lungotevere di sinistra e destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti. Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Ristrutturazione marciapiedi, sistema fognante superficiale e arredo	Comune di Roma	Costo Stimato						11.500.000.000			
					Risorse DL 651						11.500.000.000			
					Altre risorse									
					Tempi lavori (c)						mag-98			
					Tempi lavori (d)						nov-99			

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/06/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	Stato degli adempimenti amministrativi
C	01	13/2	Manutenzione superficiale delle sedi stradali del Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti e zone limitrofe agli itinerari degli autobus turistici.	Comune di Roma	Costo Sumaio	27.000.000.000							Costo Sumaio	7.000.000.000	Subdivisione di C.01.13/1 e C.01.13/2 - proroga lavori
					Risorse DL 349	27.000.000.000							Risorse DL 651	7.000.000.000	Risorse DL 651
					Altre risorse								Altre risorse		
					Temp. lavi c)	feb-98							Temp. lavi c)	lug-98	Temp. lavi c)
					Temp. lavi d)	dic-99							Temp. lavi d)	dic-99	Temp. lavi d)
					Costo Sumaio	27.000.000.000							Costo Sumaio	8.205.315.736	Riduzione assegnazioni All "A" per 5.294.684.264 - Proroga lavori
					Risorse DL 651	27.000.000.000							Risorse DL 651	8.205.315.736	
					Altre risorse								Altre risorse		
					Temp. lavi c)	feb-98							Temp. lavi c)	set-98	Temp. lavi c)
					Temp. lavi d)	dic-99							Temp. lavi d)	nov-99	Temp. lavi d)
					Costo Sumaio	20.000.000.000							Costo Sumaio	5.587.522.850	
					Risorse DL 651	20.000.000.000							Risorse DL 651	5.587.522.850	
					Altre risorse								Altre risorse		
					Temp. lavi c)	ott-97							Temp. lavi c)	ago-98	Temp. lavi c)
					Temp. lavi d)	dic-99							Temp. lavi d)	nov-99	Temp. lavi d)
					Costo Sumaio	20.000.000.000							Costo Sumaio	5.633.206.310	
					Risorse DL 651	20.000.000.000							Risorse DL 651	5.633.206.310	
					Altre risorse								Altre risorse		
					Temp. lavi c)	mar-98							Temp. lavi c)	lug-98	Temp. lavi c)
					Temp. lavi d)	nov-99							Temp. lavi d)	nov-99	Temp. lavi d)
					Costo Sumaio	20.000.000.000							Costo Sumaio	14.906.733.200	
					Risorse DL 651	20.000.000.000							Risorse DL 651	14.906.733.200	
					Altre risorse								Altre risorse		
					Temp. lavi c)	mar-98							Temp. lavi c)	mag-98	Temp. lavi c)
					Temp. lavi d)	nov-99							Temp. lavi d)	lug-99	Temp. lavi d)
					Costo Sumaio	20.000.000.000							Costo Sumaio	13.500.000.000	
					Risorse DL 651	20.000.000.000							Risorse DL 651	13.500.000.000

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
												Stato degli adempimenti amministrativi
					Costo Stimato	14.000.000.000	4.165.000.000					
					Risorse DL 349	14.000.000.000	4.165.000.000					
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)	feb-98	dic-97					
					Tempi lett. d)	dic-99	ott-99					
C	01	18	Via Piazza Sarcheth (Roma) Allargamento del tratto da piazza Giureconsulti fino alla via Trionfale (prima fase)	Comune di Roma								
					Costo Stimato	14.000.000.000	4.165.000.000					
					Risorse DL 651	14.000.000.000	4.165.000.000					
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)	feb-98	feb-98					
					Tempi lett. d)	dic-99	ott-99					
C	01	18/1	Villa Borghese: Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, fontana del Flocco e propilei egizi e neoclassici (Roma) Restauro degli arredi e del perimetro monumentale	Comune di Roma								
					Costo Stimato			2.000.000.000	2.000.000.000			
					Risorse DL 651			2.000.000.000	2.000.000.000			
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)			lug-98	lug-98			
					Tempi lett. d)			lug-99	lug-99			
C	01	18/2	Villa Borghese: propilei egizi , fontana del Flocco, perimetri murari e scogliere di viale F.La Guardia e del giardino del lago, restauro degli arredi archiettonici.	Comune di Roma								
					Costo Stimato			2.165.000.000	2.165.000.000			
					Risorse DL 651			2.165.000.000	2.165.000.000			
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)			lug-98	lug-98			
					Tempi lett. d)			lug-99	lug-99			
			Villa Borghese: Propilei egizi. Fontana del Flocco, perimetri murari e scoglere di viale F. La Guardia, restaure degli arredi architettonici	Comune di Roma								Fornace termini
					Costo Stimato			2.165.000.000				2.165.000.000
					Risorse DL 651			2.165.000.000				2.165.000.000
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)			dic-98				dic-98
					Tempi lett. d)			ott-99				ott-99
C	01	19	Villa Borghese: Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	Comune di Roma				Conferenze di Servizi su progetto definitivo	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)	Riduzione esenpiazioni Alt "A2" per 101.839.300		
					Costo Stimato			1.200.000.000	1.200.000.000		1.094.160.620	1.094.160.620
					Risorse DL 651			1.200.000.000	1.200.000.000		1.094.160.620	1.094.160.620
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)			giu-98	giu-98		giu-98	giu-98
					Tempi lett. d)			giu-99	giu-99		giu-99	giu-99
C	01	20	'Villa Borghese: Parco dei Daini (Roma) Restauro degli arredi archiettonici e del perimetro monumentale	Comune di Roma					Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)	Riduzione esenpiazioni Alt "A" per 314.544.475 - Fornace termini		
					Costo Stimato	1.190.000.000	1.190.000.000		1.190.000.000	1.190.000.000	1.190.000.000	875.455.525
					Risorse DL 651	1.190.000.000	1.190.000.000		1.190.000.000	1.190.000.000	1.190.000.000	875.455.525
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)	apr-98	giu-98		giu-98	giu-98		
					Tempi lett. d)	apr-99	giu-99		giu-99	giu-99		
C	01	21	Villa Doria Pamphilj (Roma) Allestimento del museo di Villa Vecchia , recupero delle serre ottocentesche, restauro degli arredi monumentali e del casale del Giardino del Cedrati	Comune di Roma								
					Costo Stimato	5.355.000.000	1.190.000.000	2.142.800.000				
					Risorse DL 651	5.355.000.000	1.190.000.000	2.142.000.000				
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)	dic-97	feb-98					
					Tempi lett. d)	ott-99	ott-99	mar-99				

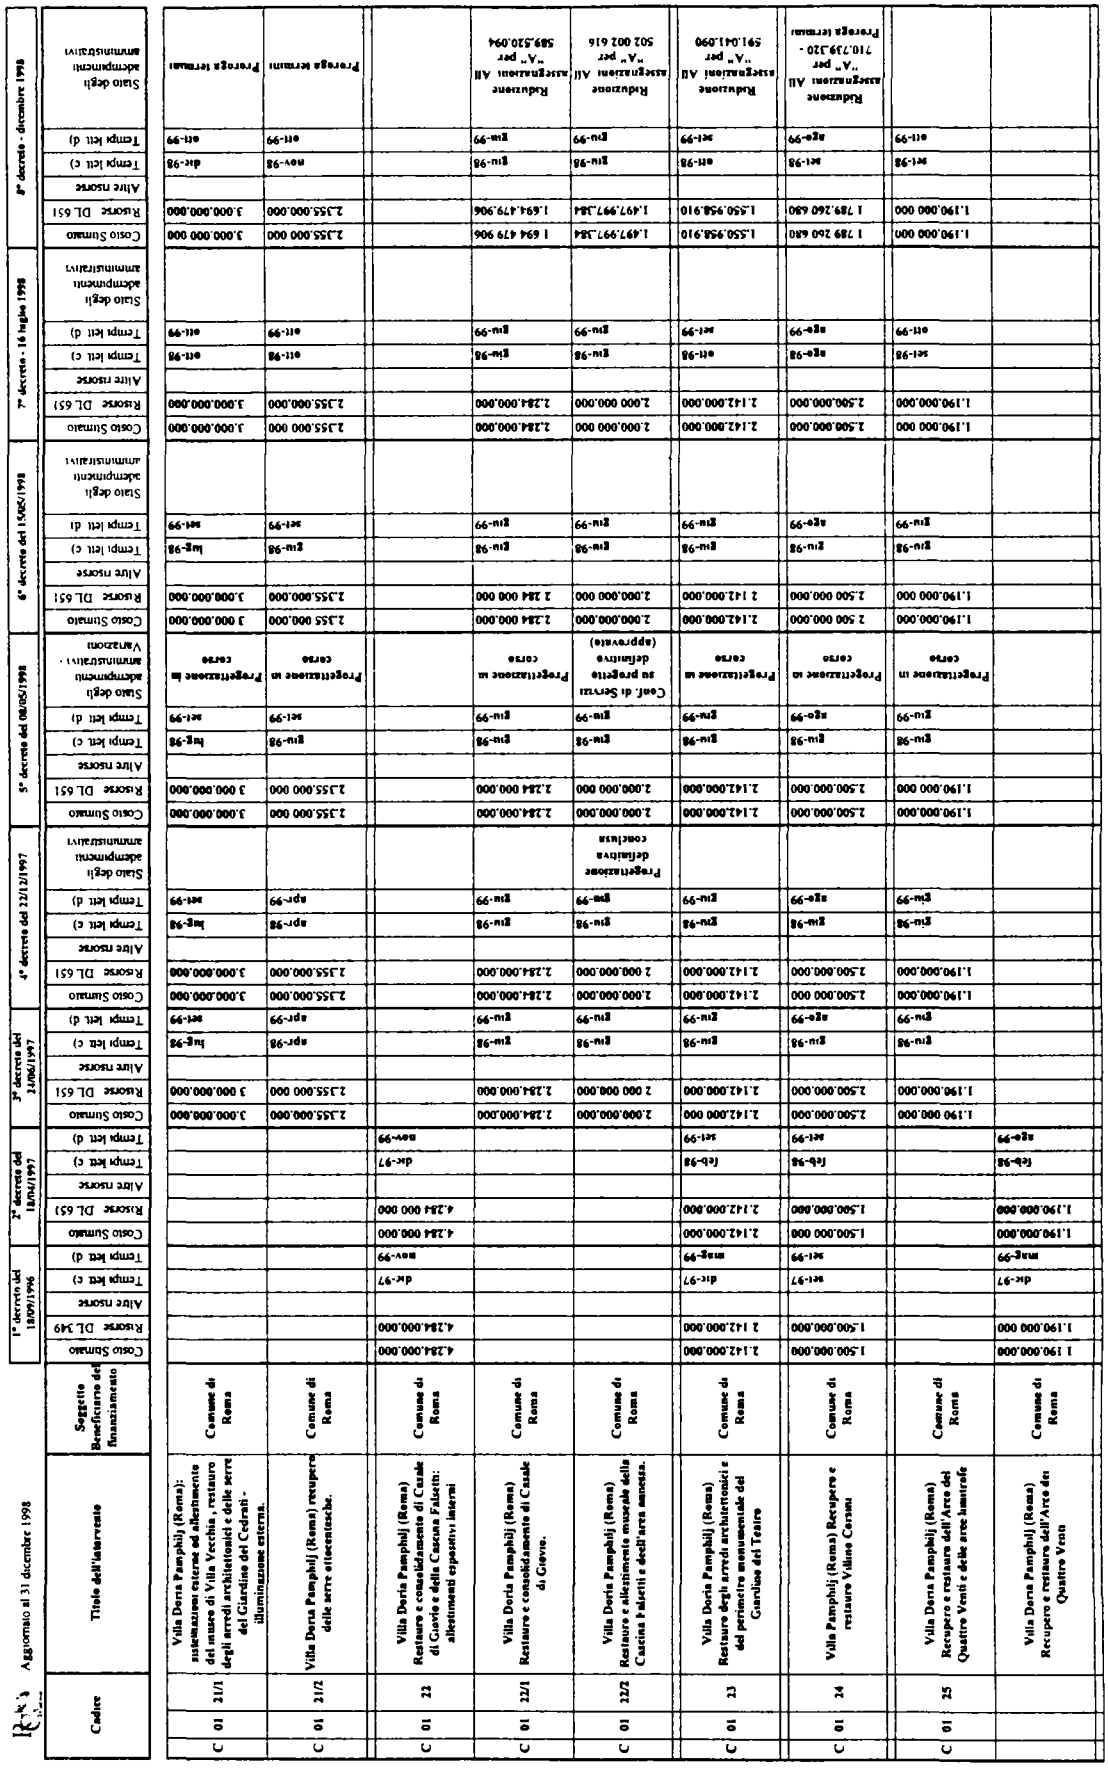

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
C	01	21/1	Villa Doria Pamphilj (Roma): sistemazioni esterne ed allestimento dei istituto di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati - illuminazione esterna.	Comune di Roma	Costo Sumano Risorse DL 349 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)	Costo Sumano Risorse DL 651 Altre risorse Temp lett c) Temp lett d)
									Progettazione in corso	Progettazione in corso	Progettazione in corso	Progettazione in corso
									Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni			
C	01	21/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche.	Comune di Roma			2.355.000.000 3.000.000.000 apr-98 apr-99	2.355.000.000 3.000.000.000 apr-98 apr-99	Progettazione in corso	Progettazione in corso	Progettazione in corso	Progettazione in corso
									Stato degli adempimenti amministrativi			
C	01	22	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Giovio e della Cascina Falsetti: allestimenti espositivi interni	Comune di Roma	4.284.000.000 4.284.000.000 dic-97 nov-99	2.284.000.000 2.284.000.000 dic-97 nov-99	2.284.000.000 2.284.000.000 dic-97 nov-99	2.284.000.000 2.284.000.000 dic-97 nov-99	2.284.000.000 2.284.000.000 dic-97 nov-99	2.284.000.000 2.284.000.000 dic-97 nov-99	2.284.000.000 2.284.000.000 dic-97 nov-99	2.284.000.000 2.284.000.000 dic-97 nov-99
C	01	22/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Giovio.	Comune di Roma	1.694.479.906 1.694.479.906 feb-97 giu-99	Riduzione stanziamenti All "A" per 589.520.094 Riduzione stanziamenti All "A" per 589.520.094 feb-97 giu-99	Riduzione stanziamenti All "A" per 589.520.094 Riduzione stanziamenti All "A" per 589.520.094 feb-97 giu-99	Riduzione stanziamenti All "A" per 589.520.094 Riduzione stanziamenti All "A" per 589.520.094 feb-97 giu-99	Riduzione stanziamenti All "A" per 589.520.094 Riduzione stanziamenti All "A" per 589.520.094 feb-97 giu-99	Riduzione stanziamenti All "A" per 589.520.094 Riduzione stanziamenti All "A" per 589.520.094 feb-97 giu-99	Riduzione stanziamenti All "A" per 589.520.094 Riduzione stanziamenti All "A" per 589.520.094 feb-97 giu-99	Riduzione stanziamenti All "A" per 589.520.094 Riduzione stanziamenti All "A" per 589.520.094 feb-97 giu-99
C	01	22/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Falsetti e dell'area annessa.	Comune di Roma	1.694.479.906 1.694.479.906 feb-97 giu-99	Riduzione stanziamenti All "A" per 502.002.616 Riduzione stanziamenti All "A" per 502.002.616 feb-97 giu-99	Riduzione stanziamenti All "A" per 502.002.616 Riduzione stanziamenti All "A" per 502.002.616 feb-97 giu-99	Riduzione stanziamenti All "A" per 502.002.616 Riduzione stanziamenti All "A" per 502.002.616 feb-97 giu-99	Riduzione stanziamenti All "A" per 502.002.616 Riduzione stanziamenti All "A" per 502.002.616 feb-97 giu-99	Riduzione stanziamenti All "A" per 502.002.616 Riduzione stanziamenti All "A" per 502.002.616 feb-97 giu-99	Riduzione stanziamenti All "A" per 502.002.616 Riduzione stanziamenti All "A" per 502.002.616 feb-97 giu-99	Riduzione stanziamenti All "A" per 502.002.616 Riduzione stanziamenti All "A" per 502.002.616 feb-97 giu-99
								Progettazione definitiva concluisa	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)			
C	01	23	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro	Comune di Roma	1.142.000.000 1.142.000.000 set-97 mag-99	1.142.000.000 1.142.000.000 set-97 mag-99	1.142.000.000 1.142.000.000 set-97 mag-99	1.142.000.000 1.142.000.000 set-97 mag-99	1.142.000.000 1.142.000.000 set-97 mag-99	1.142.000.000 1.142.000.000 set-97 mag-99	1.142.000.000 1.142.000.000 set-97 mag-99	1.142.000.000 1.142.000.000 set-97 mag-99
C	01	24	Villa Pamphilj (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini	Comune di Roma	1.500.000.000 1.500.000.000 feb-98 set-99	1.500.000.000 1.500.000.000 feb-98 set-99	1.500.000.000 1.500.000.000 feb-98 set-99	1.500.000.000 1.500.000.000 feb-98 set-99	1.500.000.000 1.500.000.000 feb-98 set-99	1.500.000.000 1.500.000.000 feb-98 set-99	1.500.000.000 1.500.000.000 feb-98 set-99	1.500.000.000 1.500.000.000 feb-98 set-99
C	01	25	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro dell'Arce dei Quattro Venti e delle aree limitrofe	Comune di Roma	1.190.000.000 1.190.000.000 set-98 ott-99	1.190.000.000 1.190.000.000 set-98 ott-99	1.190.000.000 1.190.000.000 set-98 ott-99	1.190.000.000 1.190.000.000 set-98 ott-99	1.190.000.000 1.190.000.000 set-98 ott-99	1.190.000.000 1.190.000.000 set-98 ott-99	1.190.000.000 1.190.000.000 set-98 ott-99	1.190.000.000 1.190.000.000 set-98 ott-99
C	01		Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro dell'Arce dei Quattro Venti	Comune di Roma	1.190.000.000 1.190.000.000 mag-99 ago-99	1.190.000.000 1.190.000.000 mag-99 ago-99	1.190.000.000 1.190.000.000 mag-99 ago-99	1.190.000.000 1.190.000.000 mag-99 ago-99	1.190.000.000 1.190.000.000 mag-99 ago-99	1.190.000.000 1.190.000.000 mag-99 ago-99	1.190.000.000 1.190.000.000 mag-99 ago-99	1.190.000.000 1.190.000.000 mag-99 ago-99

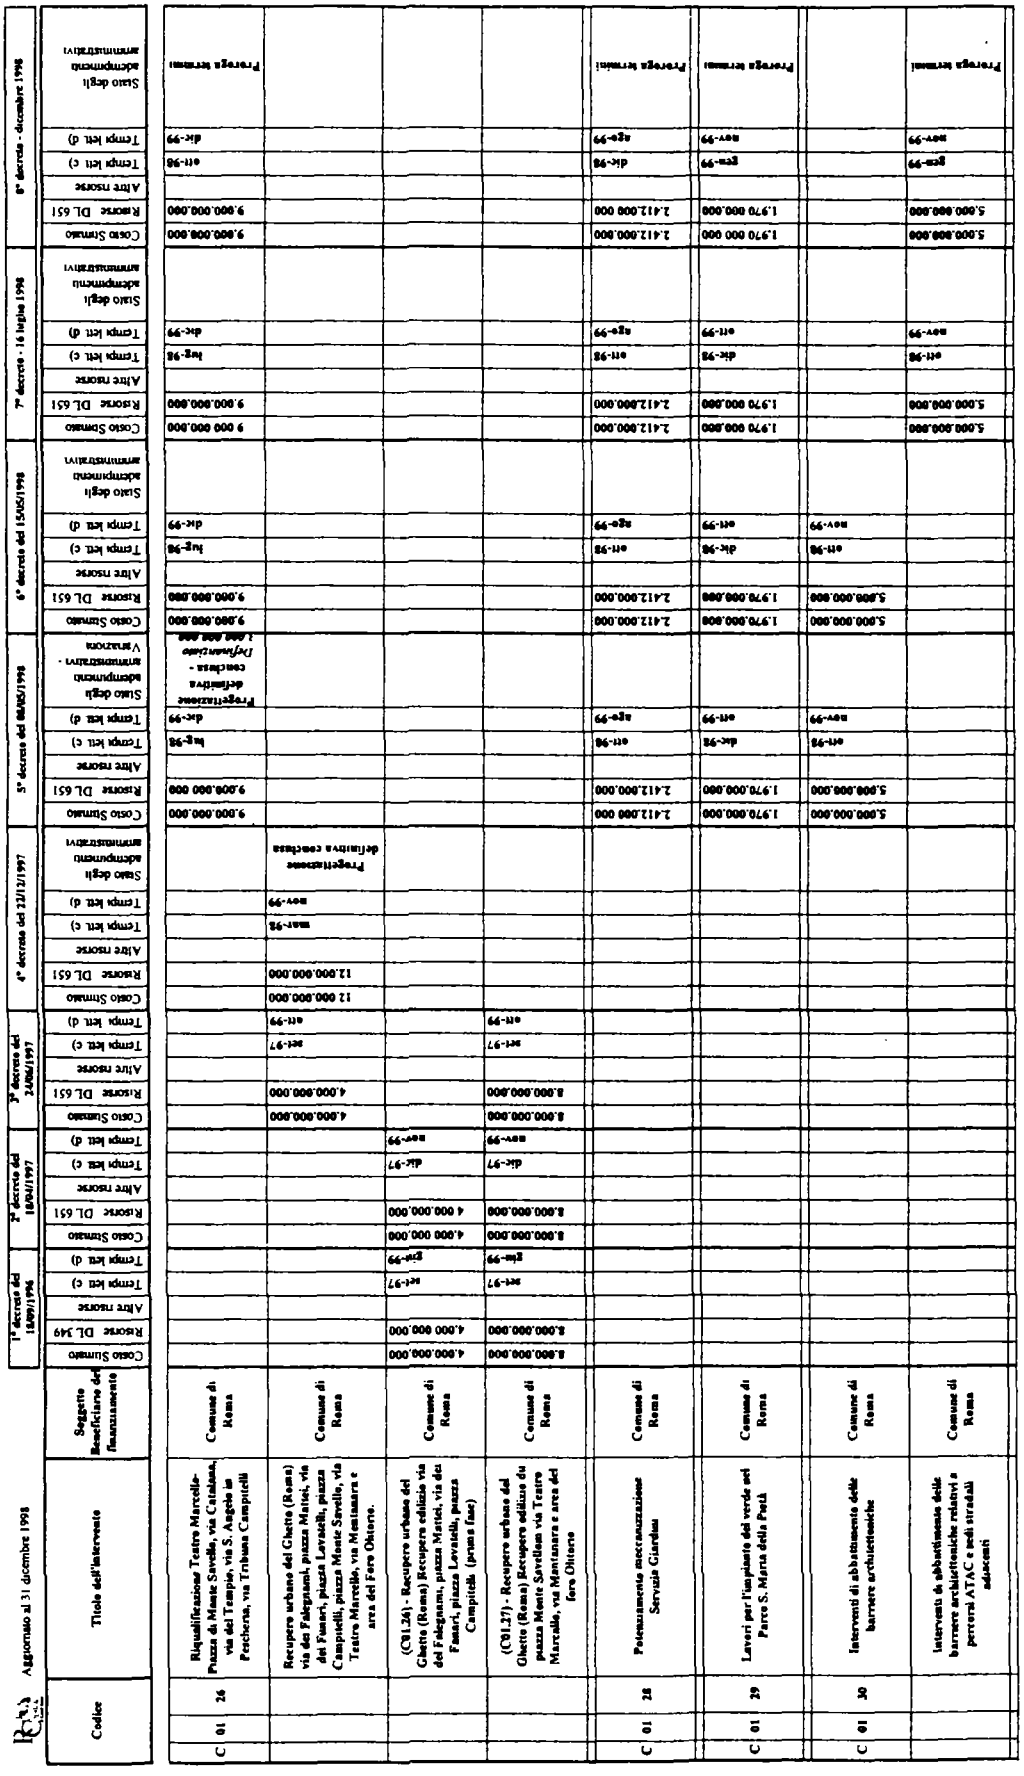

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	Vedi C.02.A
C 02 A	Area della Basiliche di S. Pietro in Vaticano, S. Giovanni, Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme e San Paolo fuori le mura. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale	STA								Accorpamento degli interventi C 02.01/3 - C.02.02/4 - C.02.03/3 in C 02.A	
C 02 01	Area della Basilica di San Pietro (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	Costo Sumano 50.000.000.000 Risorse DL 549 50.000.000.000	Costo Sumano 50.000.000.000 Risorse DL 651 49.000.000.000 Altre risorse Tempi lett c) feb-98 Tempi lett d) nov-99		Progettazione in corso					
C 02 01/1	Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza.....	Comune di Roma	Costo Sumano 50.000.000.000 Risorse DL 651 49.000.000.000 Altre risorse 1.000.000.000 Tempi lett c) gen-98 Tempi lett d) nov-99	Costo Sumano 49.000.000.000 Risorse DL 651 49.000.000.000 Altre risorse Tempi lett c) gen-98 Tempi lett d) ott-99	Costo Sumano 49.000.000.000 Risorse DL 651 49.000.000.000 Altre risorse Tempi lett c) gen-98 Tempi lett d) ott-99	Costo Sumano 25.955.600.000 Risorse DL 651 25.955.600.000 Altre risorse Tempi lett c) apr-99 Tempi lett d) ott-99	Costo Sumano 25.955.600.000 Risorse DL 651 25.955.600.000 Altre risorse Tempi lett c) apr-99 Tempi lett d) ott-99	Costo Sumano 25.955.600.000 Risorse DL 651 25.955.600.000 Altre risorse Tempi lett c) apr-99 Tempi lett d) ott-99	Costo Sumano 25.955.600.000 Risorse DL 651 25.955.600.000 Altre risorse Tempi lett c) apr-99 Tempi lett d) nov-99	Costo Sumano 5.547.538.000 Risorse DL 651 5.547.538.000 Altre risorse Tempi lett c) apr-99 Tempi lett d) nov-99	Costo Sumano 2.625.700.000 Risorse DL 651 2.625.700.000 Altre risorse Tempi lett c) giu-99 Tempi lett d) nov-99	
C 02 01.1.1	"BOR": Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma									
C 02 01.1.2	"RIS": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza Risorgimento ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma									
C 02 01.1.3	"CON". Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	Costo Sumano 1.869.560.000 Risorse DL 651 1.869.560.000	Costo Sumano 1.869.560.000 Risorse DL 651 1.869.560.000	Costo Sumano 1.869.560.000 Risorse DL 651 1.869.560.000	Costo Sumano 1.869.560.000 Risorse DL 651 1.869.560.000	Costo Sumano 1.869.560.000 Risorse DL 651 1.869.560.000	Costo Sumano 1.869.560.000 Risorse DL 651 1.869.560.000	Costo Sumano 4.583.604.000 Risorse DL 651 4.583.604.000	Costo Sumano 4.583.604.000 Risorse DL 651 4.583.604.000	
C 02 01/2	Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	Costo Sumano 1.869.560.000 Risorse DL 651 1.869.560.000	Costo Sumano 1.869.560.000 Risorse DL 651 1.869.560.000	Costo Sumano 1.869.560.000 Risorse DL 651 1.869.560.000	Costo Sumano 1.869.560.000 Risorse DL 651 1.869.560.000	Costo Sumano 1.869.560.000 Risorse DL 651 1.869.560.000	Costo Sumano 1.869.560.000 Risorse DL 651 1.869.560.000	Costo Sumano 1.869.560.000 Risorse DL 651 1.869.560.000	Costo Sumano 1.869.560.000 Risorse DL 651 1.869.560.000	Vedi C.02.A
C 02 01/3	Area della Basilica di S., Pietro in Vaticano. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale	STA									

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
			Costo Stimato Risorse DL 349 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)	Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C 02 01/4	Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Interventi di risanamento igienico ed ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici	AMA	35.000.000.000 mar-99 gen-98	35.000.000.000 1.500.000.000 33.500.000.000 mar-99 gen-98	2.837.000.000 2.837.000.000 gen-98 dic-98	1.787.000.000 1.787.000.000 gen-98 dic-98	907.430.000 907.430.000 apr-98 nov-99	907.430.000 907.430.000 apr-98 nov-99		
	Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano - interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il risanamento igienico ambientale	AMA								Cambio titolo - proroga termini
C 02 01/5	Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Installazione di impianti tecnologici TV/CC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza	Ministero Interni					907.430.000 907.430.000 apr-98 nov-99	907.430.000 907.430.000 apr-98 nov-99		
C 02 01/6	Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Stazione S. Pietro: allestimenti per strutture ai pellegrini e realizzazione del percorso pedonale protetto lungo Peste Gedemnico	F.S.					1.444.500.000 1.444.500.000 apr-99 nov-99	1.444.500.000 1.444.500.000 apr-99 nov-99		
		Roma Duemila								Cambio sedime - Cambio titolo
C 02 01/7	Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro (II Lotto)	Roma 2000 S.p.a.					9.240.000.000 9.240.000.000 gen-98 mar-99			Nuovi Interventi AR C
C 02 02	Area della Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	35.000.000.000 35.000.000.000 nov-99 gen-98 1.500.000.000 33.500.000.000 mar-99 gen-98							
C 02 02/1	Demolizione rimessa ATAC via Carlo Felice tra Basiliche S. Giovanni e S. Croce.	Comune di Roma			2.837.000.000 2.837.000.000 gen-98 dic-98	1.787.000.000 1.787.000.000 gen-98 dic-98	Conf. di Serv. tra prop. dell. (approvato) - Ribasso 1.454.000.000			
C 02 02/1	Demolizione dei dimezzi depositi ATAC di via Carlo Felice	Comune di Roma							Riduzione esproprazioni AR "A2" per 562.145 1.786.437.855 dic-97 gen-98	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 15/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
			Costo Sumaio Risorse DL 349 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d) Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d) Stato degli adempimenti amministrativi - Varianti	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d) Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d) Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d) Stato degli adempimenti amministrativi
C 02 02/2	Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; Realizzazione di strutture temporanee di srvizio ai pellegrini e per la sicurezza...	Comune di Roma								
C 02 02.2.1	CREVIA" - Area delle Basiliche di S.ta Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) Intervento di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di ...	Comune di Roma				Progettazione in corso				
C 02 02.2.1	Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali	Comune di Roma						22.213.751.000	22.213.751.000	14.129.000.000
C 02 02.2.2	"CIO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Giovanni ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma						22.213.751.000	22.213.751.000	14 129.000.000
C 02 02.2.3	"MER": Progetto di riqualificazione ambientale di via Merulana ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma								14.129.000.000
C 02 02.2.4	"MAR": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Maria Maggiore ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma								
C 02 02.2.5	"CRO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Croce in Gerusalemme ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma								
C 02 02.2.6	"QUA": Progetto di riqualificazione ambientale di via Santi Quattro Coronati ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma								
C 02 02/3	Recupero funzionale e valorizzazione edifici storici ospedale S. Giovanni in Roma. Comparto funzionale al Giubileo per l'accoglienza dei pellegrini.	Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni-Addolorata								

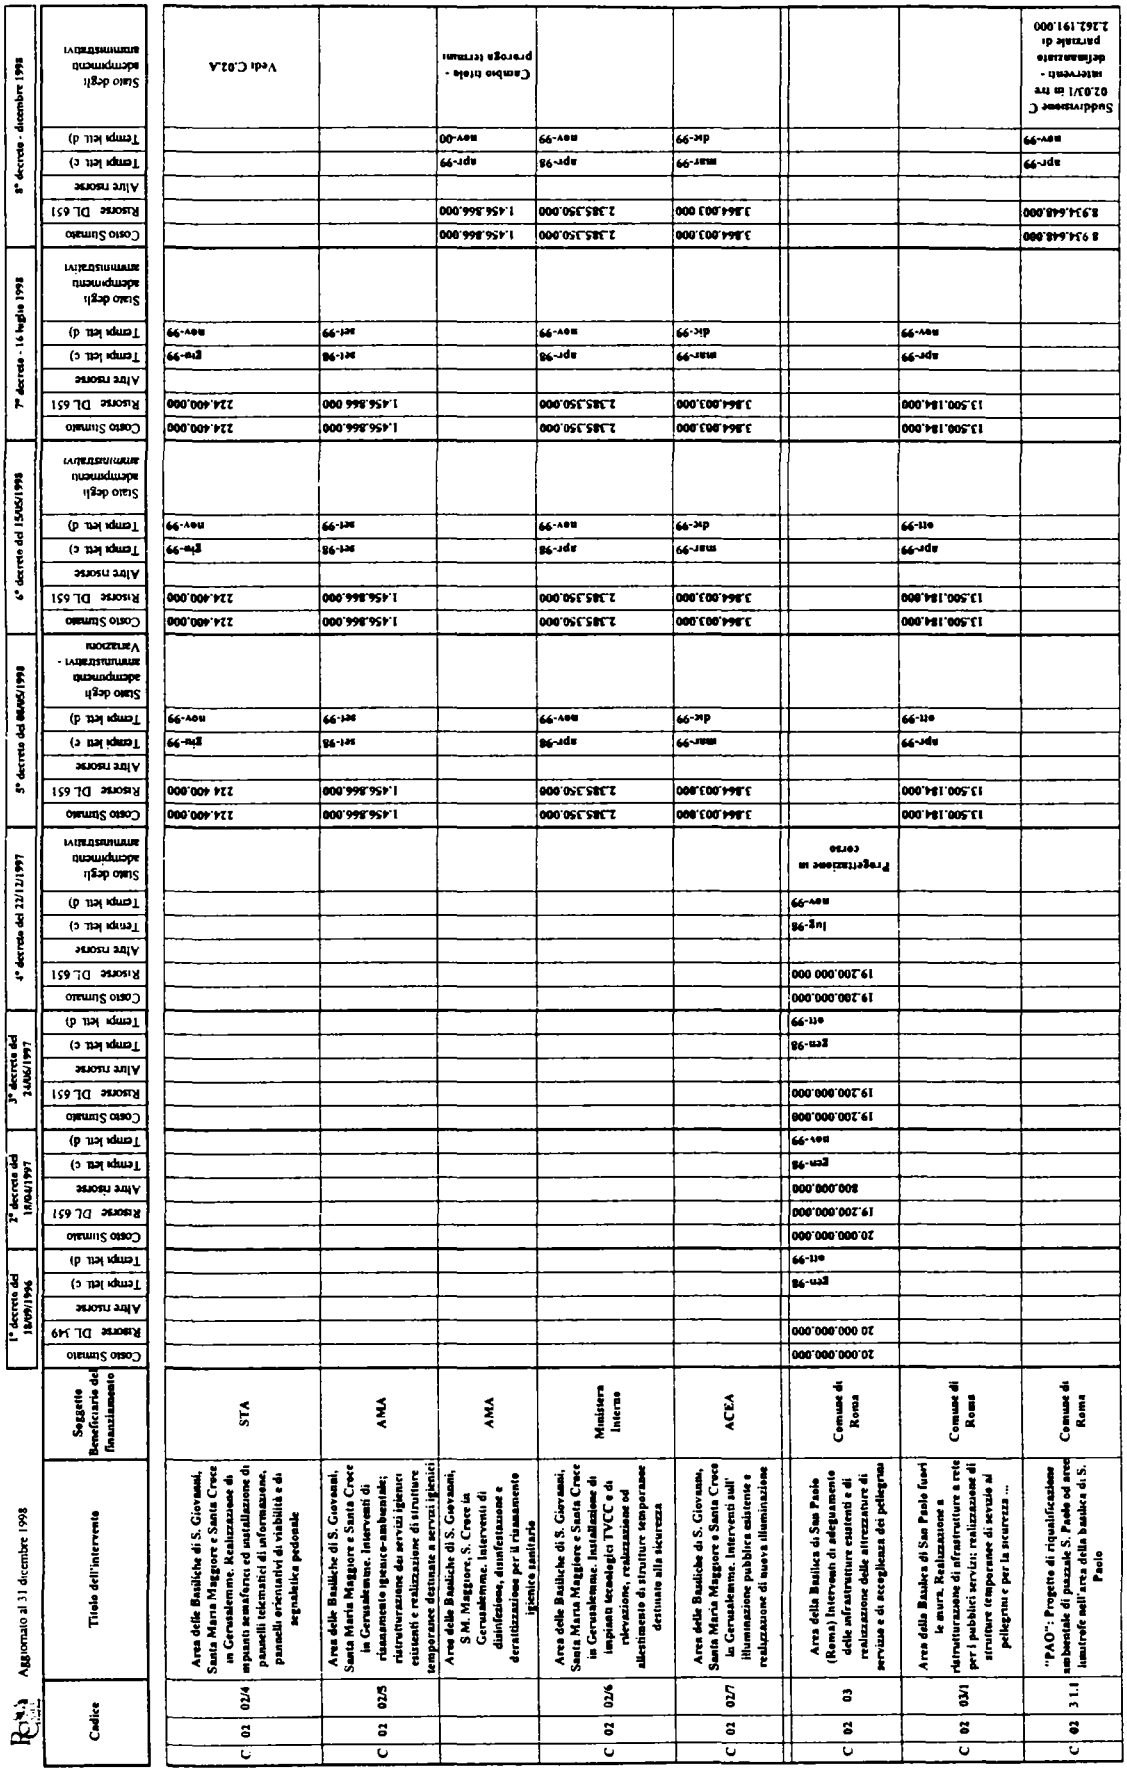

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento		1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
	Aggiornato al 31 dicembre 1998										
C 02 02/4	Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale	STA	Costo Stimato								Vedi C.02.A
			Risorse DL 449								
			Altre risorse								
			Temp. Ist. c)								
			Temp. Ist. d)								
C 02 02/5	Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Interventi di risanamento igienico-ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici	AMA	Costo Stimato					1.456.866.000	1.456.866.000	224.400.000	
			Risorse DL 651					1.456.866.000	1.456.866.000	224.400.000	
			Altre risorse								
			Temp. Ist. c)					ott-98	set-98	lug-99	
			Temp. Ist. d)					set-99	set-99	nov-99	
	Area delle Basiliche di S. Giovanni, S.M. Maggiore, S. Croce in Gerusalemme. Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il risanamento igienico sanitario	AMA	Costo Stimato								Cambio tirole - proroga termini
			Risorse DL 651								1.456.866.000
			Altre risorse								
			Temp. Ist. c)								apr-99
			Temp. Ist. d)								nov-00
C 02 02/6	Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione, realizzazione od allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza	Ministero Interno	Costo Stimato					2.385.350.000	2.385.350.000		
			Risorse DL 651					2.385.350.000	2.385.350.000		
			Altre risorse								
			Temp. Ist. c)					apr-98	apr-98		
			Temp. Ist. d)					nov-99	nov-99		
C 02 02/7	Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Interventi sull' illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	Costo Stimato					3.864.003.000	3.864.003.000		
			Risorse DL 651					3.864.003.000	3.864.003.000		
			Altre risorse								
			Temp. Ist. c)					mar-99	mar-99		
			Temp. Ist. d)					dic-99	dic-99		
C 02 03	Area della Basilica di San Paolo (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	Costo Stimato								
			Risorse DL 651								
			Altre risorse								
			Temp. Ist. c)								
			Temp. Ist. d)								
C 02 03/1	Area della Basilica di San Paolo fuori le mura. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza ...	Comune di Roma	Costo Stimato	20.000.000.000	20.000.000.000	19.200.000.000	19.200.000.000				
			Risorse DL 449	20.000.000.000							
			Altre risorse								
			Temp. Ist. c)								
			Temp. Ist. d)								
C 02 3.1.1	"PAO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazzale S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	Costo Stimato								Suddivisione C 02.03/1 in tre interventi - definizione parziale di 2.162.191.000
			Risorse DL 651								8.934.648.000
			Altre risorse								
			Temp. Ist. c)								apr-99
			Temp. Ist. d)								nov-99

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
C 02	3.1.2	"LUN": Progetto di riqualificazione ambientale di lungotevere S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma								
C 02	3.1.3	"OST": Progetto di riqualificazione ambientale da via Ostiense ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma								
C 02	03/2	Area della Basilica di San Paolo fuori le mura. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA								
C 02	03/3	Area della Basilica di San Paolo fuori le mura.Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale	STA								
C 02	03/4	Area della Basilica di San Paolo fuori le mura. Interventi di risanamento igienico ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici	AMA								
		Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione per il risanamento igienico sanitario	AMA								
C 02	03/5	Area della Basilica di San Paolo fuori le mura. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza	Ministero Interni								
C 02	03/6	Area della Basilica di San Paolo fuori le mura. Restauro e consolidamento *del tratto della Basilica di S. Paolo* fuori le mura e manutenzione del muro di cinta verso viale S. Paolo	P. Ammne Patriarcale Basilica S. Paolo								
C 02	04	Itinerari giubilari e storici. Contributo per la riqualificazione e manutenzione sedi stradali	Comune di Roma								

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
					Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato
					20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000
					Risorse DL 349	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651
					20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000
					Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse
					Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato
					20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000
					Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651
					20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000
					Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse
					Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)
					gen-98	mag-98	gen-98	lug-98	lug-98	lug-98	set-98	dic-98
					Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)
					ott-99	nov-99	ott-99	ott-99	ott-99	ott-99	nov-99	mar-99
					Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi - Varianti	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi
04.1	C 02		Itinerari giubilari storici (Roma) Riqualificazione e adeguamento delle sedi stradali	Comune di Roma								
04.1	C 02		Itinerari giubilari e storici. Contributo alla manutenzione delle sedi stradali	Comune di Roma								
04.1	C 02		Itinerari giubilari e storici. Contributi per la manutenzione e la riqualificazione delle sedi stradali e relative pertinenze	Comune di Roma								Suddivisione C.02.04 in due interventi e proroga termini
04.2	C 02		Contributo per interventi di manutenzione delle sedi stradali e relative pertinenze degli itinerari giubilari e storici, precessioni e celebrazioni religiose	Comune di Roma								Suddivisione C.02.04 in due interventi e proroga termini
05	C 02		Area delle Catacombe cristiane (Roma) Attrezzatura delle aree	Comune di Roma					Progettazione in corso			
			Intervento di adeguamento dei parcheggi a disposizione delle catacombe aperte al pubblico in Roma	Comune di Roma								
			Contributo per la manutenzione delle sedi stradali e pertinenze delle strade di accesso e dei parcheggi a servizio delle zone limitrofe alle catacombe aperte al pubblico	Comune di Roma								Cambio titolo - proroga termini
06	C 02		Posti pedonali temporanei nella città di Roma	Comune di Roma								
07	C 02		Pista ciclabile Castel S. Angelo-Ponte Sublicio	Comune di Roma								
					Definanziato Lav. Per 2.000.000.000							

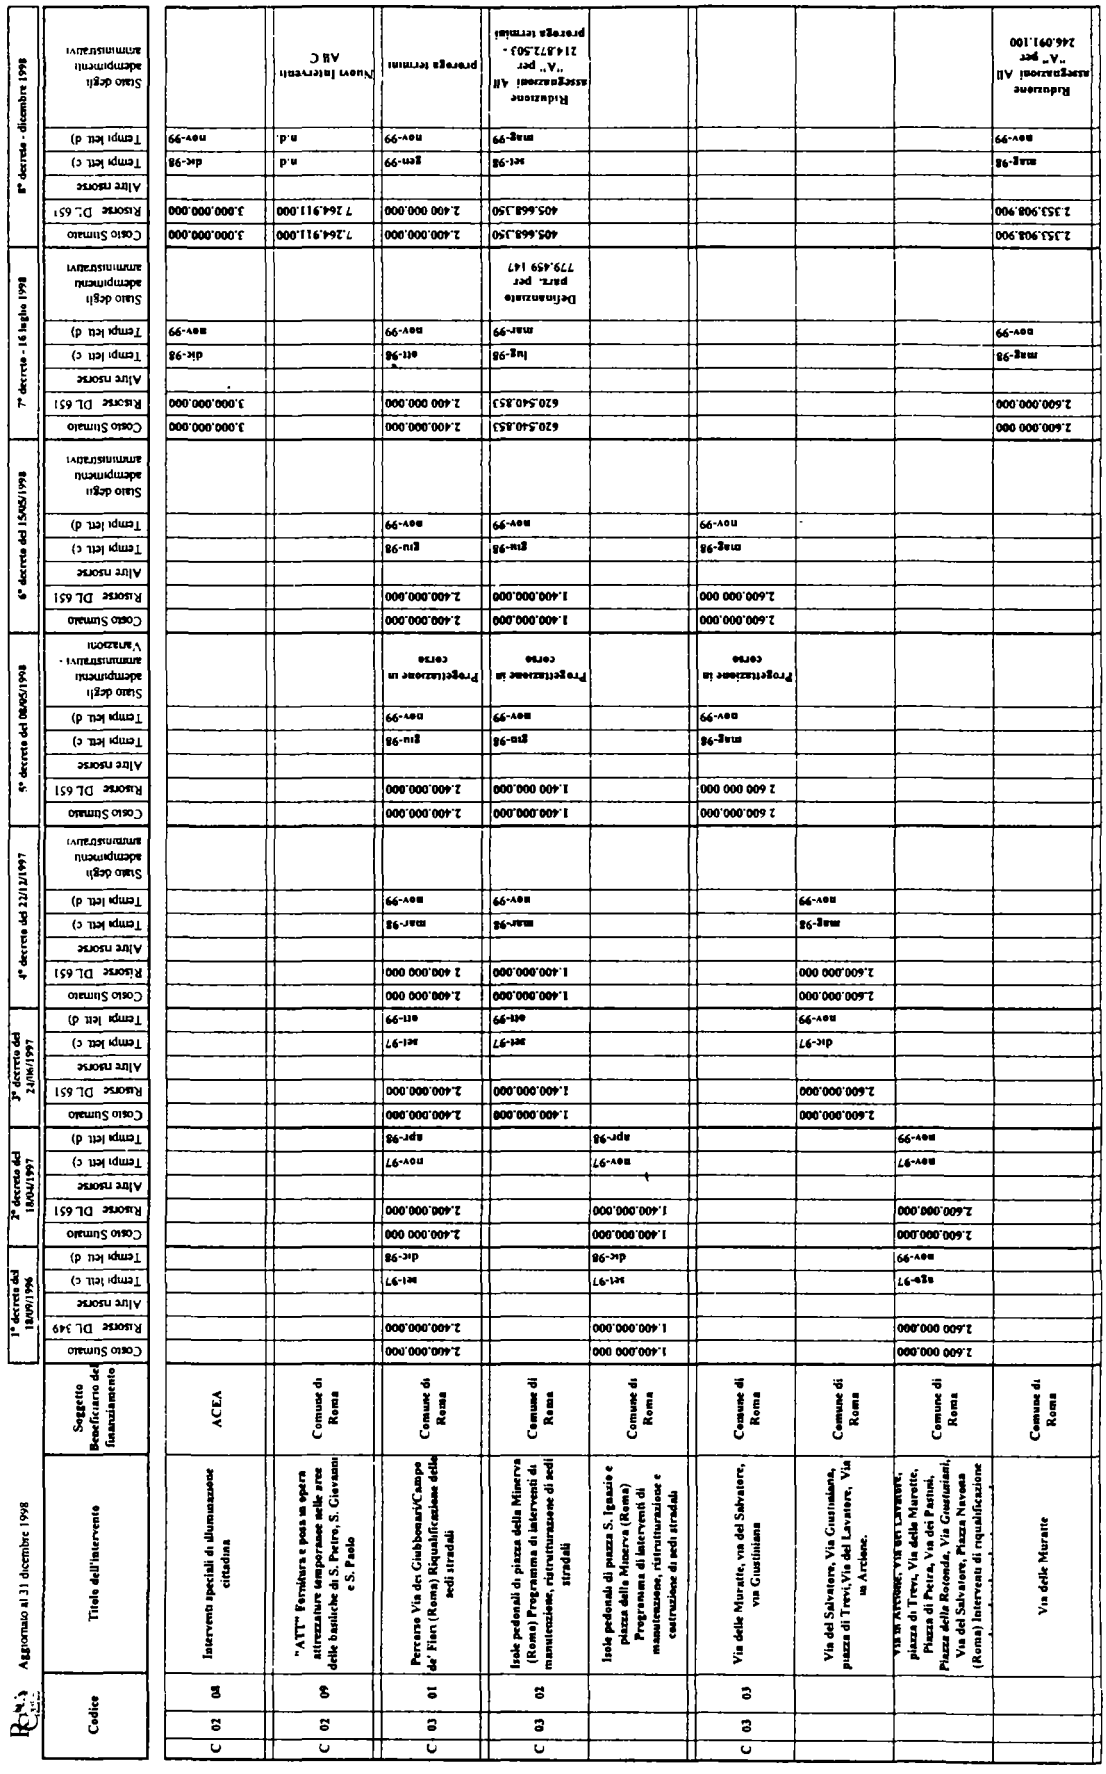

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
C 02	08		Interventi speciali di illuminazione cittadina	ACEA	Costo Sumaio Risorse DL 349 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi Istr. c) Tempi Istr. d)						Riduzione autorizzazioni Aff "A" per 246.091.100 mag-98 nov-99
C 02	09		"ATT" Forniture e posa in opera attrezzature temporanee nelle aree delle basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo	Comune di Roma	2.400.000.000 2.400.000.000 dic-98 set-97	2.400.000.000 2.400.000.000 nov-97 apr-98	2.400.000.000 2.400.000.000 set-97 ott-99	2.400.000.000 2.400.000.000 mar-98 nov-99	Proiettazione in corso Proiettazione in corso	2.600.000.000 2.600.000.000 mag-98 nov-99	620.540.853 620.540.853 lug-98 mar-99	405.668.350 405.668.350 set-98 mag-99
C 03	01		Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riqualificazione delle sedi stradali	Comune di Roma	2.400.000.000 2.400.000.000 apr-98 nov-97 set-97 ott-99 2.400.000.000 2.400.000.000 mar-98 nov-99 giu-98 nov-99 Proiettazione in corso 2.400.000.000 2.400.000.000 giu-98 nov-99							Nuovi Interventi Aff C preventivi terminali
C 03	02		Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma								405.668.350 214.872.503 - preventivi terminali Riduzione autorizzazioni Aff "A" per
C 03			Isole pedonali di piazza S. Ignazio e piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione e costruzione di sedi stradali	Comune di Roma	1.400.000.000 1.400.000.000 dic-98 set-97	1.400.000.000 1.400.000.000 nov-97 apr-98	1.400.000.000 1.400.000.000 set-97 ott-99	1.400.000.000 1.400.000.000 mar-98 nov-99	1.400.000.000 1.400.000.000 giu-98 nov-99			Difesa nazionale parz. per 779.459 147
C 03	03		Via delle Muratte, via del Salvatore, via Giustiniana	Comune di Roma					Proiettazione in corso Proiettazione in corso	2.600.000.000 2.600.000.000 mag-98 nov-99		
			Via del Salvatore, Via Giustiniana, piazza di Trevi, Via del Lavatore, Via in Arcione.	Comune di Roma				2.600.000.000 2.600.000.000 mag-98 nov-99				
			Via in Arcione, via del Lavatore, piazza di Trevi, Via della Muratte, Piazza di Pietra, Via dei Pastini, Piazza della Rotonda, Via Giustiniani, Via del Salvatore, Piazza Navona (Roma) Interventi di riqualificazione	Comune di Roma	2.600.000.000 2.600.000.000 set-97 nov-99 2.600.000.000 2.600.000.000 nov-97 mag-98							
			Via delle Muratte	Comune di Roma								2.353.908.900 2.353.908.900 mag-98 nov-99 2.600.000.000 2.600.000.000 mag-98 nov-99

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	Stato degli adempimenti amministrativi
C 03 04 01	Terminal bus	Comune di CastelGandolfo									
C 03 09	Incentivi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione	Regione Lazio									Nuovi Interventi All C
C 03 08	Controlli ristrutturazione bagni locali pubblici e insegne esercizi commerciali	Comune di Roma						5.000.000.000 dic-99	5.000.000.000 dic-99	5.000.000.000 dic-98	2.000.000.000 n.d.
C 03 07	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (secondo stralcio)	Comune di Roma						27.500.000.000 dic-99	27.500.000.000 dic-99	27.500.000.000 dic-98	5.000.000.000 dic-98
C 03 06	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (prima stralcio)	Comune di Roma						112.500.000.000 dic-99	112.500.000.000 dic-99	112.500.000.000 ott-98	5.000.000.000 dic-98
C 03	Incentivi per la manutenzione delle facciate degli edifici storici e l'adeguamento delle insegne commerciali (Roma)	Comune di Roma	19.000.000.000	Dirottamento							
C 04 01	Area pedonale del Celiomonte e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma	4.600.000.000 Risorse DL 349	4.600.000.000 Risorse DL 651	4.600.000.000 Risorse DL 651	1.500.000.000 Risorse DL 651	1.000.000.000 Risorse DL 651	4.600.000.000 Risorse DL 651	4.600.000.000 Risorse DL 651	3.257.956.147 Risorse DL 651	Riduzione autorizzazioni di cassa "A" per 1.342.043.853 - proroga termini
C 03 05	Intervento urbanistico connesso alla lisca Archeviram	Comune di Roma		28.000.000.000 Costo Stimato	20.000.000.000 Costo Stimato	20.000.000.000 Costo Stimato	Differenziato 19.000.000.000	1.000.000.000 Risorse DL 651	1.000.000.000 Risorse DL 651	1.000.000.000 Risorse DL 651	
C 03	Archeviram (Roma) Interventi di inserimento urbanistico nelle aree di maggiore interesse religioso e turistico complementari alla realizzazione della tranvia	Comune di Roma	28.000.000.000 Risorse DL 651	28.000.000.000 Costo Stimato	20.000.000.000 Costo Stimato	20.000.000.000 Costo Stimato	Differenziato 19.000.000.000	1.000.000.000 Risorse DL 651	1.000.000.000 Risorse DL 651	1.000.000.000 Risorse DL 651	
	Altre risorse										
	Temp. ist. c)		ott-97	apr-98	mar-98	mar-98	gen-98	ott-98	ago-98	set-98	
	Temp. ist. d)		lug-99	set-99	lug-99	lug-99	ott-99	dic-99	lug-99	ott-99	
	Stato degli adempimenti amministrativi										
	Costo Stimato		4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	3.257.956.147	
	Risorse DL 651		4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	2.000.000.000	
	Altre risorse										
	Temp. ist. c)		ott-97	apr-98	mar-98	mar-98	gen-98	ott-98	ago-98	set-98	
	Temp. ist. d)		lug-99	set-99	lug-99	lug-99	ott-99	dic-99	lug-99	ott-99	
	Stato degli adempimenti amministrativi						Progettazione in corso				Riduzione autorizzazioni di cassa "A" per 1.342.043.853 - proroga termini
	Costo Stimato		4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	Preventivato 19.000.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	3.257.956.147	
	Risorse DL 651		4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	2.000.000.000	
	Altre risorse										
	Temp. ist. c)		ott-97	apr-98	mar-98	mar-98	gen-98	ott-98	ago-98	set-98	
	Temp. ist. d)		lug-99	set-99	lug-99	lug-99	ott-99	dic-99	lug-99	ott-99	
	Stato degli adempimenti amministrativi						Preventivato 19.000.000.000				Riduzione autorizzazioni di cassa "A" per 1.342.043.853 - proroga termini
	Costo Stimato		4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996					2° decreto del 18/04/1997					3° decreto del 24/04/1997					4° decreto del 22/12/1997					5° decreto del 08/05/1998					6° decreto del 15/05/1998					7° decreto - 16 luglio 1998					8° decreto - dicembre 1998				
				Costo Sumaio	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Terminal bus (tra la SS 140 ed il parco pubblico di Tertona) per la riorganizzazione dei turisti	Comune di CastelGandolfo	1.500.000.000	1.500.000.000		apr-97	apr-99	1.500.000.000	1.500.000.000		gen-98	giu-98	18.000.000.000	18.000.000.000		nov-97	nov-99																								
C	04	02 Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza e galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico	Comune di CastelGandolfo																																							
C	04	02/a Area di Castel Gandolfo (Roma) Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico	Comune di CastelGandolfo												12.000.000.000	12.000.000.000		apr-98	nov-99	12.000.000.000	12.000.000.000		feb-98	lug-99	Progettazione definitiva conclusa - Definanziato 1.000.000.000	Espunto	Espunto															
C	04	02/b Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza	Comune di CastelGandolfo												6.000.000.000	6.000.000.000		apr-98	nov-99	6.000.000.000	6.000.000.000		feb-98	lug-99	Definanziato 5.700.000.000	Espunto	Espunto															
C	04	03 Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta	Comune di CastelGandolfo												1.650.000.000	1.650.000.000				1.650.000.000	1.650.000.000		feb-98	mar-99	Progettazione definitiva conclusa - Definanziato 4.950.000.000	Espunto	Espunto															
C	04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta tra la SS. Appia e la SS 140	Comune di CastelGandolfo		1.650.000.000			apr-99		1.650.000.000			apr-98																													
C	04	04 Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastrutture fermate ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo		1.200.000.000		dic-97	gen-99	1.200.000.000	1.200.000.000		mar-98	apr-99		1.200.000.000		feb-98	mar-99		1.200.000.000		feb-98	mar-99	Progettazione definitiva conclusa - Definanziato 700.000.000	Espunto	Espunto															
C	04	A Terminal Bus	Comune di CastelGandolfo		1.500.000.000		ott-98	nov-99	1.500.000.000	1.500.000.000		ott-98	nov-99																													
C	04	B Centro servizi di prima necessità	Comune di CastelGandolfo		1.500.000.000		ott-98	apr-99	1.500.000.000	1.500.000.000		ott-98	apr-99																													

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice				Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/08/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998
						Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	04	C		Sottopasso pedonale di via Maremmana	Comune di Castel Gandolfo																	300.000.000	300.000.000		otl-98	set-99		300.000.000	300.000.000		otl-98	set-99		
C	04	D		Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico	Comune di Castel Gandolfo																	2.550.000.000	550.000.000		otl-98	set-99	Definanziato parz. per 2.000.000.000	550.000.000	550.000.000		otl-98	nov-99	Definanziato parz. per 2.000.000.000	otl-98	nov-99
C	04	E		Sistemazione della viabilità urbana	Comune di Castel Gandolfo																	1.800.000.000	3.500.000.000		otl-98	set-99	Interferenze Rimaneggiamento di 1.700 000.000	3.500.000.000	3.500.000.000		otl-98	set-99	Interferenze Rimaneggiamento di 1.700 000.000	otl-98	set-99
C	04	F		Sistemazione della passeggiata sul lungolago	Comune di Castel Gandolfo																	1.000 000.000	2.500.000.000		otl-98	set-99	Interferenze Rimaneggiamento di 1.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000		otl-98	set-99	Interferenze Rimaneggiamento di 1.500.000.000	otl-98	set-99
C	04	G		Recupero e restauro monumenti	Comune di Castel Gandolfo																	500.000.000	Definanziato		otl-98	set-99	Definanziato fab. Per. 500 000.000								
C	04	H		Potenziamento infrastrutture ferrotranviarie "La Valeria"	Comune di Castel Gandolfo																	2.100 000.000	1.600.000.000		otl-98	nov-99	Definanziato parz. per 700.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000		otl-98	nov-99	Definanziato parz. per 700.000.000	otl-98	nov-99
C	05	01		Giardini di Castel S. Angelo (Roma) Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale	Comune di Roma																														
C	05	01/1		Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale, giardini dei bastioni	Comune di Roma																														
C	05	01/2		Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma																														
						5.000.000.000	5.000.000.000		nov-97	otl-99	5.000.000.000	5.000.000.000		lug-98	otl-99	3.300.000.000	3.300.000.000		dic-98	lug-99	3.300.000.000	3.300.000.000		dic-98	lug-99	Progettazione in corso	3.300.000.000	3.300.000.000		dic-98	lug-99	Progettazione in corso	3.300.000.000	3.300.000.000

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
C	06	01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	Costo Sumaio	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Risorse DL 349	3.500.000.000						
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)	ott-97	set-97					apr-98
					Tempi lett. d)	dic-99	ago-99	ago-99				dic-99
C	07	01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma	Costo Sumaio	3.500.000.000	7.000.000.000	12.000.000.000	7.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Risorse DL 651	3.500.000.000	7.000.000.000	12.000.000.000	7.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)		mar-98					apr-98
					Tempi lett. d)		dic-99	ago-99				dic-99
C	08	01	Villa Borghese (Roma) Restauro delle aree a verde del Parco dei Daini, dei Giardini Segreti e realizzazione della recinzione	Comune di Roma	Costo Sumaio		7.000.000.000	12.000.000.000				3.500.000.000
					Risorse DL 349		7.000.000.000	12.000.000.000				3.500.000.000
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)		set-98	ott-97				apr-98
					Tempi lett. d)		ago-99	ago-99				dic-99
C	08	01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma	Costo Sumaio	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.500.000.000
					Risorse DL 651	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.500.000.000
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)	mag-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	gen-98
					Tempi lett. d)	mag-98	lug-99	lug-99	mag-98	lug-99	lug-99	dic-98
C	08	01/2	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro del Giardino del Lago	Comune di Roma	Costo Sumaio	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000
					Risorse DL 651	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)	mag-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	gen-98
					Tempi lett. d)	mag-98	lug-99	lug-99	mag-98	lug-99	lug-99	dic-98
C	08	01/3	Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via Pinciana,Giardini del lago, cancelli d'ingresso,Parco dei Daini.	Comune di Roma	Costo Sumaio	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.500.000.000
					Risorse DL 651	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.500.000.000
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)	mag-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	gen-98
					Tempi lett. d)	mag-98	lug-99	lug-99	mag-98	lug-99	lug-99	dic-98
C	08	01/4	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione	Comune di Roma	Costo Sumaio	5.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000
					Risorse DL 651	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.500.000.000
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	gen-98
					Tempi lett. d)	lug-99	gen-99	gen-99	lug-99	gen-99	gen-99	dic-98
C	08	01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma	Costo Sumaio	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.500.000.000
					Risorse DL 651	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.500.000.000
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)	nov-98	nov-98	nov-98	nov-98	nov-98	nov-98	gen-99
					Tempi lett. d)	lug-99	gen-99	gen-99	lug-99	gen-99	gen-99	dic-98
C	09	01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riqualificazione del compresso degli Acquedotti	Comune di Roma	Costo Sumaio	3.500.000.000						
					Risorse DL 349	3.500.000.000						
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)	apr-98						
					Tempi lett. d)	dic-99						
					Costo Sumaio	3.500.000.000	7.000.000.000	12.000.000.000	7.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Risorse DL 651	3.500.000.000	7.000.000.000	12.000.000.000	7.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)	apr-98	mag-98	ott-97				
					Tempi lett. d)	dic-99	ago-99	ago-99				
					Costo Sumaio	3.500.000.000	7.000.000.000	12.000.000.000	7.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Risorse DL 349	3.500.000.000	7.000.000.000	12.000.000.000	7.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Altre risorse							
					Tempi lett. c)	ott-97	set-98	set-97				
					Tempi lett. d)	dic-99	ago-99	ago-99				

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento		Stato degli adempimenti amministrativi		Stato degli adempimenti amministrativi		Stato degli adempimenti amministrativi - Varazione		Stato degli adempimenti amministrativi		Stato degli adempimenti amministrativi		Stato degli adempimenti amministrativi	
C	06	01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	Costo Sumaio	progetto lavori											
					Risorse DL 349												
					Altre risorse												
					Tempi lett. c)												
					Tempi lett. d)												
C	07	01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma	Costo Sumaio	progetto lavori											
					Risorse DL 651												
					Altre risorse												
					Tempi lett. c)												
					Tempi lett. d)												
C	08	01	Villa Borghese (Roma) Restauro delle aree a verde del Parco dei Daini, dei Giardini Segreti e realizzazione della recinzione	Comune di Roma	Costo Sumaio												
					Risorse DL 349												
					Altre risorse												
					Tempi lett. c)												
					Tempi lett. d)												
C	08	01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma	Costo Sumaio	Ulteriore finanziamento di 194.343.000											
					Risorse DL 651												
					Altre risorse												
					Tempi lett. c)	nov-97											
					Tempi lett. d)	dic-98											
C	08	01/2	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro del Giardino del Lago	Comune di Roma	Costo Sumaio	progetto lavori											
					Risorse DL 651												
					Altre risorse												
					Tempi lett. c)	nov-97											
					Tempi lett. d)	ago-99											
C	08	01/3	Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via Pinciana,Giardini del lago, cancelli d'ingresso,Parco dei Daini.	Comune di Roma	Costo Sumaio	progetto lavori											
					Risorse DL 651												
					Altre risorse												
					Tempi lett. c)	set-98											
					Tempi lett. d)	mag-98											
C	08	01/4	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione	Comune di Roma	Costo Sumaio	progetto lavori											
					Risorse DL 651												
					Altre risorse												
					Tempi lett. c)	nov-97											
					Tempi lett. d)	gen-99											
C	08	01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma	Costo Sumaio	progetto lavori											
					Risorse DL 651												
					Altre risorse												
					Tempi lett. c)	nov-98											
					Tempi lett. d)	gen-99											
C	09	01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riqualificazione del compresso degli Acquedotti	Comune di Roma	Costo Sumaio	Riduzione stanziamenti AU "A" per 218.021.253											
					Risorse DL 349												
					Altre risorse												
					Tempi lett. c)	lug-98											
					Tempi lett. d)	set-99											
					Costo Sumaio	3.281.442.382											
					Risorse DL 651	3.281.442.382											
					Altre risorse												
					Tempi lett. c)	gen-99											
					Tempi lett. d)	dic-98											
					Costo Sumaio	3.499.463.635											
					Risorse DL 651	3.499.463.635											
					Altre risorse												
					Tempi lett. c)	nov-98											
					Tempi lett. d)	lug-99											
					Costo Sumaio	3.500.000.000											
					Risorse DL 651	3.500.000.000											
					Altre risorse												
					Tempi lett. c)	gen-98											
					Tempi lett. d)	dic-98											

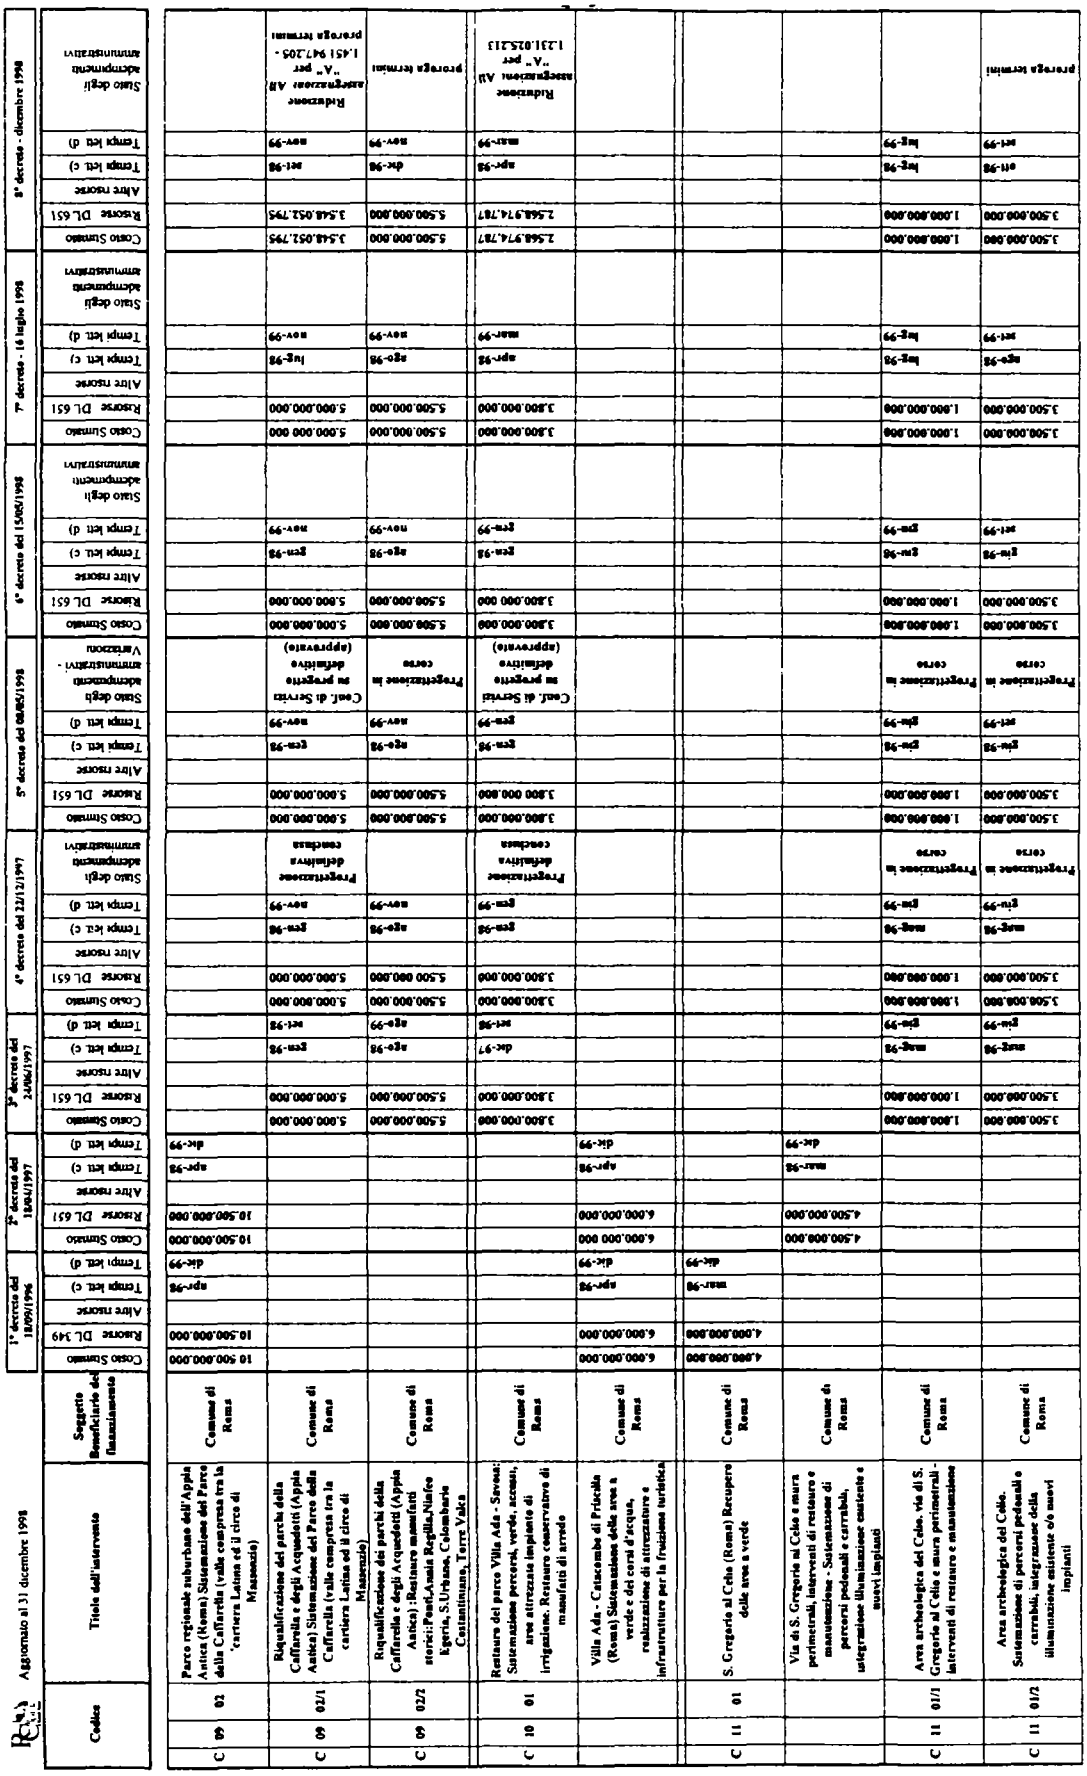

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/06/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	Stato degli adempimenti amministrativi
C	09	02	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la ferrovia Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma	Costo Stimato 10.500.000.000 Risorse DL 349 10.500.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) apr-98 Tempi ist. d) dic-99		Costo Stimato 5.500.000.000 Risorse DL 651 5.000.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) apr-98 Tempi ist. d) nov-99	Costo Stimato 5.000.000.000 Risorse DL 651 5.000.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) gen-98 Tempi ist. d) nov-99	Costo Stimato 5.000.000.000 Risorse DL 651 5.000.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) gen-98 Tempi ist. d) nov-99	Costo Stimato 5.000.000.000 Risorse DL 651 5.000.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) ago-98 Tempi ist. d) nov-99	Costo Stimato 5.000.000.000 Risorse DL 651 5.000.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) apr-98 Tempi ist. d) mar-99	Costo Stimato 3.548.052.795 Risorse DL 651 3.548.052.795 Altre risorse Tempi ist. c) set-98 Tempi ist. d) nov-99	Riduzione autorizzazioni di cassa "A" per 1.451.947.205 - proroga termini
C	09	02/1	Riqualificazione del parco della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma			Costo Stimato 5.500.000.000 Risorse DL 651 5.500.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) ago-98 Tempi ist. d) nov-99	Costo Stimato 5.500.000.000 Risorse DL 651 5.500.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) ago-98 Tempi ist. d) nov-99	Costo Stimato 5.500.000.000 Risorse DL 651 5.500.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) ago-98 Tempi ist. d) nov-99	Costo Stimato 5.500.000.000 Risorse DL 651 5.500.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) ago-98 Tempi ist. d) nov-99	Costo Stimato 5.500.000.000 Risorse DL 651 5.500.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) apr-98 Tempi ist. d) mar-99	Costo Stimato 5.500.000.000 Risorse DL 651 5.500.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) apr-98 Tempi ist. d) nov-99	proroga termini
C	09	02/2	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica): Restauro monumenti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S.Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca	Comune di Roma			Costo Stimato 5.500.000.000 Risorse DL 651 5.500.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) ago-98 Tempi ist. d) nov-99	Costo Stimato 5.500.000.000 Risorse DL 651 5.500.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) ago-98 Tempi ist. d) nov-99	Costo Stimato 5.500.000.000 Risorse DL 651 5.500.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) ago-98 Tempi ist. d) nov-99	Costo Stimato 5.500.000.000 Risorse DL 651 5.500.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) ago-98 Tempi ist. d) nov-99	Costo Stimato 5.500.000.000 Risorse DL 651 5.500.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) apr-98 Tempi ist. d) mar-99	Costo Stimato 5.500.000.000 Risorse DL 651 5.500.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) apr-98 Tempi ist. d) nov-99	proroga termini
C	10	01	Restauro del parco Villa Ada - Savoia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo	Comune di Roma			Costo Stimato 3.800.000.000 Risorse DL 651 3.800.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) dic-97 Tempi ist. d) set-98	Costo Stimato 3.800.000.000 Risorse DL 651 3.800.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) gen-98 Tempi ist. d) gen-99	Costo Stimato 3.800.000.000 Risorse DL 651 3.800.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) gen-98 Tempi ist. d) gen-99	Costo Stimato 3.800.000.000 Risorse DL 651 3.800.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) gen-98 Tempi ist. d) gen-99	Costo Stimato 3.800.000.000 Risorse DL 651 3.800.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) apr-98 Tempi ist. d) mar-99	Costo Stimato 2.568.974.787 Risorse DL 651 2.568.974.787 Altre risorse Tempi ist. c) apr-98 Tempi ist. d) mar-99	Riduzione autorizzazioni di cassa "A" per 1.231.025.213
C	10		Villa Ada - Catacombe di Priscilla (Roma) Sistemazione delle aree a verde e dei corsi d'acqua, realizzazione di attrezzature e infrastrutture per la fruizione turistica	Comune di Roma		Costo Stimato 6.000.000.000 Risorse DL 651 6.000.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) apr-98 Tempi ist. d) dic-99								
C	11	01	S. Gregorio al Celio (Roma) Recupero delle aree a verde	Comune di Roma	Costo Stimato 4.000.000.000 Risorse DL 349 4.000.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) mar-98 Tempi ist. d) dic-99								
			Via di S. Gregorio ni Celio e mura perimetrali; interventi di restauro e manutenzione - Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione illuminazione esistente e nuovi impianti	Comune di Roma		Costo Stimato 4.500.000.000 Risorse DL 651 4.500.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) mar-98 Tempi ist. d) dic-99								
C	11	01/1	Area archeologica del Celio, via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - Interventi di restauro e manutenzione	Comune di Roma							Costo Stimato 1.000.000.000 Risorse DL 651 1.000.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) lug-98 Tempi ist. d) lug-99	Costo Stimato 1.000.000.000 Risorse DL 651 1.000.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) lug-98 Tempi ist. d) lug-99	ott-98 set-99
C	11	01/2	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti	Comune di Roma							Costo Stimato 1.000.000.000 Risorse DL 651 1.000.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) set-98 Tempi ist. d) mag-99	Costo Stimato 1.000.000.000 Risorse DL 651 1.000.000.000 Altre risorse Tempi ist. c) set-98 Tempi ist. d) mag-99	proroga termini

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
C 11 02	Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro	Comune di Roma	Costo Sumaio Risorse DL 349 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi Costo Sumaio Risorse DL 651 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)
			20.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	2.866.272.653	2.866.272.653
	Casina dei Salvi consolidamento e restauro	Comune di Roma		3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	2.866.272.653	2.866.272.653
	Area archeologica del Celio (Roma) Recupero e valorizzazione dell'area (Programma PARCEL)	Comune di Roma	nov-99 gen-97							
C 11 03	Area archeologica del Celio. Sezione pubblica turistica e bande nella ex palestra dei vigili.	Comune di Roma			1.700.000.000 set-98 mag-98 gen-99	1.700.000.000 set-99 mag-98 gen-99	1.700.000.000 set-99 gen-99	1.700.000.000 set-99 gen-99	1.700.000.000 ago-99 set-98 ago-99	Riduzione assegnazioni All "A" per 418 912 469 1.281.087.531 1.281.087.531
	Ex palestra dei Vigili - Sez. Polizia Turistica e Banda (coperture, impianti, sistemazioni esterne)	Comune di Roma		dic-99 mar-98	1 700 000 000 1 700 000 000					
C 11 04	Area archeologica del Celio. Restauro del Casale quattrocentesco dell'abate commendatario e sistemazione esterna delle aree limitrofe.	Comune di Roma			800.000.000 800 000 000 apr-98 lug-99	800.000.000 800 000 000 apr-98 lug-99	800.000.000 800 000 000 mag-98 apr-99	800.000.000 800 000 000 mag-98 apr-99	800 000 000 800 000 000 gen-98 ago-99	
	Casa dell'ex Abate Commendatario (consolidamento e restauro)	Comune di Roma	dic-99	dic-99 mar-98	800 000 000 1 700 000 000	800 000 000 1 700 000 000	800 000 000 1 700 000 000	800 000 000 1 700 000 000	616 459 817 616 459 817	Riduzione assegnazioni All "A" per 183 540 183 - proroga termini proroga termini
	Area archeologica del Celio. Restauro del casale quattrocentesco dell'Abate Commendatario	Comune di Roma								
C 11 05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S Stefo Vecchio.	Comune di Roma	dic-99 mar-98	dic-98 set-98	4.000.000.000 4 000.000.000 set-98 mar-99	4.000.000.000 4 000.000.000 set-98 mar-99	4.000.000.000 4 000.000.000 set-98 mar-99	4.000.000.000 4 000.000.000 set-98 mar-99	4.000.000.000 4 000.000.000 ott-98 apr-99	
	Restauro del verde di Villa Celimontana ed aree prospicienti percorsi Archeotram	Comune di Roma	mar-98 dic-99		4 000.000.000 4.000.000.000	4 000.000.000 4.000.000.000	4 000.000.000 4.000.000.000	4 000.000.000 4.000.000.000	4 000.000.000 4.000.000.000	

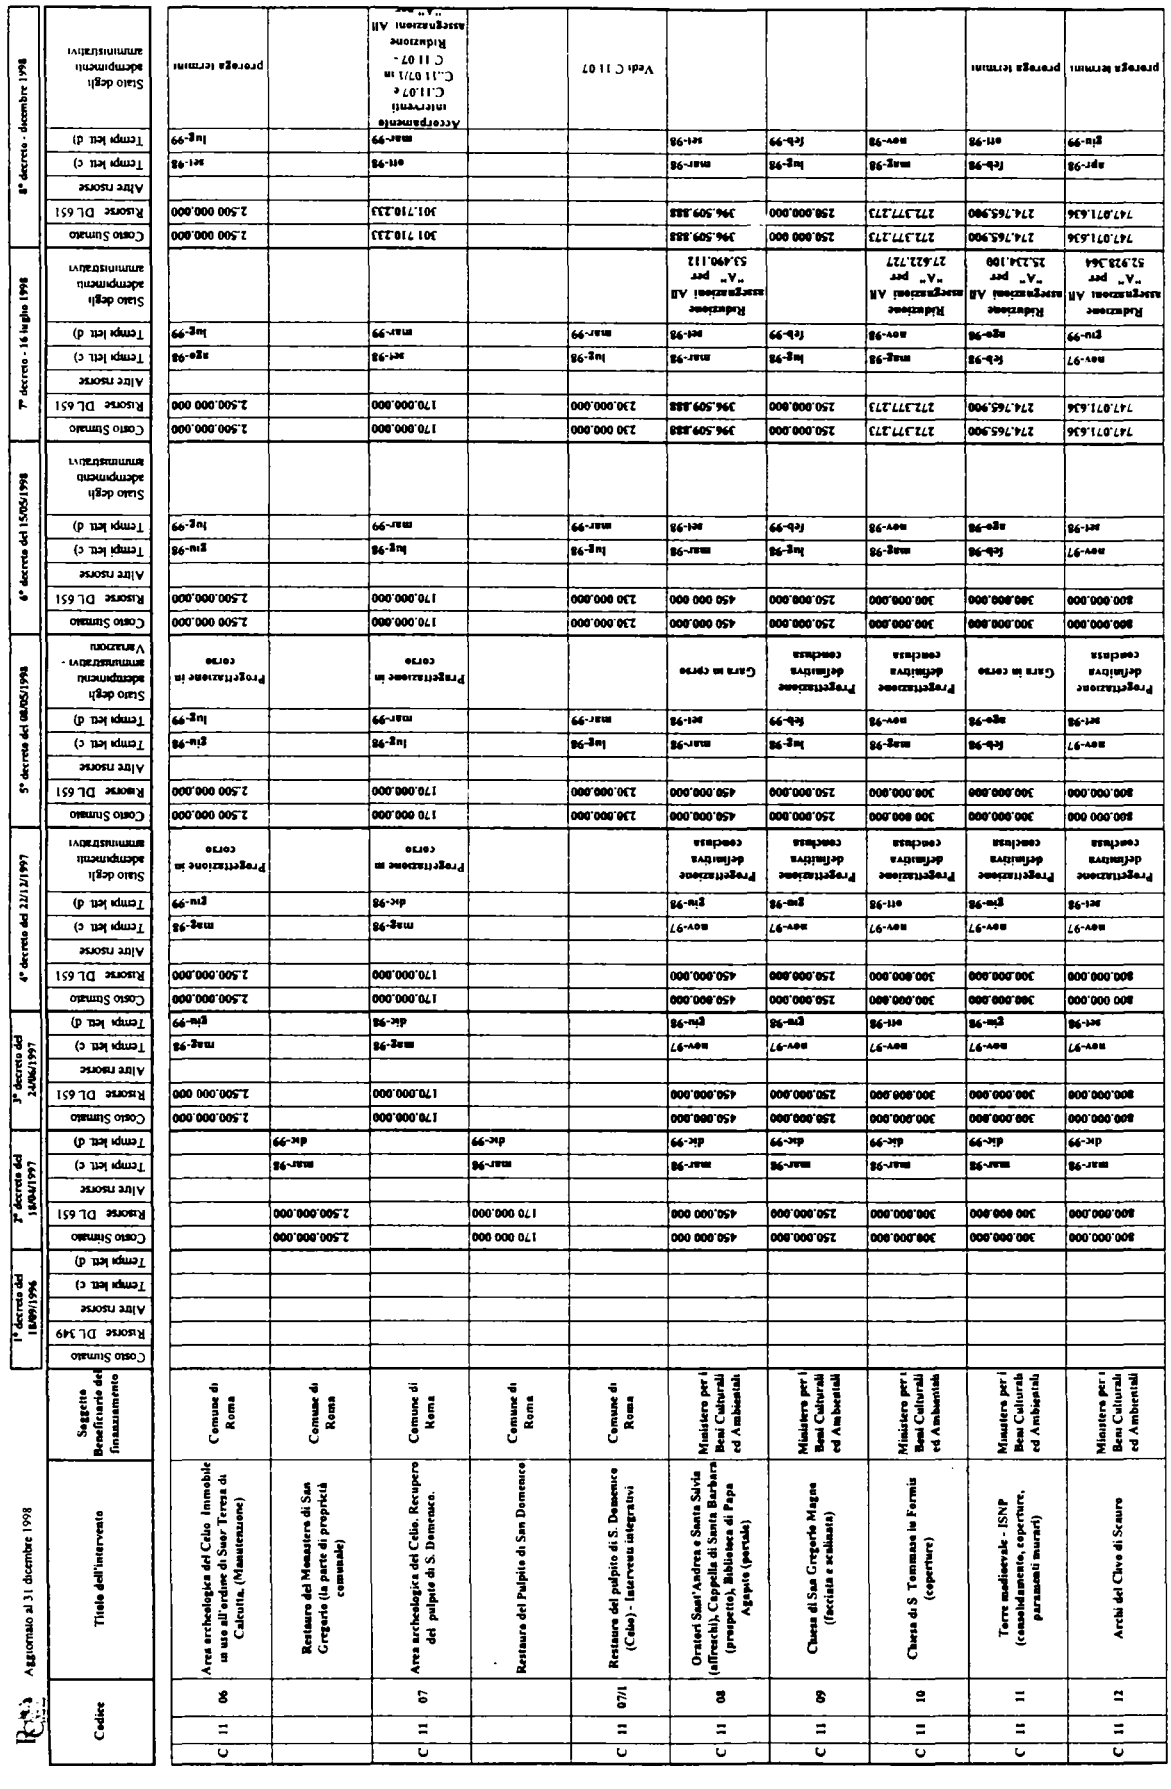

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998			
					Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	11	06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione)	Comune di Roma																																
C	11		Restauro del Monastero di San Gregorio (la parte di proprietà comunale)	Comune di Roma									dic-99	dic-99																						
C	11	07	Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico.	Comune di Roma						2.500.000.000	2.500.000.000		mar-97	dic-98	170.000.000	170.000.000				170.000.000	170.000.000					170.000.000	170.000.000					170.000.000	170.000.000					Accorpamento interventi C.11.07/1 in C.11.07 - Richiesta assegnazioni All "A" per
C	11		Restauro del Pulpito di San Domenico	Comune di Roma						170 000.000			dic-99	mar-98																						
C	11	07/1	Restauro del pulpito di S. Domenico (Celio) - Interventi integrativi	Comune di Roma																							230.000.000	mar-99	lug-98								Vedi C.11.07
C	11	08	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (presepio), Biblioteca di Papa Agapito (portale)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000					300.000.000	450.000.000		dic-99	dic-99	450.000.000	450.000.000			dic-99	450.000.000	450.000.000			mar-98	mar-98	450 000.000	450 000.000			mar-98	mar-98	396.509.883	Richiesta assegnazioni All "A" per 53.490.113				
C	11	09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000					250.000.000	250.000.000		dic-99	dic-99	250.000.000	250.000.000			Progettazione definitiva cantiera	250.000.000	250.000.000			feb-99	lug-98	250.000.000	250.000.000			feb-99	lug-98	250.000.000	250.000.000				
C	11	10	Chiesa di S Tommaso in Formis (coperture)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000					300.000.000	300.000.000		mar-98	mar-98	300.000.000	300.000.000			Progettazione definitiva cantiera	300.000.000	300.000.000			nov-98	mag-98	300.000.000	300.000.000			nov-98	mag-98	272.377.273	Richiesta assegnazioni All "A" per 27.622.727				
C	11	11	Terme medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, paramenti murari)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000					300.000.000	300.000.000		dic-99	dic-99	300.000.000	300.000.000			Progettazione definitiva cantiera	300.000.000	300.000.000			feb-98	mag-98	300.000.000	300.000.000			feb-98	mag-98	274.765.900	Richiesta assegnazioni All "A" per 25.234.100				
C	11	12	Archi del Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000					300.000.000	300.000.000		dic-99	dic-99	300.000.000	300.000.000			Progettazione definitiva cantiera	300.000.000	300.000.000			apr-98	mag-98	300.000.000	300.000.000			mar-97	mag-98	274.765.900	Richiesta assegnazioni All "A" per 25.234.100				

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/04/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	
C 11	23		Musealizzazione e finalizzazione all'accoglienza di visitatori alle case romane sotto i SS. Giovanni e Paolo al Celio	Ministero Beni Culturali									
					Costo Sumano	1.700.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000
					Risorse DL 349	1.700.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000
					Altre risorse								
C 12	01		Villa Doria Pamphilj (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma	dic-97	mar-98	dic-98	mar-98	mar-98	mar-98	mar-98	mar-98	mar-98
					Costo Sumano	1.700.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000
					Risorse DL 651	1.700.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000
					Altre risorse								
					Temp lett c)	dic-97	mar-98	apr-98	mar-98	apr-98	mar-98	apr-98	mar-98
					Temp lett d)	dic-98	dic-98	mar-99	dic-98	mar-99	dic-98	mar-99	dic-98
					Costo Sumano	1.700.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000
					Risorse DL 651	1.700.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000
					Altre risorse								
					Temp lett c)	mar-98	mar-98	apr-98	mar-98	apr-98	mar-98	apr-98	mar-98
					Temp lett d)	dic-98	dic-98	mar-99	dic-98	mar-99	dic-98	mar-99	dic-98
					Costo Sumano	1.700.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000
					Risorse DL 651	1.700.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000
					Altre risorse								
					Temp lett c)	lug-97	lug-97	lug-97	mag-98	lug-98	mag-98	lug-98	mag-98
					Temp lett d)	dic-98	dic-98	dic-98	dic-98	apr-99	dic-98	apr-99	dic-98
					Costo Sumano	1.700.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000
					Risorse DL 651	1.700.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	700.000.000
					Altre risorse								
C 12	02		Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma	lug-97	lug-98	dic-98	set-98	Progettazione in corso	Progettazione in corso	Progettazione in corso	Progettazione in corso	Progettazione in corso
					Costo Sumano	1.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000
					Risorse DL 651	1.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000
					Altre risorse								
					Temp lett c)	set-98	mag-98	set-98	mag-98	set-98	mag-98	set-98	mag-98
					Temp lett d)	apr-99	dic-98	apr-99	dic-98	apr-99	dic-98	apr-99	dic-98
					Costo Sumano	1.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000
					Risorse DL 651	1.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000
					Altre risorse								
					Temp lett c)	mar-98	mag-98	set-98	mag-98	set-98	mag-98	set-98	mag-98
					Temp lett d)	apr-99	dic-98	apr-99	dic-98	apr-99	dic-98	apr-99	dic-98
					Costo Sumano	1.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000
					Risorse DL 651	1.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000
					Altre risorse								
C 12	03		Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini	Comune di Roma	mag-98	mag-98	dic-98	mar-98	Progettazione in corso	Progettazione in corso	Progettazione in corso	Progettazione in corso	Progettazione in corso
					Costo Sumano	1.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000
					Risorse DL 651	1.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000
					Altre risorse								
					Temp lett c)	set-98	mag-98	set-98	mag-98	set-98	mag-98	set-98	mag-98
					Temp lett d)	apr-99	dic-98	apr-99	dic-98	apr-99	dic-98	apr-99	dic-98
					Costo Sumano	1.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000
					Risorse DL 651	1.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	3.000.000.000	700.000.000
					Altre risorse								
C 12	04		Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro, dei Cedrati, di Villa Vecchia, delle Serre	Comune di Roma	mag-98								
					Costo Sumano	1.700.000.000							
					Risorse DL 651	1.700.000.000							
					Altre risorse								
					Temp lett c)	mag-98							
					Temp lett d)	dic-98							
					Costo Sumano	1.700.000.000							
					Risorse DL 651	1.700.000.000							
					Altre risorse								
C 12	04/1		Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro.	Comune di Roma									
					Costo Sumano								
					Risorse DL 651	1.800.000.000							
					Altre risorse								
					Temp lett c)	nov-98							
					Temp lett d)	ago-99							
					Costo Sumano	1.800.000.000							
					Risorse DL 651	1.800.000.000							
					Altre risorse								
C 12	04/2		Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini dei Cedrati, di Villa Vecchia, delle Serre	Comune di Roma									
					Costo Sumano								
					Risorse DL 651	698.934.312							
					Altre risorse								
					Temp lett c)	ott-98							
					Temp lett d)	mag-99							
					Costo Sumano	698.934.312							
					Risorse DL 651	698.934.312							
					Altre risorse								
C 13	01		Parco di Monte Mario e Casali Mellini (Roma) Completamento della sistemazione del parco e delle aree contigue a piazzale Clodio e via Cavalieri di Vittorio Veneto	Comune di Roma	set-98								
					Costo Sumano	7.500.000.000							
					Risorse DL 349	7.500.000.000							
					Altre risorse								
					Temp lett c)	lug-98							
					Temp lett d)	dic-99							
					Costo Sumano	7.500.000.000							
					Risorse DL 651	7.500.000.000							
					Altre risorse								
					Temp lett c)	set-98							
					Temp lett d)	dic-99							
					Costo Sumano	7.500.000.000							
					Risorse DL 651	7.500.000.000							
					Altre risorse								
					Temp lett c)	nd							
					Temp lett d)	nd							
					Costo Sumano	600.000.000							
					Risorse DL 651	600

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996					2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998				Ulteriore finanziamento di 400 000 000
					Costo Sumaio	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	
C	13	01/1	Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei canali Mellini.	Comune di Roma																				Progettazione in corso																
C	13	01/2	Parco di Monte Mario e canali Mellini Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma																				Progettazione in corso																
C	14	01	Pendici del Gianicolo (Roma) Riqualificazione delle aree a verde	Comune di Roma																				Progettazione su progetto definitivo (approvato)																
C	15	01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	Comune di Roma																				Progettazione in corso																
C	15	02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Exedre Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano.	Comune di Roma																				Progettazione in corso																
			Parco di Colle Oppio (Roma) Interventi di manutenzione e restauro dei reperti archeologici	Comune di Roma																																				
C	18	01	Piano straordinario di prevenzione e sicurezza	Comune di Nemi																				Progettazione cancellata																
			Bosco di Nemi (Nemi/Roma) Piano straordinario di prevenzione dagli incendi	Comune di Nemi																																				
C	18	02	Santuario della Mentorella (Piesinone-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riqualificazione ambientale dei territori vicinori	Provincia di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000		dic-96	gen-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-98	mag-99	2.400.000.000	2.400.000.000		feb-98	apr-99	2.400.000.000	2.400.000.000		feb-98	apr-99	Progettazione definitiva in corso	2.400.000.000	2.400.000.000		lug-98	lug-99	Progettazione definitiva in corso	2.400.000.000	2.400.000.000		feb-98	apr-99	Progettazione definitiva in corso	2.400.000.000	2.400.000.000		mar-98	mag-99	Progettazione definitiva in corso	
					2.000.000.000	2.000.000.000		apr-98	lug-99	3.000.000.000	2.000.000.000		mar-98	mag-99	3.200.000.000	2.000.000.000		mar-98	mag-99	3.200.000.000	2.000.000.000		mar-98	mag-99		3.200.000.000	2.000.000.000		mar-98	mag-99		3.200.000.000	2.000.000.000		mar-98	mag-99		3.200.000.000	2.000.000.000		mar-98	mag-99		
C	13	01/1	Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei canali Mellini.	Comune di Roma																																				
C	13	01/2	Parco di Monte Mario e canali Mellini Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma																																				
C	14	01	Pendici del Gianicolo (Roma) Riqualificazione delle aree a verde	Comune di Roma	3.000.000.000	3.000.000.000		mag-99	lug-99	3.000.000.000	3.000.000.000		feb-98	mag-99	3.000.000.000	3.000.000.000		feb-98	mag-99	3.000.000.000	3.000.000.000		feb-98	mag-99	Conf di Servizi su progetto definitivo (approvato)	3.000.000.000	3.000.000.000		lug-98	lug-99	Progettazione definitiva in corso	3.000.000.000	3.000.000.000		feb-98	apr-99	Progettazione definitiva in corso	3.000.000.000	3.000.000.000		mar-98	mag-99	Progettazione definitiva in corso	
C	15	01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000		set-97	lug-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-98	mag-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-98	mag-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-98	mag-99	Progettazione in corso	1.000.000.000	1.000.000.000		lug-98	lug-99	Progettazione definitiva in corso	1.000.000.000	1.000.000.000		feb-98	apr-99	Progettazione definitiva in corso	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-98	mag-99	Progettazione definitiva in corso	
C	15	02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Exedre Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano.	Comune di Roma	2.000.000.000	2.000.000.000		ago-97	lug-99	2.000.000.000	2.000.000.000		apr-98	lug-99	2.000.000.000	2.000.000.000		gen-98	lug-99	2.000.000.000	2.000.000.000		gen-98	lug-99	Progettazione in corso	2.000.000.000	2.000.000.000		lug-98	lug-99	Progettazione definitiva in corso	2.000.000.000	2.000.000.000		feb-98	apr-99	Progettazione definitiva in corso	2.000.000.000	2.000.000.000		mar-98	mag-99	Progettazione definitiva in corso	
			Parco di Colle Oppio (Roma) Interventi di manutenzione e restauro dei reperti archeologici	Comune di Roma																																				
C	18	01	Piano straordinario di prevenzione e sicurezza	Comune di Nemi																				Progettazione cancellata																
			Bosco di Nemi (Nemi/Roma) Piano straordinario di prevenzione dagli incendi	Comune di Nemi																																				
C	18	02	Santuario della Mentorella (Piesinone-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riqualificazione ambientale dei territori vicinori	Provincia di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000		dic-96	gen-99	1.000.000.000	1.000.000.000		mar-98	mag-99	2.400.000.000	2.400.000.000		feb-98	apr-99	2.400.000.000	2.400.000.000		feb-98	apr-99	Progettazione definitiva in corso	2.400.000.000	2.400.000.000		lug-98	lug-99	Progettazione definitiva in corso	2.400.000.000	2.400.000.000		feb-98	apr-99	Progettazione definitiva in corso	2.400.000.000	2.400.000.000		mar-98	mag-99	Progettazione definitiva in corso	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/04/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998			
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
	Santuario della Mesterella (Psanuso-Caprarola/Roma) Valorizzazione, salvaguardia e riqualificazione ambientale	Provincia di Roma	2.000.000.000			mar-98	apr-99																										
	Tutela ambientale di Terre Astura	Comune di Nettuno																																
	Terre Astura (Nettuno/Roma) Riqualificazione ambientale e realizzazione di itinerari naturalistici	Comune di Nettuno																																
04	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione	Provincia di Roma	1.200.000.000	1.200.000.000		dic-97	set-99	1.200.000.000	1.200.000.000		apr-98	set-99	1.200.000.000	1.200.000.000		mag-98	lug-99	1.200.000.000	1.200.000.000	Prefettizzazione definitiva in corso	1.200.000.000	1.200.000.000		lug-98	ott-99	Prefettizzazione definitiva in corso	1.200.000.000	1.200.000.000		gen-99	ott-99		1.200.000.000	1.200.000.000		preorga terreni
01	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque	Regione Lazio	75.000.000.000	75.000.000.000		set-97	ott-99																											
	C 19 - 1a. Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque	Comune di Roma				ago-97	ott-99	36.000.000.000	36.000.000.000																										
01/a1	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Intervento del Comune di Roma - Ria Galeria. (Adduttrici acque nere e impianto di depurazione - località Castelsi).	Comune di Roma																40.000.000.000	40.000.000.000	Definanziato	40.000.000.000	40.000.000.000		mar-98	dic-99	Conferenze di Servizi su preventivo preliminare	40.000.000.000	40.000.000.000		mar-98	dic-99	Conferenze di Servizi su preventivo preliminare
01/a2	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Quota parte sistemazione idraulica fasce Acqua Mariana.	Comune di Roma																7.000.000.000	7.000.000.000	Cons. di Servizi su preventivo definitivo (approvato)	7.000.000.000	7.000.000.000		mag-98	mag-99	Cons. di Servizi su preventivo definitivo (approvato)	7.000.000.000	7.000.000.000		mag-98	mag-99	
	Sistemazione idraulica del fosso dell'acqua Mariana																																	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 12/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
					Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio
					Risorse DL 349	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651
					Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse
					Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)
					Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)
												Stato degli adempimenti amministrativi
C	19	01/b1	C19 - 1b. Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque	Regione Lazio								
C	19	01/b1	Risanamento Fosse Papirona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magre Fecene e Ostia Litorale	Regione Lazio								
C	19	01/b2	Risanamento Fosse Papirona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magre Fecene e Ostia Litorale	Regione Lazio								
C	19	01/b3	Risanamento Fosse Papirona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magre Fecene e Ostia Litorale	Regione Lazio								
C	19	01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Fecene	Regione Lazio								
C	19	02	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di varia	Provincia di Roma								
				Regione Lazio								
C	20	01	Orto Botanico	Università La Sapienza								
D	02	01	Linea tramviaria S.Pietro Aurelia	Comune di Roma								

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 12/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
					Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio
					Risorse DL 349	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651
					Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse
					Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)
					Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)
									Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni		
C	19	01/b1	C19 - 1b. Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque	Regione Lazio	19.000.000.000				C.T.A. parere favorevole			
C	19	01/b1	Risanamento Fosse Papirona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magre Fecene e Ostia Litorale	Regione Lazio		10.000.000.000	10.000.000.000	Progettazione in corso	Progettazione in corso			
C	19	01/b2	Risanamento Fosse Papirona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magre Fecene e Ostia Litorale	Regione Lazio		4.000.000.000	4.000.000.000	Progettazione in corso	Progettazione in corso			
C	19	01/b3	Risanamento Fosse Papirona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magre Fecene e Ostia Litorale	Regione Lazio		16.000.791.415	16.000.791.415	Progettazione in corso	C.T.A. parere favorevole			
C	19	01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Fecene	Regione Lazio		9.000.000.000	9.000.000.000	Progetto definitivo cantiere	C.T.A. parere favorevole			
C	19	02	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di varia	Provincia di Roma		8.000.000.000	8.000.000.000	Progettazione preliminare in corso	Progettazione preliminare cantiere			
				Regione Lazio		8.000.000.000						
C	20	01	Orto Botanico	Università La Sapienza								
D	02	01	Linea tramviaria S.Pietro Aurelia	Comune di Roma								

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 12/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
					Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio
					Risorse DL 349	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651
					Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse
					Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)
					Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)
												Stato degli adempimenti amministrativi
C	19	01/b1	C19 - 1b. Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque	Regione Lazio								
C	19	01/b1	Risanamento Fosse Papirona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magre Fecene e Ostia Litorale	Regione Lazio		10.000.000.000	10.000.000.000	Progettazione in corso	Progettazione definitiva in corso			
C	19	01/b2	Risanamento Fosse Papirona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magre Fecene e Ostia Litorale	Regione Lazio		4.000.000.000	4.000.000.000	Progettazione in corso	Progettazione in corso			
C	19	01/b3	Risanamento Fosse Papirona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magre Fecene e Ostia Litorale	Regione Lazio		16.000.791.415	16.000.791.415	Progettazione in corso	Progettazione in corso			
C	19	01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Fecene	Regione Lazio		9.000.000.000	9.000.000.000	Progetto definitivo cantiere	Progettazione definitiva in corso			
C	19	02	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di varia	Provincia di Roma		8.000.000.000	8.000.000.000	Progettazione preliminare in corso	Progettazione preliminare cantiere			
				Regione Lazio								
C	20	01	Orto Botanico	Università La Sapienza								
D	02	01	Linea tramviaria S.Pietro Aurelia	Comune di Roma								

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 12/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
					Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio
					Risorse DL 349	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651
					Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse
					Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)	Tempi lett c)
					Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)	Tempi lett d)
												Stato degli adempimenti amministrativi
C	19	01/b1	C19 - 1b. Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque	Regione Lazio								
C	19	01/b1	Risanamento Fosse Papirona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magre Fecene e Ostia Litorale	Regione Lazio		10.000.000.000	10.000.000.000	Progettazione in corso	Progettazione definitiva in corso			
C	19	01/b2	Risanamento Fosse Papirona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magre Fecene e Ostia Litorale	Regione Lazio		4.000.000.000	4.000.000.000	Progettazione in corso	Progettazione in corso			
C	19	01/b3	Risanamento Fosse Papirona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magre Fecene e Ostia Litorale	Regione Lazio		16.000.791.415	16.000.791.415	Progettazione in corso	Progettazione in corso			
C	19	01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Fecene	Regione Lazio		9.000.000.000	9.000.000.000	Progetto definitivo cantiere	Progettazione definitiva in corso			
C	19	02	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di varia	Provincia di Roma		8.000.000.000	8.000.000.000	Progettazione preliminare in corso	Progettazione preliminare cantiere			
				Regione Lazio								
C	20	01	Orto Botanico	Università La Sapienza								
D	02	01	Linea tramviaria S.Pietro Aurelia	Comune di Roma								

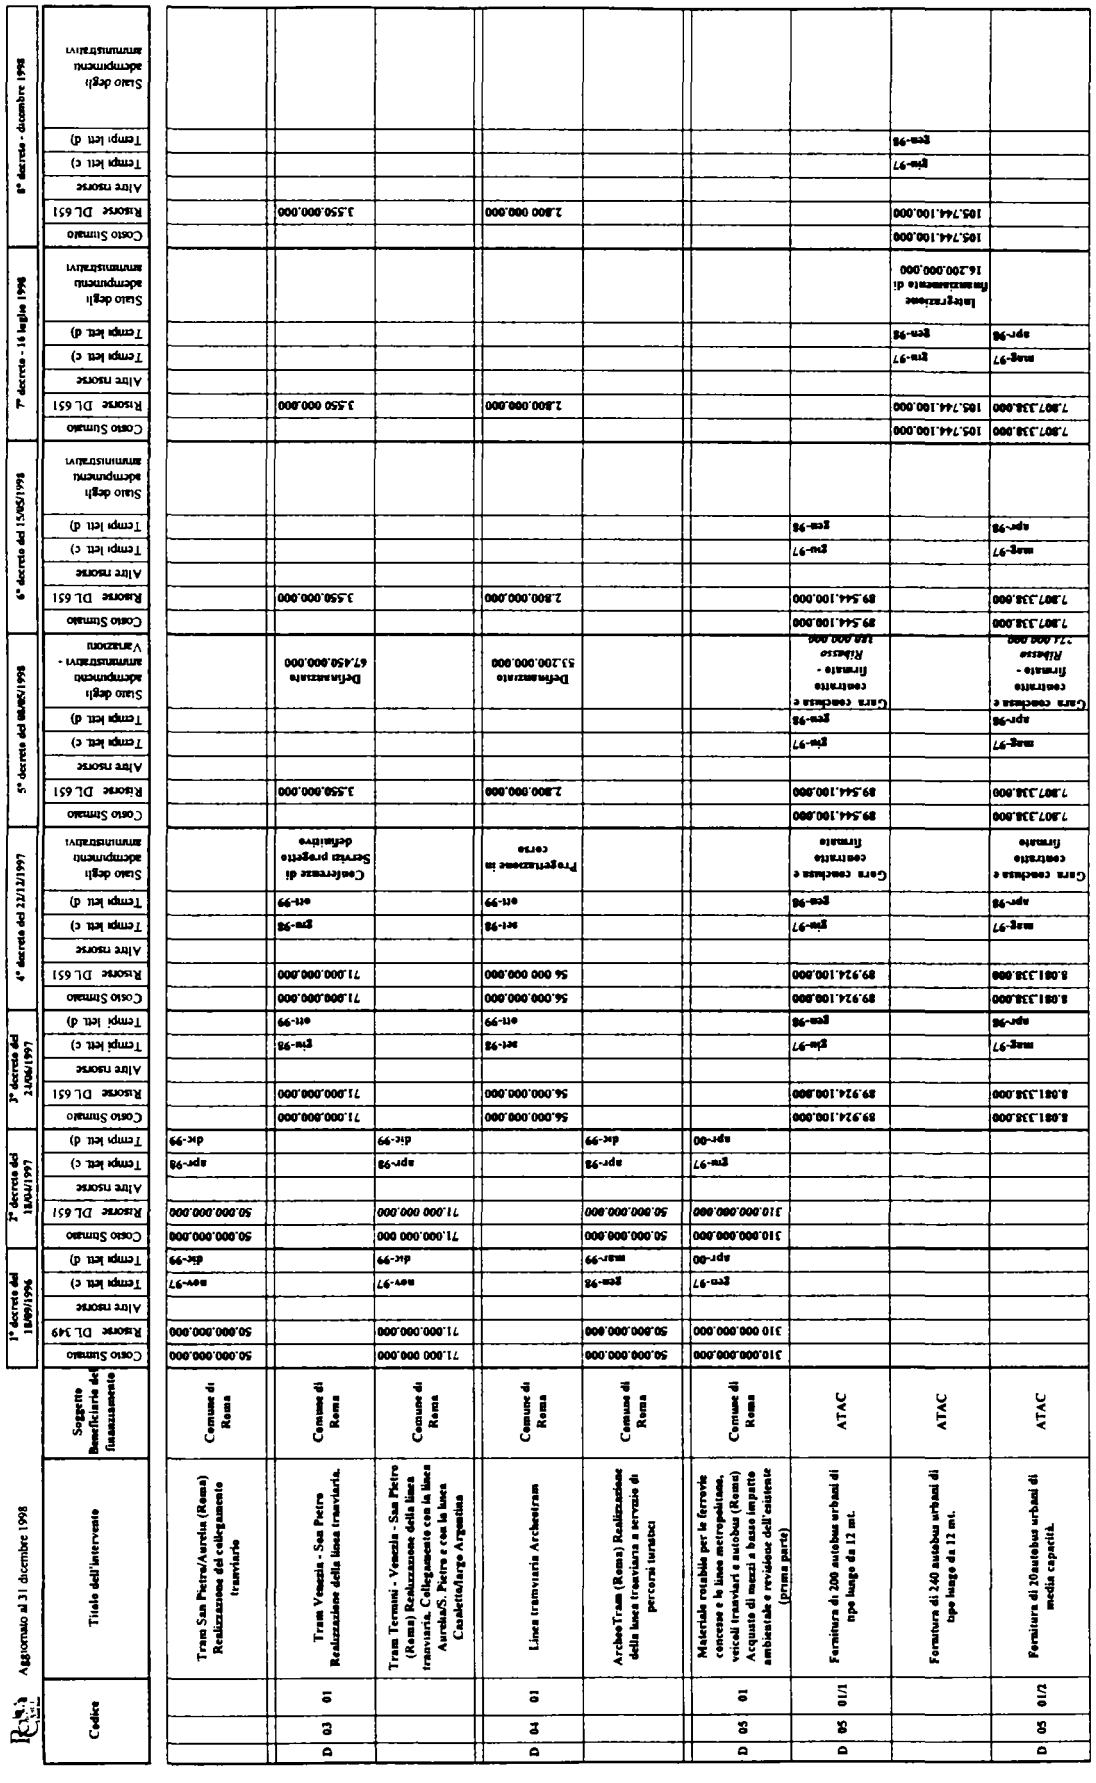

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998			
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Temp. istr. c)	Temp. istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. istr. c)	Temp. istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. istr. c)	Temp. istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. istr. c)	Temp. istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. istr. c)	Temp. istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. istr. c)	Temp. istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Stato degli adempimenti amministrativi
D 03	01 Tram San Pietro/Aurelia (Roma) Realizzazione del collegamento tranviario	Comune di Roma	50.000.000.000	50.000.000.000		mar-97	dic-99	50.000.000.000	50.000.000.000		apr-98	dic-99																						
D 04	01 Linea tranviaria Archeotram	Comune di Roma	310.000.000.000	310 000.000.000		gen-97	apr-00	310.000.000.000	310.000.000.000																									
D 05	01 Materiale rotabile per le ferrovie concesse e le linee metropolitane, veicoli tranviari e autobus (Roma) Acquisto di mezzi a basso impatto ambientale e revisione dell'esistente (prima parte)	Comune di Roma	310.000.000.000	310 000.000.000		gen-97	apr-00	310.000.000.000	310.000.000.000																									
D 05	01/1 Fornitura di 200 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.	ATAC	89.924.100.000					89.924.100.000					89.924.100.000					89.924.100.000					89.544.100.000					89.544.100.000						
D 05	01/2 Fornitura di 20autobus urbani di media capacità	ATAC	8.081.338.000					8.081.338.000					8.081.338.000					8.081.338.000					7.807.338.000					7.807.338.000						

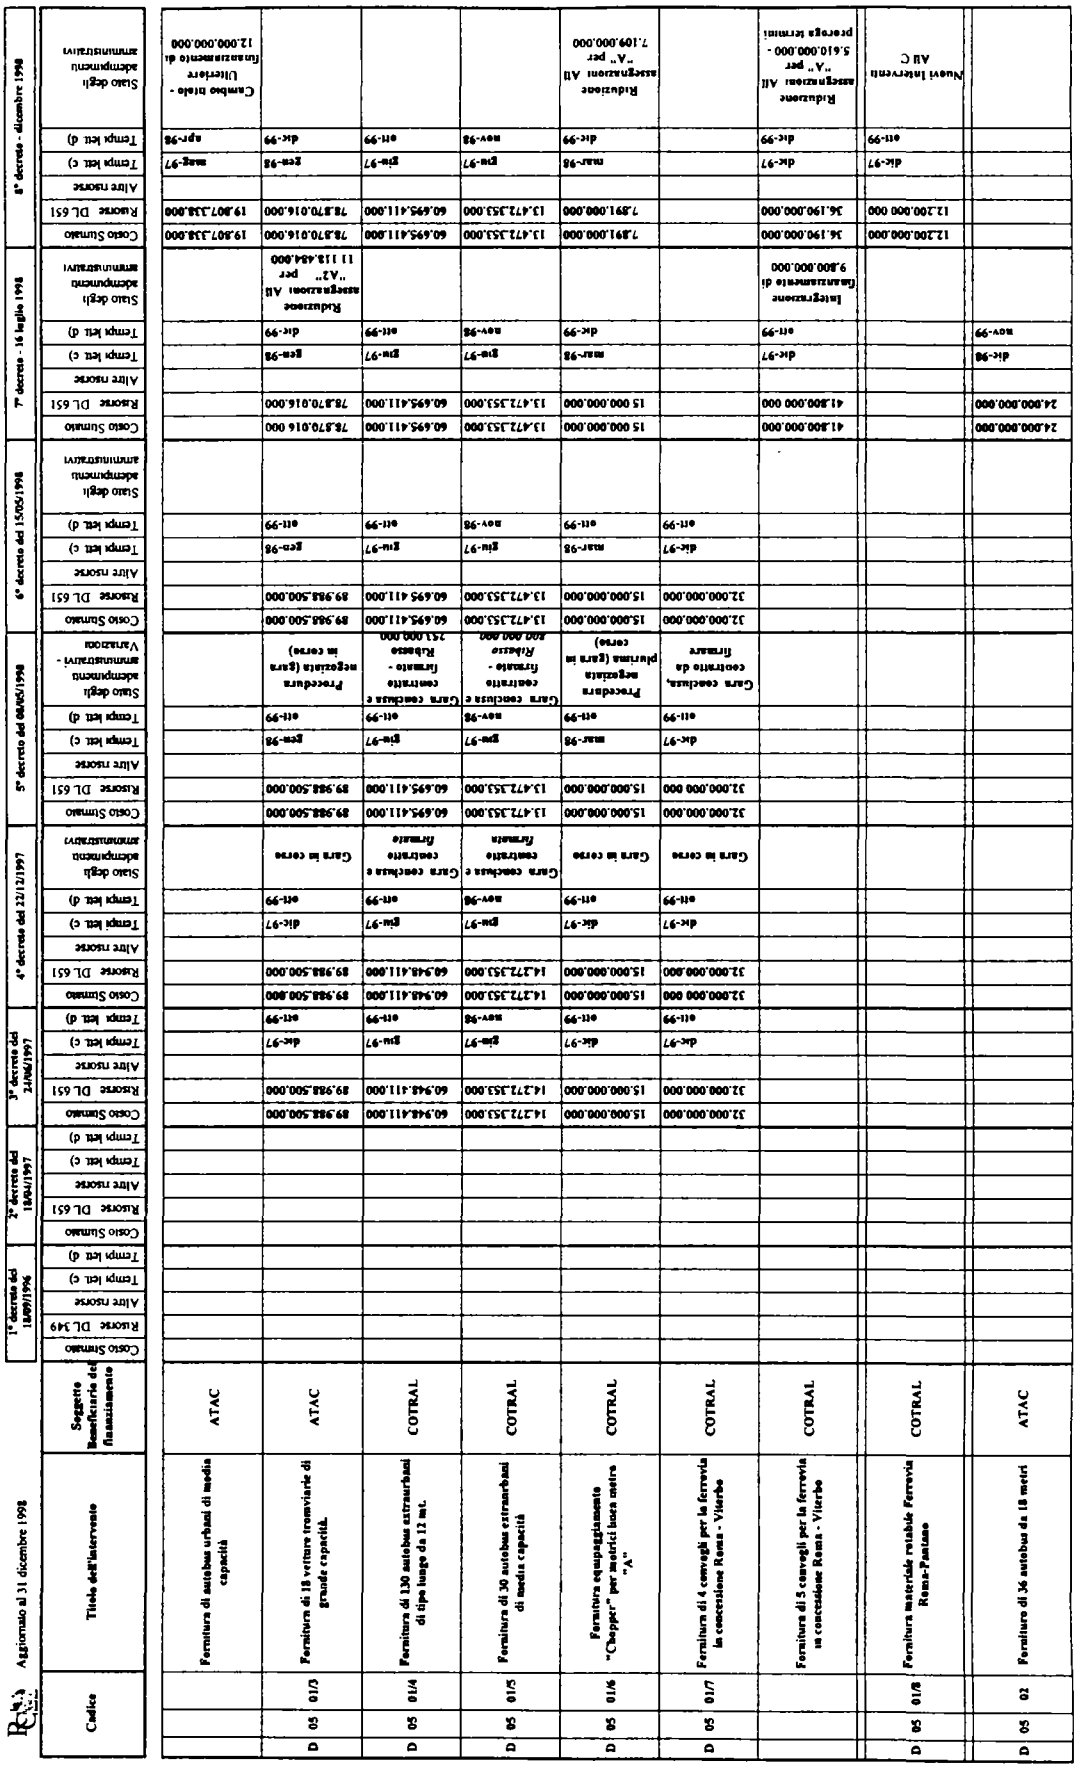

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998			
					Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi fatt. c)	Tempi fatt. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. c)	Tempi fatt. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. c)	Tempi fatt. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. c)	Tempi fatt. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. c)	Tempi fatt. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. c)	Tempi fatt. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
			Aggiornato al 31 dicembre 1998																																	
D	05	01/3	Fornitura di autobus urbani di media capacità	ATAC																																
D	05	01/3	Fornitura di 18 vetture tramviarie di grande capacità	ATAC						89.988.500.000	89.988.500.000			dic-97	01-99	89.988.500.000	89.988.500.000			dic-97	01-99	89.988.500.000	89.988.500.000			dic-97	01-99	89.988.500.000	89.988.500.000			Riduzione stanziamenti All "A2" per 11 118.484.000	dic-99				Cambio titolo - Ulteriore finanziamento di 12.000.000.000
D	05	01/4	Fornitura di 130 autobus extraurbani di tipo lungo da 12 mt.	COTRAL						60.948.411.000	60.948.411.000			giu-97	01-99	60.695.411.000	60.695.411.000			giu-97	01-99	60.695.411.000	60.695.411.000			giu-97	01-99	60.695.411.000	60.695.411.000								
D	05	01/5	Fornitura di 30 autobus extraurbani di media capacità	COTRAL						14.272.353.000	14.272.353.000			giu-97	nov-98	13.472.353.000	13.472.353.000			giu-97	nov-98	13.472.353.000	13.472.353.000			giu-97	nov-98	13.472.353.000	13.472.353.000								
D	05	01/6	Fornitura equipaggiamento "Chopper" per motrici linea metro "A"	COTRAL						15.000.000.000	15.000.000.000			dic-97	ott-99	15.000.000.000	15.000.000.000			dic-97	ott-99	15.000.000.000	15.000.000.000			mar-98	ott-99	15.000.000.000	15.000.000.000			Riduzione stanziamenti All "A" per 7.109.000.000	dic-99				
D	05	01/7	Fornitura di 4 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo	COTRAL						32.000.000.000	32.000.000.000			dic-97	ott-99	32.000.000.000	32.000.000.000	Gara in corso	Gara conclusa e contratto firmato	dic-97	ott-99	32.000.000.000	32.000.000.000	Gara conclusa, contratto da firmare	Procedura negoziata ristretta (Gara in corso)	dic-97	ott-99	32.000.000.000	32.000.000.000								
D	05		Fornitura di 5 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo	COTRAL																												Riduzione stanziamenti All "A" per 5.610.000.000 - proroga termini	dic-99				
D	05	01/8	Fornitura materiale rotabile Ferrovia Roma-Pantano	COTRAL																														dic-97	nov-99			
D	05	02	Fornitura di 36 autobus da 18 metri	ATAC																															dic-98			

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
				Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato	Costo Stimato
				Risorse DL 349	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651
				Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse
				Tempi ksk c)	Tempi ksk c)	Tempi ksk c)	Tempi ksk c)	Tempi ksk c)	Tempi ksk c)	Tempi ksk c)	Tempi ksk c)
				Tempi ksk d)	Tempi ksk d)	Tempi ksk d)	Tempi ksk d)	Tempi ksk d)	Tempi ksk d)	Tempi ksk d)	Tempi ksk d)
								Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi	Stato degli adempimenti amministrativi
D	07	Fornitura di autobus da 18 metri	ATAC								Cambio titolo - Finanziamento di 20.000.000.000
D	07	01 Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Costruzione di un sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione di scambio-parcheggio per circa 25 posti pullman)	Comune di Roma	100.000.000.000	164.000.000.000	164.000.000.000	2.341.816.000	2.341.816.000	2.341.816.000	2.341.816.000	44.000.000.000
		Altre risorse			5.000.000.000	5.000.000.000	Determinazione di 161.658.184.000 di cui 27.500.000.000 da destinare				
		Tempi ksk c)			apr-97	mag-97					
		Tempi ksk d)			nov-99	dic-99	dic-99				
D	07	01 Settopasso di Castel Sant'Angelo (Roma) Lavori di costruzione e creazione di una zona pedonale attrezzata	Comune di Roma	100.000.000.000	164.000.000.000	164.000.000.000	Lavori in corso appaltati				
		Altre risorse			5.000.000.000	5.000.000.000					
		Tempi ksk c)			apr-97	mag-97	mag-97				
		Tempi ksk d)			nov-99	dic-99					
D	07	02 Sottovia Lungotevere in Sassia	Comune di Roma	100.000.000.000	169.000.000.000	169.000.000.000	169.000.000.000	43.500.000.000	43.500.000.000	43.500.000.000	33.309.567.545
		Tempi ksk c)			apr-97	mag-97		apr-98	apr-98	apr-98	mag-98
		Tempi ksk d)			nov-99	dic-99		nov-99	nov-99	nov-99	nov-99
		Stato degli adempimenti amministrativi									Riduzione autorizzazioni AP "A" per 10.190.432.455 - proroga termini
D	08	01 Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta (Realizzazione galleria scalare di m. 10,50 di larghezza e m. 6,30 di altezza - lunghezza totale m. 850 - lunghezza in sotterraneo m. 676)	Comune di Roma		68.000.000.000	68.000.000.000	Lavoro appaltato	Lavoro appaltato (in attesa di decisioni)	56.050.000.000	56.050.000.000	56.050.000.000
		Altre risorse									
		Tempi ksk c)				mag-97	mag-97	mag-97	mag-97	mag-97	mag-97
		Tempi ksk d)				dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99
		Stato degli adempimenti amministrativi									
D	08	Galleria Principe Amedeo d'Aosta (Roma) Interventi di manutenzione per impermeabilizzazione delle pareti e della volta	Comune di Roma	4.600.000.000	63.000.000.000	63.000.000.000					
		Altre risorse									
		Tempi ksk c)			apr-97	apr-97					
		Tempi ksk d)			dic-99	dic-99					
D	08	02 Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	40.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	Lavori in corso	40.000.000.000	40.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000
		Altre risorse						40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
		Tempi ksk c)			apr-97	apr-97	apr-97	apr-97	apr-97	apr-97	apr-97
		Tempi ksk d)			nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99
D	08	02 Parcheggio in area Gianicolo. Interventi di realizzazione del parcheggio in area extraterritoriale	Congregazione de Propaganda Fide	40.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000					
		Altre risorse									
		Tempi ksk c)			mag-97	mag-97					
		Tempi ksk d)			ott-99	ott-99					
D	08	03 Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	13.950.000.000	13.950.000.000	13.950.000.000	Interruzione 2.000.000.000				
		Altre risorse									
		Tempi ksk c)			mag-98	mag-98					
		Tempi ksk d)			nov-99	nov-99					
		Stato degli adempimenti amministrativi									

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 18/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
			Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Stato degli adempimenti amministrativi
			Risorse DL 349	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	
			Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse	Altre risorse		Altre risorse	
			Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	Tempi lett. c)	Tempi lett. c)		Tempi lett. c)	
			Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	Tempi lett. d)	Tempi lett. d)		Tempi lett. d)	
D 09	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio				Progettazione definitiva in corso			Interruzione finanziaria di 1.440 000 000	Riduzione stanziamenti di "A" per 23.508.305.000
D 09	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	150 000.000.000	150.000.000.000	150 000 000.000	150.000.000.000	150 000.000.000		Definanziato parz. Per 34.000 000 000	
D 09	Area della Stazione Tiburtina (Roma) Infrastrutturazione	Ferrovie dello Stato	150 000.000.000	150.000.000.000						
D 10 01	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2° e 3°)	ANAS	97.500.000.000	97 500.000.000	90 000 000.000	90.000 000.000	90.000.000.000	150 000.000.000	Riduzione stanziamenti All "A2" per 12.655.018 906	
D 10 01/a	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2°)	ANAS	90 000 000.000	90.000.000.000	3.500 000 000	3.500.000.000	4 270.230.000	4.270 230 000	Integrazione finanziaria di 3 000 000.000	Integrazione finanziaria di 3 000 000.000
D 10 01/b	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 3°)	ANAS	97.500 000 000	97 500.000.000	7.500 000 000	7.500.000.000	94.270.230.000	94.270.230.000	66 867.134.712	69 867 134.712
D 11 01	GRA tratto Pisana-Aurelia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)	ANAS	50.000.000.000	50.000 000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	45.950.000.000	45 950 000.000	14.571.357 164	15 748.076.382
D 12 01	Tratto viario Olimpica - Pineta Sacchetti (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italico e via Pineta Sacchetti	Comune di Roma	100.000.000.000	100.000.000.000	Delibera mutuo		Lavori in corso - Ribasso 4 050 000 000		62 773 623 930	65.773.623.930
D 13 01	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Clampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'scroparte e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
									176.719.218	176.719.218
									4.093.510.782	4.093.510.782
									15.390.000.000	15.390.000.000
									92.491.695.000	92.491.695.000
									15.390.000.000	15.390.000.000
									116.000.000.000	116 000.000.000
									15.390 000.000	15.390.000.000
									1.500 000 000	1.500 000 000
									14 748 076.382	14 748 076.382
									45.950.000 000	45.950.000 000
									15.390.000.000	15.390 000 000
									1.500 000 000	1.500 000 000
									176 719.218	176 719.218
									4 093.510.782	4 093.510.782
									15.390.000.000	15.390 000.000
									92 491.695.000	92 491.695.000
									15.390.000.000	15.390.000.000
									116 000.000.000	116.000.000.000
									15.390 000.000	15.390.000.000
									1.500 000 000	1.500 000 000
									14.571.357 164	14.571.357 164
									45.950.000 000	45.950.000 000
									15.390 000.000	15.390 000.

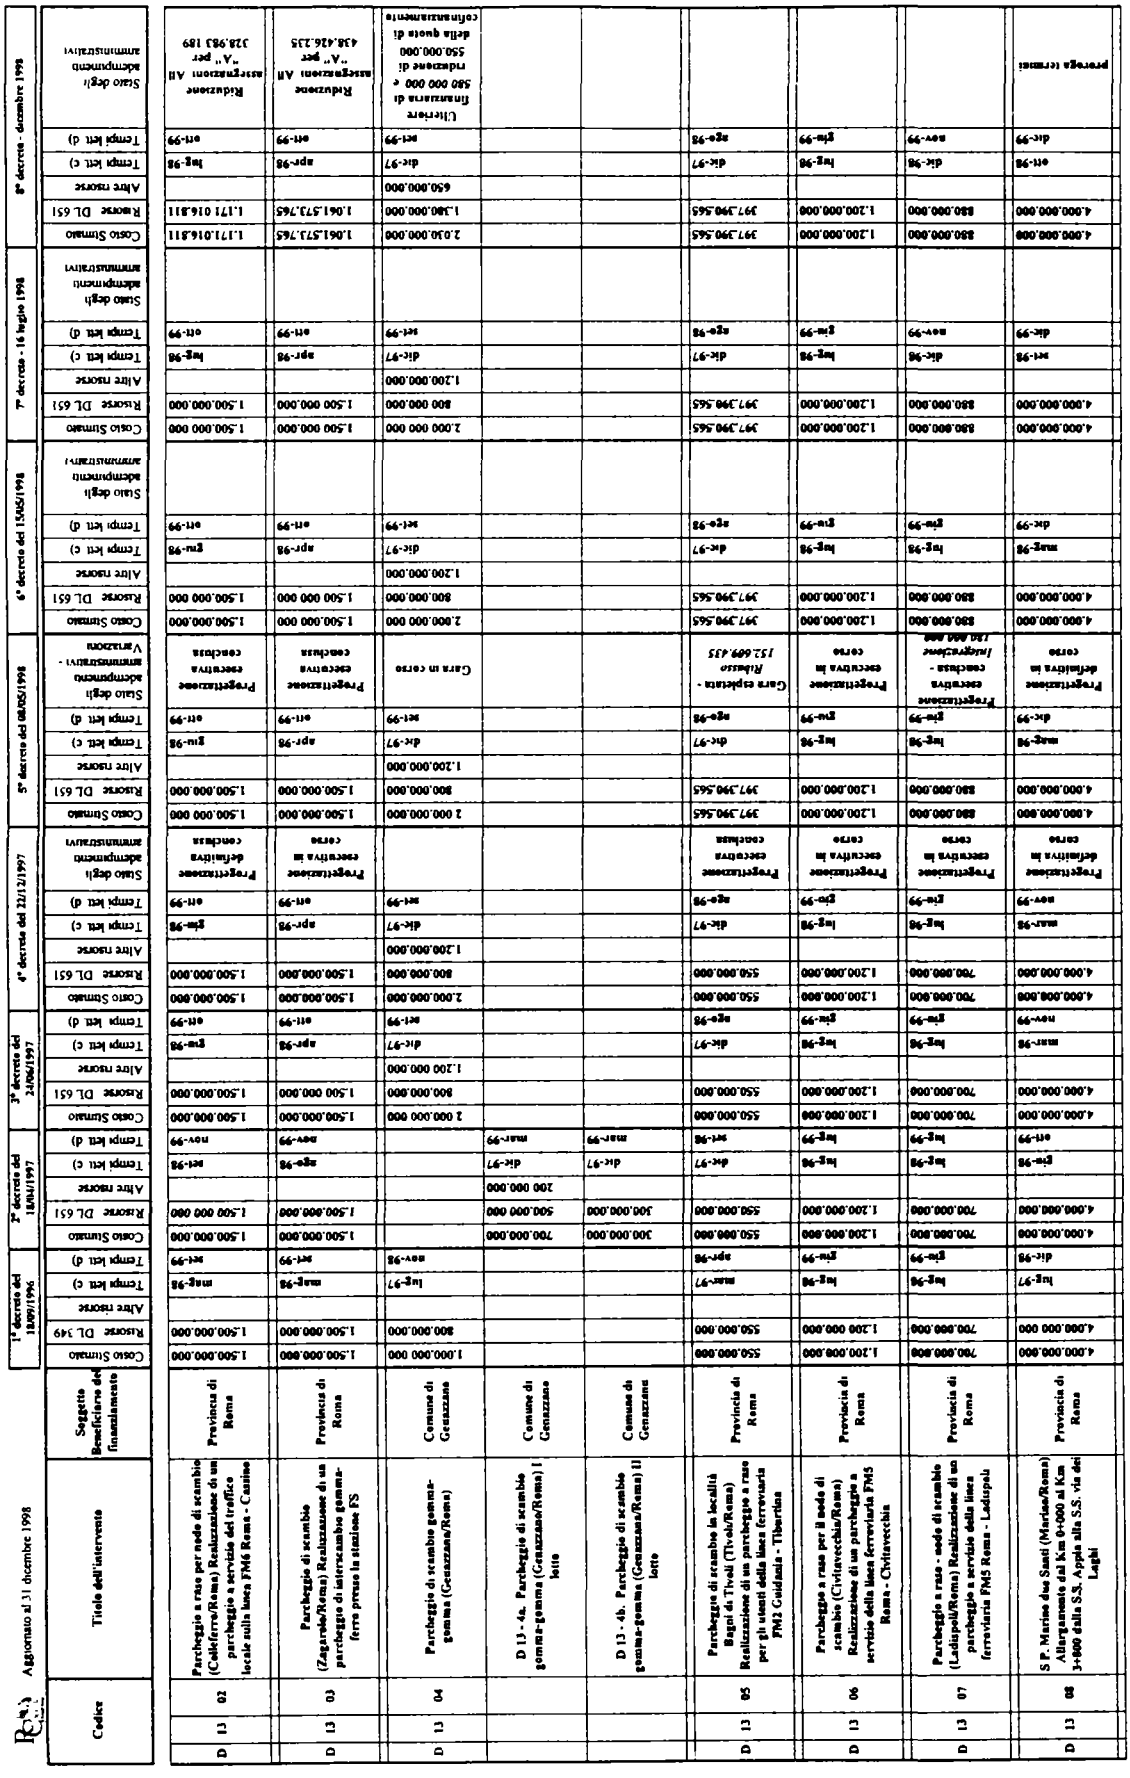

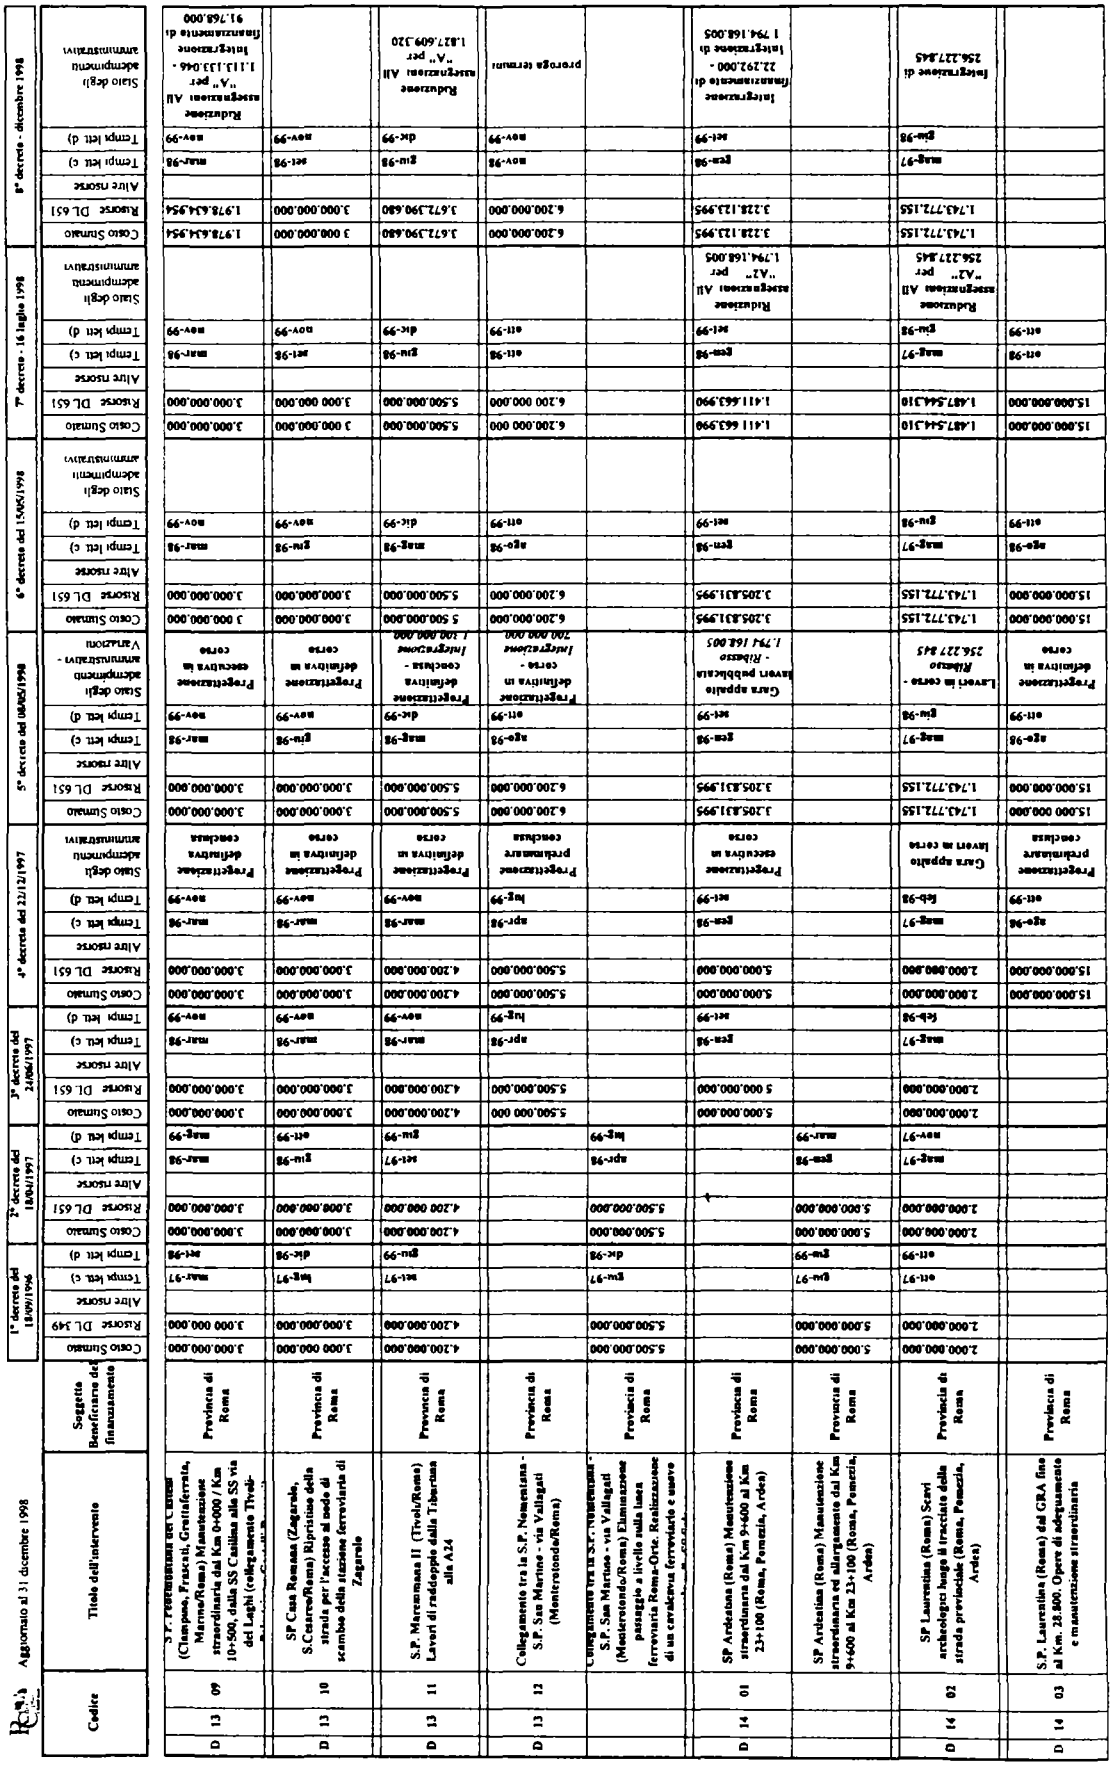

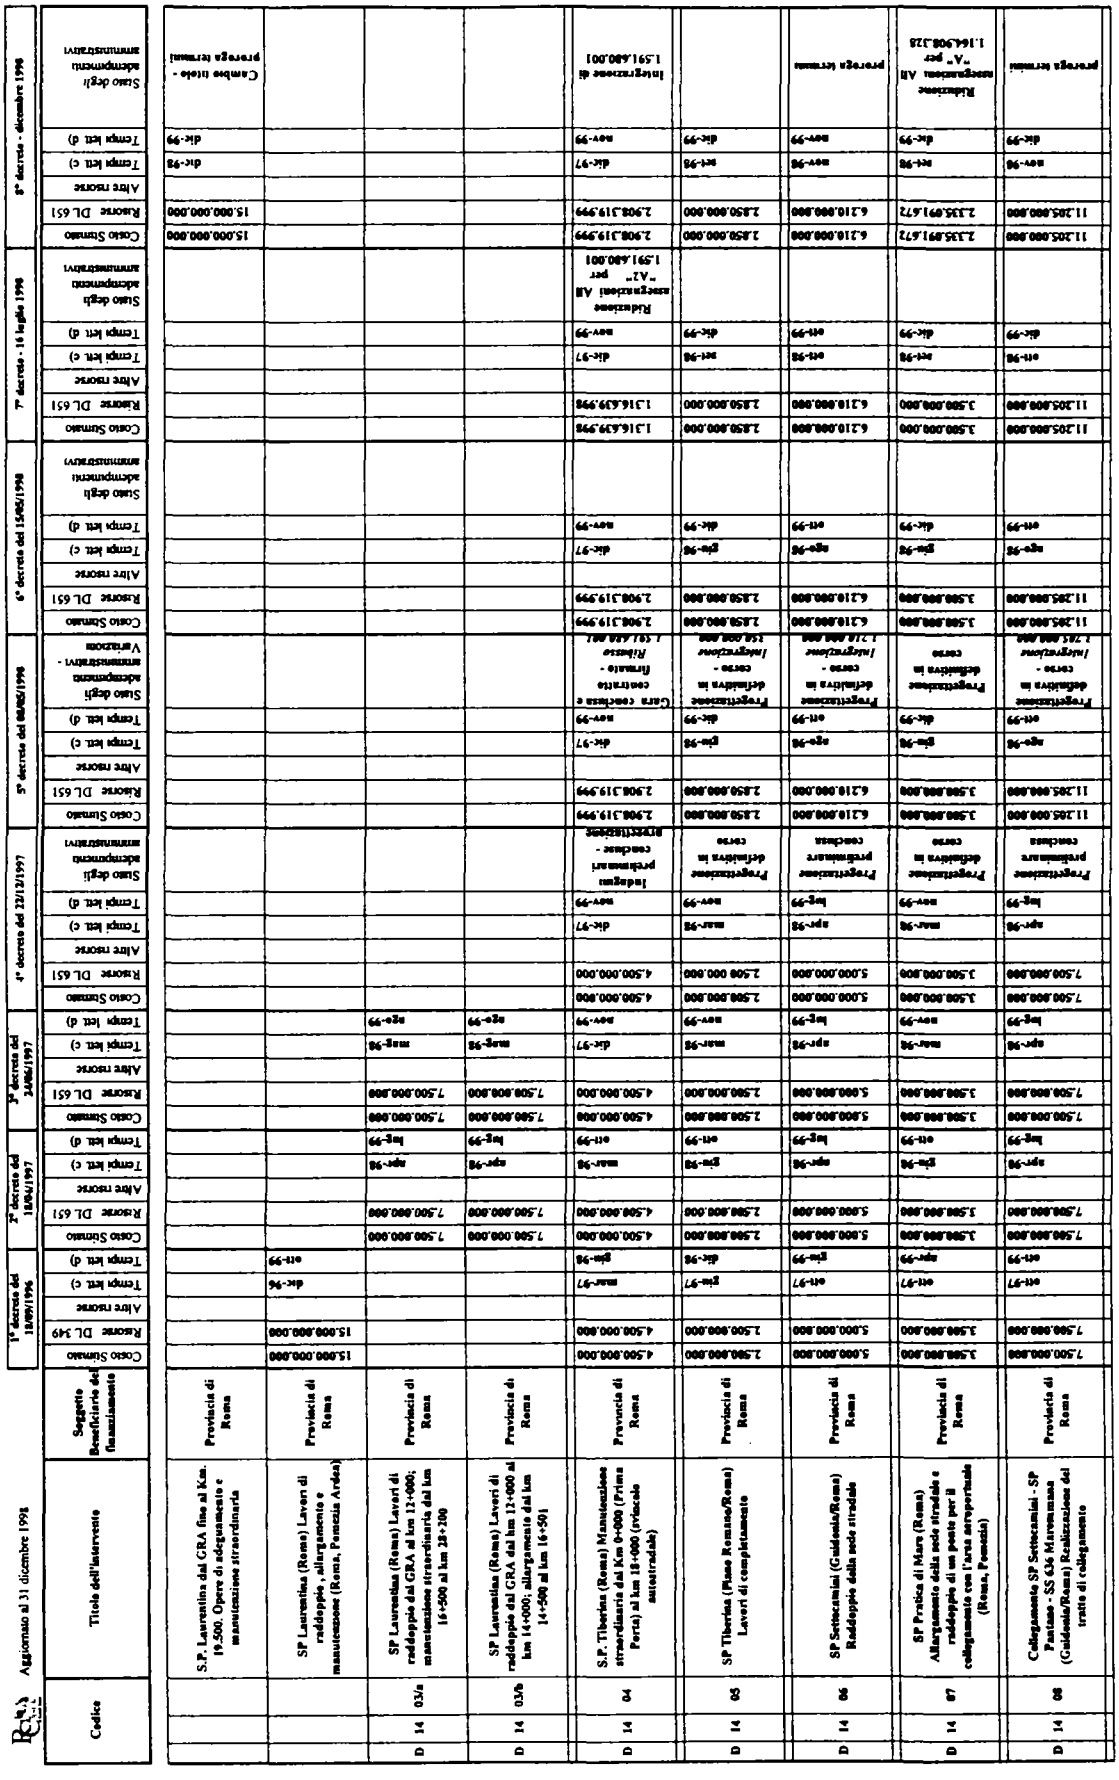

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996							2° decreto del 18/04/1997							3° decreto del 24/06/1997							4° decreto del 22/12/1997							5° decreto del 08/05/1998							6° decreto del 15/05/1998							7° decreto - 16 luglio 1998							8° decreto - dicembre 1998						
					Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi Istr. d)	Tempi Istr. c)	Costo Stimato	Risorse DL 651

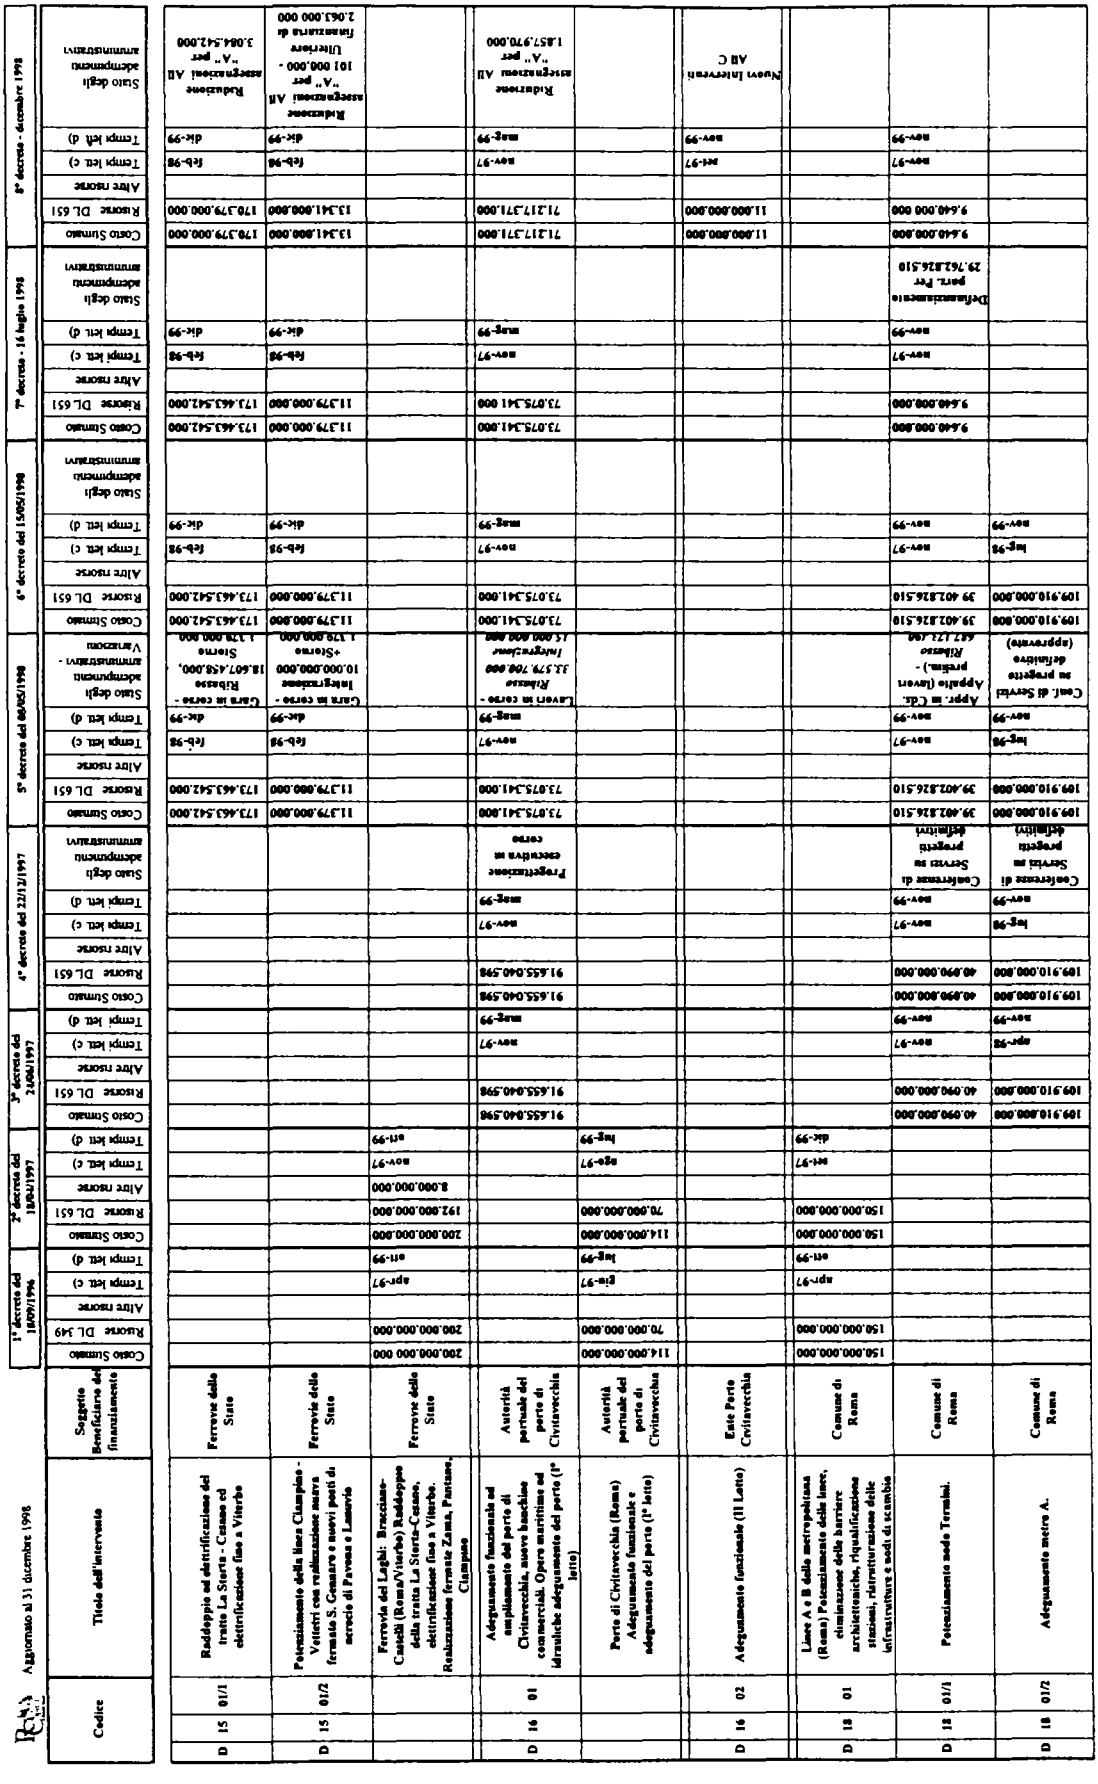

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998	
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi Istr. c)	Tempi Istr. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
D 18 01/2a	Linea metropolitana Adeguamento metro A. 1° stralcio	Comune di Roma	30.000.000.000			apr-97	set-99	30.000.000.000	30.000.000.000		dic-97	dic-99	10.000.000.000	10.000.000.000			mag-99	20.000.000.000	20.000.000.000			mag-99	20.000.000.000	20.000.000.000			mag-99	79.970.000.000	29.940.000.000			ago-99	Riduzione autorizzazioni di cassa "A" per proroga termini 24.932.733.990 - Riduzione autorizzazioni di cassa "A" per proroga termini 4.576.418.267 -
D 18 01/2b	Linea metropolitana Adeguamento metro A. 2° stralcio	Comune di Roma																										55.037.266.010	25.363.361.733			
D 18 02	Ferrovie concesse Roma Lido e Roma Nord (Roma) Potenziamento linee, eliminazione delle barriere architettoniche, riqualificazione stazioni, ristrutturazione delle infrastrutture di servizio	Comune di Roma																														
D 18 02/1	Potenziamento Roma - Lido .	Comune di Roma											10.000.000.000			lug-98	mag-99	10.000.000.000			lug-98	mag-99	10 000.000.000			lug-98	nov-99						
D 18 02/1a	Ferrovie concesse. Potenziamento linea Roma-Lido	Comune di Roma																										6.581.330.834	1.618.669 166 - Riduzione autorizzazioni di cassa "A" per proroga termini			
D 18 02/1b	Ferrovie concesse. Potenziamento linea Roma-Lido. Manutenzione	COTRAL																										2.000.000.000				
D 18 02/2	Potenziamento Roma - Nord.	Comune di Roma																										20.000.000.000	Accorpamento interventi D.18 02/2a e D.18 02/2b in D.18 02/2 - proroga termini			
D 18 02/2a	Ferrovie concesse. Potenziamento linea Roma Nord. 1° stralcio: Labaro	Comune di Roma																														
D 18 02/2b	Ferrovie concesse. Potenziamento linea Roma Nord. 2° stralcio: Saxa Rubra	Comune di Roma																														

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996						2° decreto del 18/04/1997						3° decreto del 24/06/1997						4° decreto del 22/12/1997						5° decreto del 08/05/1998						6° decreto del 15/05/1998						7° decreto - 16 luglio 1998						8° decreto - dicembre 1998	
				Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
D	18	03	Sicurezza stazione Termini	Grandi Stazioni SPA																																										
D	18	04	Ala Mazzoni - stazione Termini	Grandi Stazioni SPA																																										
D	19	01	Nodi di scambio (Roma) Connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari. Valle Aurelia, Tiburtina, Flaminia, Anagnina	Comune di Roma		40.000.000.000		dic-99				mar-98	dic-99					Definanziato																														
D	19	02	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"	Ferrovie dello Stato						40.000.000.000				40.000.000.000	40.000.000.000																	10.000.000.000	5.000.000.000				Definanziato 30.000.000.000											
D	19	03	Parcheggi di scambio con strutture mobili	STA																												5.000.000.000	5.000.000.000					10.000.000.000	5.000.000.000					10.000.000.000	5.000.000.000			
D	19	04	Strade funzionali. Nodo di scambio Valle Aurelia con intersezione tra Via Assarotti II e Via Angelo Emo. Circoscrizione XVII - XVIII.	Comune di Roma																										5.500.000.000	5.500.000.000					5.500.000.000	5.500.000.000					5.500.000.000	5.500.000.000			
D	20	01	Aggiornamento delle reti semaforica, segnaletica e uso di tecnologie per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roma)	STA																20.000.000.000	20.000.000.000			dic-99		20.000.000.000	20.000.000.000		mag-98	dic-99		20.000.000.000	20.000.000.000					20.000.000.000	20.000.000.000					20.000.000.000	20.000.000.000			
D				Comune di Roma																																									
D	20	02	Rifacimento e manutenzione segnaletica	STA		20.000.000.000		mag-97		20.000.000.000		mar-98	ago-99	20.000.000.000	20.000.000.000																																	
D				Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 23/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
D 20 03	Interventi per una mobilità sostenibile a Roma	Ministero Ambiente	Costo Sumaio Risorse DL 349 Altre risorse Tempi lett. c) Tempi lett. d)	Costo Sumaio Risorse DL 651

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice				Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997			3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 12/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1996				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998	
E	01	02		*Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Cassonetto movimentabile con automezzi Side Lander*	AMA	Costo Stimato	Ribasso DL 349	Altre risorse	Tempi Iter c)	Tempi Iter d)	Costo Stimato	Ribasso DL 651	Altre risorse	Tempi Iter c)	Tempi Iter d)	Costo Stimato	Ribasso DL 651	Altre risorse	Tempi Iter c)	Tempi Iter d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Ribasso DL 651	Altre risorse	Tempi Iter c)	Tempi Iter d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Ribasso DL 651	Altre risorse	Tempi Iter c)	Tempi Iter d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Ribasso DL 651	Altre risorse	Tempi Iter c)	Tempi Iter d)	Stato degli adempimenti amministrativi
						2.975.000.000	2.500.000.000	475.000.000	nov-97	nov-97	2.975.000.000	2.500.000.000	475.000.000	feb-99	nov-99	2.975.000.000	2.500.000.000	475.000.000	feb-99	nov-99	Free ettazione definitiva in corso	2.975.000.000	2.500.000.000	475.000.000	feb-99	nov-99	Carro in corso	2.975.000.000	2.500.000.000	475.000.000	feb-99	nov-99	Carro in corso	2.975.000.000	2.500.000.000	475.000.000	feb-99	nov-99	Carro in corso
E	01	03		*Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti*	AMA	12.400.000.000	8.000.000.000	4.400.000.000	set-98	mar-99	12.400.000.000	8.000.000.000	4.400.000.000	set-98	mar-99	14.300.000.000	8.000.000.000	6.300.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso	14.400.000.000	10.000.000.000	4.400.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso	14.400.000.000	10.000.000.000	4.400.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso	14.400.000.000	10.000.000.000	4.400.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso
E	01	04		*Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Monicompattatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani*	AMA	11.900.000.000	1.500.000.000	400.000.000	set-98	dic-98	1.900.000.000	1.500.000.000	400.000.000	set-98	dic-98	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso	2.000.000.000	1.500.000.000	500 000 000	apr-98	set-99	Carro in corso	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso
E	01	05		*Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile.*	AMA	600.000.000	600.000.000				600.000.000	600.000.000				700.000.000	600.000.000	100.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso	700.000.000	600.000.000	100.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso	700.000.000	600.000.000	100.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso	700.000.000	600.000.000	100.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso
E	01	06		*Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Spazzatrici.*	AMA	1.400.000.000	1.000.000.000	400.000.000	set-98	dic-99	1.400.000.000	1.000.000.000	400.000.000	set-98	dic-99	1.400.000.000	1.000.000.000	400.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso	1.400.000.000	1.000.000.000	400.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso	1.400.000.000	1.000.000.000	400.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso	1.400.000.000	1.000.000.000	400.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso
E	01	07		*Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.*	AMA	600.000.000	500.000.000	100.000.000	set-98	gen-99	600.000.000	500.000.000	100.000.000	set-98	gen-99	600.800.000	500.800.000	100.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso	600.800.000	500.800.000	100.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso	600.800.000	500.800.000	100.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso	600.800.000	500.800.000	100.000.000	apr-98	set-99	Carro in corso
E	01	08		*Sedi di sosta e area intermedia attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di sosta nell'area ex Mercati Generali.*	AMA	3.700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	mar-99	nov-97	3.700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	set-98	nov-99	3.700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	apr-98	nov-99	Carro in corso	3.700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	set-98	nov-99	Riduzione aree/razioni AB "A" per 353.079.944 - proroga termini	3.446.920.034	2.646.920.034	700.000.000	dic-98	mar-99	Riduzione aree/razioni AB "A" per 353.079.944 - proroga termini	3.446.920.034	2.646.920.034	700.000.000	dic-98	mar-99	Riduzione aree/razioni AB "A" per 353.079.944 - proroga termini
E	01	09		*Sedi di sosta e area intermedia attrezzate (Roma).Adeguamento locali della sede di sosta via dei Cappellari.*	AMA																																		
E	01			*Sedi di sosta e area intermedia attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di sosta via dei Cappellari*	AMA	2.975.000.000	2.500.000.000	475.000.000	nov-97	nov-98	2.975.000.000	2.500.000.000	475.000.000	feb-99	nov-99	2.975.000.000	2.500.000.000	475.000.000	feb-99	nov-99	Free ettazione definitiva in corso	2.975.000.000	2.500.000.000	475.000.000	feb-99	nov-99	Carro in corso	2.975.000.000	2.500.000.000	475.000.000	feb-99	nov-99	Carro in corso	2.975.000.000	2.500.000.000	475.000.000	feb-99	nov-99	Carro in corso

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 2/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/06/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
E	01	09 1	Adeguamento locali della sede di zona Cappellari	AMA	Costo Stimato	2.260.000.000	2.500.000.000	2.480.000.000	2.500.000.000	2.480.000.000	2.500.000.000	6.252.839.000
					Risorse DL 349	1.900.000.000	2.000.000.000	1.900.000.000	2.000.000.000	1.900.000.000	2.000.000.000	5.672.839.000
					Altre risorse	500.000.000	500.000.000	580.000.000	500.000.000	580.000.000	500.000.000	580.000.000
					Tempi Istr. c)	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	dic-98
					Tempi Istr. d)	mar-99	mar-99	mar-99	mar-99	mar-99	mar-99	mar-99
E	01	09.2	Attrezzature specifiche per il centro storico	AMA	Costo Stimato	2.380.000.000	3.570.000.000	4.521.000.000	3.213.000.000	595.000.000	3.213.000.000	3.213.000 000
					Risorse DL 651	1.500.000.000	2.500.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
					Altre risorse	880.000.000	1.070.000.000	522.000.000	1.213.000.000	95.000.000	1.213.000.000	1.213.000.000
					Tempi Istr. c)	nov-97	mag-98	mag-98	mag-98	mag-98	mag-98	dic-98
					Tempi Istr. d)	mar-99	nov-98	nov-98	nov-98	nov-98	mar-99	mar-99
E	01	10	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona presso l'ex Caserma Pepe	AMA	Costo Stimato		3.601.000.000	5.056.000.000	3.213.000.000	636.000.000	3.213.000.000	5.008.565.752
					Risorse DL 651	Definanziato	2.500.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000	2.000.000.000	3.952.565.752
					Altre risorse		1.101.000.000	1.056.000.000	1.213.000.000	136.000.000	1.213.000.000	1.056.000.000
					Tempi Istr. c)		apr-98	nov-97	apr-98	dic-97	apr-98	ecn-99
					Tempi Istr. d)		nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99
E	01	11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Sabotino.	AMA	Costo Stimato		3.601.000.000	5.056.000.000	3.213.000.000	636.000.000	3.213.000.000	5.008.565.752
					Risorse DL 651		2.500.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000	2.000.000.000	3.952.565.752
					Altre risorse		1.101.000.000	1.056.000.000	1.213.000.000	136.000.000	1.213.000.000	1.056.000.000
					Tempi Istr. c)		apr-98	nov-97	apr-98	dic-97	apr-98	ecn-99
					Tempi Istr. d)		nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99
					Stato degli adempimenti amministrativi		Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Riduzione assegnazioni AR "A" per 47.434.148 - proroga termini
E	01	12	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri.	AMA	Costo Stimato		3.601.000.000	5.056.000.000	3.213.000.000	636.000.000	3.213.000.000	5.039.521.235
					Risorse DL 651		2.500.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000	2.000.000.000	403.521.235
					Altre risorse		1.101.000.000	1.056.000.000	1.213.000.000	136.000.000	1.213.000.000	136.000.000
					Tempi Istr. c)		apr-98	nov-97	apr-98	dic-97	apr-98	ecn-99
					Tempi Istr. d)		nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99
					Stato degli adempimenti amministrativi		Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Riduzione assegnazioni AR "A" per 96.478.765 - proroga termini
E	01	13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via Giolitti.	AMA	Costo Stimato		3.601.000.000	5.056.000.000	3.213.000.000	636.000.000	3.213.000.000	5.039.521.235
					Risorse DL 651		2.500.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000	2.000.000.000	403.521.235
					Altre risorse		1.101.000.000	1.056.000.000	1.213.000.000	136.000.000	1.213.000.000	136.000.000
					Tempi Istr. c)		apr-98	nov-97	apr-98	dic-97	apr-98	ecn-99
					Tempi Istr. d)		nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99
					Stato degli adempimenti amministrativi		Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Proroga termini
E	01	14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Papalonia.	AMA	Costo Stimato		3.601.000.000	5.056.000.000	3.213.000.000	636.000.000	3.213.000.000	3.213.000 000
					Risorse DL 651		2.500.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
					Altre risorse		1.101.000.000	1.056.000.000	1.213.000.000	136.000.000	1.213.000.000	1.213.000.000
					Tempi Istr. c)		apr-98	nov-97	apr-98	dic-97	apr-98	ecn-99
					Tempi Istr. d)		nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99
					Stato degli adempimenti amministrativi		Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	Proroga termini
E	01	15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino.	AMA	Costo Stimato		3.601.000.000	5.056.000.000	3.213.000.000	636.000.000	3.213.000.000	2.600.000.000
					Risorse DL 651		2.500.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000
					Altre risorse		1.101.000.000	1.056.000.000	1.213.000.000	136.000.000	1.213.000.000	100.000.000
					Tempi Istr. c)		apr-98	nov-97	apr-98	dic-97	apr-98	apr-99
					Tempi Istr. d)		nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99
					Stato degli adempimenti amministrativi		Proroga termini	Proroga termini	Proroga termini	Proroga termini	Proroga termini	Suddivisione E.01.09 in due interventi - proroga termini
E	01	16	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona viale Savini.	AMA	Costo Stimato		3.601.000.000	5.056.000.000	3.213.000.000	636.000.000	3.213.000.000	2.600.000.000
					Risorse DL 651		2.500.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000
					Altre risorse		1.101.000.000	1.056.000.000	1.213.000.000	136.000.000	1.213.000.000	100.000.000
					Tempi Istr. c)		apr-98	nov-97	apr-98	dic-97	apr-98	apr-99
					Tempi Istr. d)		nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99	nov-99
					Stato degli adempimenti amministrativi		Proroga termini	Proroga termini	Proroga termini	Proroga termini	Proroga termini	Suddivisione E.01.09 in due interventi - proroga termini

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	Stato degli adempimenti amministrativi
E	01	17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Bellami.	AMA	Costo Stimato	5.355.000.000	5.370.000.000	4.384.000.000	3.937.000.000	8.330.000.000	4.384.000.000	3.937.000.000	4.872.789.000	proroga termini
					Risorse DL 349	4.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000			2.500.000.000		2.500.000.000	Interruzione finanziamento di 488.789.000 - proroga termini
					Altre risorse	1.355.000.000	1.870.000.000	1.884.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	937.000.000	1.884.000.000	Differenziamento parziale per 1.850.000.000
					Tempi Istr. c)	may-97	may-97	may-98	may-98	may-98	may-98	may-98	may-98	
					Tempi Istr. d)	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	Differenziamento parziale per 5.330.000.000 - proroga termini
E	01	18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.	AMA	Costo Stimato	600.000.000	600.000.000	2.330.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	937.000.000	1.884.000.000	
					Risorse DL 349	600.000.000	600.000.000	2.330.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	937.000.000	1.884.000.000	
					Altre risorse									
					Tempi Istr. c)	may-97	may-97	may-97	may-97	may-97	may-97	may-97	may-97	
					Tempi Istr. d)	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	
E	01	19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Saxa Rubra. (1° lotto funzionale)	AMA	Costo Stimato	3.600.000.000	3.570.000.000	4.384.000.000	3.937.000.000	8.330.000.000	4.384.000.000	3.937.000.000	4.872.789.000	proroga termini
					Risorse DL 349	3.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	2.500.000.000	Interruzione finanziamento di 488.789.000 - proroga termini
					Altre risorse	600.000.000	1.070.000.000	1.884.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	937.000.000	1.884.000.000	Differenziamento parziale per 1.850.000.000
					Tempi Istr. c)	may-97	may-97	may-98	may-98	may-98	may-98	may-98	may-98	
					Tempi Istr. d)	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	
E	01	20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli.	AMA	Costo Stimato	8.330.000.000	4.384.000.000	3.937.000.000	8.330.000.000	4.384.000.000	3.937.000.000	8.330.000.000	4.872.789.000	proroga termini
					Risorse DL 349	6.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	2.500.000.000	Interruzione finanziamento di 488.789.000 - proroga termini
					Altre risorse	2.330.000.000	1.884.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	Differenziamento parziale per 1.850.000.000
					Tempi Istr. c)	may-98	may-98	may-98	may-98	may-98	may-98	may-98	may-98	
					Tempi Istr. d)	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	
E	01	21	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Bravaria	AMA	Costo Stimato	1.790.000.000	Differenziato							
					Risorse DL 349	1.500.000.000								
					Altre risorse	290.000.000								
					Tempi Istr. c)	may-97	may-97							
					Tempi Istr. d)	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	
E	01	22	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Sannio	AMA	Costo Stimato	5.355.000.000								
					Risorse DL 349	4.500.000.000								
					Altre risorse	855.000.000								
					Tempi Istr. c)	may-97								
					Tempi Istr. d)	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	
E	01	22/1	Ristrutturazione opere civili sull'Area Intermedia Attrezzata (A.I.A.) Via Sannio.	AMA	Costo Stimato									
					Risorse DL 349									
					Altre risorse									
					Tempi Istr. c)									
					Tempi Istr. d)									
E	01	22/2	Fornitura attrezzature: Compattatori su autotelaio e matrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sannio	AMA	Costo Stimato	1.073.500.864	3.402.734.032	1.850.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	937.000.000	1.884.000.000	
					Risorse DL 349	1.073.500.864	2.547.734.032	670.000.000	150.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	937.000.000	1.884.000.000	
					Altre risorse		855.000.000							
					Tempi Istr. c)	lug-98	dic-98	gen-99	set-98	set-98	set-98	set-98	dic-98	
					Tempi Istr. d)	set-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	
					Costo Stimato	1.073.500.864	3.402.734.032	1.087.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	937.000.000	1.884.000.000	
					Risorse DL 349	1.073.500.864	2.547.734.032	150.000.000		670.000.000			2.988.789.000	
					Altre risorse		855.000.000			2.330.000.000	1.884.000.000	937.000.000	1.884.000.000	
					Tempi Istr. c)	apr-98	set-98	set-98	set-98	set-98	set-98	set-98	set-98	
					Tempi Istr. d)	set-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	
					Costo Stimato	1.550.000.000	4.885.800.000	3.937.000.000	8.330.000.000	4.384.000.000	3.937.000.000	8.330.000.000	4.872.789.000	proroga termini
					Risorse DL 349	1.550.000.000	3.150.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	2.500.000.000	Interruzione finanziamento di 488.789.000 - proroga termini
					Altre risorse		855.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	Differenziamento parziale per 1.850.000.000
					Tempi Istr. c)	apr-98	set-98	set-98	set-98	set-98	set-98	set-98	set-98	
					Tempi Istr. d)	set-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	
					Costo Stimato	1.550.000.000	4.885.800.000	3.937.000.000	8.330.000.000	4.384.000.000	3.937.000.000	8.330.000.000	4.872.789.000	proroga termini
					Risorse DL 349	1.550.000.000	3.150.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	2.500.000.000	Interruzione finanziamento di 488.789.000 - proroga termini
					Altre risorse		855.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	Differenziamento parziale per 1.850.000.000
					Tempi Istr. c)	apr-98	set-98	set-98	set-98	set-98	set-98	set-98	set-98	
					Tempi Istr. d)	set-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	
			Cura in corso					Prefettizzazione definitiva in corso	Prefettizzazione definitiva in corso	Prefettizzazione definitiva in corso	Prefettizzazione definitiva in corso	Prefettizzazione definitiva in corso	Prefettizzazione definitiva in corso	Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni
					Costo Stimato	1.550.000.000	4.885.800.000	3.937.000.000	8.330.000.000	4.384.000.000	3.937.000.000	8.330.000.000	4.872.789.000	proroga termini
					Risorse DL 349	1.550.000.000	3.150.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	2.500.000.000	Interruzione finanziamento di 488.789.000 - proroga termini
					Altre risorse		855.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	Differenziamento parziale per 1.850.000.000
					Tempi Istr. c)	apr-98	set-98	set-98	set-98	set-98	set-98	set-98	set-98	
					Tempi Istr. d)	set-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	
			Cura in corso					Prefettizzazione definitiva in corso	Prefettizzazione definitiva in corso	Prefettizzazione definitiva in corso	Prefettizzazione definitiva in corso	Prefettizzazione definitiva in corso	Prefettizzazione definitiva in corso	Stato degli adempimenti amministrativi
					Costo Stimato	1.550.000.000	4.885.800.000	3.937.000.000	8.330.000.000	4.384.000.000	3.937.000.000	8.330.000.000	4.872.789.000	proroga termini
					Risorse DL 349	1.550.000.000	3.150.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	2.500.000.000	Interruzione finanziamento di 488.789.000 - proroga termini
					Altre risorse		855.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	937.000.000	2.330.000.000	1.884.000.000	Differenziamento parziale per 1.850.000.000
					Tempi Istr. c)	apr-98	set-98	set-98	set-98	set-98	set-98	set-98	set-98	
					Tempi Istr. d)	set-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998	Stato degli adempimenti amministrativi
23	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) Tiburtina Ostiense	AMA	Costo Sumaio	7.140.000.000	7.140.000.000	7.140.000.000	7.140.000.000	7.140.000.000	7.140.000.000	7.140.000.000	
			Risorse DL 349	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	
			Altre risorse	1.140.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000	
			Tempi lett. c)	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	
			Tempi lett. d)	set-99	mar-99	set-99	set-99	nov-99	nov-99	gen-99	
			Costo Sumaio	7.140.000.000	5.355.000.000	7.140.000.000	7.140.000.000	1.190.000.000	1.190.000.000	10.000.000.000	
			Risorse DL 651	6.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	1.000.000.000		10.000.000.000	
			Altre risorse	1.140.000.000	2.355.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000	190.000.000			
			Tempi lett. c)	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	mag-98		ott-97	
			Tempi lett. d)	set-99	mar-99	set-99	set-99	nov-99		gen-99	
24	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Acquafredda. (1° lotto funzionale) di una Sede di Zona e di un'isola ecologica.	AMA	Costo Sumaio		7.038.000.000	7.038.000.000	7.038.000.000	7.038.000.000			
			Risorse DL 651	Definanziato	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000			
			Altre risorse		4.038.000.000	4.038.000.000	4.038.000.000	4.038.000.000			
			Tempi lett. c)		set-98	set-98	set-98	set-98			
			Tempi lett. d)		nov-99	nov-99	nov-99	nov-99			
			Costo Sumaio								
			Risorse DL 651								
			Altre risorse								
			Tempi lett. c)								
			Tempi lett. d)				

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
E	01	27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione esistente	AMA	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Costo Sumaio	Stato degli adempimenti amministrativi
					10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
					Risorse DL 349	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Risorse DL 651	Tempi lett. d)
					25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	
					1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	Tempi lett. c)
					7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	
					5.600.000.000	5.600.000.000	5.600.000.000	5.600.000.000	5.600.000.000	5.600.000.000	5.600.000.000	Altre risorse
					2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	
					8.710.000.000	8.710.000.000	8.710.000.000	8.710.000.000	8.710.000.000	8.710.000.000	8.710.000.000	Tempi lett. c)
					may-98	may-98	may-98	may-98	may-98	may-98	may-98	Tempi lett. d)
					jun-98	jun-98	jun-98	jun-98	jun-98	jun-98	jun-98	Stato degli adempimenti amministrativi
					10.710.000.000	10.710.000.000	10.710.000.000	10.710.000.000	10.710.000.000	10.710.000.000	10.710.000.000	Costo Sumaio
					2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Risorse DL 651
					jul-98	jul-98	jul-98	jul-98	jul-98	jul-98	jul-98	Altre risorse
					aug-98	aug-98	aug-98	aug-98	aug-98	aug-98	aug-98	Tempi lett. c)
					sep-98	sep-98	sep-98	sep-98	sep-98	sep-98	sep-98	Tempi lett. d)
					1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	Costo Sumaio
					5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	Risorse DL 651
					apr-99	apr-99	apr-99	apr-99	apr-99	apr-99	apr-99	Altre risorse
					may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	may-99	Tempi lett. c)
					jun-99	jun-99	jun-99	jun-99	jun-99	jun-99	jun-99	Tempi lett. d)
					3.100.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000	Stato degli adempimenti amministrativi
E	01	27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.	AMA								
E	01	27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi presso intervento	AMA								
E	01	28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA								
E	01	29	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA								
E	01	30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione o ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.	AMA								
E	01	31	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti.	AMA								
E	02	01	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	USL RM E								
E	02	02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di seconda livello (1° stralcio funzionale)	Azienda S. Giovanni Addolorata								

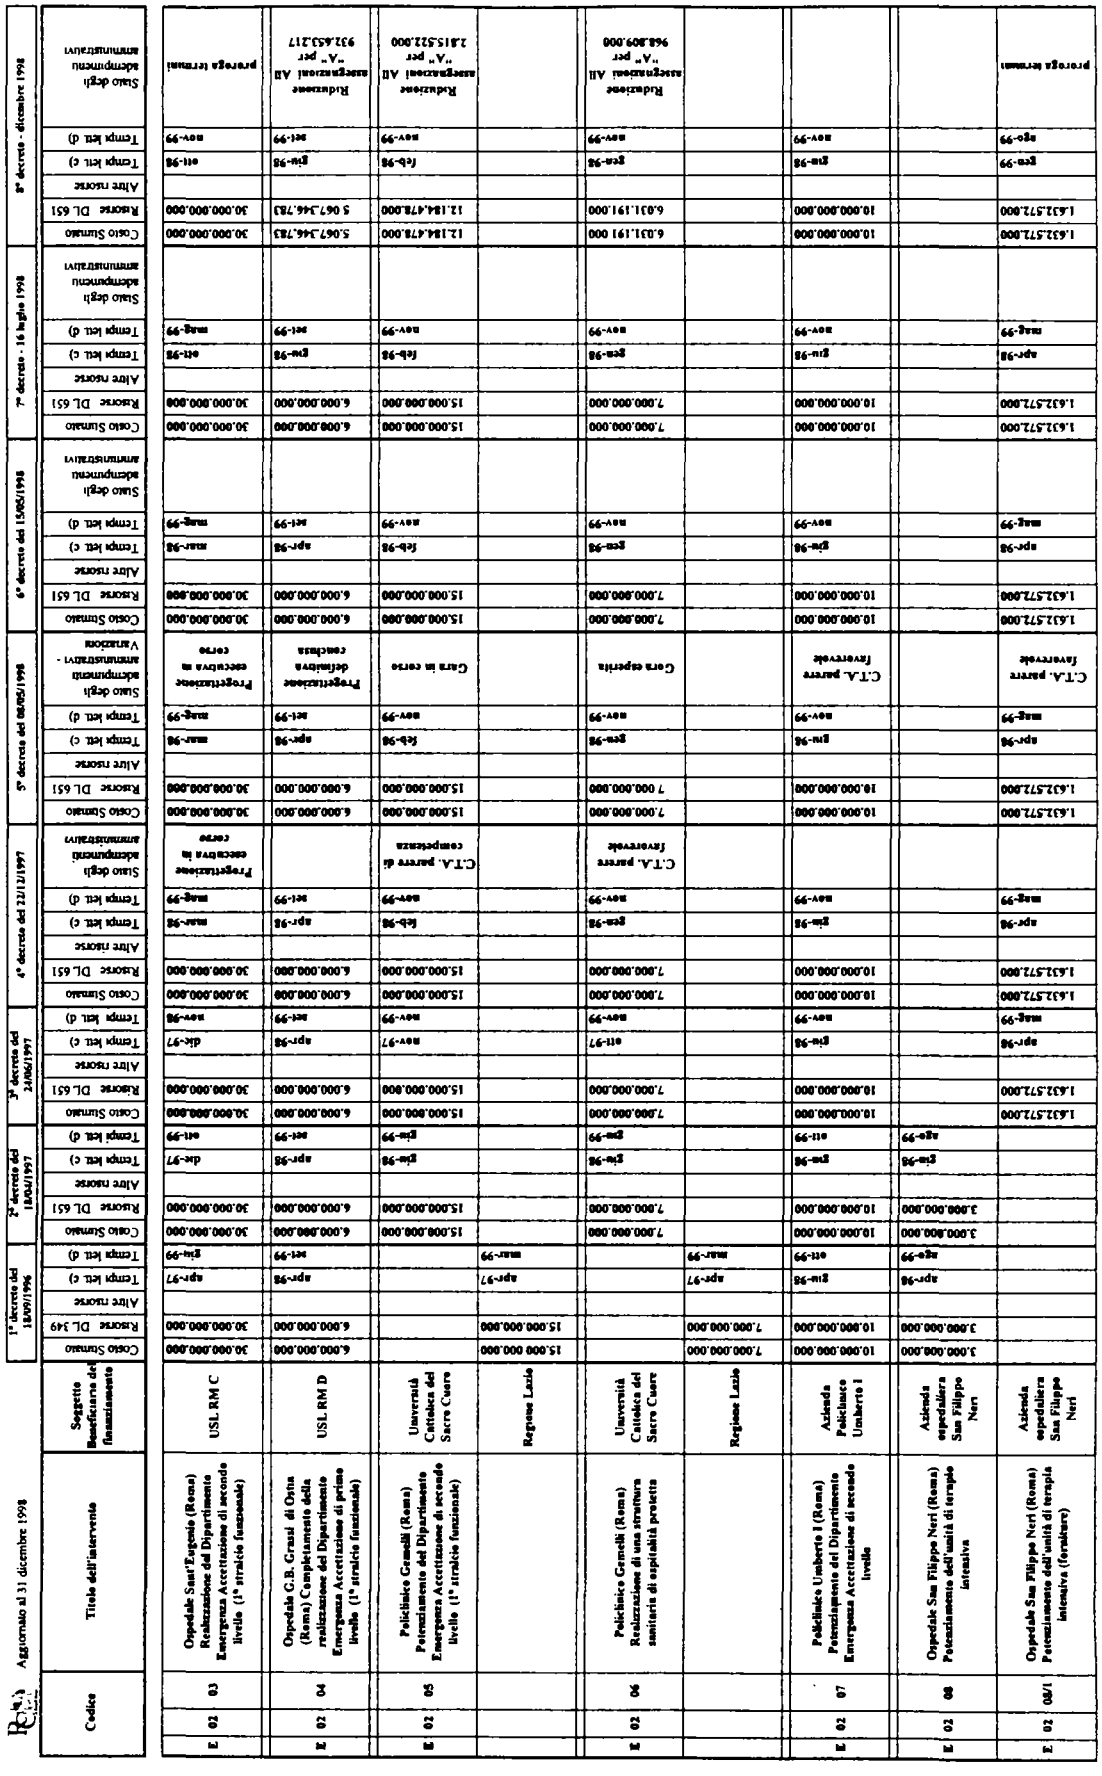

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice				Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/04/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998	
E	02	03																		Stato degli adempimenti ammnistrativi	
E	02	04		Ospedale Sant'Eugenio (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	Costo Sumano	30.000.000.000	Costo Sumano	30.000.000.000	Costo Sumano	30.000.000.000	Costo Sumano	30.000.000.000	Costo Sumano	30.000.000.000	Costo Sumano	30.000.000.000	Costo Sumano	30.000.000.000	Costo Sumano	30.000.000.000	preventivi	1.632.572.000
						Risorse DL 349	30.000.000.000	Risorse DL 651	30.000.000.000	Risorse DL 651	30.000.000.000	Risorse DL 651	30.000.000.000	Risorse DL 651	30.000.000.000	Risorse DL 651	30.000.000.000	Risorse DL 651	30.000.000.000	Risorse DL 651	30.000.000.000	preventivi	1.632.572.000
						Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse			
						Tempi lett. c)	apr-97	Tempi lett. c)	dic-97	Tempi lett. c)	dic-97	Tempi lett. c)		Tempi lett. c)	apr-98	Tempi lett. c)	mar-98	Tempi lett. c)	otl-98	Tempi lett. c)	otl-98	preventivi	1.632.572.000
						Tempi lett. d)	giu-99	Tempi lett. d)	otl-99	Tempi lett. d)	nov-98	Tempi lett. d)	mag-99	Tempi lett. d)	mag-99	Tempi lett. d)	mag-99	Tempi lett. d)	mag-99	Tempi lett. d)	nov-99	preventivi	1.632.572.000
E	02	05		Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	Costo Sumano	15.000.000.000	Costo Sumano	15.000.000.000	Costo Sumano	15.000.000.000	C.T.A. parere di competenza		Costo Sumano	15.000.000.000	Costo Sumano	15.000.000.000	Costo Sumano	15.000.000.000	Costo Sumano	15.000.000.000	Riduzione assegnazioni All "A" per 2.815.522.000	12.184.478.000
						Risorse DL 651	15.000.000.000	Risorse DL 651	15.000.000.000	Risorse DL 651	15.000.000.000	Risorse DL 651	15.000.000.000	Risorse DL 651	15.000.000.000	Risorse DL 651	15.000.000.000	Risorse DL 651	15.000.000.000	Risorse DL 651	15.000.000.000	Riduzione assegnazioni All "A" per 2.815.522.000	12.184.478.000
						Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse			
						Tempi lett. c)	apr-97	Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)			
						Tempi lett. d)	mar-99	Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)			
E	02	06		Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di eccellenza protetta	Università Cattolica del Sacro Cuore	Costo Sumano	7.000.000.000	Costo Sumano	7.000.000.000	Costo Sumano	7.000.000.000	C.T.A. parere favorevole		Costo Sumano	7.000.000.000	Costo Sumano	7.000.000.000	Costo Sumano	7.000.000.000	Costo Sumano	7.000.000.000	Riduzione assegnazioni All "A" per 968.809.000	6.031.191 000
						Risorse DL 349	7.000.000.000	Risorse DL 651	7.000.000.000	Risorse DL 651	7.000.000.000	Risorse DL 651	7.000.000.000	Risorse DL 651	7 000.000.000	Risorse DL 651	7.000.000.000	Risorse DL 651	7.000.000.000	Risorse DL 651	7.000.000.000	Riduzione assegnazioni All "A" per 968.809.000	6.031.191 000
						Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse			
						Tempi lett. c)		Tempi lett. c)	dic-97	Tempi lett. c)	otl-97	Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)			
						Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)			
E	02	07		Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	Costo Sumano	10.000.000.000	Costo Sumano	10.000.000.000	Costo Sumano	10.000.000.000	Costo Sumano	10.000.000.000	Costo Sumano	10.000.000.000	Costo Sumano	10.000.000.000	Costo Sumano	10.000.000.000	Costo Sumano	10.000.000.000	preventivi	1.632.572.000
						Risorse DL 349	10.000.000.000	Risorse DL 651	10.000.000.000	Risorse DL 651	10.000.000.000	Risorse DL 651	10.000.000.000	Risorse DL 651	10.000.000.000	Risorse DL 651	10.000.000.000	Risorse DL 651	10.000.000.000	Risorse DL 651	10.000.000.000	preventivi	1.632.572.000
						Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse			
						Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)			
						Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)			
E	02	08		Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	Costo Sumano	3.000.000.000	Costo Sumano	3.000.000.000	Costo Sumano	3.000.000.000	Costo Sumano	3.000.000.000	Costo Sumano	3.000.000.000	Costo Sumano	3.000.000.000	Costo Sumano	3.000.000.000	Costo Sumano	3.000.000.000	preventivi	1.632.572.000
						Risorse DL 349		Risorse DL 651		Risorse DL 651		Risorse DL 651		Risorse DL 651		Risorse DL 651		Risorse DL 651		Risorse DL 651		preventivi	1.632.572.000
						Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse			
						Tempi lett. c)	apr-98	Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)			
						Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)			
E	02	08/1		Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (ferialture)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	Costo Sumano		Costo Sumano		Costo Sumano		Costo Sumano		Costo Sumano		Costo Sumano		Costo Sumano		Costo Sumano		preventivi	
						Risorse DL 349		Risorse DL 651		Risorse DL 651		Risorse DL 651		Risorse DL 651		Risorse DL 651		Risorse DL 651		Risorse DL 651		preventivi	
						Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse		Altre risorse			
						Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)		Tempi lett. c)			
						Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)		Tempi lett. d)			

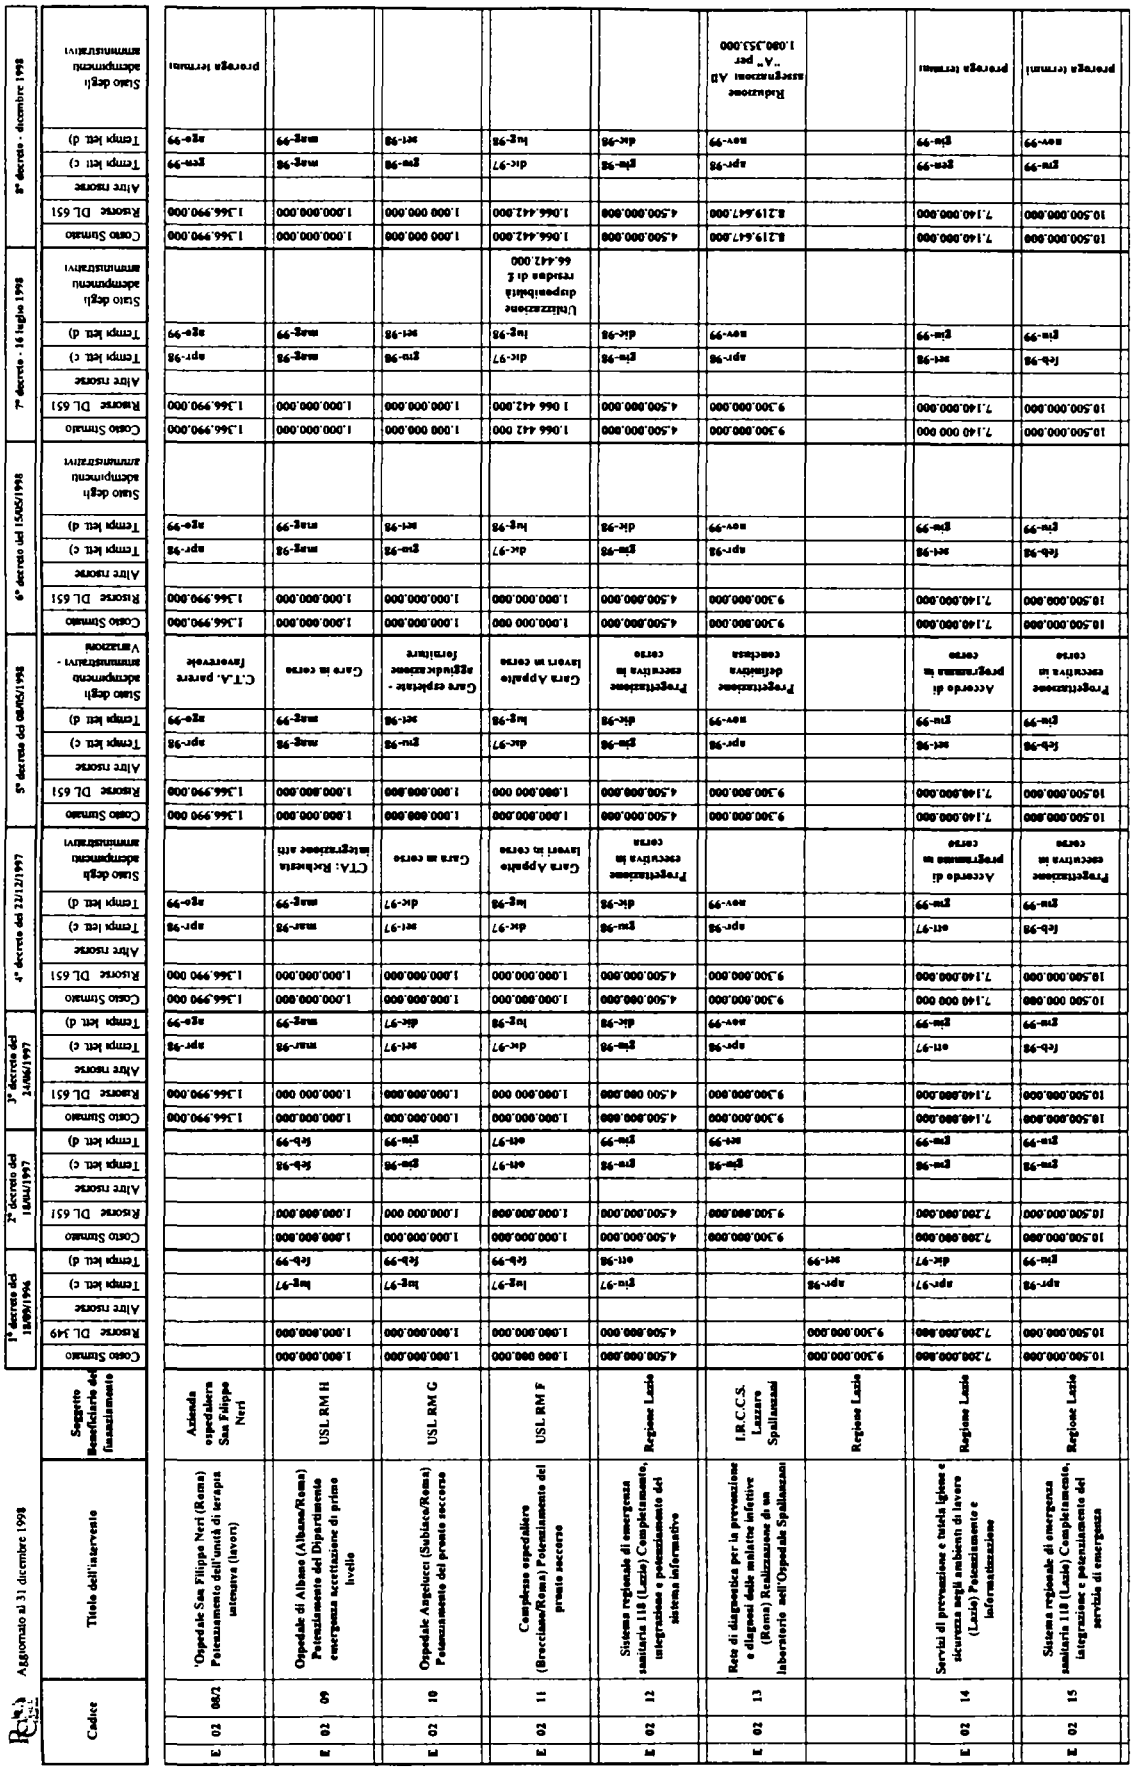

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1994	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
E 02	08/2	'Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	Costo Stimato 10.500.000.000 Risorse DL 349 1.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mar-97 Tempi lett. d) feb-99							proroga termini
E 02	09	Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	USL RM H	Costo Stimato 1.000.000.000 Risorse DL 651 1.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) feb-98 Tempi lett. d) feb-99				Gara in corso			
E 02	10	Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM G	Costo Stimato 1.000.000.000 Risorse DL 651 1.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) feb-98 Tempi lett. d) feb-99				Gara espletata - approvazione graduatoria			
E 02	11	Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM F	Costo Stimato 1.000.000.000 Risorse DL 651 1.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) feb-98 Tempi lett. d) feb-99				Gara Appalto lavori in corso			Utilizzazione disponibilità residue di £ 66.442.000
E 02	12	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo	Regione Lazio	Costo Stimato 4.500.000.000 Risorse DL 651 4.500.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) gen-98 Tempi lett. d) feb-99			Progettazione esecutiva in corso	Progettazione esecutiva in corso			
E 02	13	Rete di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani	I.R.C.C.S. Lazzaro Spallanzani	Costo Stimato 9.300.000.000 Risorse DL 651 9.300.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) set-99				Progettazione definitiva esecutiva		Riduzione stanziamenti AD "A" per 1.080.353.000	
			Regione Lazio	Costo Stimato 9.300.000.000 Risorse DL 349 9.300.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) set-97 Tempi lett. d) nov-97							
E 02	14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	Costo Stimato 7.200.000.000 Risorse DL 651 7.200.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mag-98 Tempi lett. d) lug-98	Costo Stimato 7.200.000.000 Risorse DL 651 7.200.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mag-98 Tempi lett. d) lug-98	Costo Stimato 7.200.000.000 Risorse DL 651 7.200.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mag-98 Tempi lett. d) lug-98	Costo Stimato 7.200.000.000 Risorse DL 651 7.200.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mag-98 Tempi lett. d) lug-98	Costo Stimato 7.200.000.000 Risorse DL 651 7.200.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mag-98 Tempi lett. d) lug-98	Costo Stimato 7.200.000.000 Risorse DL 651 7.200.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mag-98 Tempi lett. d) lug-98	Costo Stimato 7.140.000.000 Risorse DL 651 7.140.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) gen-99 Tempi lett. d) gen-99	proroga termini
E 02	15	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	Regione Lazio	Costo Stimato 10.500.000.000 Risorse DL 651 10.500.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mag-98	Costo Stimato 10.500.000.000 Risorse DL 651 10.500.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mag-98	Costo Stimato 10.500.000.000 Risorse DL 651 10.500.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mag-98	Costo Stimato 10.500.000.000 Risorse DL 651 10.500.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mag-98	Costo Stimato 10.500.000.000 Risorse DL 651 10.500.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mag-98	Costo Stimato 10.500.000.000 Risorse DL 651 10.500.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mag-98	Costo Stimato 10.500.000.000 Risorse DL 651 10.500.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mag-98	Costo Stimato 10.500.000.000 Risorse DL 651 10.500.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) mag-98

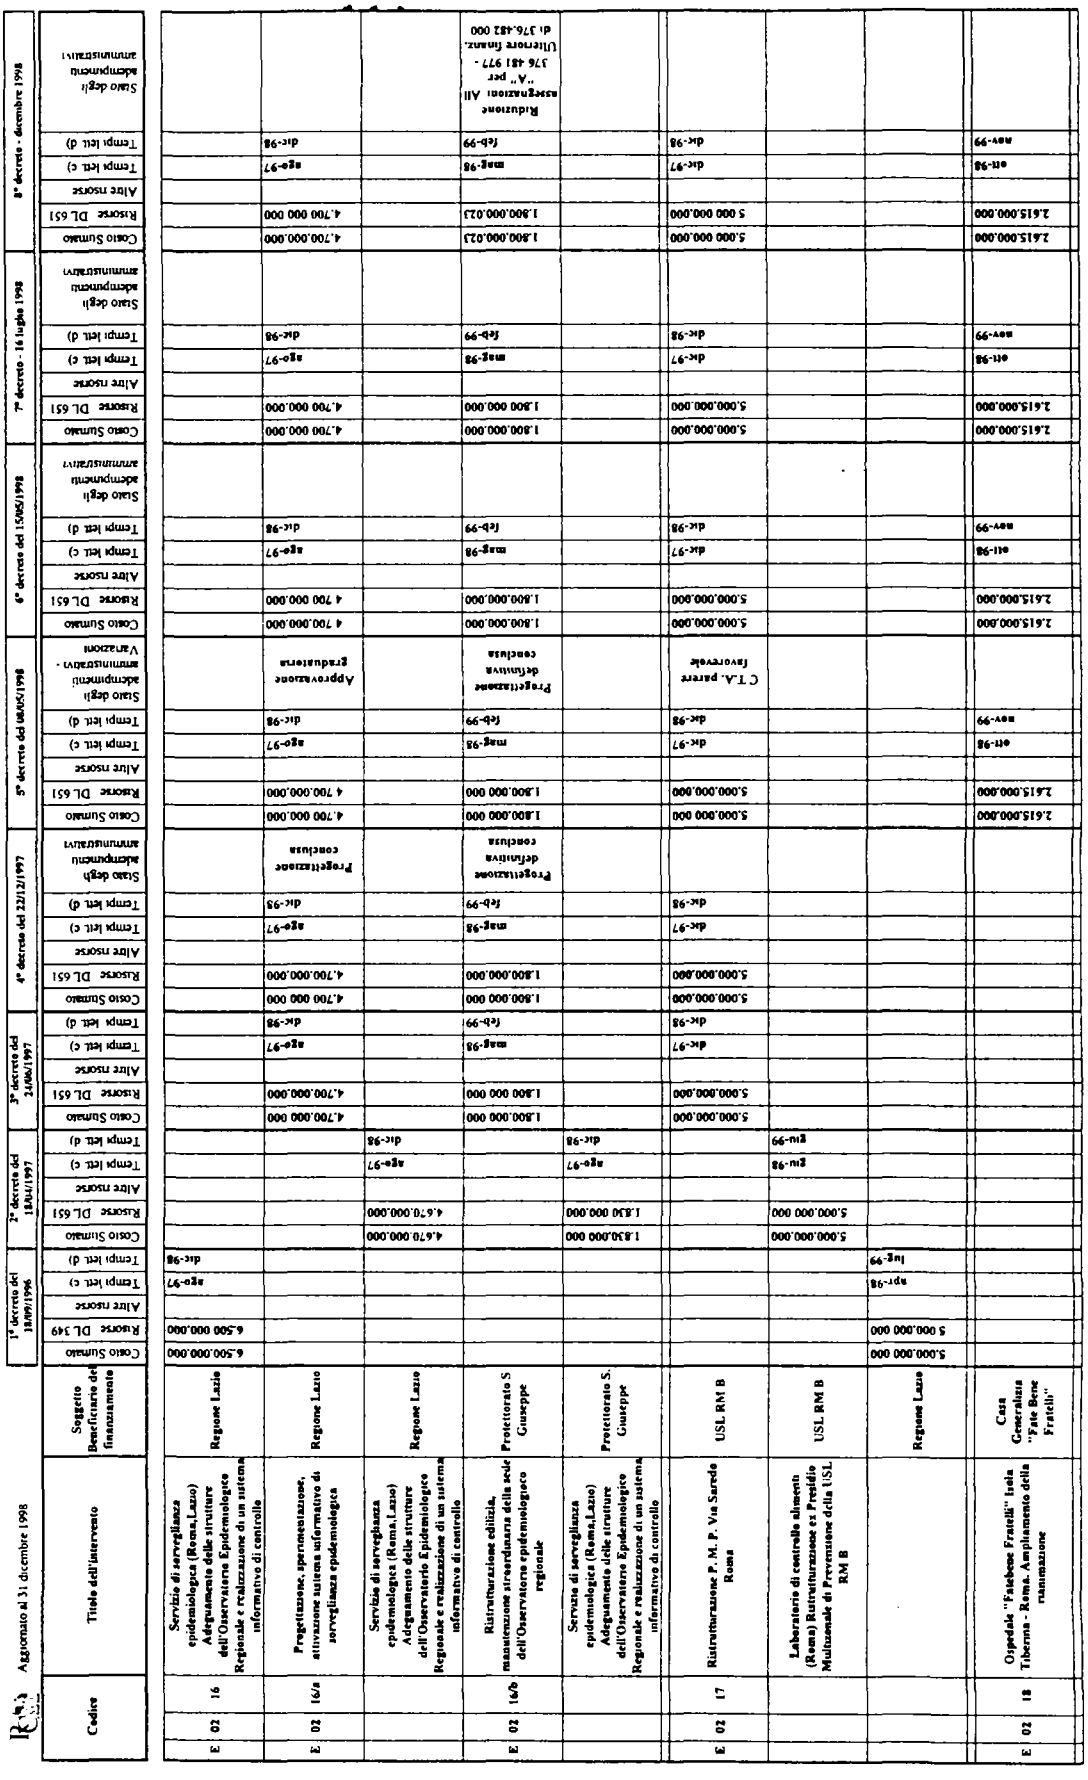

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
E	02	16	*Servizio di sorveglianza epidemiologica (Roma,Lazio) Adeguamento delle strutture dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale e realizzazione di un sistema informativo di controllo*	Regione Lazio	Costo Sumaio 6.500.000.000 Risorse DL 349 6.500.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) ago-97 Tempi lett. d) dic-98	Costo Sumaio 4.670.000.000 Risorse DL 651 4.670.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) ago-97 Tempi lett. d) dic-98	Costo Sumaio 4.700.000.000 Risorse DL 651 4.700.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) ago-97 Tempi lett. d) dic-98	Costo Sumaio 4.700.000.000 Risorse DL 651 4.700.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) ago-97 Tempi lett. d) dic-98	Costo Sumaio 4.700.000.000 Risorse DL 651 4.700.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) ago-97 Tempi lett. d) dic-98 Stato degli adempimenti amministrativi Progettazione conclusa	Costo Sumaio 4.700.000.000 Risorse DL 651 4.700.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) ago-97 Tempi lett. d) dic-98 Stato degli adempimenti amministrativi - Varianti Approvazione graduatoria	Costo Sumaio 4.700.000.000 Risorse DL 651 4.700.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) ago-97 Tempi lett. d) dic-98 Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio 4.700.000.000 Risorse DL 651 4.700.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) ago-97 Tempi lett. d) dic-98 Stato degli adempimenti amministrativi
E	02	16/a	*Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica*	Regione Lazio								
E	02		*Servizio di sorveglianza epidemiologica (Roma,Lazio) Adeguamento delle strutture dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale e realizzazione di un sistema informativo di controllo*	Regione Lazio		Costo Sumaio 4.670.000.000 Risorse DL 651 4.670.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) ago-97 Tempi lett. d) dic-98						
E	02	16/b	*Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale*	Protettorato S. Giuseppe	Costo Sumaio 1.830.000.000 Risorse DL 651 1.830.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) ago-97 Tempi lett. d) dic-98	Costo Sumaio 1.800.000.000 Risorse DL 651 1.800.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mag-98 Tempi lett. d) feb-99 Stato degli adempimenti amministrativi Progettazione definitiva conclusa	Costo Sumaio 1.800.000.000 Risorse DL 651 1.800.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mag-98 Tempi lett. d) feb-99 Stato degli adempimenti amministrativi Progettazione definitiva conclusa	Costo Sumaio 1.800.000.000 Risorse DL 651 1.800.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) mag-98 Tempi lett. d) feb-99 Stato degli adempimenti amministrativi Riduzione risorse Atti "A" per 376.481.977 - Utilizzo finanz. di 376.482.000				
E	02		*Servizio di sorveglianza epidemiologica (Roma,Lazio) Adeguamento delle strutture dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale e realizzazione di un sistema informativo di controllo*	Protettorato S. Giuseppe	Costo Sumaio 1.830.000.000 Risorse DL 651 1.830.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) ago-97 Tempi lett. d) dic-98							
E	02	17	*Ristrutturazione P. M. P. Via Sarde Roma*	USL RM B	Costo Sumaio 5.000.000.000 Risorse DL 651 5.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) dic-98	Costo Sumaio 5.000.000.000 Risorse DL 651 5.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) dic-98	Costo Sumaio 5.000.000.000 Risorse DL 651 5.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) dic-98 Stato degli adempimenti amministrativi C.T.A. parere favorevole	Costo Sumaio 5.000.000.000 Risorse DL 651 5.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) dic-98	Costo Sumaio 5.000.000.000 Risorse DL 651 5.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) dic-98 Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio 5.000.000.000 Risorse DL 651 5.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) dic-97 Tempi lett. d) dic-98 Stato degli adempimenti amministrativi
E	02		*Laboratorio di controllo alimenti (Roma) Ristrutturazione ex Presidio Multizonale di Prevenzione della USL RM B*	USL RM B	Costo Sumaio 5.000.000.000 Risorse DL 651 5.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) lug-98 Tempi lett. d) lug-99							
E	02			Regione Lazio	Costo Sumaio 5.000.000.000 Risorse DL 349 5.000.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) apr-98 Tempi lett. d) lug-99							
E	02	18	*Ospedale "Fatebene Fratelli" Isola Tiberina - Roma. Ampliamento della rianimazione*	Casa Generalizia "Fate Bene Fratelli"								Costo Sumaio 2.615.000.000 Risorse DL 651 2.615.000.000 Altre risorse Tempi lett. c) ott-98 Tempi lett. d) nov-99

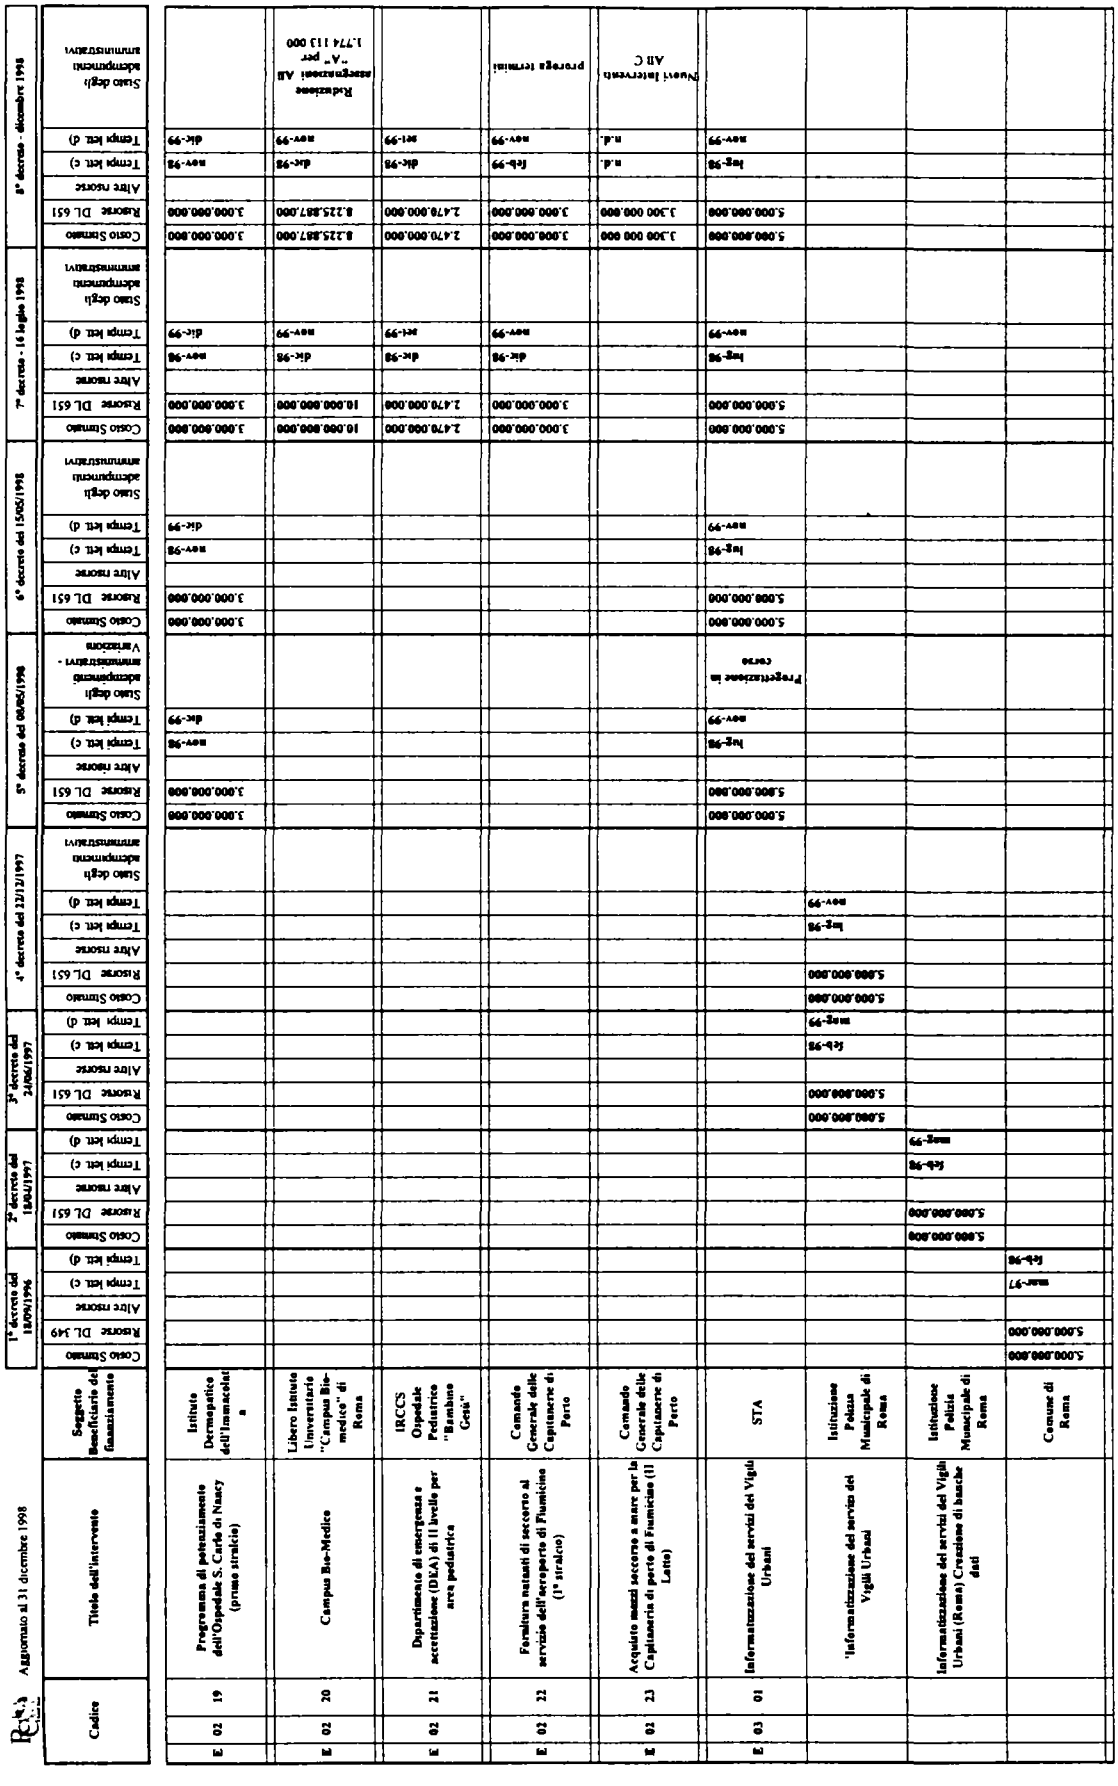

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/06/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998			
			Costo Sumaio	Risorse DL 349	Altre risorse	Temp. lett. c)	Temp. lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. lett. c)	Temp. lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. lett. c)	Temp. lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. lett. c)	Temp. lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. lett. c)	Temp. lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Riduzione ascrizioni AII "A" per 8.000.000	Proiettazione in corso	Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni	Temp. lett. d)	Temp. lett. c)	Altre risorse	Risorse DL 651	Costo Sumaio

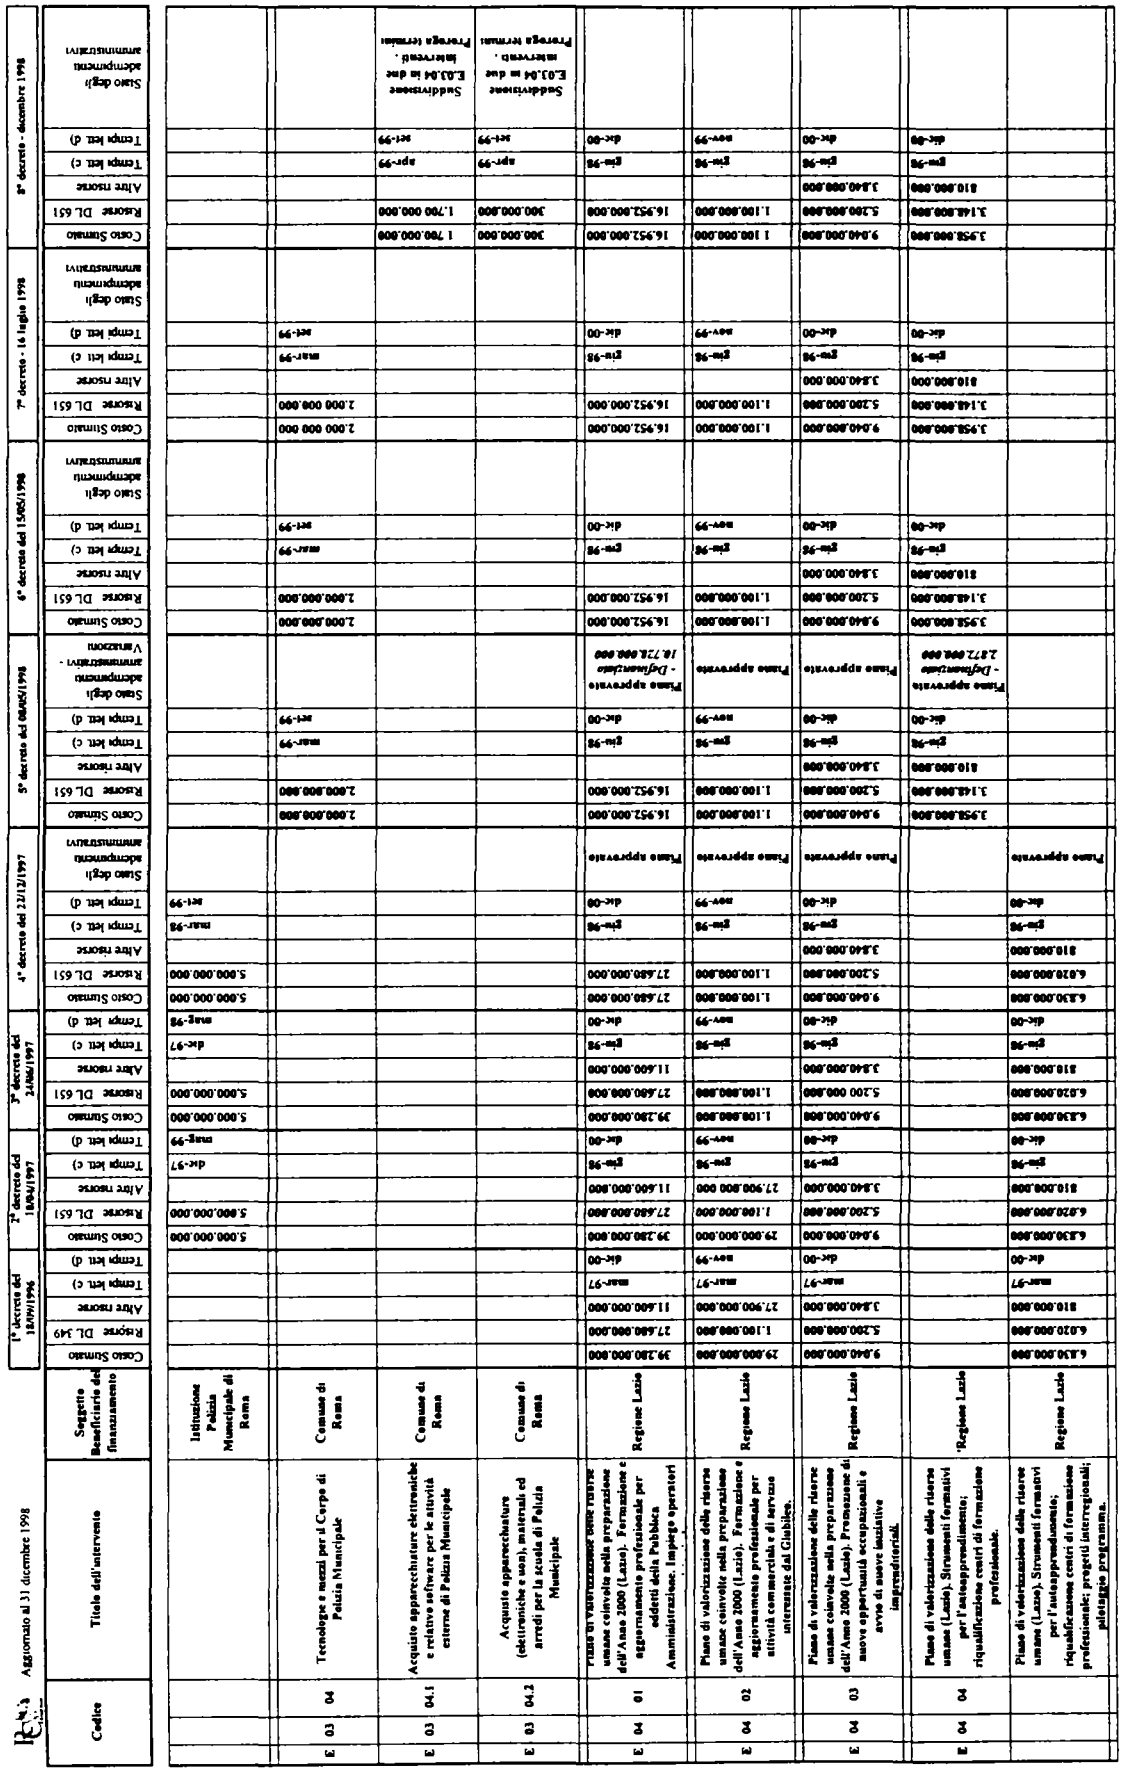

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 18/04/1997	3° decreto del 21/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 08/05/1998	6° decreto del 15/05/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
										Stato degli adempimenti amministrativi
										Termi lett d)
										Termi lett c)
										Altre risorse
										Risorse DL 651
										Costo Sumaio
										Stato degli adempimenti amministrativi
										Termi lett d)
										Termi lett c)
										Altre risorse
										Risorse DL 651
										Costo Sumaio
										Stato degli adempimenti amministrativi
										Termi lett d)
										Termi lett c)
										Altre risorse
										Risorse DL 651
										Costo Sumaio
										Stato degli adempimenti amministrativi
										Termi lett d)
										Termi lett c)
										Altre risorse
										Risorse DL 651
										Costo Sumaio
										Stato degli adempimenti amministrativi
										Termi lett d)
										Termi lett c)
										Altre risorse
										Risorse DL 651
										Costo Sumaio
										Stato degli adempimenti amministrativi
										Termi lett d)
										Termi lett c)
										Altre risorse
										Risorse DL 651
										Costo Sumaio
E 05 01	Sicurezza Pubblica (Lazio, Roma) Piano degli interventi di potenziamento e adeguamento tecnologico del sistema di Pubblica Sicurezza	Ministero dell'Interno	5.000.000.000							
			5.000.000.000							
			5.000.000.000							
				lug-97						
			set-99							
E 05 01/1	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Acquisto rete LAN e materiale hardware	Ministero dell'Interno				1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	dic-99
						3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000	dic-99
					lug-97	lug-97	lug-97	lug-97	lug-97	lug-97
					dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	giu-99
E 05 01/2	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Integrazione software	Ministero dell'Interno				1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	dic-99
						3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000	dic-99
					lug-97	lug-97	lug-97	lug-97	lug-97	lug-97
					dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	dic-99	prorog. termini
E 05 02	Sistemi e servizi per la protezione civile (Lazio, Roma) Piano degli interventi e dei servizi per la sicurezza e la protezione civile	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei								
			1.000.000.000							
			1.000.000.000							
					set-97					
					set-98					
E 05 02/1	Sistema di telecomunicazioni su veicolo a breve raggio	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei								
					630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	
					630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	
					nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	
					mar-99	mar-99	mar-99	mar-97	dic-98	
E 05 02/2	Sistema per la rilevazione automatica della posizione - 1	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei								
					140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	
					140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	
					nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	
					mar-99	mar-99	mar-99	mar-97	dic-98	
E 05 02/3	Sistema per la rilevazione automatica della posizione - 2	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei								
					230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	
					230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	
					nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	
					mar-99	mar-99	mar-99	mar-97	dic-98	
E 05 26	Impianti di telecomunicazioni per le sedi operative dei vigili del fuoco operanti nella provincia di Roma	Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile								
E 06 02/4	Servizi ed impianti di telecomunicazioni per le sedi operative dei vigili del fuoco operanti nella provincia di Roma	"Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile								

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998			
					Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi fatt. c)	Tempi fatt. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. c)	Tempi fatt. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. c)	Tempi fatt. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. c)	Tempi fatt. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. c)	Tempi fatt. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi fatt. c)	Tempi fatt. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
E	05	03	Progetto sicurezza grandi basiliche	Ministero dell'interno																																
E	05	04	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'interno																																
E	05	05	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'interno																																
E	05	06	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'interno																																
E	05	07	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'interno																																
E	05	08	Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino																																
E	05	09	Acquisto 7 torri per illuminazione	Ministero Difesa																																
E	05	10	Acquisto 4 gruppi elettrogeni con relativi shelter	Ministero Difesa																																
E	05	11	Adeguamento, potenziamento e ripristino infrastrutture destinate alloggio operatori volontari e pellegrini militari italiani ed esteri	Ministero Difesa																																

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996						2° decreto del 18/04/1997						3° decreto del 24/06/1997						4° decreto del 22/12/1997						5° decreto del 08/05/1998						6° decreto del 15/05/1998						7° decreto - 16 luglio 1998						8° decreto - dicembre 1998					
					Costo Sumaio	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi ist. c)	Tempi ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi ist. c)	Tempi ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi ist. c)	Tempi ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi - Varianzioni	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi ist. c)	Tempi ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi ist. c)	Tempi ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi ist. c)	Tempi ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi ist. c)	Tempi ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
E	05	12	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Talamo"	Ministero Difesa - Arma dei Carabinieri																																												
E	05	13	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Ter di Quarta"	Ministero Difesa - Arma dei Carabinieri																																													
				Ministero Lavori Pubblici																																												
E	05	14	Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Ministero Interno																																												
E	05	15	Infrastrutture - Ristrutturazione Servizi Logistici caserma "Piave"	Ministero Interno																																												
E	05	16	Caserma della polizia di Stato "Villa Tevere" sede del reparto scorte	Ministero Interno																																												
E	05	17	Caserma della polizia di Stato "Maurizio Gigio" sede del reparto volanti	Ministero Interno																																												
E	05	18	Nuovo complesso polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	Ministero Interno																																												
E	05	19	Nuovo complesso polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	Ministero Interno																																												

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996								2° decreto del 18/04/1997								3° decreto del 24/06/1997								4° decreto del 22/12/1997								5° decreto del 08/05/1998								6° decreto del 15/05/1998								7° decreto - 16 luglio 1998								8° decreto - dicembre 1998							
					Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi - Variazioni	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
E	05	20	Coordinamento Centrale operative Interforze	Ministero Interno							

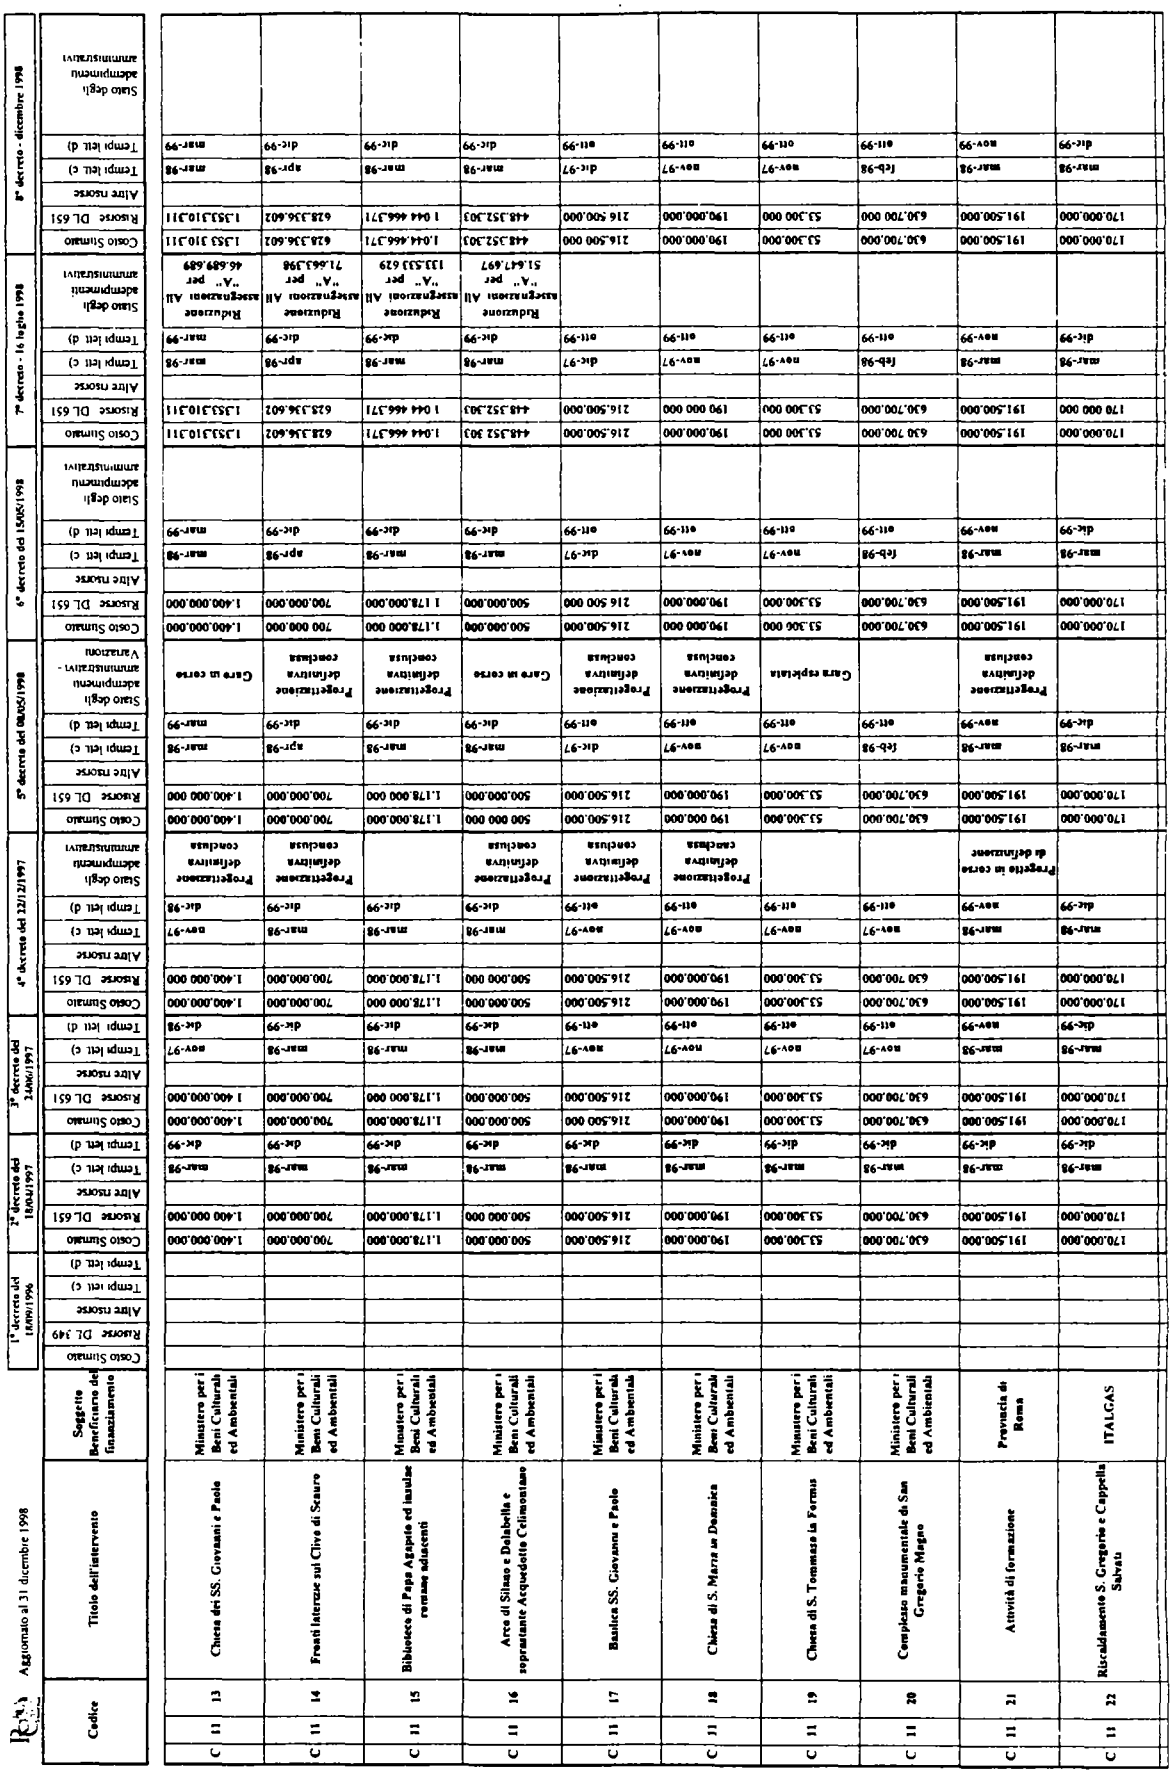

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996					2° decreto del 18/04/1997					3° decreto del 24/06/1997					4° decreto del 22/12/1997					5° decreto del 08/05/1998					6° decreto del 15/05/1998					7° decreto - 16 luglio 1998					8° decreto - dicembre 1998	
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi ieri c)	Tempi ieri d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi ieri c)	Tempi ieri d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi ieri c)	Tempi ieri d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi ieri c)	Tempi ieri d)	Stato degli adempimenti amministrativi - Varianti	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi ieri c)	Tempi ieri d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi ieri c)	Tempi ieri d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi ieri c)	Tempi ieri d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C 11 13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali						1.400.000.000	1.400.000.000		mar-98	dic-99	1.400.000.000	1.400.000.000		dic-98	dic-99	1.400.000.000	1.400.000.000		nov-97	dic-98	Gara in corso	1.400.000.000	1.400.000.000		mar-98	mar-99		1.400.000.000	1.400.000.000		mar-98	dic-99		1.353.310.311	1.353.310.311		mar-98	mar-99	
C 11 14	Fronti interne sul Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali						700.000.000	700.000.000		mar-98	dic-99	700.000.000	700.000.000		dic-98	dic-99	700.000.000	700.000.000		mar-98	dic-99	Progettazione definitiva conclusa	700.000.000	700.000.000		mar-98	dic-99		700.000.000	700.000.000		apr-98	dic-99	Riduzione Alt asseg.ni "A" per 71.663.398	628.336.602	628.336.602		apr-98	dic-99	
C 11 15	Biblioteca di Papa Agapito ed insulae romane adiacenti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali						1.178.000.000	1.178.000.000		mar-98	dic-99	1.178.000.000	1.178.000.000		dic-99	dic-99						Progettazione definitiva conclusa	1.178.000.000	1.178.000.000		mar-98	dic-99		1.178.000.000	1.178.000.000		mar-98	dic-99	Riduzione Alt asseg.ni "A" per 133.533.629	1.044.466.371	1.044.466.371		mar-98	dic-99	
C 11 16	Arce di Silano e Dolabella e sopraelante Acquedotto Celimontano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali						500.000.000	500.000.000		mar-98	dic-99	500.000.000	500.000.000		mar-98	dic-99						Progettazione definitiva conclusa	500.000.000	500.000.000		mar-98	dic-99	Gara in corso	500.000.000	500.000.000		mar-98	dic-99	Riduzione Alt asseg.ni "A" per 51.647.697	448.352.303	448.352 303		mar-98	dic-99	
C 11 17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali						216.500.000	216.500.000		nov-97	dic-97	216.500.000	216.500.000		nov-97	ott-99	216.500.000	216.500.000		nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	216.500.000	216.500.000		nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	216.500.000	216.500.000		nov-97	ott-99		216.500 000	216.500 000		nov-97	ott-99	
C 11 18	Chiesa di S. Maria in Domnica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali						190.000.000	190.000.000		nov-97	dic-99	190.000.000	190.000.000		nov-97	ott-99	190.000.000	190.000.000		nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	190.000.000	190.000.000		nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa	190.000.000	190.000.000		nov-97	ott-99		190.000.000	190.000.000		nov-97	ott-99	
C 11 19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali						53.300.000	53.300.000		mar-98	dic-99	53.300.000	53.300.000		nov-97	ott-99	53.300.000	53.300.000		nov-97	ott-99	Gara esplorativa	53.306 000	53.300.000		nov-97	ott-99		53.300.000	53.300.000		nov-97	ott-99		53.300 000	53.300 000		nov-97	ott-99	
C 11 20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali						630.700.000	630.700.000		mar-98	dic-99	630.700.000	630.700.000		nov-97	ott-99	630.700.000	630.700.000		nov-97	ott-99		630.700.000	630.700.000		feb-98	ott-99		630.700.000	630.700.000		feb-98	ott-99		630 700.000	630 700.000		feb-98	ott-99	
C 11 21	Attività di formazione	Provincia di Roma						191.500.000	191.500.000		mar-98	dic-99	191.500.000	191.500.000		mar-98	dic-99	191.500.000	191.500.000		mar-98	dic-99	Progettazione definitiva conclusa	191.500.000	191.500.000		mar-98	dic-99		191.500.000	191.500.000		mar-98	dic-99		191.500.000	191.500.000		mar-98	dic-99	
C 11 22	Riscaldamento S. Gregorio e Cappella Salviati	ITALGAS						170.000.000	170.000.000		mar-98	dic-99	170.000.000	170.000.000		mar-98	dic-99	170.000.000	170.000.000		mar-98	dic-99		170.000.000	170.000.000		mar-98	dic-99		170.000.000	170 000 000		mar-98	dic-99		170.000.000	170.000.000		mar-98	dic-99	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996						2° decreto del 18/04/1997						3° decreto del 24/06/1997						4° decreto del 22/12/1997						5° decreto del 08/05/1998						6° decreto del 15/05/1998						7° decreto - 16 luglio 1998						8° decreto - dicembre 1998					
					Costo Sumano	Risorse DL 349	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi - Valutazione	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Sumano	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
E	05	29	Predisposizione di circa 150 moduli contrattuali giurisdizionali per le aree periferiche di supporto logistico e di accoglienza	Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Protezione Civile																																													
E	05	30	Acquisto mezzi e attrezzature varie	Ministero Interno - Corpo nazionale VV. FF - Dipartimento																																													
E	05	31	Ampliamento e ristrutturazione sede EUR	Ministero Interno - Corpo nazionale VV. FF - Dipartimento																																													
E	05	32	Caserma CC P.zza Dante - Lavori di ristrutturazione (1° stralcio)	Ministero Interno																																													
E	05	33	Rete di radio comunicazioni della polizia	Ministero Interno																																												
E	06	01	Contributo a favore di imprese giovanili per la promozione di occupazione connessa alle attività giubilari	Comune di Roma																																												
			Interventi di sostegno all'occupazione giovanile attraverso la promozione di nuove attività professionali e lo sviluppo di imprese (Roma) Costituzione organismo di gestione e avvio di programmi occupazionali	Comune di Roma																																												
E	06	01/1	Costituzione e avvio del Centro Giovani per Garantire l'operatività delle imprese giovanili fin dall'inizio dell'anno giubilare.	Comune di Roma																																												
E	06	01/2	Sostegno del Centro Giovani per la gestione delle attività a favore delle imprese giovanili nel corso dell'anno giubilare.	Comune di Roma																																												

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998		
					Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Temp. ist. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
E 07	01	01	Attività del Corpo della Polizia Municipale per assicurare l'apertura ed il funzionamento dei cantieri giubilari	Comune di Roma																										
F 01	01	01	Centri informati - Realizzazione di centri di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo										10.000.000.000	Preventivazione in corso															
				Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la					10.000.000.000	10.000.000.000			gen-99																	
				Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la				mar-97																						
F 01	01	01/1	Centro informativo del Museo del Risorgimento - realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo															Preventivazione in corso - Interazione 1.675.712.000	7.175.712.000	5.675.712.000	feb-99									
F 01	01	01/2	Centro informativo di Via della Conciliazione - realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo															Preventivazione in corso - Interazione 1.275.712.000	7.175.712.000	5.675.712.000	feb-99									
F 01	02		Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo															Preventivazione in corso - Interazione 2.500.000.000	6.500.000.000	4.000.000.000	dic-98			Riduzione assegnazioni AII "A" per 1.338.237.450	5.161.762.550	2.700.000.000	n.d.		
			Sala stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la																										
F 01	03		Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di preparazione dell'informazione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo																										

Nuovi Interventi All C

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996					2° decreto del 18/04/1997					3° decreto del 24/06/1997					4° decreto del 22/12/1997					5° decreto del 08/05/1998					6° decreto del 15/05/1998					7° decreto - 16 luglio 1998					8° decreto - dicembre 1998				
			Costo Sumaio	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
		Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la preparazione						1.000.000.000	1.000.000.000			gia-99																											
												gia-98																											
04	Sistema di informazione al pubblico - nodo di Roma	FS S.p.A.																																							
1	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8 del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996 (art. 1 comma 12)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	40.000.000.000					32.000.000.000	32.000.000.000				32.000.000.000	32.000.000.000																											
	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 651																																							
2	Osservatorio sul Piano del Giubileo	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi	6.000.000.000					6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000	
	Gestione operativa attività concernenti il Giubileo dell'anno 2000 anche in relazione al carattere internazionale dell'evento	Dipartimento per le Aree Urbane	5.400.000.000	5.400.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000	
01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000	
		Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la				ago-97	ten-98				ago-97	ten-98				ago-97	ten-98				ago-97	ten-98				ago-97	ten-98				ago-97	ten-98				ago-97	ten-98			
05	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo																																							

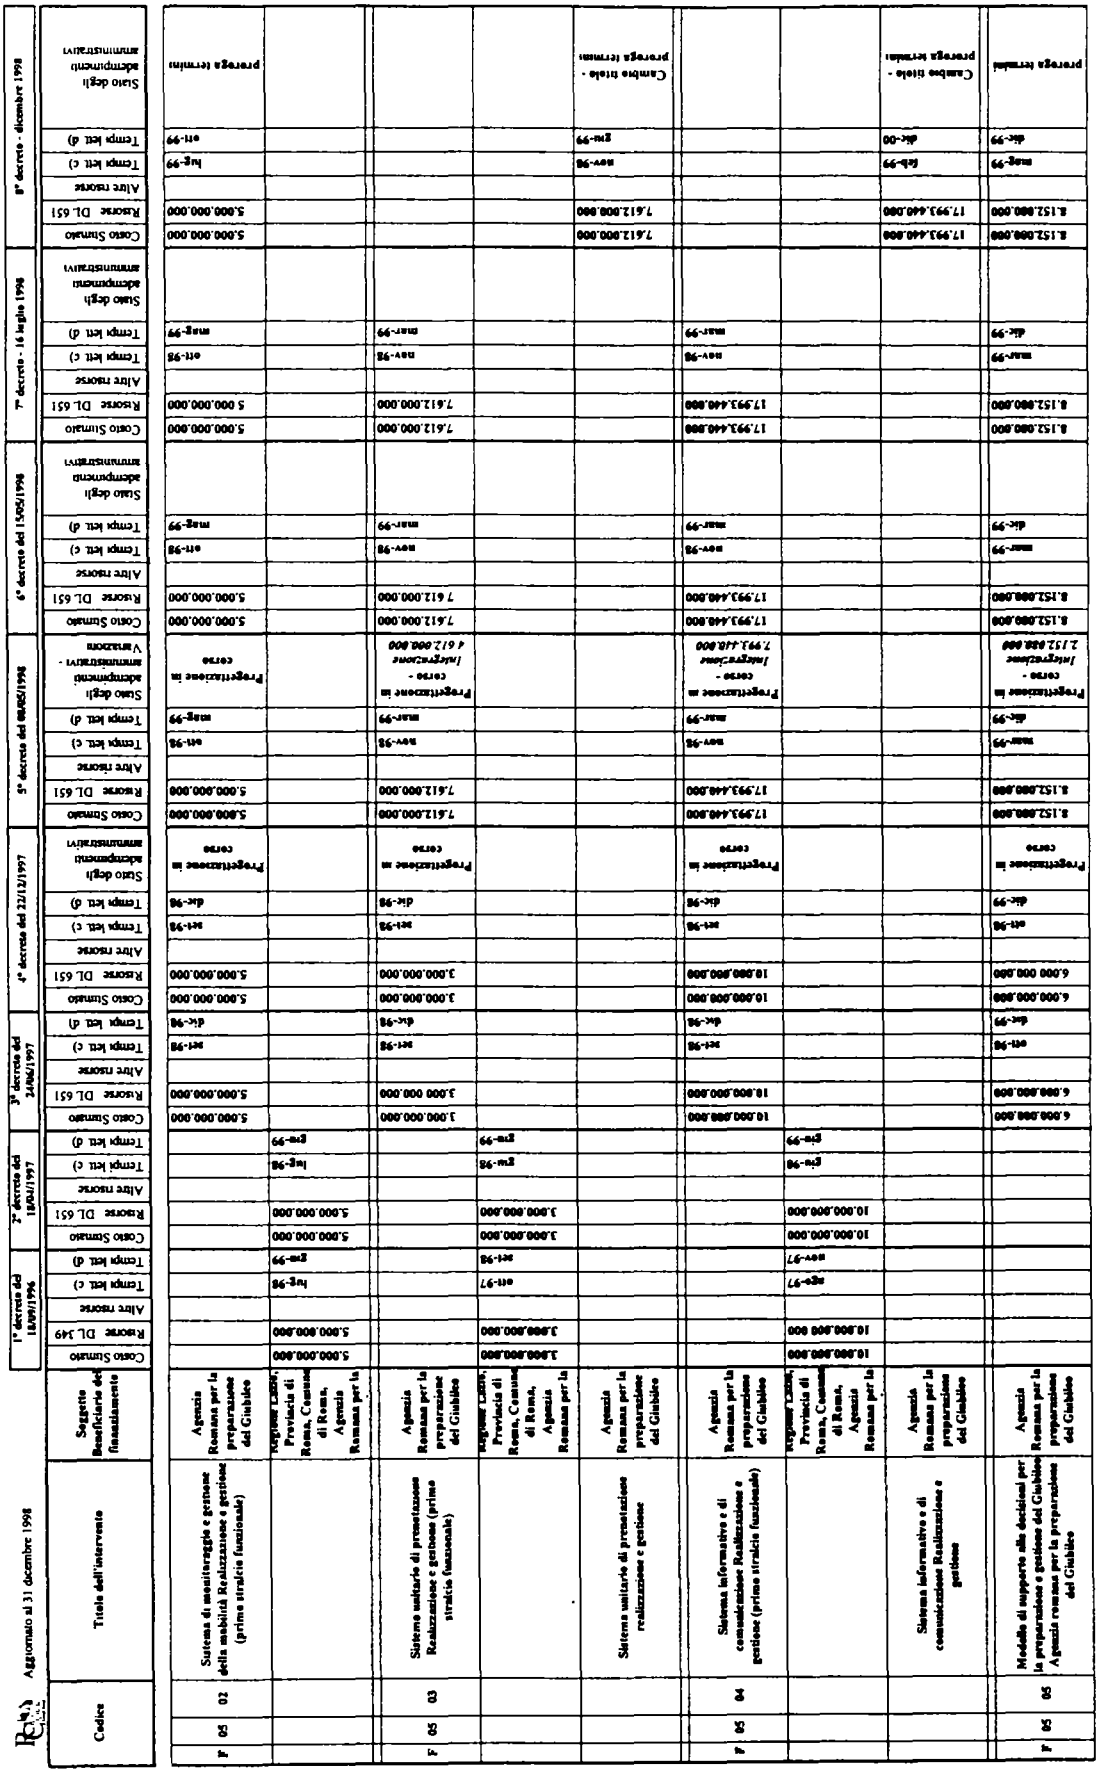

Aggiornato al 31 dicembre 1998

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 21/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998			
			Costo Sumaio	Risorse DL 349	Altre risorse	Temp. ist. c)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)	Costo Sumaio	Risorse DL 651	Altre risorse	Temp. ist. c)
		Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la		6.000.000.000				6.000.000.000																										
	Funzionamento delle strutture del Commissario straordinario di Governo	Presidenza Consiglio Ministri - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi																		3.500.000.000				3.500.000.000				3.500.000.000				Riduzione autorizz. "A" per 200.000.000			
	Mantenimento degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale																		6.000.000.000				6.000.000.000				6.000.000.000							
	TOTALI		3.775.908.300.000	3.500.000.000.000	163.798.300.000		3.883.933.400.000	3.497.742.000.000	184.681.400.000		3.700.843.191.123	3.498.185.861.123	198.657.330.000		3.688.243.191.123	3.497.185.861.123	187.057.330.000		3.660.894.737.433	3.499.254.358.540	177.694.094.893		3.660.944.737.433	3.499.104.358.540	177.694.094.893		3.665.756.700.630	3.499.506.321.738	182.503.094.893		3.652.416.053.563	3.463.450.748.671	181.007.994.893	

2. Situazione finanziaria in relazione al singolo intervento

PAGINA BIANCA

UFFICIO ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Progetto Preliminare del Responsabile	Termini indicativi conclusione fase	Termini completa conclusione opera	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: L.Bas.Tremonti 13% (Comm. ridotta)	PROGETTAZIONE: Privati 6% (Comm. ridotta)	PROGETTAZIONE: Ulteriori finanziamenti all 10% (Comm. ridotta)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% o 30% (progetto di opera ...)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% o 30% (progetto di opera non di maggiore rilievo economico)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: 20% (progetto di opera)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: Non sulla rimanenza dell'80% o 90% dell'importo di opera	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO: 10% all'ultimazione dei medesimi in relazione provvisoria	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Direzione di riferimento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandato diretto): "lavorabile" nel settore dell'intervento	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandato diretto): Vincolo/obbligo Ministero economia	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI SOGGETTI: per "lavorabile" nel settore dell'intervento	IMPEGNI	PAGAMENTI	altro fondi
A	**SETTORE A - SOCIALE E ACCOGLIENZA**																							
A 1	**Creazione di strutture per l'assistenza e l'accoglienza alle categorie disagiate**																							
A 01 01	Lavori diretti per interventi volti alla tutela dell'ambiente (Verde) Allestimento aree verdi Parco a Tema Spontaneo	Comune di Roma			ORGANIZZATO																			
A 01 02	Centro di accoglienza per giovani (Verde) Ristrutturazione di Villa delle Rose Organizzazione Parco	URL Real A.	luglio 98	mese 99		212 000 000	10 600 000		10 600 000													10 600 000	10 600 000	
A 01 03	Centro diurno e residenziale a gestione privata (Verde) Ristrutturazione di Villa delle Camelie di Pace	URL Real A.	luglio 98	mese 99		212 000 000	10 600 000		10 600 000													10 600 000	10 600 000	
A 01 04	Centro di accoglienza per anziani	IPAB "Margherita" Roma	agosto 98	nov. 99		7 000 000 000	350 000 000		350 000 000													350 000 000	350 000 000	
A 01 05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e ad alta tecnologia (Verde)	IPAB "Margherita" Roma	agosto 98	giug. 99		1 900 000 000																		
A 01 06	Ostello alloggio per studenti (Verde) Ristrutturazione di Villa Lucidi	Comune di Roma	dic. 98	nov. 99		1 500 000 000	50 000 000	10 000 000	40 000 000													50 000 000	50 000 000	
A 01 07	Centro di accoglienza temporanea per Giovani coppie con figli (Verde) Costruzione di tre complessi edilizi e parcheggi sotterranei	Comune di Roma	mag. 98	mag. 99		4 355 744 364					3 629 820 636	1 814 914 320										3 629 820 636	1 814 914 320	
A 01 08	Centro residenziale per il turismo sociale (Verde) Ristrutturazione di un edificio e progetto esecutivo	Comune di Roma				50 000 000	50 000 000	10 000 000	40 000 000													50 000 000	50 000 000	

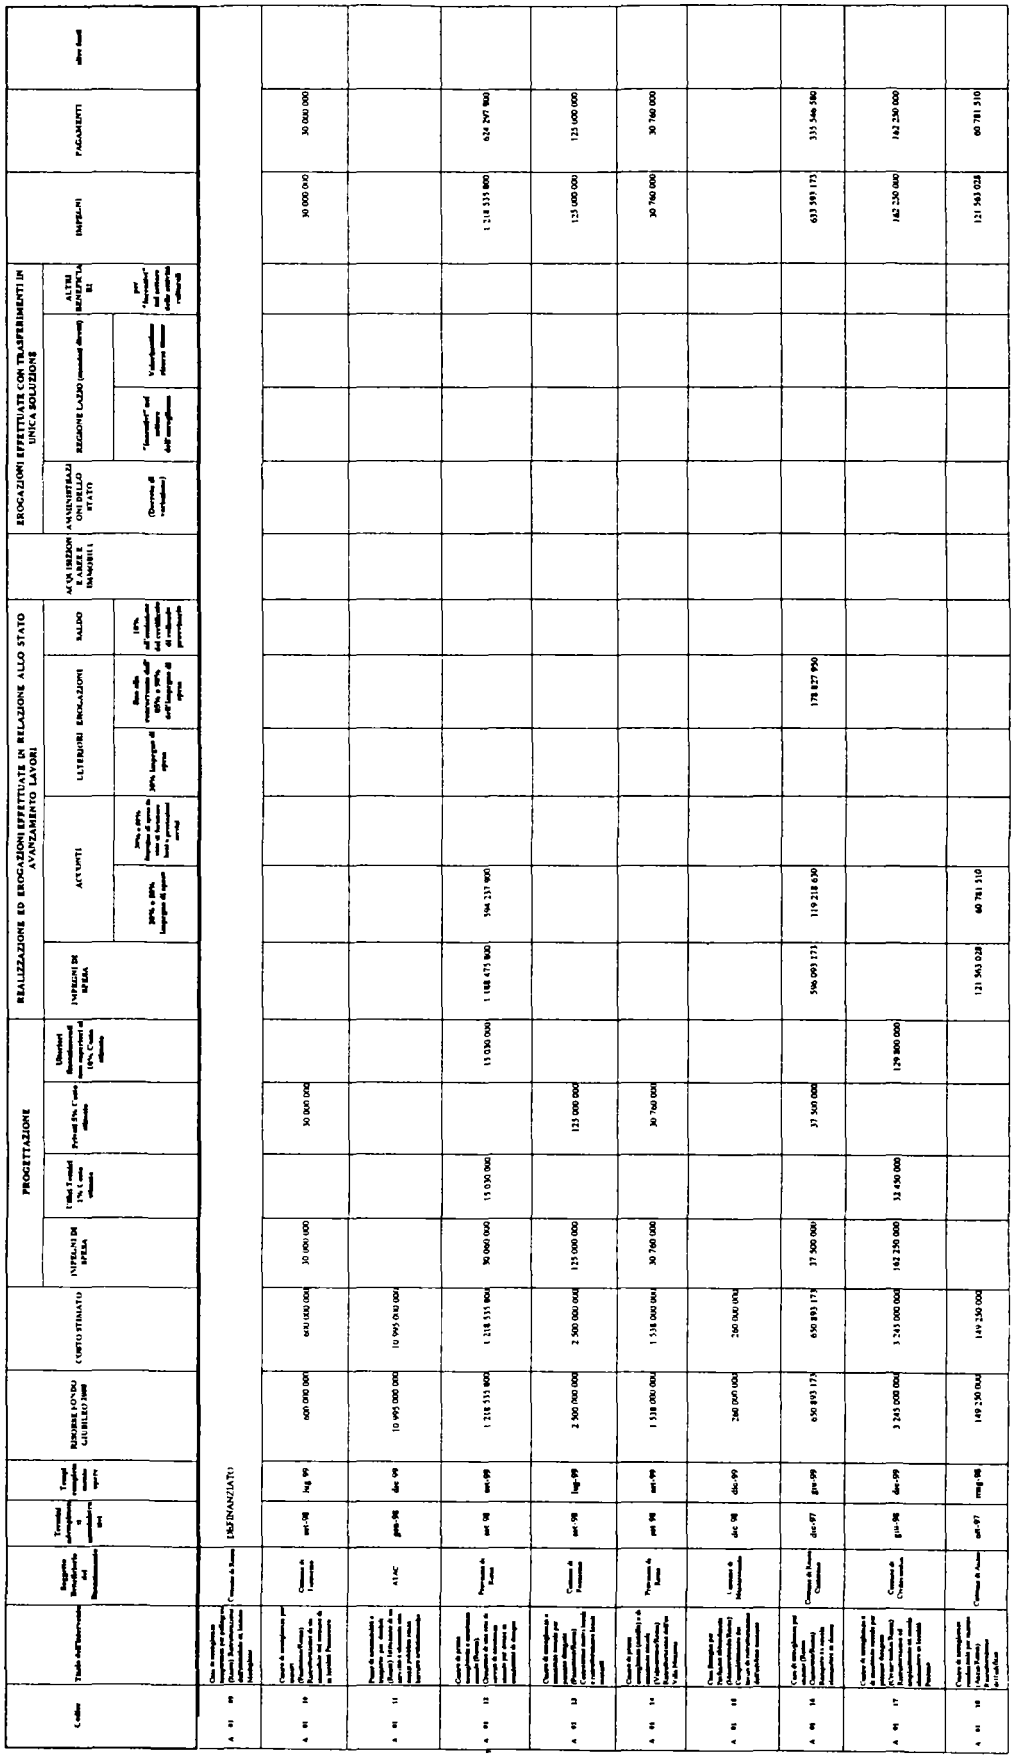

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Termine ultimazione lavori	Termine completamento opere	ESIGENZE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI IN SPESA	PROGETTAZIONE: Ulteriori fabbisogni finanziari	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCORDI	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI BENEFICIARI	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
A 95	Centro di rianimazione e Chirurgia Cardiaca di una grande metropoli	Provincia di Roma	ago-98	lug-99	1 165 065 800	1 165 065 800	28 320 000	14 160 000	1 136 745 800	568 372 800							1 165 065 800	596 692 800	
A 96	Asse di scorrimento Tiburtina/Valeria/Prenestina/Casilina/Anagnina della Metropolitana	Comune di Roma	DEFINANZIATO																
A 97	Completamento metropolitana A linea prima tratta Battistini-Cornelia, Cornelia-Valle Aurelia, Valle Aurelia-Ottaviano	Comune di Roma	feb-99	nov-99	5 500 000 000	5 500 000 000	275 000 000	55 000 000									275 000 000	275 000 000	
A 98	Ripristino tramvia per Cinecittà	ATAC	dic-98	dic-99	5 000 000 000	5 000 000 000													
A 99	Progetto direzione Pineta	Comune di Roma	DEFINANZIATO																
A 100	Adeguamento di tratti di via Cassia nel tratto extraurbano	Comune di Roma	mag-99	dic-99	1 000 000 000	1 000 000 000													
A 101	Completamento percorso a monte ciclabile	Uff. Tec. Speciale Parchi Urbani I	feb-99	dic-99	2 000 000 000	2 000 000 000													
A 102	Completamento dell'Asse Viario Cortina d'Ampezzo-Via Flaminia e della via di Vigna Stelluti	Comune di Roma	lug-98	mag-99	1 288 700 400	1 288 700 400			1 288 700 400	644 350 200							1 288 700 400	644 350 200	
A 103	Completamento della Tangenziale Est	Concessione Autostrada Tangenziale Est Roma	dic-98	set-99	3 438 800 000	3 438 800 000	171 900 000		171 900 000								171 900 000	171 900 000	
A 104	Progetto di completamento e riqualificazione del tratto urbano della Via Aurelia Antica	Ordine del Sacro Ospedale di S. Spirito	DEFINANZIATO																
A 105	Progetto di completamento e riqualificazione con la via Aurelia Antica	Ordine del Sacro Ospedale di S. Spirito	set-98	set-99	2 349 442 000	2 349 442 000													

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi di realizzazione dell'opera: inizio	Tempi di realizzazione dell'opera: completamento	PROGETTAZIONE: RISORSE DI CUI AL D.M. 615/1995 ED ANNI	COSTO STIMATO	IMPEGNI DI SPESA	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% (costo stimato)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI: 20% o 30% (superiore all'importo di spesa)	ACCONTI: 20% o 30% (superiore all'importo di spesa)	ULTERIORI EROGAZIONI: 20% (superiore all'importo di spesa)	ULTERIORI EROGAZIONI: fino alla concorrenza dell'80% o 90% dell'importo di spesa	SALDO: 10% del costo dell'intervento al netto delle precedenti	ACQUISIZIONI E AREE E DANNI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Impegni" nel sistema dell'anagrafica	REGIONE LAZIO (mandati diretti): Trasferimento risorse vincolate	ALTRI BENEFICIARI: per "impegni" nel sistema delle anagrafiche individuali	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
A 01	3045	Opera di Bonifica n. 1 Roma	set-98	set-99		1 922 090 625	1 922 090 625		1 922 090 625	961 045 300												961 045 300		
A 01	37	Cassa compilazione progetti per collegamento Roma Ostia (primo stralcio)	set-98	dic-99		10 000 000 000																		
A 01	38	Area portuale Ostia	dic-98	set-99		3 000 000 000																		
A 01	39	Opere difensive per la difesa della spiaggia in Roma e per la salvaguardia degli insediamenti	dic-98	dic-99		6 909 000 000																		
A 4		Restauro del complesso del Buon Pastore																						
A 04	4045	Complesso Buon Pastore Ristrutturazione delle Chiese	ago-99	nov-99		2 300 000 000																		
A 04	4045	Complesso Buon Pastore Restauro e recupero del corpo principale	ago-98	dic-99		9 800 000 000	446 172 727															446 172 727		
A 5		Demolizione e ricostruzione Ospedale S. Maria della Pietà e dell'Istituto V. Emanuele di Ostia come centri di accoglienza per pellegrini																						
A 05	4045	Ente Ospedale della Pietà Demolizione e ricostruzione e riconversione ospedaliera (Demolizioni parziali)	mar-98	nov-99		2 000 000 000	100 000 000		1 465 930 939													1 565 930 939	100 000 000	
A 05	4045	Ente Ospedale della Pietà Demolizione e riconversione ospedaliera (Demolizioni parziali)	gen-99	lug-99		1 000 000 000	50 000 000															50 000 000	50 000 000	
A 05	4045	Ente Ospedale della Pietà Demolizione e riconversione ospedaliera (Demolizioni parziali)	mar-98	dic-99		5 086 000 000	210 000 000		3 035 282 875													3 245 282 875	210 000 000	
A 05	4045	Ente Ospedale della Pietà Demolizione e riconversione ospedaliera (Demolizioni parziali)	mar-98	dic-99		6 988 000 000	297 000 000		5 184 646 089													5 481 646 089	297 000 000	
A 05	4045	Ente Ospedale della Pietà Demolizione e riconversione ospedaliera (Demolizioni parziali)	mar-98	dic-99		9 927 000 000	410 000 000		7 837 419 390													8 247 419 390	410 000 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Progetto finanziato dal finanziamento	Termine lavori previsto dal contratto	Termine ultimazione lavori	Fonti copertura costo opera	EUROME FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI IN SPESA	PROGETTAZIONE: Utilità Tecnici Ufficio Comune	PROGETTAZIONE: Privati 0% Costo ufficio	PROGETTAZIONE: Ulteriori Rimborsi non superiori al 10% Costo ufficio	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI IN SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% + 20% (seguito di opera)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% + 20% (seguito di opera con un importo non superiore al 50% del costo)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: 20% (seguito di opera)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: fino alla concorrenza dell'80% e 95% dell'importo di opera	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO: 10% di ribassi d'asta	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Accantonati" sul conto corrente della Tesoreria	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandati diretti): Versamento diretto tesoro	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRE REGIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
A 96 98	Opere di completamento del palazzetto e di parte dell'adiacente area verde di Piazza Asmara nonché "Opere connesse alla 2ª Olimpiade Estiva"	Comune di Roma	lug-98	dic-99			6 879 166 414	6 879 166 414															6 879 166 414		
A 6	Interventi per l'acquisizione dei pellegrini in condizioni disagiate: interventi pubblici di ristrutturazione e locazioni privati ("private social")																								
A 96 98	Interventi di riqualificazione urbanistica e di edilizia residenziale pubblica nell'area compresa tra piazza Pia e piazza Risorgimento	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma	gen-98	mar-99			10 000 000 000	10 000 000 000												9 543 230 000				9 543 230 000	
A 96 98	Interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia residenziale pubblica nell'area compresa tra piazza Risorgimento, piazza Cavour, via Cola di Rienzo e via Tunisi	Regione Lazio	lug-98	set-99			20 000 000 000	20 000 000 000																	
A 7	Completamento della rete degli assetti e compensi nella città metropolitana e nella regione al fine di promuovere l'offerta di strutture ricettive a basso costo (interventi finanziari nella misura del 75% del costo di realizzazione)																								
A 97 98	Centro di completamento dell'edificio e sistemazione esterna della via centrale e piazza G. Cesare	Provincia di Roma	gen-97	mar-99		5 331 486 400	6 975 315 293	337 500 000	67 500 000		270 000 000	4 893 986 400	978 797 280		1 448 195 920					5 231 984 600	2 794 695 300		1 743 828 893
A 97 98	Completamento e sistemazione dell'area "Ex Cinodromo"	Provincia di Roma				16 900 000		16 900 000	3 380 000		13 520 000									16 900 000	16 900 000		-16 900 000
A 97 98	Completamento dell'area di proprietà Via Cristoforo Colombo angolo Viale Marco Polo	Provincia di Roma	gen-99	mar-99		676 000 000	1 110 000 000	16 900 000	3 380 000		13 520 000									16 900 000	16 900 000		434 000 000
A 97 98	Centro della Gioventù (Villa Lazzaroni)	Comune di Roma	mar-98	mar-99		2 538 201 390	3 538 201 390	150 000 000		150 000 000		2 388 201 390	358 233 190	835 847 480						2 538 201 390	1 344 100 670		1 000 000 000
A 97 98	Centro di Documentazione e Archivio Comunale	Comune di Roma, Azienda Comunale Energia e Ambiente	dic-97	feb-99		375 000 000	550 000 000	34 313 330		18 750 000	17 563 330	235 796 330								272 109 750	34 313 330		175 000 000
A 97 98	Centro della Gioventù (Villa Ada)	Comune di Roma	dic-97	mar-99		3 283 849 215	4 032 849 215	306 815 100		306 815 100		2 976 034 115	1 488 017 060							3 282 849 215	1 794 832 140		1 350 000 000
A 97 98	Centro di completamento dell'edificio e sistemazione esterna	Comune di Roma	mar-98	mar-99		1 350 000 000	2 440 000 000	91 500 000		91 500 000										91 500 000	91 500 000		610 000 000

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Trimestre aggiudicazione gara	Trimestre ultimazione lavori	COSTO STIMATO	IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Ulteriori finanziamenti ad altre voci	PROGETTAZIONE: Pro-rata IVA Conto chiuso	PROGETTAZIONE: Utilizzi Fondi Voci non chiuse	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI: 20% - 80% impegno di spesa	ACCONTI: 20% - 30% impegno di spesa non ancora pervenuto	LII TRANCHE EROGAZIONI: 20% impegno di spesa	LII TRANCHE EROGAZIONI: Rata da maturarsi dall'80% o 100% dell'impegno di spesa	SALDO: 10% all'ultimazione del certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI (VINCOLI)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (pendenti decreti): "Immediata" nel settore delle ferrovie	REGIONE LAZIO (pendenti decreti): Valorizzazione risorse umane	ALTRI EX ART. 1 LETT. B): per "Immediata" nel settore delle aree in ritardo	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
A 97 97b	Opere di completamento della Darsena Petroli (Ravenna) - Completamento di un molo di ottava	Comune di Ravenna	mar-98	nov-98	560 000 000	21 000 000		21 000 000													21 000 000	21 000 000	140 000 000
A 97 98	Opere di completamento e messa in sicurezza del porto (Valle d'Aosta) - Prolungamento della banchina commerciale e opere connesse (Pont-Saint-Martin)	Comune di Verrès	DEFINANZIATO																					
A 97 99	Completamento della banchina di sopraflutto	Consorzio di Primo Grado per il Porto di Trapani	nov-97	nov-98	889 921 540	45 000 000		45 000 000		344 921 540	272 460 770							317 460 770			589 921 540	317 460 770	300 000 000
A 97 100	Completamento e rete di banchine per navi Ro-Ro e Ro-Pax	Comune di Civitavecchia	set-98	nov-99	350 000 000												150 000 000				150 000 000	150 000 000	200 000 000
A 97 101	Opere di completamento, messa in sicurezza e nuove opere foranee	Comune di Trieste	dic-98	gen-99	1 750 000 000	52 500 000		52 500 000													52 500 000	52 500 000	700 000 000
A 97 102	Diga foranea Duca d'Aosta - Completamento della diga foranea esterna del porto di Bari	Comune di Bari	dic-98	dic-99	500 000 000	500 000 000																	125 000 000
A 97 103	Completamento Diga Foranea	Comune di Crotone	gen-98	gen-99	302 623 500	219 172 500				219 172 500	43 834 500		65 751 750								219 172 500	109 586 250	83 450 000
A 97 104	Opere di completamento Darsena Commerciale e banchina di Ponente Civitavecchia	Comune di Civitavecchia	ott-98	mar-99	874 500 000																		218 500 000
A 97 105	Opere di completamento, banchina Ponente e banchina Levante	Comune di Ancona	apr-98	gen-99	964 700 000																		350 000 000
A 97 106	Diga foranea di sopraflutto, banchina di Ponente e banchina Levante	Comune di Napoli	gen-98	gen-99	942 706 000																		342 706 000
A 97 107	Diga foranea di sopraflutto, banchina di Ponente e banchina Levante	Comune di Palermo	dic-98	nov-99	400 000 000																		100 000 000
A 97 108	Completamento della banchina di Ponente e banchina di Levante	Provincia di Trapani	mag-99	nov-99	1 065 901 523					1 065 901 523	532 950 760										1 065 901 523	532 950 760	411 000 000
A 97 109	Completamento della banchina di Ponente e banchina di Levante	Comune di Venezia	dic-97	feb-99	741 502 620	37 500 000		37 500 000		704 002 620	140 800 520										741 502 620	178 300 520	250 000 000

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Aggiudicatore ed Beneficiario	Termine ultimazione lavori	Tempi completamento opera	IMPORTO GENERALE PROGETTO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI ED EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE								
						COSTO STIMATO	IMPEGNI DI SPESA	Limiti 5 anni (1% C.Unico stimato)	Privati (5% C.Unico stimato)	Ulteriori (Ammontare non superiore al 10% C.Unico stimato)	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONI E AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	REGIONE LAZIO		ALTRI BENEFICIARI	PAGAMENTI	altre fonti
												80% o 100% (secondo gli importi di opera	20% o 50% (secondo gli importi di opera e non le limiti di finanziamento stesso)	20% (secondo gli importi di opera)	Altre alle concessioni dell'80% o 50% dell'importo di opera	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		(Decreto di variazione)	"Secondo" nel settore dell'immigrazione	Vi determinazione diverse concessi	"Secondo" nel settore dell'immigrazione		
A 97 31	Quinto stralcio Direzione Trasporti Viabilità Adeguamento e ristrutturazione rete stradale	Anas Direzione Compartimentale Lazio	dic. 97	giu-99	500 000 000	16 900 000	16 900 000		16 800 000		317 626 977	158 813 490									334 538 977	175 713 490	162 000 000
A 97 32	Adeguamento in sede Direzione di Asse Roma-Fiumicino	Autostrade Direzione di Asse Roma-Fiumicino	giu 97	set-99	1 167 077 495	90 000 000	90 000 000		90 000 000		784 077 495	156 815 500									834 077 495	306 815 500	333 000 000
A 97 33	Opere di completamento Ristrutturazione e Viabilità	Comune di Civitavecchia	giu-98	giu-99	2 200 000 000	82 500 000	16 500 000		66 000 000								1 309 000 000				1 191 500 000	1 391 500 000	550 000 000
A 97 34	Cui di completamento Ristrutturazione Asse di Porta Ostiense (Ferrovie)	Comune di Roma	set-98	lug 99	800 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000												30 000 000	50 000 000	350 000 000
A 97 35	Opere di completamento Asse Ostiense Ristrutturazione via Ostiense e Piazzale Ostiense	Comune di Roma	set-98	nov-99	6 000 000 000																		1 500 000 000
A 97 36	Cui di completamento Asse Ostiense (Progetto Metropolitano) Ristrutturazione via Ostiense e piazzale Ostiense Nuova Darsena	Comune di Roma	mag 98	mag 99	729 000 000	34 450 000	34 450 000		34 450 000		577 657 402										614 107 402	34 450 000	241 000 000
A 97 37	Quinto stralcio Direzione Trasporti Viabilità ed Adeguamento sud Lazio	Comune di Roma	lug 98	set-99	1 200 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000												40 000 000	60 000 000	400 000 000
A 97 38	Opere di completamento Asse Ostiense (Progetto Metropolitano) Ristrutturazione via Ostiense e Piazzale Ostiense	Comune di Roma	lug 98	nov-99	2 021 000 000	101 759 741	101 759 741		50 000 000	38 759 741	1 090 000 000						1 090 000 000				2 288 759 741	1 198 759 741	675 000 000
A 97 39	Asse tangenziale (Prima Ristrutturazione Viabilità urbana e interventi sulla rete)	Comune di Roma	mag 98	mar-99	375 000 000	18 750 000	18 750 000		18 750 000												18 750 000	18 750 000	125 000 000
A 97 40	Asse tangenziale Ristrutturazione Viabilità urbana e interventi sulla rete (prolungamento e via Prenestina)	Comune di Roma	giu 98	giu 99	375 000 000	18 750 000	18 750 000		18 750 000												18 750 000	18 750 000	125 000 000
A 97 41	Quinto stralcio (Progetto Metropolitano)	Comune di Roma	ago 98	mar-99	210 000 000	10 500 000	10 500 000		10 500 000												10 500 000	10 500 000	70 000 000
A 97 42	Quinto stralcio (Progetto Metropolitano)	Comune di Roma	giu-97	giu-99	298 250 000						204 250 000			165 000 000							204 250 000	165 000 000	93 000 000
A 97 43	Opere di completamento Tratta di Castel Lama Ristrutturazione Stazione Tiburtina	Comune di Roma	giu 97	lug 99	340 238 500						230 238 500	115 238 500									230 238 500	115 238 500	150 000 000

Codice	Titolo dell'intervento	Regione, Provincia, Comune, Ente beneficiario del finanziamento	Tempi di completamento dell'intervento	Tempi di completamento opere	RISORSE FONDO CIPE/DELIBERA 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Utilizzi 1% C.vo rilascio	PROGETTAZIONE: Perizie 8% C.vo rilascio	PROGETTAZIONE: Ulteriori Ribassi non superiori al 10% C.vo rilascio	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% e 20% impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% e 20% impegno di spesa (2)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: 20% impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: Non sulla maggiorazione dell'80% e 90% dell'importo di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO: 10% dell'ammontare del contributo dell'ultima annualità	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Trasferimenti" sul conto della contabilità speciale	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandati diretti): Trasferimenti diretti vincolati	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI BENEFICIARI: per "trasferimenti" sulla contabilità speciale	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
A 47 34	Centro Direzionale Polifunzionale ad Ostia Antica	Comune di Roma	mar-99	gen-98	90 000 000	120 000 000																	30 000 000
A 47 36	Civile Abitazione Ostiense Trullo Parco Tiburtino	Comune di Roma	mar-99	apr-98	375 000 000	500 000 000	25 000 000		25 000 000											25 000 000	25 000 000		125 000 000
A 47 38	Civile Abitazione Ostiense (Ambito 6 Tor Marancia)	Comune di Roma	mag 99	lug-98	150 000 000	200 000 000																	50 000 000
A 47 41	Civile Abitazione Ostiense (Ambito 7 Tor Marancia)	Comune di Roma	lug-99	set-97	942 016 873	1 342 010 873	60 000 000		60 000 000		618 016 873	309 008 440				264 000 000				942 016 873	633 008 440		400 000 000
A 47 39	Civile Abitazione Ostiense (Ambito 11 Tor Marancia)	Comune di Roma	set-99	ago-98	2 000 000 000	2 667 000 000																	667 000 000
A 47 45	Centro di completamento Direzionale Polifunzionale di Pietralata, Via Tiburtina, Via Nomentana	Roma Partecipazioni Pietralata S.p.A.	mar-99	gen-98	961 703 000	1 395 703 000					961 703 000	480 851 500								961 703 000	480 851 500		434 000 000
A 47 43	Centro di completamento Direzionale Casilino	Comune di Roma	dic-99	set-98	800 000 000	1 067 000 000																	267 000 000
A 47 42	Centro di completamento Direzionale Magliana Nuova	Comune di Roma	mar-99	ago-98	1 500 000 000	2 000 000 000	75 000 000		75 000 000											75 000 000	75 000 000		500 000 000
A 47 40	Centro di completamento Direzionale Ostiense Via Ostiense/Via Cristoforo Colombo	Comune di Roma	mar-99	gen-98	236 218 865	336 218 865					236 418 865	118 209 430								236 418 865	118 209 430		100 000 000
A 47 44	Centro di completamento Direzionale Tiburtino	Provincia di Roma	set-99	dic-97	926 160 740	1 301 160 740	56 250 000		56 250 000		828 274 740	165 254 950	247 882 420							882 524 740	469 387 370		375 000 000
A 47 48	Civile Abitazione Via Donna Olimpia (Ambito 15)	Comune di Roma (Dipartimento VII)	mar-99	lug-97	799 380 500	1 084 160 500	60 000 000		60 000 000		730 574 630	146 114 930	219 172 390			40 000 000			255 701 120	810 574 630	705 988 440		284 780 000
A 47 34	Civile Abitazione, Servizi, Direzionale, Commerciale e Attrezzature pubbliche a Tor Vergata	Comune di Roma	dic-99	dic-97	2 000 000 000	2 667 000 000	100 000 000		100 000 000											100 000 000	100 000 000		667 000 000
A 8	Incrementi per la riqualificazione delle strutture di accoglienza alberghiera ed extralberghiera																						
A 48 34	Interventi per la riqualificazione e ristrutturazione di strutture alberghiere ed extralberghiere	Regione Lazio	lug-98	gen-99	99 653 000 000	99 653 000 000					99 653 000 000							99 653 000 000		99 653 000 000	99 653 000 000		
A 9	Allestimento di un centro di accoglienza per pellegrini nella Corsia Sistina dell'Ospedale Santo Spirito																						

Codice	Titolo dell'intervento	Progetto Interdisciplinare del Rinnovamento	Tipologia di intervento	Tempi completamento opera	RISORSE FONDO CIS DELIBERA 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Utilizzi Tremonti 1% Conto chiuso	PROGETTAZIONE: Privati 8% Conto chiuso	PROGETTAZIONE: Utilizzi Tremonti non superiori al 10% Conto chiuso	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% e 50% impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% + 20% impegno di spesa in fase di definizione accolta	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: 20% impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: fino alla concorrenza dell'80% e 20% dell'impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO: 10% all'ultimazione dei lavori, collaudo, provvisorio	ACQUISIZIONI E AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (modalità diverse): "Secondo" rel. relativo dell'intervento	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (modalità diverse): Valorizzazione diverse somme	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI BENEFICIARI: per "Secondo" rel. relativo dell'intervento	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
A 01 01	Corso Vittorio Capitale e Piazza Venezia: riqualificazione e arredo urbano della Basilica di San Pietro, Piazza Venezia e Corso Vittorio	MIC BAS B			650 000 000	650 000 000																	
A 10 11	Pavimentazione storica dell'Anfiteatro e dei suoi accessi	Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio		dic-98	1 379 000 000	1 379 000 000																	
A 10 10	Consolidamento dei fronti della Valle del Tevere e della sponda del Palatino	Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio		dic-99	234 000 000	234 000 000																	
A 20 10	Risanamento funzionale ed ambientale dell'insediamento del Circo Massimo	Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio		dic-98	917 000 000	917 000 000																	
				dic-99																			
					300 498 611 737	232 466 979 630	4 775 956 790	673 372 727	3 379 625 188	823 332 971	153 545 796 319	10 220 331 500	1 302 922 290	1 533 947 670	599 529 970		2 853 000 000		100 196 250 000		161 174 749 117		
B	SETTORE B - BENI CULTURALI																						
B 1	Area del Grande Complesso, Palazzo Senatorio e Musei Capitolini																						
B 01 01	Area del Grande Complesso, Palazzo Senatorio e Musei Capitolini	Camera di Stato			425 000 000		425 000 000		425 000 000												425 000 000	425 000 000	-425 000 000
B 01 02	Area del Grande Complesso, Palazzo Senatorio e Musei Capitolini: completamento e valorizzazione dell'ambiente archeologico Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo	Camera di Stato		giu-98	7 500 000 000	7 500 000 000					7 500 000 000										7 500 000 000		
B 2	Area dei Fori Imperiali, nuovi scavi, restauri e allestimenti museali																						
B 02 03/5	Area archeologica dei Fori Imperiali, Palatino e Velia (Parte Centrale)	Camera di Stato		set-98	5 000 000 000	5 000 000 000	261 079 200		261 079 200												261 079 200	261 079 200	
B 02 06/8	Area archeologica dei Fori Imperiali, Palatino e Velia (Parte Orientale)	Camera di Stato		set-98	990 000 000	990 000 000																	
B 02 09/10	Area archeologica dei Fori Imperiali, Esquilino, Viminale, Celio	Camera di Stato		mar-98	2 322 277 175	2 322 277 175	173 318 400		173 318 400												173 318 400	173 318 400	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile del Procedimento	Tempi di realizzazione		COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	Altre fonti
			Trimestre di inizio lavori	Trimestre di ultimazione lavori		IMPEGNI IN SPESA	Ulteriori Completamenti Cassa	Ulteriori Completamenti di cui al DPR. C. Cassa ottenuta	IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI		ULTERIORE EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO	REGIONE LAZIO		ALTRI SOGGETTI		
										20% o 30% Impegno di spesa	20% o 30% Impegno di spesa con il progresso reale	30% Impegno di spesa	Rata alla conclusione dell'80% o 90% dell'impegno di spesa	10% dell'ammontare di ciascun provvedimento		(Decreto di trasferimento)	"Impianti" nel settore dell'energia	Volontariato Fondo sociale	"Impianti" nel settore delle attività produttive	
9 42 42	Area archeologica del Foro Augusteo sotto via dei Fori Imperiali, Foro di Cesare, Argiletto, Foro e Curia	Comune di Roma	ott-98	nov-99	2 168 123 545				2 168 123 545											
9 42 42/1	Area archeologica del Foro Imperiale Foro di Augusto, Foro di Nerva, Foro di Cesare	Comune di Roma	mag-98	nov-99	3 278 708 000				2 804 317 789	1 402 158 890						2 804 317 789		1 402 158 890		
9 42 42/2	Area archeologica del Foro Imperiale sotto Torre delle Milizie	Comune di Roma	mag-98	nov-99	4 283 954 000				3 617 168 031	1 808 584 010						3 617 168 031		1 808 584 010		
9 42 42/3	Area archeologica del Foro Imperiale sotto via del Foro di Traiano	Comune di Roma	mag-98	nov-99	5 844 358 000				5 096 479 223	2 548 239 610						5 096 479 223		2 548 239 610		
9 42 42/4	Area del Foro Imperiale (complesso Foro di Traiano)	Comune di Roma	lug-98	nov-99	1 312 658 068															
9 42 42/5	Area del Foro Imperiale (Basilica Ulpia e Foro di Traiano)	Comune di Roma	lug-98	nov-99	1 360 489 963															
9 42 42/6	Area del Foro Imperiale (Basilica Aemilia e Foro di Augusto)	Comune di Roma	lug-98	nov-99	1 969 554 263															
9 3	**Restauro e manutenzione del percorso delle Mura storiche**																			
9 42 41	Mura di Roma: Restauro Porta S. Sebastiano, Arco di Travertino e tratto a Porta S. Giovanni	Comune di Roma	set-98	nov-99	1 600 000 000															
9 42 43/1	Mura di Roma: Restauro Porta S. Sebastiano, Arco di Travertino e tratto a Porta S. Giovanni	Comune di Roma	ago-98	set-99	1 814 554 434															
9 42 43/2	Mura di Roma: Restauro e consolidamento e restauro delle cortine tra Porta Pia e Porta Salaria	Comune di Roma	set-98	set-99	1 689 120 966															
9 42 44	Mura di Roma: Restauro di Porta Ostiense e restauro archeologico Ostiense	Comune di Roma	dic-98	nov-99	3 000 000 000															
9 42 45	Mura di Roma: Porta Asinaria e Porta San Giovanni e restauro archeologico	Comune di Roma	dic-98	nov-99	2 600 000 000															
9 42 45/1	Mura di Roma: Restauro e consolidamento del tratto di mura tra Porta S. Giovanni e Porta Asinaria	Comune di Roma	set-98	set-99	1 088 736 250															
9 42 42	Mura di Roma: Restauro consolidamento e restauro archeologico nel tratto tra Porta Pia	Comune di Roma	set-98	nov-99	1 786 034 040															

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile del finanziamento	Termine ultimazione lavori	Termine completamento funzionale	RISORSE PON/FESR 2000-2006	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Utilizzo Tramiti (1% C.vino ottenuto)	PROGETTAZIONE: Privati (3% C.vino ottenuto)	PROGETTAZIONE: Ulteriori finanziamenti (10% C.vino ottenuto)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	ATTIVITÀ: 20% a 50% impegno di spesa	ATTIVITÀ: altra % della spesa ammessa a finanziamento entro	ULTERIORI EROGAZIONI: 20% impegno di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: Non alla conclusione degli SAL e 90% dell'importo di opera	SALDO (10% del totale del contributo pubblico previsto)	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandati diretti): Impegni sul relativo dell'assegnazione	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandati diretti): Valorizzazione risorse umane	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRE MODALITÀ	IMPEGNI	PAGAMENTI	Altre fonti
B 4	**Palazzo delle Esposizioni. Restauro ed adeguamento funzionale**																							
B 5	**Palazzo Braschi. (Museo di Roma). Restauro ed adeguamento funzionale**																							
B 6	**Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)**																							

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario ed Amministrazione	Tempi realizzazione e completamento lavori	Tempi completamento opere	ELENCO PONTE GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Uffici Tecnici 10% Costo stimato	PROGETTAZIONE: Perizie 6% Costo stimato	PROGETTAZIONE: Lavori non superiori al 10% Costo stimato	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI: 20% e 80% impegno di spesa	ACCONTI: 80% e 95% impegno di spesa con il decreto di approvazione stesso	ULTERIORI EROGAZIONI: 90% impegno di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: fino alla concorrenza dell'80% e 95% dell'impegno di spesa	SALDO: 10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Quietanze" sul conto dell'amministrazione	REGIONE LAZIO (mandati diretti): Valuta fissa ultimo trimestre	ALTRI BENEFICIARI: per "Quietanze" sul conto dell'ente beneficiario	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
9 10 02	Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Villa Giulia) - Ampliamento	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	set-99	2 146 765 526	2 146 765 526												2 200 000 000				2 200 000 000	2 200 000 000	
9 10 04	Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Villa Giulia) - Progetto di allestimento e degli allestimenti e degli arredi museali	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	dic-97	set-99	2 367 818 207	2 367 818 207												2 500 000 000				2 500 000 000	2 500 000 000	
9 10 09	Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Villa Giulia) - Progetto di allestimento e degli allestimenti e degli arredi museali	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	dic-97	set-99	911 587 600	911 587 600												1 000 000 000				1 000 000 000	1 000 000 000	
9 10 08	Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Villa Giulia) - Progetto di allestimento e degli allestimenti e degli arredi museali	Ministero per i Beni e le Attività Culturali			300 000 000													2 100 000 000				2 100 000 000	2 100 000 000	400 000 000
9 10 07	Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Villa Giulia) - Progetto di allestimento e degli allestimenti e degli arredi museali	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	dic-97	set-99	2 970 484 700	2 970 484 700												3 000 000 000				3 000 000 000	3 000 000 000	
9 10 06	Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Villa Giulia) - Progetto di allestimento e degli allestimenti e degli arredi museali	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	set-99	8 760 000 000	8 760 000 000												8 700 000 000				8 700 000 000	8 700 000 000	
9 10 05	Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Villa Giulia) - Progetto di allestimento e degli allestimenti e degli arredi museali	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	ott-99	8 222 533 416	28 222 533 416												10 000 000 000				10 000 000 000	10 000 000 000	20 000 000 000
B 9	Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)																							
9 09 01	Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica) - Progetto di allestimento museale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	set-99	5 142 888 597	5 142 888 597												6 000 000 000				6 000 000 000	6 000 000 000	10 000 000 000
B 10	Museo Nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia e Villa Poniatowski)																							
9 10 03	Museo Nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia) - Progetto di allestimento	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	dic-97	nov-99	9 800 000 000	9 800 000 000												9 800 000 000				9 800 000 000	9 800 000 000	
9 10 10	Museo Nazionale di Villa Giulia (Villa Poniatowski) - Progetto di allestimento	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	nov-99	9 800 000 000	9 800 000 000												9 800 000 000				9 800 000 000	9 800 000 000	
9 10 01	Museo Nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia) - Progetto di allestimento	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mag-98	nov-99	3 400 000 000	3 400 000 000												3 400 000 000				3 400 000 000	3 400 000 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Progetto Biennale del Bendistanza	Tempi adempimento procedurale	Tempi completamento opera	RIPORTO FONDO GIUBILEO 2000	COSTO ETTARATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI IN SPESA	PROGETTAZIONE: Utilizzi Tempi Tecnici Tot. Costo stimato	PROGETTAZIONE: Privati 0% Costo stimato	PROGETTAZIONE: Ulteriori finanziamenti (0% Costo stimato)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI: 30% o 20% Impegno di spesa	ACCONTI: 30% o 20% Impegno di spesa con il limite non superiore al 90%	ULTERIORI EROGAZIONI: 20% Impegno di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: Sino alla concorrenza dell'80% o 20% dell'Impegno di spesa	SALDO: 10% all'ordinativo del collaudo provvisorio	ATTO DEFINITIVO (CARTE E IMMOBILI)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AVANZO/DEFICIT CON LO STATO (Decreto di ripartizione)	REGIONE LAZIO (vendita diretta): "Immobili" nel settore dell'agricoltura	REGIONE LAZIO (vendita diretta): Valorizzazione risorse umane	ALTRI DESTINATARI: Per "operazioni" nel settore delle attività culturali	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
B 11	**Galleria Nazionale d'Arte Moderna**																							
B 11 11	Gallerie Nazionali d'Arte Moderna (Roma) Ampliamento e ristrutturazione dell'edificio Palazzetta e dell'edificio ex-Ina-Casa (piano seminterrato)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	dic-97	set-99	9 124 458 514	24 124 458 514												10 000 000 000				10 000 000 000	10 000 000 000	15 000 000 000
B 12	**Interventi di restauro di immobili e complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)**																							
B 12 01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento statico, restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	giu-98	giu-99	501 696 951	501 696 951												600 000 000				600 000 000	600 000 000	
B 12 02	Museo di Palestrina (Roma) Adeguamento ed ampliamento della funzionalità	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	nov-99	3 103 075 337	3 103 075 337												3 500 000 000				3 500 000 000	3 500 000 000	
B 12 03	Villa Adriana (Tivoli) Consolidamento statico, restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mag-98	nov-99	9 676 423 063	9 676 423 063												10 000 000 000				10 000 000 000	10 000 000 000	
B 12 04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arredi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	nov-98	ago-99	3 000 000 000	3 000 000 000												3 000 000 000				3 000 000 000	3 000 000 000	
B 12 05	Palazzo Spada (Roma) Restauro del cortile	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mag-98	set-99	1 401 670 000	1 401 670 000												1 500 000 000				1 500 000 000	1 500 000 000	
B 12 06	Fontana di Trevi (Roma) Restauro e protezione dalle acque	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	giu-99	2 308 104 197	2 308 104 197												2 500 000 000				2 500 000 000	2 500 000 000	
B 12 07	Chiesa di Regina Mundi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	apr-98	dic-99	267 073 338	267 073 338												300 000 000				300 000 000	300 000 000	
B 12 08	Tempio Ustrinum del Testaccio (Roma) Restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	set-99	1 654 139 865	1 654 139 865												1 800 000 000				1 800 000 000	1 800 000 000	
B 12 09	Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	ago-99	300 000 000	300 000 000												300 000 000				300 000 000	300 000 000	
B 12 10	Appia Antica - Ciampino	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	set-99	1 860 558 753	1 860 558 753												2 700 000 000				2 700 000 000	2 700 000 000	
B 12 11	Soprintendenza ai Beni Archeologici per l'Etruria meridionale (per il completamento e il primo stralcio funzionale)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	set-99	1 206 640 370	1 206 640 370												1 300 000 000				1 300 000 000	1 300 000 000	
B 12 12	Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano e per le aree archeologiche di Roma (Roma) Restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	set-99	1 264 993 182	1 264 993 182												1 400 000 000				1 400 000 000	1 400 000 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile del Procedimento	Termine procedurale di aggiudicazione dei lavori	Termine completamento opere	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: L'Ente Terzo 1% Lavori esterno	PROGETTAZIONE: Partner 5% Costo pubblico	PROGETTAZIONE: L'Ente non rientra nel 10% Lavori esterno	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% o 30% (a seguito di opere)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% o 30% (a seguito di opere in corso di realizzazione)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: 30% (a seguito di opere)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: Rate alla ultimazione dell'opera e/o a seguito dell'emissione di mutui	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO: 10% ad ultimazione dei lavori e/o a collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI E AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mediante decreti): "Immobili" nel patrimonio dell'amministrazione	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mediante decreti): Valorizzazione risorse ambientali	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI BENEFICIARI: Art. "Immobili" nel patrimonio delle aziende ospedaliere	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
B 13 12	Parco archeologico della via Flaminia, Area archeologica di Villa Ada, Villa Borghese, Villa Ada, Villa Savoia, Villa Torlonia, Villa Ada, Villa Savoia, Villa Torlonia	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	dic-99	1 000 000 000												1 000 000 000				1 000 000 000	1 000 000 000	
B 13 14	Via dei Modelli (Parco Leonardo di Fiumicino)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	dic-98	573 725 000												600 000 000				600 000 000	600 000 000	
B 13 15	Area di Piazza Cavalieri di Malta	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-97	nov-99	923 046 914												1 000 000 000				1 000 000 000	1 000 000 000	
B 13 16	Castello Chiaromonte (Fiumicino) e Museo Archeologico dell'Alto corso	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-97	set-99	5 382 254 464												5 000 000 000				5 000 000 000	5 000 000 000	
B 13 17	Centro Studi (Fiumicino/Isola Sacra)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-97	ott-99	1 691 923 000												1 800 000 000				1 800 000 000	1 800 000 000	
B 13 18	Parco Archeologico (Via Flaminia/Prima)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-97	set-99	2 670 383 035												2 800 000 000				2 800 000 000	2 800 000 000	
B 13 19	Castello di Santa (Fiumicino/Isola Sacra)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-97	set-99	4 965 504 000												5 500 000 000				5 500 000 000	5 500 000 000	
B 13 20	Castello Odescalchi (Isola Sacra/Fiumicino)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-97	dic-99	523 783 395												600 000 000				600 000 000	600 000 000	
B 13 11	Castello Odescalchi (Fiumicino/Isola Sacra) Ristrutturazione complessiva	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-97	dic-99	564 329 999												600 000 000				600 000 000	600 000 000	
B 13 21	Castello di Santa Severa (Castello di Santa Severa)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-97	set-99	2 820 072 000												3 000 000 000				3 000 000 000	3 000 000 000	
B 13 22	Completamento del Museo di antichità e di arte sacra del territorio	Provincia del Comune di Velletri	gen-98	set-99	1 500 000 000																		
B 13 24	Restauro delle facciate esterne ed interne, delle coperture e delle pavimentazioni della Palazzo Chigi	Presidenza del Consiglio dei Ministri	ago-98	nov-99	3 672 000 000																		
B 13 26	Restauro della Chiesa di S. Angelo in Pescheria	Chiesa di San Angelo in Pescheria	dic-98	nov-99	600 000 000					587 625 000	293 812 500										587 625 000	293 812 500	
B 13 36	Progetto di Parco Archeologico Via Appia Antica	Ministero Beni Culturali	apr-98	nd	1 000 000 000																		
B 13 37	Ex Industria Pirotecnica di Castelnuovo di Porto	Ministero Beni Culturali	set-98	giu-00	8 897 000 000																		
B 13	Restauri e interventi conservativi di Chiese, Basiliche, Monasteri, Oratori luoghi gli itinerari storici del Giubileo																						
0 13 015	Restauro di S. Croce in Gerusalemme (Roma) e altri edifici religiosi, interessati dal pellegrinaggio	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	lug-97	dic-99	4 000 000 000												4 000 000 000				4 000 000 000	4 000 000 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario ed Attuatore	Tempi amministrativi e contrattuali	Tempi completamento opera	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Utilizzi Fondi 1% Conto chiuso	PROGETTAZIONE: Previsti 9% Conto chiuso	PROGETTAZIONE: Ulteriori finanziamenti per ripristini al 15% Conto chiuso	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% e 90% lavorazioni di opera	ACCONTI: 20% e 90% lavorazioni di opera in fase di realizzazione e relativi oneri	ULTERIORI EROGAZIONI: 20% lavorazioni di opera	ULTERIORI EROGAZIONI: Non alla superazione dell'80% e 90% dell'opera e di opera	SALDO: 10% all'ultimazione dei lavori e collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (procedure diverse): Trasferimenti sul bilancio della regione	REGIONE LAZIO (procedure diverse): Valorizzazione risorse umane	ALTRI BENEFICIARI: per "trasferimenti sulla contabilità speciale"	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
0 13 0 0	Chiesa di Cristo re Lavanderia - Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mag-98	dic-99	927 719 949	927 719 949															1 000 000 000	1 000 000 000	
0 13 0 0	Progetto di Larvotto Area e museo (Monaco) Completamento complessivo e valorizzazione sistema	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	mar-98	384 356 901	384 356 901															400 000 000	400 000 000	
0 13 0 0	Chiesa di S. Salvatore Area e museo Pontificio	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	dic-99	300 000 000	300 000 000															300 000 000	300 000 000	
0 13 0 0	Basilica di San Francesco Area e museo (Perugia) Restauro opere	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	nov-97	dic-99	500 000 000	500 000 000															500 000 000	500 000 000	
0 13 0 0	Chiesa di Cristo Area e museo	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	dic-98	489 647 201	489 647 201															500 000 000	500 000 000	
0 13 0 0	Cimitero Ebraico Area e museo (Praga) Consolidamento e restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	dic-97	dic-99	890 903 672	890 903 672															980 000 000	980 000 000	
0 13 0 0	Chiesa di Pietro a Vinoli (Firenze) Restauro opere	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	set-99	1 922 727 273	1 922 727 273															2 000 000 000	2 000 000 000	
0 13 0 0	Basilica di S. Antonio Area e museo (Padova) Restauro opere	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	dic-97	dic-99	700 000 000	700 000 000															700 000 000	700 000 000	
0 13 0 0	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro opere	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	mar-99	190 830 000	190 830 000															200 000 000	200 000 000	
0 13 0 0	Chiesa di Maria a Piazza (Roma) Restauro opere	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-97	dic-99	1 000 000 000	1 000 000 000															1 000 000 000	1 000 000 000	
0 13 0 0	Chiesa di Santa Maria Area e museo (Praga) Restauro opere	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	gen-99	918 180 682	918 180 682															1 000 000 000	1 000 000 000	
0 13 0 0	Chiesa del Gesù (Roma) Area e museo	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	nov-97	dic-99	800 000 000	800 000 000															800 000 000	800 000 000	
0 13 0 0	Basilica del complesso monumentale di Assisi (Perugia) Consolidamento e restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	mar-99	444 153 774	444 153 774															500 000 000	500 000 000	
0 13 0 0	Chiesa di Antonio (Firenze) Restauro del museo	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	dic-99	672 316 182	672 316 182															700 000 000	700 000 000	
0 13 0 0	Chiesa di Santa Maria (Roma) Restauro opere interne della chiesa	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	feb-99	1 000 000 000	1 000 000 000															1 000 000 000	1 000 000 000	
0 13 0 0	Basilica Minore di Assisi (Perugia) Restauro del complesso e delle facciate	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	dic-98	800 000 000	800 000 000															800 000 000	800 000 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Trimestre di aggiudicazione o realizzazione	Trimestre ultimazione lavori	IMPORTO DI FINANZIAMENTO	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI IN SPESA	PROGETTAZIONE: Utilizzi 1% Conto rilancio	PROGETTAZIONE: Pre-ed 8% Conto rilancio	PROGETTAZIONE: Utilizzi finanziamenti 8% Conto rilancio	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI: 20% < 50% Impegni di spesa	ACCONTI: 50% < 80% Impegni di spesa e atto di liquidazione emesso	ULTERIORI EROGAZIONI: 20% Impegni di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: Saldo (massimo dell'80% o 95% dell'impegno di spesa)	SALDO: 5% all'accertamento del certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (massimo dieci anni): "Immediate" nel primo anno dall'assegnazione	REGIONE LAZIO (massimo dieci anni): Successive nuove annualità	ALTRI BENEFICIARI: per "Immediate" nel primo anno dalla stipula mutuo	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
0 13 17	Opere di Architettura e Opere di Grande Bellezza	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	ott-99	1 388 727 272	1 388 727 272													1 500 000 000				1 500 000 000	1 500 000 000	
0 13 19	Opere di II Livello e di Grande Attrazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	ago-99	394 948 780	394 948 780													400 000 000				400 000 000	400 000 000	
0 13 19	Opere d'Arte e Opere	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	ago-99	1 072 494 418	1 072 494 418													1 200 000 000				1 200 000 000	1 200 000 000	
0 13 20	Opere Per Ordine e Grandi Opere di Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	ago-99	2 500 000 000	2 500 000 000													2 500 000 000				2 500 000 000	2 500 000 000	
0 13 22	Opere di Grandezza e Opere Diffuse nelle regioni	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	feb-99	981 300 000	981 300 000													1 000 000 000				1 000 000 000	1 000 000 000	
0 13 22	Opere di Restauro Architettonico e Opere di Restauro Archeologico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	apr-98	dic-99	737 477 273	737 477 273													800 000 000				800 000 000	800 000 000	
0 13 23	Opere di Musei dei Palazzi Diffusi e Opere di valorizzazione del patrimonio nelle regioni	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	ago-98	500 000 000	500 000 000													500 000 000				500 000 000	500 000 000	
0 13 24	Opere di Archivi e Opere di Cultura Diffusa	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	apr-98	mag-99	639 479 710	639 479 710													800 000 000				800 000 000	800 000 000	
0 13 24/1	Restauro e Valorizzazione Architettonica e Ambientale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-97	dic-99	500 000 000	500 000 000													500 000 000				500 000 000	500 000 000	
0 13 24/2	Opere di II Livello e di Grande Attrazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	dic-99	300 000 000	300 000 000													300 000 000				300 000 000	300 000 000	
0 13 26	Opere di Grandezza e Opere Diffuse	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	apr-98	dic-99	848 723 637	848 723 637													1 000 000 000				1 000 000 000	1 000 000 000	
0 13 27	Restauro Architettonico e Archeologico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mag-98	lug-99	749 391 208	749 391 208													800 000 000				800 000 000	800 000 000	
0 13 28	Opere di Archivi delle Opere e Restauro Archeologico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	gen-99	600 000 000	600 000 000													600 000 000				600 000 000	600 000 000	
0 13 29	Opere di Polizia Diffusa Opere di Restauro Archeologico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	apr-98	feb-99	189 613 918	189 613 918													200 000 000				200 000 000	250 000 000	
0 13 30	Restauro e valorizzazione Architettonica delle Chiese e Musei e Cappelle	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	gen-99	778 810 000	778 810 000													800 000 000				800 000 000	850 000 000	
0 13 31	Opere del Centro e Grandi Opere di Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	dic-99	761 914 618	761 914 618													800 000 000				800 000 000	800 000 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Progetto finanziato dal finanziamento	Tipologia attuazione e procedura	Tempi complessivi della realizzazione	RISORSE FONDO QUADRILATERO	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Ulteriori Somme Tecniche 1% Costo stimato	PROGETTAZIONE: Prevedi 0% Costo stimato	PROGETTAZIONE: Ulteriori Somme non superiori al 10% Costo stimato	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 10% a 20% Importo di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% a 30% Importo di spesa in fasi funzionali	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: 30% Importo di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: Non sulla spesa totale dell'importo di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO: 10% del costo stimato di realizzo previsto	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Denominazione del beneficiario)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (eventuali diversi): "Quantificare" nel dettaglio per ogni singolo	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (eventuali diversi): Ulteriori diverse somme	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI BENEFICIARI	DEPOSITI	PAGAMENTI	altre fonti
0 13 354	Caserma dei Carabinieri a Rignano Flaminio (Roma) – Lavori di costruzione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mm-97	ott-99	450 000 000	450 000 000															450 000 000	450 000 000	
0 13 355	Palazzina Direzione del MiBAC Civitella	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	apr-98	ott-98	416 992 360	416 992 360															450 000 000	450 000 000	
0 13 30	Caserma dei Marescialli (Progetto del concorso Internazionale)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	giu-99	350 000 000	350 000 000															350 000 000	350 000 000	
0 13 34	Caserma dei Carabinieri Benevento (Roma) – Nuova Sede Operativa	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	apr-98	mar-99	736 895 440	736 895 440															800 000 000	800 000 000	
0 13 38	Caserma di Agrigento (Progetto Preliminare degli Architetti Agrigento e Sciacca)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-97	dic-98	500 000 000	500 000 000															500 000 000	500 000 000	
0 13 36	Caserma dei Carabinieri Roma (Roma) – Nuova Sede Operativa	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	ago-99	1 300 000 000	1 300 000 000															1 300 000 000	1 300 000 000	
0 13 39	Caserma dei Carabinieri a Roma (Roma) – Nuova Sede Operativa	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	nov-99	449 272 727	449 272 727															500 000 000	500 000 000	
0 13 40	Caserma di Bergamo e di Chiavari (Genova) – Nuova Sede Operativa	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	ago-99	518 656 900	518 656 900															550 000 000	550 000 000	
0 13 41	Caserma di Civita Castellana (Roma) – Nuova Sede Operativa	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	giu-99	713 805 802	713 805 802															800 000 000	800 000 000	
0 13 42	Caserma di Frosinone (Roma) – Nuova Sede Operativa	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	gen-99	494 332 254	494 332 254															560 000 000	560 000 000	
0 13 43	Caserma di Chiavenna (Progetto Preliminare – Commissione provinciale del	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	dic-97	mar-99	94 873 950	94 873 950															100 000 000	100 000 000	
0 13 45	Caserma dei Dragoni di Frosinone	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	apr-98	apr-99	700 000 000	700 000 000															700 000 000	700 000 000	
0 13 497	Caserma e autorimessa di Rieti (Progetto Preliminare degli Architetti di Rieti)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	dic-97	dic-99	640 000 000	640 000 000															640 000 000	640 000 000	
0 13 448	Caserma e autorimessa di Rieti (Progetto Preliminare degli Architetti di Rieti)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	dic-99	310 696 800	310 696 800															360 000 000	360 000 000	
0 13 495	Caserma di Chiavenna (Progetto Preliminare degli Architetti Agrigento)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-97	dic-98	300 000 000	300 000 000															300 000 000	300 000 000	
0 13 448	Caserma di Agrigento di Agrigento (Progetto Preliminare degli Architetti)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-97	dic-99	400 000 000	400 000 000															400 000 000	400 000 000	
0 13 495	Caserma di Cassino (Progetto Preliminare degli Architetti Agrigento)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	nov-99	470 650 000	470 650 000															500 000 000	500 000 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Attuatore ed Amministrazione	Termine completamento ultimazione lavori	Termine completamento collaudo	RISORSE POR/DO (LIRE/ELU 2000)	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Unified Toronto 1% Centro ritenuto	PROGETTAZIONE: Privati PPA Centro ritenuto	PROGETTAZIONE: Finanziari non rispettati del 10% Centro ritenuto	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% e 30% impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% e 30% impegno di spesa rese a fronte di fatture quietanzate	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: LIQUIDI: 20% impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: LIQUIDI: Rate di rimborso dell'80% e 90% dell'impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO: 10% effettuato dal certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI DI UNICA EROGAZIONE: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI DI UNICA EROGAZIONE: REGIONE LAZIO (assunzione diretta): Trasferimenti dal settore dell'erogazione	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI DI UNICA EROGAZIONE: REGIONE LAZIO (assunzione diretta): Valorizzazione risorse erogate	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI DI UNICA EROGAZIONE: ALTRI BENEFICIARI	IMPEGNI	PAGAMENTI	note fondi
B 13 0105	Chiusa di Monte alla Croce - Fontana piana	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	dic-98	711 335 618	711 335 618															750 000 000	750 000 000	
B 13 0502	Ristrutturazione Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mag-98	dic-99	700 000 000	700 000 000															700 000 000	700 000 000	
B 13 0503	Chiusa di Monte Isola	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	feb-99	724 740 182	724 740 182															800 000 000	800 000 000	
B 13 0505	Ristrutturazione Museo Nazionale Romano (Palazzo Altemps e Magazzini storici)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-97	dic-99	550 000 000	550 000 000															550 000 000	550 000 000	
B 13 0506	Ristrutturazione Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo e Magazzini storici)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	ago-99	1 235 000 000	1 235 000 000															1 235 000 000	1 235 000 000	
B 13 0702	Chiusa di Monte a Cesa - Restauro degli affreschi e luoghi annessi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	dic-99	350 000 000	350 000 000															350 000 000	350 000 000	
B 13 0704	Chiusa di Monte di Cesa - Restauro degli affreschi e luoghi annessi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-97	dic-99	220 000 000	220 000 000															220 000 000	220 000 000	
B 13 0705	Chiusa di S. Vivia - Restauro degli affreschi e luoghi annessi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-97	dic-99	200 000 000	200 000 000															200 000 000	200 000 000	
B 13 0707	Chiusa di S. Maria - Restauro degli affreschi e luoghi annessi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	feb-99	374 916 000	374 916 000															400 000 000	400 000 000	
B 13 0708	Chiusa di S. Maria di Pugnano - Restauro degli affreschi e luoghi annessi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mag-98	dic-99	470 434 546	470 434 546															500 000 000	500 000 000	
B 13 0709	Chiusa di S. Maria di Pugnano - Restauro degli affreschi e luoghi annessi (primo lotto)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	dic-99	381 127 272	381 127 272															400 000 000	400 000 000	
B 13 0801	Chiusa di S. Maria - Restauro degli affreschi e luoghi annessi (primo lotto)	Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali	dic-97	dic-98	600 000 000	600 000 000															600 000 000	600 000 000	
B 13 0802	Chiusa di S. Maria della Stella - Restauro dell'intero complesso	Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali	dic-97	dic-98	300 000 000	300 000 000															300 000 000	300 000 000	
B 13 0806	Chiusa di S. Maria di Farfa - Restauro Portale del Bramante (primo lotto)	Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	dic-99	550 000 000	550 000 000															550 000 000	550 000 000	
B 13 0807	Chiusa di S. Maria di Farfa - Restauro dell'Antiquarium Romano (primo lotto)	Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali	apr-98	mar-99	230 610 433	230 610 433															230 000 000	230 000 000	
B 13 0901	Chiusa di S. Matteo - Restauro delle tombe	Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	set-99	400 000 000	400 000 000															400 000 000	400 000 000	
B 13 0902	Chiusa di S. Pietro	Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	dic-99	385 915 000	385 915 000															400 000 000	400 000 000	
B 13 0903	Chiusa di S. Pietro - Restauro e Allestimento Museo (1° lotto)	Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali	mag-98	dic-99	359 282 537	359 282 537															400 000 000	400 000 000	
B 13 0904	Chiusa di S. Pietro	Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali	mag-98	dic-99	264 344 102	264 344 102															300 000 000	300 000 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Progetto preliminare/ studio di fattibilità	Tempi stimati di completamento delle procedure di gara	Tempi stimati di completamento dei lavori	RISORSE FONDO CIPE/BILANCIO STATO	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Lotto / I stralcio funzionale	PROGETTAZIONE: Privati (Fin. Civile)	PROGETTAZIONE: Ulteriori finanziamenti ed Enti (Fin. Civile)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI: 20% e 25% (progressivi di spesa)	ACCONTI: 25% e 25% (secondo e terzo lotto o provvisorie varie)	ULTERIORI EROGAZIONI: 20% (progressivi di spesa)	ULTERIORI EROGAZIONI: Ove alla conclusione dell'80% e 95% dell'impegno di spesa	SALDO: 15% (da produrre dal certificato di collaudo provvisorio)	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (modalità diverse): "Anticipazioni" sui costi dell'intervento	REGIONE LAZIO (modalità diverse): Trasferimento risorse statali	ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
B 14 48	Museo Nazionale Romano: restauro conservazione e riordino	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	set-99	6 984 523 896	6 984 523 896												8 000 000 000				8 000 000 000	8 000 000 000	
B 14 44	Completamento Foro Romano e Area Palatina	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	nov-99	747 868 855	747 868 855												800 000 000				800 000 000	800 000 000	
B 14 44	Ostia Antica: Restauro dei mosaici e delle pitture	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	set-99	1 303 436 014	1 303 436 014												1 400 000 000				1 400 000 000	1 400 000 000	
B 14 48	Ostia Antica: Restauro delle Terme del Nuotatore	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	nov 97	set 99	1 500 000 000	1 500 000 000												1 500 000 000				1 500 000 000	1 500 000 000	
B 14 46	Museo delle navi romane (Porto Nuovo)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	nov-97	giu-99	800 000 000	800 000 000												800 000 000				800 000 000	800 000 000	
B 14 46	Antiquarium di Fiumicino	Fiumicino e Fregene	set-98	lug-99	700 000 000	700 000 000																		
B 14 48	Completamento Museo del Porto	Comune di Fiumicino	gen-99	set-99	900 000 000	900 000 000																		
B 15	Interventi nelle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano																							
B 15 41	Ostia Antica (Ostia Antica): Completamento del primo stralcio funzionale e sistemazione del Porto di Traiano	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-97	set-99	4 000 000 000	4 000 000 000												4 000 000 000				4 000 000 000	4 000 000 000	
B 15 48	Ostia Antica (Ostia Antica): Completamento del primo stralcio funzionale degli scavi archeologici, delle sistemazioni del Porto di Traiano, Ostia Antica (Ostia Antica, area archeologica)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen 97	dic-99	7 000 000 000	7 000 000 000												7 000 000 000				7 000 000 000	7 000 000 000	
B 15 48	Museo Ostiense di Ostia Antica (Ostia Antica): Adeguamento funzionale, impianti di protezione e sistemazione museale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	nov-97	ago-99	2 000 000 000	2 000 000 000												2 000 000 000				2 000 000 000	2 000 000 000	
B 15 54	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Ostia Antica): Completamento della sistemazione museale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	set 97	set-99	2 000 000 000	2 000 000 000												2 000 000 000				2 000 000 000	2 000 000 000	
B 15 46	Area archeologica di Ostia Antica (Ostia Antica): Restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-97	set-99	2 000 000 000	2 000 000 000												2 000 000 000				2 000 000 000	2 000 000 000	
B 15 46	Area archeologica di Ostia Antica (Ostia Antica): Completamento e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	ago-99	1 500 000 000	1 500 000 000												1 500 000 000				1 500 000 000	1 500 000 000	
B 15 47	Area archeologica di Ostia Antica (Ostia Antica): Restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-97	ago-99	1 500 000 000	1 500 000 000												1 500 000 000				1 500 000 000	1 500 000 000	
B 16	Interventi di restauro e riqualificazione di beni culturali archeologici																							

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile del finanziamento	Tempi realizzazione completa opera	BENEFICIARIO FONDO GIUDIZIO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Ulteriori Tranches 1% L. Cons. ambiente	PROGETTAZIONE: Polizze Ass. Cred. ambiente	PROGETTAZIONE: Liberi finanziamenti non imputati al Titolo Sesto ambiente	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI: 20% o 40% impegno di spesa	ACCONTI: 20% o 40% impegni di spesa e presentazione polizza	ULTERIORI EROGAZIONI: 30% impegni di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: Non oltre ammontare dell'80% o 90% dell'impegno di spesa	SALDO: 10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZ. CENTRALE DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (somme dovute): "Immediate" nel settore dell'emergenza	REGIONE LAZIO (somme dovute): Viabilità/altre risorse ordinarie	ALTRI BILANCI PUBBLICI: per "Immediate" nel settore delle infrastrutture viarie	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
0 16 11	Palazzo Tesi Fondo (Zona Arno Consolidamento e risanamento)	Assessorato per l'Ambiente della Regione Toscana	mar-98	apr-99	893 928 372													1 000 000 000					1 000 000 000	1 000 000 000	
0 16 12	Palazzo Tesi Fondo (Zona Arno Consolidamento e risanamento)	Assessorato per l'Ambiente della Regione Toscana	mar-98	ott-99	4 672 784 441													5 000 000 000					5 000 000 000	5 000 000 000	
0 16 13	Palazzo Tesi Fondo (Zona Arno Consolidamento e risanamento)	Assessorato per l'Ambiente della Regione Toscana	gen-98	apr-99	1 180 799 366													1 250 000 000					1 250 000 000	1 300 000 000	
0 16 14	Palazzo Tesi Fondo (Zona Arno Consolidamento e risanamento, protezione spondale, regimazione per impianto e pulizia)	Assessorato per l'Ambiente della Regione Toscana	mar-98	ott-99	2 339 234 765													2 500 000 000					2 500 000 000	2 300 000 000	
0 16 15	Diga Aulla (Magra) Sist. Consolidamento, protezione spondale, sistemazione e regimazione	Assessorato per l'Ambiente della Regione Toscana	feb-98	ago-99	1 886 029 015													2 000 000 000					2 000 000 000	2 000 000 000	
0 16 16	Palazzo Tesi Fondo (Zona Arno Consolidamento e risanamento protezione	Assessorato per l'Ambiente della Regione Toscana	nov-97	nov-99	398 319 328													400 000 000					400 000 000	400 000 000	
0 16 17	Palazzo Tesi Fondo (Zona Arno Consolidamento e risanamento, protezione spondale, sistemazione e regimazione per impianto e pulizia)	Assessorato per l'Ambiente della Regione Toscana	nov-97	ott-99	2 117 285 925													2 300 000 000					2 300 000 000	2 300 000 000	
0 16 18	Palazzo Tesi Fondo (Zona Arno Consolidamento e risanamento)	Assessorato per l'Ambiente della Regione Toscana	feb-98	apr-99	721 895 066													800 000 000					800 000 000	800 000 000	
0 16 19	Palazzo Tesi Fondo (Zona Arno Consolidamento e risanamento)	Assessorato per l'Ambiente della Regione Toscana	gen-98	nov-99	2 745 453 709													3 000 000 000					3 000 000 000	3 000 000 000	
0 16 20	Palazzo Tesi Fondo (Zona Arno Consolidamento e risanamento)	Assessorato per l'Ambiente della Regione Toscana	mar-98	nov-99	1 780 173 678													2 000 000 000					2 000 000 000	2 000 000 000	
0 16 21	Palazzo Tesi Fondo (Zona Arno Consolidamento e risanamento)	Assessorato per l'Ambiente della Regione Toscana	nov-97	ott-99	1 815 958 548													2 000 000 000					2 000 000 000	2 000 000 000	
0 16 22	Palazzo Tesi Fondo (Zona Arno Consolidamento e risanamento)	Assessorato per l'Ambiente della Regione Toscana	nov-97	ott-99	3 181 883 190													3 400 000 000					3 400 000 000	3 400 000 000	
0 16 23	Palazzo Tesi Fondo (Zona Arno Consolidamento e risanamento)	Assessorato per l'Ambiente della Regione Toscana	feb-98	ott-99	902 239 741													1 000 000 000					1 000 000 000	1 000 000 000	

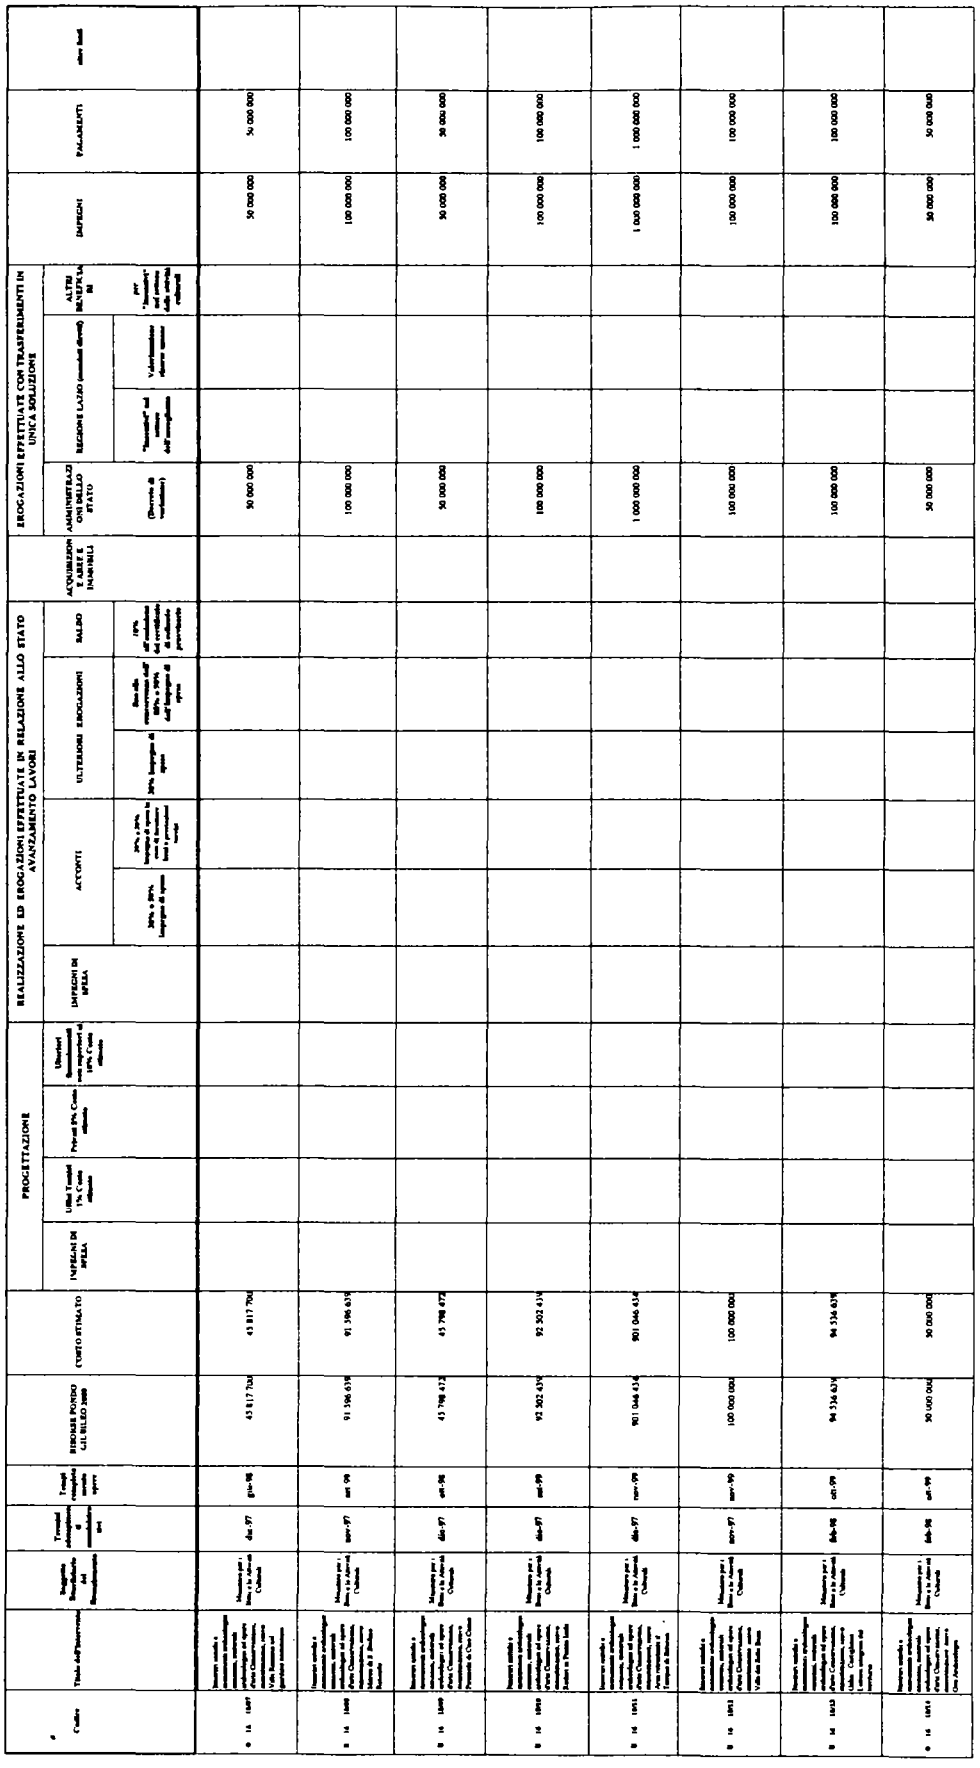

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del Finanziamento	Tempi inizio lavori	Tempi completamento lavori	IMPORTO FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Lavori Tempi Costo effettivi	PROGETTAZIONE: Prove nel PPA	PROGETTAZIONE: Lavori non superiori al 10%	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI: 30% e 20%	ACCONTI: 20% e 10%	ULTERIORI EROGAZIONI: 30%	ULTERIORI EROGAZIONI: Non oltre	SALDO	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	RELAZIONE LAZIO	ALTRI BENEFICIARI	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
0 16 1015	Restauro statico e consolidamento strutturale della Chiesa di Santa Maria Maggiore e delle adiacenze	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	set-99	60 000 000	60 000 000												60 000 000			60 000 000	60 000 000	
0 16 1016	Restauro statico e consolidamento strutturale della Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta e Chiostro annesso	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	gen-98	set-99	122 102 475	122 102 475												135 000 000			135 000 000	135 000 000	
0 16 1017	Restauro statico e consolidamento strutturale della Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta e Chiostro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	set-99	675 513 500	675 513 500												750 000 000			750 000 000	750 000 000	
0 16 1018	Restauro statico e consolidamento strutturale della Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta e Via Francesco Ierardi Chiusdino	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	mar-99	91 184 325	91 184 325												100 000 000			100 000 000	100 000 000	
0 16 1019	Restauro statico e consolidamento strutturale della Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta e Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta Chiusure	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	nov-99	23 000 000	23 000 000												25 000 000			25 000 000	25 000 000	
0 16 1020	Restauro statico e consolidamento strutturale della Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta e Via Francesco Ierardi Chiusdino	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	nov-99	576 928 746	576 928 746												600 000 000			600 000 000	600 000 000	
0 16 1021	Restauro statico e consolidamento strutturale della Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta e Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta Chiusure	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	set-99	470 392 287	470 392 287												500 000 000			500 000 000	500 000 000	
0 16 1022	Restauro statico e consolidamento strutturale della Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta e Via Francesco Ierardi Chiusdino	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	dic-97	nov-99	831 233 953	831 233 953												900 000 000			900 000 000	900 000 000	
0 16 1023	Restauro statico e consolidamento strutturale della Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta e Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta Chiusure	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	set-99	100 000 000	100 000 000												100 000 000			100 000 000	100 000 000	

Codice	Titolo dell'Opera pubblica	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Termine di ultimazione dei lavori	Termine completamento delle opere	RISORSE FONDO CIPE/LEGGE 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI IN SPESA	PROGETTAZIONE: Ulteriori Somme a disposizione (10% Costo stimato)	PROGETTAZIONE: Previsti 25% Costo stimato	PROGETTAZIONE: Ulteriori Somme a disposizione (10% Costo stimato)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI: 30% + 20% (seguito di spesa)	ACCONTI: 20% a 30% (secondo stato di avanzamento)	ULTERIORI EROGAZIONI: 30% (seguito di spesa)	ULTERIORI EROGAZIONI: Ulteriori erogazioni dell'80% a 90% dell'impegno di spesa	SALDO: 10% all'ultimazione dei contributo di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONE CENTRALE STATO	REGIONE LAZIO: "Immobili" nel settore dell'immigrazione	REGIONE LAZIO: Valorizzazione risorse umane	ALTRI ENTI PUBBLICI: per "Immobili" nel settore delle attività culturali	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
1 – 14 – 1999	Palazzo Balduccini Sede di accademie musicali	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	set-99	300 000 000	300 000 000															300 000 000	300 000 000	
8 – 14 – 1998	Teatro comunale di Nuova Gradisca – Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	set-99	150 000 000	150 000 000															150 000 000	150 000 000	
8 – 14 – 19	Teatro comunale (Roma) Restauro Piazza Navona	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	set-99	1 869 967 700	1 869 967 700															2 000 000 000	2 000 000 000	
8 – 14 – 20	Villa di Quarto (Firenze) Restauro complesso	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	set-99	5 469 913 397	5 469 913 397															5 900 000 000	5 900 000 000	
8 – 14 – 21	Acquedotto della Villa di Quarto	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	FINANZIATO																		1 000 000 000	1 000 000 000	
8 – 14 – 22	Parco della Tenuta della Villa Reale (Firenze) Restauro complesso monumentale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	dic-98	mar-99	2 639 356 304	2 639 356 304															4 580 000 000	4 580 000 000	
8 – 14 – 23	Palazzo Villa di Corte, Tenuta Corte, Parco Mediceo di Quarto (Firenze)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali			680 000 000																3 000 000 000	3 000 000 000	-680 000 000
8 – 14 – 24	Pitella, giardino e mura (Firenze) Manutenzione, restauro e	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	nov-97	set-99	8 076 283 107	8 076 283 107															8 700 000 000	8 700 000 000	
8 – 14 – 25	Parco archeologico di Vigna Barberini restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mag-98	dic-99	600 000 000	600 000 000															600 000 000	600 000 000	
8 – 14 – 26	Aree sede di Città (Firenze) Restauro complesso del monte e Cappellone e di Monumentale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	mar-98	ago-99	4 705 714 979	4 705 714 979															5 000 000 000	5 000 000 000	
8 – 14 – 27	Via Arnolfo (Firenze) Restauro complesso monumentale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	feb-98	set-99	1 438 180 311	1 438 180 311															1 500 000 000	1 500 000 000	
8 – 14 – 28	Aree sede Sud (Pontecorvo)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	nov-97	giu-99	560 000 000	560 000 000															560 000 000	560 000 000	
8 – 14 – 29	Villa Arbusto (Treviso) Restauro complesso monumentale della Torre di Ezzelino e Corte Comunale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	set-97	ago-99	1 000 000 000	1 000 000 000															1 060 000 000	1 060 000 000	
8 – 14 – 30	Restauro del Teatro Regionale delle Valle Romane	Comune di Alatri (Frosinone)	giu-99	dic-99	3 000 000 000	3 000 000 000																	
B 18	Valorizzazione del patrimonio culturale dei luoghi di culto e di vita nella provincia di Roma																						
8 – 18 – 31	Restauro Sala Baronio (Sabina Tiberina) Restauro del complesso e del Sacro Speco	Comune di Affile (Roma)	giu-98	dic-98	500 000 000	500 000 000	25 000 000		25 000 000		399 370 526										424 370 526	25 000 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Termine ultimazione lavori	Termine completamento opere	RIDUZIONE FONDO GIUGNO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Utilità Termini 1% C.Conto chiusura	PROGETTAZIONE: Prelievi 5% C.conto chiusura	PROGETTAZIONE: Eventuali Accantonamenti non soggetti al 10% C.conto chiusura	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE DI RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI: 20% e 30% Impegno di spesa	ACCONTI: 20% e 30% Impegno di spesa (Lavori in corso)	ULTERIORI EROGAZIONI: 20% Impegno di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: Rata alla conclusione dell'80% o 90% dell'importo di spesa	SALDO: 10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Immediata" nel settore dell'emergenza	REGIONE LAZIO (mandati diretti): Valorizzazione risorse umane	ALTRI BENEFICIARI: per "Immediata" nella sanità e nei beni culturali	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
1 10 10	Adeguamento impianti e sistemi antincendio e messa in sicurezza	Comune di Alatri (Lazio)	mar-98	lug-99		800 000 000	40 000 000		40 000 000														40 000 000	40 000 000	
9 10 10	Tutela e Valorizzazione Area e di Collemaggio, Museo delle Mura e del complesso della Torre	Comune di Alatri (Lazio)	mar-98	dic-98		300 000 000	25 000 000		25 000 000		420 955 534	210 467 770											445 955 534	235 467 770	
4 14 10	Circolazione Urbana Lavori di messa in sicurezza	Comune di Alatri (Lazio)	mag-98	dic-98		200 000 000	10 000 000		10 000 000		166 040 918	83 020 460											176 040 918	93 020 460	
9 10 10	Tutela Acquedotto di Paola (Alatri) Progetto	Comune di Alatri (Lazio)	mar-99	mar-99		1 000 000 000	50 000 000		50 000 000		730 821 681	365 410 840											780 821 681	415 410 840	
8 16 10	Tutela e Valorizzazione Area Archeologica	Comune di Alatri (Lazio)	mar-97	dic-98		4 515 221 371	250 000 000		250 000 000		3 865 221 371	1 932 610 760											4 115 221 371	2 182 610 760	
5 17 10	Restauro e valorizzazione Cinta Muraria e completamento Porta	Provincia di Roma	giu-99	giu-99		510 043 644	30 000 000	6 000 000		24 000 000													50 000 000	30 000 000	
5 18 10	2° Circolo Didattico di Cerveteri (Lavori di ristrutturazione, Ampliamento e Messa a norma della Scuola Primaria)	Provincia di Roma	mar-99	mar-99		500 000 000	25 000 000		25 000 000														25 000 000	25 000 000	
6 15 10	Villa Borghese (Museo Pinacoteca, Casina di Raffaello e Orangerie)	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	mar-98	gen-99		7 700 000 000																			
6 16 10	Adeguamento Impianti Antincendio	Comune di Roma	set-97	lug-99		1 357 000 000																			93 000 000
5 16 11	Circolazione e Parcheggi	Comune di Velletri	set-98	ago-99		392 504 737					392 504 737	196 252 380											392 504 737	196 252 380	
9 10 13	Adeguamento Antincendio e messa in sicurezza Museo Nazionale Etrusco	Comune di Tarquinia	set-97	apr-99		1 313 738 552	75 000 000		75 000 000		1 281 238 552	240 347 710	340 371 360										1 306 238 552	703 619 270	
6 15 13	Restauro e Valorizzazione Complesso di Santa Maria Maggiore	Comune di Civitavecchia (Area Archeologica e Via Aurelia)	mag-98	mar-99		544 829 000	30 000 000		30 000 000		514 329 000	101 845 800											544 329 000	132 845 800	2 500 000
8 10 14	Museo del Territorio (Museo della Civiltà Romana e Museo delle Arti e Tradizioni Popolari)	Provincia di Roma	lug-98	gen-99		405 771 440	25 000 000	5 000 000		20 000 000	380 771 440												405 771 440	25 000 000	
9 10 15	Museo dell'Alabastro di Volterra (Ampliamento e Ristrutturazione)	Provincia di Roma	giu-98	mar-99		1 959 837 248	54 000 000	27 000 000		27 000 000													54 000 000	54 000 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'intervento	Tempi realizzazione intervento	Tempi completamento opera	REGIONE FONDO CUI RELEGO parte	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE					IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
							IMPEGNI DI SPESA	Ulteriori Tremonti 1% Conto rilancio	Tremonti 6% Conto rilancio	Ulteriori Tremonti non rapportati al 14% Conto rilancio	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	REGIONE LAZIO (somme dovute)		ALTRI BENEFICIARI			
												20% o 30% (spettanze di opera)	20% o 30% (spettanze di opera in relazione ai lavori eseguiti)	20% (spettanze di opera)	Ass.ne dell'ammontare dal 50% o 70% dell'importo di opera	10% dell'ammontare presunto		(Decreto di variazione)	"Incassate" sul relativo dell'intervento	Valori definitivi ritenuta ritenuta		per "Incassate" dalle relative somme		
0 18 17	Comune di Roma Dipartimento Politiche Sociali Istituzione Centri Educativi e di tutela di Bambini per Bambini	Provincia di Roma	giu-99	giu-99		397 665 651	21 750 000	4 350 000		17 600 000	353 935 651	187 967 825									397 665 651	205 717 825	
0 18 18	Roma Alfabeta Istituzione Biblioteche Biblioteche Centrali Istituzione Biblioteche per ragazzi e centro	Provincia di Roma	lug-98	ott-99		741 881 223	50 000 000	10 000 000		40 000 000	691 881 223	345 940 610									741 881 223	393 940 610	
0 18 19	Ex Ateneo di Medicina (Via del Verano) Recupero e valorizzazione a sede per convegni e mostre	Provincia di Roma	dic-97	mar-99		389 792 498	22 500 000	4 500 000		18 000 000	367 292 498	148 446 250			143 532 265						389 792 498	334 699 450	
0 18 20	Chiesa di S. Maria in Trivio (Via del Corso) Restauro	Provincia di Roma	lug-98	giu-99		150 000 000	7 500 000		7 500 000												7 500 000	7 500 000	
0 18 21	Chiesa di San Lorenzo in Lucina (Via del Corso) Restauro	Comune di Roma	feb-98	dic-98		254 200 000	15 000 000	3 000 000		12 000 000	239 105 936	119 511 970									254 105 936	134 551 970	
0 18 22	Mausoleo di Roma (Via Flaminia)	Comune di Roma	lug-97	giu-99		274 992 886	15 000 000		15 000 000		259 992 886	129 996 440									274 992 886	144 996 440	
0 18 23	Villa Borghese nella (Via del Corso) Restauro	Comune di Roma	feb-98	giu-99		1 230 000 000	70 000 000		70 000 000		1 113 806 829	222 761 365	334 142 050								1 183 806 829	628 903 410	
0 18 24	Quadrilatero Romano Piazza Dante e piazza Vittorio	Comune di Roma	n.d.	n.d.		1 000 000 000																	
B 19	Valorizzazione del patrimonio culturale regionale (circoli ufficiali, teatri e cinematografi)																						
0 19 16	Biblioteche dipartimentali Teatro Regionale Teatro Regionale Circoli Ufficiali ed Enti Culturali Regionali	Comune di Roma	DEFINANZIATO																				
0 19 17	Cinema per ragazzi: promozione di iniziative culturali e didattiche sulla cinematografia	Regione Lazio	dic-98	giu-99	1 000 000 000	1 000 000 000																	
0 19 18	Cinematografia sale cinematografiche	Comune di Roma	mar-98	mar-99	4 517 060 000	4 517 060 000																	
0 19 19	Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II	Comune di Roma	lug-97	mar-99	995 862 486	995 862 486	60 000 000			60 000 000	917 076 359	183 415 310		275 122 970							977 076 359	518 538 280	
0 19 20	Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II Restauro	Comune di Roma	lug-97	mar-99	840 000 000	840 000 000																	
0 19 21	Restauro del palazzo sede di Direzione Regionale Cinema e Istituto Luce Via Tuscolana	Comune di Roma	mar-98	ott-99	1 167 162 876	1 167 162 876	70 000 000			70 000 000	1 097 162 876	548 581 440									1 167 162 876	618 581 440	

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario ed Attuatore	Tempi di realizzazione (mese-anno)	Tempi completamento opera	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI IN SPESA	PROGETTAZIONE: Utilizzi Fondi (5% Conto chiusura)	PROGETTAZIONE: Prelievi 5% Conto chiusura	PROGETTAZIONE: Utilizzi fondi accantonati all'1% Conto chiusura	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI: 20% - 95% impegno di spesa	ACCONTI: 20% - 95% impegno di spesa in corso di perizia non di perizia e varianti	ULTERIORI EROGAZIONI: 20% impegno di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: Rata alla conservazione dell'85% e 95% dell'impegno di spesa	SALDO: 15% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Ministero di riferimento)	REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Immediata" nel settore dell'immigrazione	REGIONE LAZIO (mandati diretti): Valorizzazione risorse umane	ALTRI BENEFICIARI	"Recuperi" nel settore delle attività culturali	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
B 19 48		Restauro conservativo della Cappella Sistina e di Michelangelo	Direzione Musei Vaticani	nov-97	set-98	403 000 000	20 000 000		20 000 000		377 737 075	188 868 538			132 214 970							397 737 075	341 093 440	
B 19 47		Chiesa Collegio Pontificio Nord Americano	Direzione Musei Vaticani	giu-98	giu-99	999 034 076	50 000 000		50 000 000		894 369 076	447 184 540										944 369 076	497 184 540	
B 19 48		Centro Chiesa Cappella di Nicolò V e Museo di arte contemporanea	Direzione Musei Vaticani	dic-97	dic-99	5 774 000 000	300 000 000		300 000 000		4 760 983 580	952 116 720		1 428 175 870							5 060 583 580	2 686 291 790	
B 19 46		Chiesa della Collegio Vaticano (Ristrutturazione)	Direzione Musei Vaticani	set-98	apr-99	548 829 313					548 829 313	274 414 656										548 829 313	274 414 656	
B 19 50		Chiesa di Santa Maria Regina Apostolorum (Restauro)	Direzione Musei Vaticani	mar-98	apr-99	100 000 000																		
B 19 51		Ristrutturazione di Palazzo Apostolico (Restauro)	Direzione Musei Vaticani	DIFFERIMENTO																				
B 19 52		Chiesa Cappella Sistina (Restauro)	Direzione Musei Vaticani	gen-98	dic-99	1 242 089 443					1 134 739 443	577 169 720					87 750 000					1 242 489 443	664 919 720	
B 19 53		Chiesa di Santa Maria e San Stefano degli Abissini (Restauro)	Direzione Musei Vaticani	mag-98	nov-99	300 000 000	15 000 000		15 000 000		285 000 000	142 500 000										300 000 000	157 500 000	
B 19 54		Ristrutturazione e messa in sicurezza della Cappella di Urbano VIII	Direzione Musei Vaticani	nov-98	giu-99	764 429 110					764 429 110	382 214 550										764 429 110	382 214 550	
B 19 55		Restauro e ristrutturazione della Chiesa di San Pietro	Direzione Musei Vaticani	lug-97	giu-99	212 890 475					172 890 475	86 445 240										172 890 475	86 445 240	40 000 000
B 19 56		Chiesa di Santa Caterina dei Parigini Barnabiti (Restauro)	Direzione Musei Vaticani	lug-97	giu-99	470 519 547					470 519 547	235 259 770										470 519 547	235 259 770	
B 19 57		Chiesa di San Pietro (Restauro Facciata)	Direzione Musei Vaticani	mar-98	mar-99	200 000 000																		
B 19 58		Ampliamento del Complesso di S. Marta (Lavori residenziali)	Direzione Musei Vaticani	mar-98	nov-98	150 000 000	7 500 000		7 500 000													7 500 000	7 500 000	
B 19 59		Restauro di Michelangelo (Volta della Cappella Sistina)	Direzione Musei Vaticani	lug-98	dic-98	63 000 000																		
B 19 301		Restauro della Chiesa di S. Pietro in Vincoli (Ristrutturazione)	Direzione Musei Vaticani	giu-98	set-99	372 274 000	40 000 000		40 000 000		312 966 000	156 483 000										352 966 000	196 483 000	
B 19 304		Restauro della Chiesa di S. Giovanni in Laterano (Restauro Facciata)	Direzione Musei Vaticani	gen-98	set-99	627 304 000	70 000 000		70 000 000		599 626 000	299 813 000										669 626 000	339 813 000	
B 19 305		Ristrutturazione del Corpo Nuovo ed Ampliamento della Chiesa di S. Giovanni in Laterano	Direzione Musei Vaticani	giu-98	set-99	643 246 000	50 000 000		50 000 000		380 407 000	190 203 000										430 407 000	240 203 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Termini realizzazione o completamento	Termine completamento opere	COSTO STIMATO	IMPEGNI DI SPESA	Ulteriori disponibilità da reperire	IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ALIENAZIONI BENI E DIRITTI IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			INTERESSI	PAGAMENTI	altre fonti
0 19 304	Ammodernamento e ferr. della Sardegna: ed. Cagliari-Golfo Aranci (Tratto)	Comune di Cagliari	gen-98	set-99	820 823 000	92 000 000		709 391 000	354 795 500							801 591 000	446 795 500	
0 19 305	Adeguamento della Cintura della Metropolitana della Regione Lombardia	Comune di Cagliari	gen-98	set-99	453 724 000	52 000 000		388 901 000	194 450 500							440 901 000	246 450 500	
0 19 306	Ammodernamento della ferrovia della Cintura (Cagliari-Golfo Aranci)	Comune di Cagliari	gen-98	set-99	560 327 000	66 000 000		481 249 900	240 624 950							347 249 900	306 624 950	
0 19 31	Ammodernamento del tronco ferroviario [illegible] per la metropolitana di superficie	Comune di Venezia	mar-98	lug-99	3 070 104 360	175 000 000		2 895 104 360	1 447 552 180							3 070 104 360	1 622 552 180	
0 19 32	Completamento del Passante ferroviario di Torino	Provincia di Torino e Comune di Chivasso	mar-98	ago-99	2 366 953 308	120 000 000		2 246 953 308	449 390 662	674 085 990						2 366 953 308	1 293 476 650	
0 19 33	Metro della Maddalena	Comune della Maddalena e Cantiere	dic-97	dic-99	2 128 411 478	100 000 000		1 778 411 478	355 782 295	533 673 443						1 978 911 478	989 965 295	
0 19 105	Raddoppio e velocizzazione Chivasso-Ivrea	Comune di Torgnano	ago-97	mag-98	162 388 321	10 000 000	2 000 000	132 388 321			129 550 070					162 388 321	110 550 070	
0 19 349	Raddoppio e velocizzazione Chivasso-Ivrea (Cintura)	Comune di Torgnano	ago-97	mag-98	122 788 972	7 500 000	1 500 000	115 288 972	57 644 490							122 788 972	65 144 490	
0 19 340	Progetto per l'ammodernamento, l'ampliamento e il raddoppio della ferrovia Torino-Ceres	Comune di Torgnano	ago-97	mag-99	2 087 813 000	120 000 000	24 000 000	96 000 000	983 907 030							2 087 814 106	1 103 907 030	
0 19 341	Raddoppio della ferrovia Torino-Ceres tratto Torino-Venaria	Comune di Piossasco	feb-99	ago-99	300 000 000	15 000 000		15 000 000								15 000 000	15 000 000	
0 19 345	Raddoppio della ferrovia Torino-Ceres tratto Piossasco-Bivio Airasca	Comune di Piossasco	ago-98	gen-99	200 000 000	10 000 000		10 000 000								10 000 000	10 000 000	
0 19 38	Raddoppio della ferrovia Torino-Ceres tratto Torino-Rivoli	Comune di Rivoli	set-98	ott-99	1 600 000 000	80 000 000		80 000 000								80 000 000	80 000 000	
0 19 37	Raddoppio della ferrovia Torino-Ceres tratto Rivoli-Bivio Airasca	Comune di Rivoli	ago-98	set-99	1 850 000 000	92 250 000		92 250 000								92 250 000	92 250 000	
0 19 39	Lavori di ammodernamento del sistema ferroviario per la Valsesia per la velocizzazione e la sicurezza passeggeri e merci (Novara-Varallo) (1° stralcio funzionale)	Comune di Torino	gen-98	ago-99	804 000 000	40 000 000		738 138 650	369 069 320							738 138 650	499 069 320	
0 19 348	Lavori di ammodernamento della tratta del tronco ferroviario Novara-Varallo (1° stralcio funzionale)	Comune di Grignasco	mar-98	mar-99	488 429 056	25 000 000		463 429 056	231 714 530							488 429 056	256 714 530	
0 19 303	Lavori di ammodernamento e potenziamento della tratta ferroviaria Novara-Varallo (1° stralcio funzionale)	Comune di Grignasco	gen-98	ago-99	201 075 000	10 000 000	-	10 000 000								10 000 000	10 000 000	15 000 000
0 19 36	Ammodernamento della S.S. Cuneo-Ventimiglia	Comune di Mondovì	ago-97	lug-99	499 790 619	25 000 000		417 790 619	83 558 120	125 337 180						442 790 619	233 895 310	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile del Procedimento	Termine ultimazione lavori	Tempi completamento opera	RISORSE PONTE GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Utilizzi Tremonti 1% Conto vincolo	PROGETTAZIONE: Privati 50% Conto vincolo	PROGETTAZIONE: Ulteriori finanziamenti non soggetti al 10% Conto vincolo	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI: 20% e 30% lavorazioni di opera	ACCONTI: altre 4 50% lavorazioni di opera in presenza fatt. di pagamento emessi	ULTERIORI EROGAZIONI: 30% lavorazioni di opera	ULTERIORI EROGAZIONI: Ass. alla conservazione dell'80% e 90% dell'importo di opera	SALDO: 10% all'ultimazione dei contributi non soggetti a vincolo previsionale	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Immobili" nel settore dell'immigrazione	REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Autofinanziamento" nuovo intervento	ALTRI BENEFICIARI: per "immobili" nel settore dell'edilizia residenziale	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
0 19 30	Completamento e Adeguamento Funzionale della stazione	Direzione Trasporto Ferroviario e Sistemi Urbani	nov-97	mag-99	1 500 000 000	1 500 000 000	75 000 000		75 000 000		1 244 715 000	248 943 000	372 414 050										1 319 715 000	497 357 050	
0 19 31	Riqualificazione urbana del Borgo di Ponte e realizzazione del collegamento con via Ostiense	Direzione Trasporto Ferroviario e Sistemi Urbani	lug-98	nov-99	4 729 000 000	4 729 000 000	275 000 000		275 000 000														275 000 000	275 000 000	
0 19 32	S. Cecilia (Nuovo Auditorium, Foresteria e Parcheggio) e Via della Conciliazione	Direzione Beni Culturali	ago-98	mar-99	400 000 000	400 000 000					80 000 000							80 000 000					160 000 000	80 000 000	
0 19 33	Ristrutturazione Museo Civiltà Romana (Quadrilatero) Completamento Lotto Sud	Direzione Beni Culturali	dic-98	dic-99	1 906 803 343	4 906 803 343					1 218 803 343	609 451 670	609 451 670										1 218 803 343	609 451 870	3 000 000 000
0 19 34	Lavori di riqualificazione urbana Ostiense Marconi nella Porta ambrogiana	Direzione Beni Culturali	set-97	mag-99	1 000 000 000	1 000 000 000					828 377 028	414 188 510		290 001 860									828 377 028	704 290 870	
0 19 36	Ristrutturazione Museo Nazionale Preistorico Etnografico "L. Pigorini" Completamento Lotto 1	Direzione Beni Culturali	gen-97	mar-99	1 000 000 000	1 000 000 000	50 000 000																50 000 000	50 000 000	
0 19 38	Restauro Mausoleo della Terza Piramide (Cestio) e Restauro Mura e Porta Ostiense	Direzione Beni Culturali	ago-98	giu-99	1 000 000 000	1 000 000 000																			
0 19 37	Castello Pasquini (Completamento Lotto) Ristrutturazione	Direzione Beni Culturali	lug-98	dic-99	1 000 000 000	1 000 000 000																			
0 19 39	Chiesa di San Giovanni (Completamento Lotto) Restauro	Direzione Beni Culturali	giu-98	giu-99	200 000 000	200 000 000																			
0 19 40	Adeguamento e Potenziamento Funzionale Impianti del Complesso Monumentale del Vittoriano (1° Lotto Funzionale)	Direzione Beni Culturali	set-98	dic-99	1 250 000 000	1 250 000 000																			
0 19 41	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Completamento Lotto) Restauro	Direzione Beni Culturali	ago-98	ago-99	683 400 000	683 400 000																			
0 19 42	Restauro e consolidamento Conservativo e Funzionale del Complesso di S. Giovanni in Laterano	Direzione Beni Culturali	ago-97	giu-99	224 855 727	224 855 727	11 750 000		11 750 000		213 105 727	42 621 150	63 931 720										224 855 727	118 803 870	
0 19 43	Progetto di consolidamento delle Chiese di S. Alessandro	Direzione Beni Culturali	ago-97	dic-98	130 642 227	130 642 227	7 000 000		7 000 000		123 642 227	24 728 450	37 092 670										130 642 227	48 821 120	
0 19 45	Ristrutturazione e restauro di immobili in Piazza della Bocca della Verità	Direzione Beni Culturali	set-97	ago-98	105 593 685	105 593 685	6 250 000		6 250 000														6 250 000	6 250 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi di completamento dell'opera	Tempi di completamento dell'opera	Tempi di completamento dell'opera	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO EFFETTUATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
								IMPEGNI DI SPESA	Utilizzo Fondi Unici di Area obiettivo	Privati 5% Costo obiettivo	Utilizzo fondi pubblici/privati ed 10% Costo obiettivo	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	REGIONE LAZIO (modalità diversa)		ALTRI BENEFICIARI			
													30% a fine lavori	20% a sette mesi dalla fine dei lavori	30% a inizio opere	Rata alla conclusione dell'80% e 10% dell'importo di opera	10% dell'ammontare del certificato di collaudo provvisorio	(Decreto di variazione)	"Accordo" sul sistema dell'immagine	"Accordo" sul sistema dell'accoglienza	per "accordo" sul sistema dell'accoglienza relativi		
0 19 45	Adeguamento strutture e impianti del Museo di Palazzo Venezia	Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio	mar-97	giu-99		10 000 000	179 311 434	10 000 000		10 000 000												10 000 000	10 000 000	
0 19 46	Museo di Villa Giulia - Museo Nazionale Etrusco	Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio	mag-98	gen-99		120 000 000	120 000 000	5 000 000		5 000 000		84 373 226	42 187 610										89 373 226	47 187 610	
0 19 47	Museo di San Martino al Monte	Provincia di Roma	giu-98	giu-99		6 500 000	650 000 000	6 500 000		6 500 000													6 500 000	6 500 000	
0 19 48	Ristrutturazione Biblioteca nel Chiostro	Comune di Lanuvio	mag-97	set-97		99 961 000	99 961 000					96 571 027	48 285 510										96 571 027	48 285 510	
0 19 49	Acquisizione ex Ospedale Consolazione da Roma Capitale	Comune di Roma	ago-97	ago-98		936 086 742	936 086 742	50 000 000		50 000 000		886 086 742	443 043 370										936 086 742	493 043 370	
0 19 50	Ristrutturazione Biblioteca Comunale di Ariccia	Comune di Ariccia	set-98	lug-99		700 000 000	700 000 000	35 000 000		35 000 000													35 000 000	35 000 000	
0 19 51	Adeguamento funzionale Museo Civico	Provincia di Lodi	giu-98	ago-99		1 300 000 000	1 300 000 000	35 000 000		35 000 000													35 000 000	35 000 000	
0 19 52	Adeguamento funzionale Museo Civico	Comprensorio della Valle del Comino	ago-98	set-99		650 901 668	650 901 668	35 000 000		35 000 000		308 701 668	154 350 834										343 701 668	189 350 834	
0 19 53	Restauro e Valorizzazione del Castello di Torrimpietra	Azienda di Stato per le Foreste Demaniali	mar-99	mar-99		999 007 346	999 007 346	55 000 000		55 000 000		934 007 346	467 003 670										989 007 346	522 003 670	
0 19 54	Adeguamento della struttura museale del Castello di Torrimpietra	Comune di Fiumicino	set-98	set-98		232 424 924	232 424 924					232 424 924	50 484 980		75 727 480								232 424 924	126 212 460	
0 19 55	Museo Multimediale Archeologico	Provincia di Roma	set-99	giu-00		615 500 000	615 500 000					615 214 971	307 607 490										615 214 971	307 607 490	
0 19 56	Ristrutturazione Museo Civico (Adeguamento)	Comune di Rocca Priora	set-98	giu-00		333 080 125	333 080 125					271 880 125	54 376 025		81 564 040								271 880 125	135 940 065	
0 19 57	Museo di Storia Naturale (Ampliamento)	Roma Natura s.r.l.	set-99	set-99		240 000 000	240 000 000	7 000 000		7 000 000		132 550 000	66 275 000										139 550 000	73 275 000	
0 19 58	Museo di Villa Giulia (Ampliamento)	Comune di Roma	set-99	giu-00		4 000 000 000	4 000 000 000																		
0 19 59	Museo di Storia Naturale (Ampliamento)	Comune di Storia Naturale	giu-97	giu-99		236 272 400	236 272 400	30 000 000		30 000 000		226 272 400	113 136 200										256 272 400	143 136 200	
0 19 60	Ampliamento Museo Civico di Rocca Priora e Museo di Civitavecchia	Comune di Rocca Priora Museo Civico di Civitavecchia	giu-99	giu-99		430 000 000	430 000 000	22 500 000		22 500 000		407 500 000	203 750 000										430 000 000	226 250 000	
0 19 61	Museo di Storia Naturale (Ampliamento)	Comune di Roma	mar-98	dic-98		300 000 000	300 000 000					291 919 095	145 959 550										291 919 095	145 959 550	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile del finanziamento	Tempi realizzazione opera	Tempi realizzazione opera	IMPORTO FONDO DICEMBRE 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
							IMPEGNI IN SPESA	Utilizzi Tremonti 1% Cassa depositi	Privati 8% Credito sportivo	Liberi finanziamenti non soggetti al 10% Cassa depositi	IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI ORDINARIO STATO	SEZIONE LAZIO (assistenti diversi)		ALTRI SOGGETTA RI			
												80% di spesa, impegni di spesa	20% a saldo, impegni di spesa e/o presentazione certificazione finale	30% impegni di spesa	Altre rate assistenti dell'80% e 20% dell'impegno di spesa	10% dell'importo del certificato di collaudo provvisorio		(Ricevuta di versamento)	"Assistenti" nel settore dell'accoglienza	Volontariato Settore sanità	"Operatori" nel settore delle attività culturali			
5 19 48	Piano di Salvaguardia per il bacino idrografico del Fiume Sarno	Camera di Deputati	ago-98	ago-98	483 803 180	483 803 180	25 000 000		25 000 000		398 802 960	79 760 390	119 640 590									423 802 960	234 401 480	
5 19 46	Area del Comune della Castella (Crotone)	Camera di Deputati	set-99	ago-98	363 473 000	363 473 000	20 000 000		20 000 000		339 873 710	169 937 856										359 873 710	189 937 856	
5 19 49/1	Facoltà Collegio Universitario Ingegneria Edile - Architettura nell'area residuale e di completamento	APQ Sviluppo Locale Collegio Universitario	set-98	giu-97	1 071 006 279	1 071 006 279	41 777 850		41 777 850		539 228 429	264 414 210										571 006 279	306 392 060	560 000 000
5 19 48/1	Facoltà Collegio Universitario Ingegneria Edile - Architettura nell'area residuale e di completamento	APQ Sviluppo Locale Collegio Universitario	set-98	giu-97	164 443 125	164 443 125																		
5 19 44	Ristrutturazione Chiesa di San Francesco	Diocesi di Aversa	nov-97	dic-99	683 006 900	683 006 900	40 000 000		40 000 000		643 006 900	321 503 450										681 006 900	341 503 450	
5 19 45	Chiesa Madre di Pietrelcina (Benevento)	Diocesi di Benevento	giu-97	giu-98	870 224 170	870 224 170	87 083 550		87 083 550		782 276 535	391 138 270		312 910 810								869 360 085	791 132 430	
5 19 46	Ristrutturazione Chiesa di San Giovanni Battista in Ripa Candida	Diocesi di Rapolla	dic-97	giu-99	422 384 000	422 384 000	25 000 000		25 000 000		397 384 000	198 692 000										422 384 000	223 692 000	
5 19 47	Chiesa di Santa Maria Assunta (Benevento) Ristrutturazione e Adeguamento funzionale	Diocesi di Ariano Irpino	dic-97	nov-99	2 750 000 000	2 750 000 000	300 000 000		300 000 000		778 085 900	389 042 950										1 078 085 900	689 042 950	
5 19 48	Chiesa di S. Pietro (Benevento)	Diocesi di Benevento	ago-98	giu-99	675 357 148	675 357 148					675 357 148	337 678 570										675 357 148	337 678 570	
5 19 49	Chiesa di San Rocco	Diocesi di Benevento	set-97	dic-99	300 000 000	300 000 000																		
5 19 76	San Chiesa di S. Maria Assunta in Paternopoli (Avellino)	Diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi	nov-98	ago-99	100 000 000	100 000 000																		
5 19 71	Adeguamento Chiesa Parrocchiale per Parrocchiale	Parrocchia di Paternopoli	dic-97	ago-99	1 110 846 077	1 110 846 077	75 000 000		75 000 000		1 035 846 077	207 168 215										1 110 846 077	281 169 210	
5 19 75	Ristrutturazione della Chiesa di San Francesco di Paola	Diocesi di San Marco dei Cavoti (Benevento)	giu-98	giu-99	60 000 000	60 000 000																		
5 19 72	Ristrutturazione importante della chiesa e del convento di Paternopoli	Diocesi di San Marco dei Cavoti (Benevento)	giu-98	giu-99	100 000 000	100 000 000																		
5 19 74	Ristrutturazione Chiesa di S. Lorenzo Martire, S. Antonio	Diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi	giu-98	giu-99	40 000 000	40 000 000																		

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile e Ref. Amministrativo	Tempi di realizzazione e conclusione (fine)	Tempi completamento opere	EUROPA FONDO GIUBILEO 2000	COSTO ETTARATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Ulteriori Trimestri 1% Costo stimato	PROGETTAZIONE: Periodi 5% Costo stimato	PROGETTAZIONE: Ulteriori finanziamenti non importanti al 10% Costo stimato	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI: 20% e 80% impegno di spesa	ACCONTI: 20% e 80% impegno di spesa con approvazione varianti	ULTERIORI EROGAZIONI: 20% impegno di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: fino alla concorrenza del 80% o min. dell'impegno di spesa	SALDO: 10% del costo finale di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (conto di tesoro): "Assunzioni" sul conto di tesoreria	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (conto di tesoro): Versamento risorse statali	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI BENEFICIARI: per "operazioni" sul conto delle risorse statali	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
B 19 98	Adeguare il Cimitero	Ufficio Cimitero	B.4		1 000 000 000	1 000 000 000																		
B 20	**Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse al Giubileo**																							
B 20 98.1	Opere Prog. Progetto di adeguam. e funz. ex Mattatoio di Testaccio per attività culturali	Opere dell'ufficio di Roma	ott 98	gen-01	15 000 000 000	15 000 000 000																		
B 20 98.2	Interv. Progetto di adeguam. e funz. ex Mattatoio di Testaccio per attività culturali	Amministr. e il Comune di Roma	ott 98	gen-01	13 000 000 000	13 000 000 000																		
B 20 98.3	Interv. Progetto di adeguam. e funz. ex Mattatoio di Testaccio per attività culturali	Opere Roma	ott 98	gen-01	7 000 000 000	7 000 000 000																		
B 20 98.4	Interv. Progetto di valorizzazione Foro Italico per attività culturali	Agenzia Demanio per il Giubileo	ott 98	gen-01	5 000 000 000	5 000 000 000																		
B 20 98.5	Consegne straordinarie	Agenzia Demanio per il Giubileo	ott 98	gen-01	2 000 000 000	2 000 000 000																		
B 20 98.6	Ulteriori finanziamenti patrimonio culturale da Comuni, Province e Regioni	Agenzia Demanio per il Giubileo	ott 98	gen-01	5 000 000 000	5 000 000 000																		
B 20 98.7	Interventi di valorizzazione culturale a Roma	Direzione Roma	ott 98	gen-01	1 000 000 000	1 000 000 000																		
B 20 98.8	Interventi di valorizzazione culturale a Roma	Provincia di Roma	lug 99	gen-01	1 000 000 000	1 000 000 000																		
B 20 98.9	Interventi di valorizzazione culturale Regione Lazio	Regione Lazio	ott 98	gen-01	1 000 000 000	1 000 000 000																		
B 20 98	Opere infrastrutturali per Via Giubileo, Via del Mare	Ferrovie Stato Ferrovie	nov 99	nov 99	2 985 000 000	2 985 000 000																		
					559 225 641 254	607 976 941 254	4 939 168 600	162 350 000	4 588 418 600	268 400 000	88 823 747 750	28 556 152 050	1 334 782 350	2 947 566 199	1 986 389 810		197 750 000	324 845 000 000			418 885 666 350	364 825 329 500	48 745 500 000

C SETTORE C - MANUTENZIONE E ARREDO URBANO , PATRIMONIO AMBIENTALE

C1 Programma di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone maggiormente esposte e programma di abbattimento barriere architettoniche

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile del finanziamento	Termine ultimazione lavori	Fonti copertura spesa	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
							IMPEGNI DI SPESA	Utilizzi Tranches 1% Conto riflesso	Privati Fin. Conto riflesso	Ulteriori finanziamenti non imputati al 1% Conto riflesso	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	REGIONE LAZIO (contributi diversi)		ALTRI BENEFICIARI			
												20% o 50% Impegno di spesa	20% o 50% Impegno di spesa da parte di Roma Capitale	30% Impegno di spesa	Rim. alla presentazione del 50% o 70% dell'impegno di spesa	10% all'ultimazione dei lavori/collaudo provvisorio	(Decreto di trasferimento)	*Importi per lavori già completati	Valorizzazione risorse umane	*per "Spettacoli nel cortile delle antiche mura"		
C 01 01	Parco Regionale Suburbano di Aguzzano e Villa Sciarra (Roma)	Comune di Roma	mar-98	dic-99	7 009 951 742	7 009 951 742					5 841 626 450	1 168 325 290									5 841 626 450	1 168 325 290	
C 01 02	Parco Delle Ciliegie, Delle Sabine, Delle Tre Fontane (Roma)	Comune di Roma	mar-98	dic-99	8 151 363 442	8 151 363 442					6 792 802 868	1 358 560 570									6 792 802 868	1 358 560 570	
C 01 03	Parco Regionale e Tenuta	Comune di Roma	mar-98	dic-99	8 622 871 543	8 622 871 543					7 185 726 286	1 437 145 250									7 185 726 286	1 437 145 250	
C 01 04	Parco Archeologico e naturale monumentale	Comune di Roma	dic-97	lug-99	2 689 000 000	2 689 000 000					2 550 365 400	511 673 080									2 550 365 400	511 673 080	
C 01 05	Parco archeologico e naturale Valle Aurelia	Comune di Roma	nov-98	dic-99	3 334 069 912	3 334 069 912	80 000 000	80 000 000			3 174 069 912	1 587 034 950									3 174 069 912	1 587 034 950	
C 01 06	Parco Pubblico Urbano e naturale di recupero	Comune di Roma	dic-97	lug-99	2 138 803 758	2 138 803 758	180 000 000	36 000 000		143 180 000	1 615 019 289	323 003 850									1 795 019 289	503 003 850	
C 01 07	Parco Archeologico Urbano (Caserma) di progetto, restauro e uso Ippico Roma	Comune di Roma	dic-97	set-99	2 554 975 300	2 554 975 300	70 000 000	36 500 000		33 500 000	2 336 138 827	471 227 765									2 426 138 827	341 227 765	
C 01 08	Istituzione ecclesiale nazionale alla Basa (Fiano Romano)	Comune di Roma			990 000 000		990 000 000		990 000 000												990 000 000	990 000 000	-990 000 000
C 01 09	Istituzione ecclesiale nazionale alla Basa (Fiano Romano)	Comune di Roma			400 000 000		400 000 000		400 000 000												400 000 000	400 000 000	-400 000 000
C 01 10	Parco Pubblico e Tenuta, Parco Archeologico, Parco Naturale, Parco Regionale, Parco Archeologico e Tenuta Agricola	Comune di Roma	set-98	nov-99	3 243 963 042	3 243 963 042	250 000 000	50 000 000		200 000 000	2 016 374 296	926 675 720									2 016 374 296	926 675 720	
C 01 11	Via Clodia, Via Cassia, Via Flaminia, Via Tiberina, Via Salaria, Via Nomentana, Via Prenestina, Via Tuscolana (Roma)	Comune di Roma	apr-98	nov-99	2 228 821 726	2 228 821 726					2 016 374 296	926 675 720									2 016 374 296	926 675 720	
C 01 12	Via Ostiense, Via Cristoforo Colombo, Via Ostiense (Roma)	Comune di Roma	set-98	lug-99	2 894 623 446	2 894 623 446					2 894 623 445										2 894 623 445		

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Termini amministrativi di completamento delle opere	Termini temporali della copertura finanziaria	RISORSE POR/PON (FESR/FSE) 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Utilizzi 1° anno (Cassa stimata)	PROGETTAZIONE: Privati 25% Cassa stimata	PROGETTAZIONE: Liquidazioni dopo collaudo 10% Cassa stimata	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI: 20% o 25% impegno di spesa	ACCONTI: 20% o 25% impegno di spesa non di competenza esercizio	LIQUIDAZIONI: 20% impegno di spesa	EROGAZIONI: Rata saldo rimanente dell'80% o 95% dell'impegno di spesa	SALDO: 10% del contributo dopo collaudo e rilascio certificato	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Impegnato" nel settore dell'immigrazione	REGIONE LAZIO (mandati diretti): Voce beneficiario ultimo	ALTRI BENEFICIARI: per "Impegnato" nel settore dell'immigrazione	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
C 01 135	Completamento di edificio a uso di Polo Didattico e Centro Residenziale e relative opere di completamento, recinzione, sistemazione esterna, impiantistica, allacciamenti e opere connesse	Comune di Fiano	giu-98	nov-99	4 500 000 000	4 500 000 000	340 000 000	115 000 000		225 000 000													340 000 000	340 000 000	
C 01 145	Interventi sulla strada dell'Acquedotto di Traiano e Polo Museale di Colle Mario, Tagliacozzo e zone limitrofe, Comune di Tagliacozzo	Comune di Fiano	gen-99	nov-00	7 000 000 000	7 000 000 000																			
C 01 14	Via Di Decima, tra Castel di Leva e Malafede, Comune di Roma	Comune di Roma	lug-98	set-99	8 265 515 736	8 265 515 736	300 000 000	115 000 000		65 000 000													300 000 000	300 000 000	
C 01 18	Via Appia Antica, Ristrutturazione e completamento edificio sede della Polizia Municipale di Roma	Comune di Roma	LIBERALIZZATO	LIBERALIZZATO	1 000 000 000		1 000 000 000	200 000 000		800 000 000													1 000 000 000	1 000 000 000	
C 01 165	Via Appia Antica, 2° stralcio funzionale, completamento edificio sede della Polizia Municipale di Via di Decima Malafede	Comune di Roma	ago-98	nov-99	3 587 322 850	3 587 322 850	2 754 312 849	1 377 156 420			2 754 312 849	1 377 156 420											2 754 312 849	1 377 156 420	
C 01 166	Via Appia Antica, 2° stralcio funzionale, completamento edificio sede della Polizia Municipale di Via di Decima Malafede	Comune di Roma	set-98	nov-99	9 681 073 728	9 681 073 728																			
C 01 16	Adeguamento e riuso Fontana Monumentale e Piazza all'Acqua Paola sul Gianicolo (parte bassa)	Comune di Roma	LIBERALIZZATO																						
C 01 17	Via Paolo Emilio, Ristrutturazione del plesso scolastico di Via La Spezia 81	Comune di Roma			300 000 000		300 000 000	140 000 000		160 000 000													300 000 000	300 000 000	
C 01 188	Via Borgo Pio, Parco archeologico del Parco Paolo Aron e Edificio Scuola, progetto di recupero della Caserma	Comune di Roma	dic-98	set-99	2 000 000 000	2 000 000 000	100 000 000	20 000 000		80 000 000													100 000 000	100 000 000	
C 01 185	Via Borgo Pio, progetto per il recupero e completamento di Via Borgo Pio, Vaticano, dalla Caserma alla Porta Cavalleggeri	Comune di Roma	dic-98	set-99	2 165 000 000	2 165 000 000	100 825 000	21 650 000		79 200 000													100 825 000	100 850 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi completamento opera	Tempi completamento progettazione	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI							EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
							IMPEGNI DI SPESA	Utilizzi Tremonti 1% L.com. obbligo	Fondi Fio (Turismo) obbligo	Utilizzi Tremonti non superiori al 10% L.com. obbligo	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONI E AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	REGIONE LAZIO (somme già disponibili)		ALTRI BENEFICIARI			
												30% o 50% impegno di spesa	20% o 30% impegno di spesa non a fronte di stati di avanzamento lavori	30% impegno di spesa	Non alla sottoscrizione dell'80% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'erogazione del precedente		(Decreto di trasferimento)	"Somme" nel settore dell'emergenza	Variazioni rispetto stanziamento	"Somme" nel settore dell'emergenza			
C 01 11	Via Borgiana, Cambio Aqua in Acquapendente e Radicofani, Valle Orcia, Radicofani, Pienza e itinerari degli eventi tradizionali	Comune di Roma	giu-99	giu-98	1 098 160 820	1 098 160 820					915 133 850											915 133 850		
C 01 20	Via Borgiana, Parco del Lago di Bolsena e del promont.	Comune di Roma	mar-99	mar-98	875 455 525	875 455 525	36 000 000	11 800 000		24 100 000												36 000 000	36 000 000	
C 01 315	Via Dora Francia, restauro ed allestimento del Tracciato di Via Appia antica ed itinerari e del Centro per l'antico Acquedotto romano	Comune di Roma	dic-98	set-98	3 000 000 000	3 000 000 000	150 000 000	30 000 000		120 000 000												150 000 000	150 000 000	
C 01 316	Via Dora Francia, Complesso monumentale	Comune di Roma	nov-98	set-98	2 353 000 000	2 353 000 000	117 750 000	23 550 000		94 200 000												117 750 000	117 750 000	
C 01 317	Via Dora Francia, Complesso Domus di Ciampino	Comune di Roma	giu-98	giu-98	1 494 479 506	1 494 479 506	114 289 000	22 840 000		91 360 000	1 380 279 506	760 139 950										1 494 479 506	904 339 950	
C 01 318	Via Dora Francia, Quinto Stabiano e Villa Domus Pacis e altre emerse	Comune di Roma	giu-98	giu-98	1 497 997 384	1 497 997 384	100 000 000	20 000 000		80 000 000												100 000 000	100 000 000	
C 01 33	Via Dora Francia, Parco Archeologico del Celio	Comune di Roma	set-98	set-98	1 350 958 910	1 350 958 910	63 000 000	21 630 000		41 380 000												63 000 000	63 000 000	
C 01 34	Via Francigena (Lazio)	Comune di Roma	set-98	ago-97	1 789 260 685	1 789 260 685																		
C 01 38	Via Dora Francia, restauro dell'area da Quarto Vico a Villa Adriana	Comune di Roma	set-98	set-99	1 180 000 000	1 180 000 000																		
C 01 36	Progetto unitario di Parco Archeologico del Celio, Via dei Fori, Via Appia Antica, Via Tuscolana, Via Nomentana e area San Giovanni	Comune di Roma	set-98	dic-99	9 000 000 000	9 000 000 000																		
C 01 38	Fontanile	Comune di Roma	dic-99	ago-99	2 612 000 000	2 612 000 000																		
C 01 39	Lungo per Tivoli e Villa Adriana	Comune di Roma	giu-99	mar-99	1 970 000 000	1 970 000 000																		
C 01 39	Infrastrutture di valle, Lungo Aniene	Comune di Roma	giu-99	nov-99	5 000 000 000	5 000 000 000																		

C1) Interventi di adeguamento della struttura per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, Itinerari giubilari e catacombe)

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile del Procedimento	Termine ultimo di conclusione dei lavori	Termine completamento opere	IMPORTO FINANZIATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Utilizz. Termini Utilizz. Fondo rotazione	PROGETTAZIONE: Periodi 5% Conto edilizio	PROGETTAZIONE: Ulteriori finanziamenti ed 10% Conto edilizio	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI: 20% a 90% lavoratori di spesa	ACCONTI: 20% a 20% lavoratori di spesa con il decreto [illegible]	ULTERIORI EROGAZIONI: 20% lavoratori di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: Ass. [illegible]	SALDO: 10% [illegible]	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMONTARE DI ONERI DELLO STATO	REGIONE LAZIO: "Trasferiti" [illegible]	REGIONE LAZIO: Valorizzazione risorse umane	ALTRI BENEFICIARI	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
C 42 A	Asse della Direttrice di Roma (Roma) Stazione Tiburtina – Interventi [illegible]	RFI	giu-99	apr-99	2 625 700 000																			
C 42 A	Asse della Direttrice di Roma (Roma) Stazione Tiburtina – Interventi [illegible]	Comune di Roma	DISACCORDO EGATO E SOSTITUITO			1 282 308 210		1 282 308 210										1 282 308 210				1 282 308 210		
C 42 A 11	TRAM - Progetto di riqualificazione [illegible]	Comune di Roma	ago-99	nov-99	5 347 538 000																			
C 42 A 12	TRAM - Progetto di riqualificazione [illegible]	Comune di Roma	ago-99	nov-99	9 425 458 000																			
C 42 A 13	TRAM - Progetto di riqualificazione [illegible]	Comune di Roma	ago-99	nov-99	4 583 604 000																			
C 42 A 15	Asse della Direttrice di Roma (Roma) Stazione Tiburtina – [illegible]	ATAC	mar-99	dic-99	1 869 560 000																			
C 42 A 16	Asse della Direttrice di Roma (Roma) Stazione Tiburtina – [illegible]	ATAC	apr-99	nov-00	907 430 000																			
C 42 A 18	Asse della Direttrice di Roma (Roma) Stazione Tiburtina – [illegible]	Assessorato [illegible]	apr-99	nov-99	2 805 000 000																			
C 42 A 19	Interconnessione [illegible] Roma [illegible]	Roma Metropolitane	apr-99	apr-99	1 446 500 000																			

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile dell'Intervento	Tempi di realizzazione dell'intervento	Tempi procedurali e di spesa	REGIONE STATO CATANIA 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Utilità Tecniche (1% C.tto esterno)	PROGETTAZIONE: Privati Ris. Costo effettivo	PROGETTAZIONE: Rimborsi non superiori al 10% C.tto esterno	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI: 30% + 40% Impegno di spesa	ACCONTI: 20% + 40% Impegno di spesa + 10% Collaudo tecnico amm.vo	ULTERIORI EROGAZIONI: 30% Impegno di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: Non alla sottoscrizione dell'Atto Integrativo di spesa	SALDO: 10% del costo effettivo di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI E AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Quietanza" sul mandato dell'assessore	REGIONE LAZIO (mandati diretti): Valori bollati rilascio mandato	ALTRI BENEFICIARI: per "quietanza" (specificare nella colonna relativa)	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
C 01 007	Ristrutturazione ed ampliamento ex Mercato Ittico di Fiumicino	Comune di Fiumicino	2000 e s.s.	gen.-98	mar.-99	9 240 000 000																		
C 01 001	Completamento itinerario ATAC-via Cilicia Prolungamento da Subaugusta a Cinecittà	Comune di Roma	dic.-97	dic.-98	gen.-99	1 784 437 815					1 732 062 489	1 558 856 240									1 732 062 489	1 558 856 240	
C 01 005	Asse Via Nomentana e Asse Viaggiante e Asse Circonvallazione Interna e riqualificazione della Via Nomentana e realizzazione di parcheggi in corrispondenza delle stazioni	Comune di Roma					1 321 981 510			1 321 981 510	1 321 981 510										1 321 981 510	1 321 981 510	
C 01 013.1	Centro di Protezione civile	Comune di Roma	apr.-99	nov.-99		400 000 000																	
C 01 013.3	"SDO" Progetto di realizzazione di un sistema direzionale orientale nella zona di Centocelle	Comune di Roma	apr.-99	nov.-99		9 932 494 000																	
C 01 013.3	"SDO" Progetto di realizzazione di un sistema direzionale orientale nella zona di Centocelle	Comune di Roma	apr.-99	nov.-99		4 943 242 000																	
C 01 013.3	"SDO" Progetto di realizzazione di un sistema direzionale orientale nella zona di Centocelle	Comune di Roma	apr.-99	nov.-99		5 211 681 000																	
C 01 013.3	"SDO" Progetto di realizzazione di un sistema direzionale orientale nella zona di Centocelle	Comune di Roma	apr.-99	nov.-99		1 909 836 000																	
C 01 013.3	"SDO" Progetto di realizzazione di un sistema direzionale orientale nella zona di Centocelle	Comune di Roma	apr.-99	nov.-99		1 410 753 000																	
C 01 010	Interventi finalizzati alla realizzazione del Nuovo Centro Direzionale di Roma ed il collegamento con la Via Ostiense	Azienda Comunale di Edilizia Abitativa	mag.-99	nov.-99		14 139 000 000	706 450 000		706 450 000	706 450 000											706 450 000	1 412 900 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile del finanziamento	Termine ultimazione lavori	Termine ultimazione spesa	COSTO DI ITALIA 10	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Utilità Triennio 1% Conto rilancio	PROGETTAZIONE: Prelievi 2% Conto rilancio	PROGETTAZIONE: Ulteriori finanziamenti nel triennio 1% Conto rilancio	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI SOGGETTI	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
C 48 454	Asse delle Barriere e di Circonv. ESI Tangenz. E Circon. di Ancona, Asse Autostrad. e Asse Autostrad. e collegam. vari	AAA	apr-99	nov-00	1 656 866 000															
C 48 466	Asse delle Barriere e Asse Circonv. Asse Tangenz. e Asse Autostrad. Circon. Settentrionale di Firenze, Asse Autostrad. e collegamento di Firenze	Autostrade dell'Arno	apr-98	nov-99	2 385 350 000															
C 48 467	Asse delle Barriere e Asse Tangenz. e Asse Circon. di Cesena, Asse Autostrad. e collegam. vari	ANAS	mar-99	dic-99	3 864 003 000															
C 48 505	Asse delle Barriere e Asse Port. N. Asse Autostrad. e Asse Autostrad. e collegamento di Ancona	Comune di Ancona				886 575 270		886 575 270										886 575 270	886 575 270	
C 48 511	"PAIP" Progetto di riqualificazione e di Piano ed area Autostrad. Asse delle Barriere di Pesaro	Comune di Pesaro	apr-99	nov-99	8 934 648 000															
C 48 512	"LAP" Progetto di riqualificazione e di Piano ed area Autostrad. Asse delle Barriere di Pesaro	Comune di Pesaro	apr-99	nov-99	1 482 318 000															
C 48 513	"QPT" Progetto di riqualificazione e di Piano ed area Autostrad. Asse delle Barriere di Pesaro	Comune di Pesaro	apr-99	nov-99	820 927 000															
C 48 505	Asse delle Barriere e Asse Port. N. Asse Autostrad. e Asse Autostrad. e collegamento di Ancona	ANAS	mar-99	dic-99	1 943 700 000															

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile del Procedimento	Tempi completamento opere	Tempi completamento procedure	BUDGET FONDO CATULLO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI IN SPESA	PROGETTAZIONE: Utilizzi Tremonti 1 bis Credito edilizio	PROGETTAZIONE: Privati 15% Credito edilizio	PROGETTAZIONE: Ulteriori finanziamenti da reperirsi ad integrazione del budget	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI: 80% o 60% impegno di spesa	ACCONTI: 20% o 40% (a fine lavori o a stati avanzamento lavori)	ULTERIORI EROGAZIONI: 20% impegno di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: Ove alla rendicontazione dell'80% o 60% dell'impegno di spesa	SALDO: 10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI CASE E TERRENI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ANTICIPATAZIONE ON LEGGE STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (somme dovute): "Quantificate" nel milione dell'accordo	REGIONE LAZIO (somme dovute): Valorizzazione risorse stanziate	ALTRI SOGGETTI: per "quantificate" nel milione dello schema ridotto	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
C 45 Rm1	Area della Stazione e di Piazza Porta Maggiore: riqualificazione e valorizzazione per il nuovo centro	Atac	ago-99	nov-00	386 534 000	386 534 000																			
C 46 Rm2	Area della Stazione di Roma Ostiense-Porta San Paolo: riqualificazione, valorizzazione, completamento e adeguamento funzionale	Direzione da definirsi	ago-99	dic-99	1 491 600 000	1 491 600 000																			
C 47 Rm3	Area della Stazione di Roma Ostiense-Porta San Paolo: riqualificazione, valorizzazione, completamento e adeguamento funzionale della Stazione e di Porta San Paolo e delle aree ex scalo merci Ostiense e Trastevere	P. Aree in Roma e in Italia	ago-99	nov-99	1 256 330 000	1 256 330 000																			
C 48 Rm4	Nuova stazione Tiburtina e riqualificazione delle aree limitrofe	Comune di Roma																							
C 49 Rm5	Stazione Tiburtina e nuova Centralità per la riqualificazione delle aree limitrofe e ferroviarie	Comune di Roma	dic-98	nov-99	10 000 000 000	10 000 000 000																			
C 50 Rm6	Quadrilatero per interventi di riqualificazione urbana negli ambiti prossimi alla Stazione Tiburtina	Comune di Roma	gen-99	dic-00	10 000 000 000	10 000 000 000																			
C 51 Rm7	Area ex Mercati Generali: riqualificazione urbanistica e ambientale	Comune di Roma	gen-99	dic-00	5 000 000 000	5 000 000 000																			
C 52 Rm8	Parco urbano nella valle di Roma	Comune di Roma	mar-99	nov-99	7 400 000 000	7 400 000 000																			
C 53 Rm9	Stazione sperimentale di Centocelle-Archeologia	ATAC	dic-98	nov-99	3 000 000 000	3 000 000 000																			
C 54 Rm10	ATAC Riqualificazione e nuova costruzione delle rimesse di Magliana e Tor Sapienza	Comune di Roma	n.d.	n.d.	7 264 911 000	7 264 911 000																			
C3	Azienda turismo: razionalizzazione della ricettività alberghiera ed incentivi per l'adeguamento della terza e quarta categoria																								
C 55 Rm11	Centro Via dei Fori Imperiali (Palatino) per la valorizzazione delle aree archeologiche	Comune di Roma	gen-99	nov-99	2 400 000 000	2 400 000 000	120 000 000	24 000 000		96 000 000													120 000 000	120 000 000	
C 56 Rm12	Sede prestigiosa in grado della Soprintendenza Speciale e Direzione Regionale per la valorizzazione dei beni culturali	Comune di Roma	mar-98	mag-99	405 648 350	405 648 350																			
C 57 Rm13	Via dei Fori Imperiali	Comune di Roma	mag-98	nov-99	2 333 908 900	2 333 908 900	130 000 000		130 000 000														130 000 000	130 000 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Realizzatore del Completamento	Termine ultimazione lavori	Tempi completamento opere	EUROBOB FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: I Stralcio Tecnico Fin. Costo stimato	PROGETTAZIONE: Privati 25% Costo stimato	PROGETTAZIONE: I Stralcio non finanziato dal 25% Costo stimato	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI: 20% o 30% Impegno di spesa	ACCONTI: 20% o 30% Impegno di spesa con il massimo del 90% complessivo	ULTERIORI EROGAZIONI: 80% Impegno di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: Non oltre concorrenza dell'85% o 95% dell'impegno di spesa	SALDO: 20% all'ottenimento di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMONTARE DEL MUTUO A CARICO DELLO STATO (Decreto di ripartizione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Immediati" nel settore dell'ortofrutticolo	REGIONE LAZIO (mandati diretti): Volontà politiche (Camera Interna)	ALTRI SOGGETTI: per "Immediati" nel settore delle attività ittiche	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
L 03 04	Completamento della Rete Ferroviaria Alta Velocità	Camera di Deputati	ott-98	ott-99	3 257 956 147	3 257 956 147	90 000 000	46 000 000		44 000 000	3 167 986 147											3 257 986 147	90 000 000	
C 03 05	Interventi sull'edilizia scolastica della Città Amministrativa	Camera di Deputati			1 000 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000													1 000 000 000	1 000 000 000	-1 000 000 000
C 03 06	Interventi per la riqualificazione ed il disagio metropolitano in Palermo	Camera di Deputati	ott-98	dic-99	112 500 000 000	112 500 000 000																		
C 03 07	Interventi per la riqualificazione urbanistica ed il disagio metropolitano in Milano	Camera di Deputati	dic-98	dic-99	27 500 000 000	27 500 000 000																		
C 03 08	Completamento Tangenziale Nord Catania e Svincolo Misterbianco	Camera di Deputati	dic-98	dic-99	5 000 000 000	5 000 000 000																		
C 03 09	Interventi per la riqualificazione urbana e ambientale	Regione Lazio	n.d.	n.d.	2 000 000 000	2 000 000 000																		
C4	Area di Canal Grande, Adeguamento delle infrastrutture																							
C 04 01	Terminal Bus	Camera di Deputati/Comune di Venezia	DISACQUISTO EDIFICIO L SUBITTUTO				73 000 000		73 000 000												73 000 000	73 000 000	
C 04 02bis	Area di Canal Grande (Rialto) Ordine intervento e messa in sicurezza	Camera di Deputati/Comune di Venezia	DISACQUISTO EDIFICIO E SUBITTUTO				600 000 000		600 000 000												600 000 000	600 000 000	
C 04 02bis	Area di Canal Grande (Rialto) Opere di prima sistemazione	Camera di Deputati/Comune di Venezia	DISACQUISTO EDIFICIO E SUBITTUTO				300 000 000		300 000 000												300 000 000	300 000 000	
C 04 03	Area di Canal Grande (Rialto) Opere di pavimentazione	Camera di Deputati/Comune di Venezia	DISACQUISTO EDIFICIO E SUBITTUTO				82 500 000		82 500 000												82 500 000	82 500 000	
C 04 04	Area di Canal Grande (Rialto) Ponte Nuovo, Ristrutturazione "Ca d'Oro"	Camera di Deputati/Comune di Venezia	DISACQUISTO EDIFICIO E SUBITTUTO				60 000 000		60 000 000												60 000 000	60 000 000	
C 04 A	Terminal Bus	Camera di Deputati/Comune di Venezia	ott-98	apr-99	1 300 000 000	1 300 000 000																		
C 04 B	Centro servizi di terra	Camera di Deputati/Comune di Venezia	ott-98	apr-99	1 500 000 000	1 500 000 000																		
C 04 C	Adeguamento protezione di Via Marittima	Camera di Deputati/Comune di Venezia	ott-98	apr-99	300 000 000	300 000 000																		
C 04 D	Realizzazione nuovo terminal per navi da crociera	Camera di Deputati/Comune di Venezia	ott-98	apr-99	550 000 000	550 000 000																		
C 04 E	Ristrutturazione della viabilità urbana	Camera di Deputati/Comune di Venezia	ott-99	mar-99	3 500 000 000	3 500 000 000																		
C 04 F	Ristrutturazione della passeggiata sul Bacino	Camera di Deputati/Comune di Venezia	ott-98	mar-99	2 500 000 000	2 500 000 000																		

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi di realizzazione dell'opera	Tempi completamento funzionale opera	RIPARTIZIONE PONTE GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Lire Tremilacinquecentomila (pari al 1,5% del costo stimato)	PROGETTAZIONE: Prima del 5% (costo stimato)	PROGETTAZIONE: Lire Tremilacinquecentomila (non superiori al 10% del costo stimato)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 80% o 90% (secondo il tipo di opera)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% o 10% (secondo il tipo di opera e come da decreto di approvazione del progetto esecutivo)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: 20% (secondo il tipo di opera)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: Non oltre complessivo dell'80% o 90% dell'importo di opera	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO: 10% (o diversa percentuale prevista dal certificato di collaudo)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Immediate" sul settore delle compilazioni	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandati diretti): Volturazione risorse liberate	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI BENEFICIARI	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
C 96 H	Progetto preliminare Ponte Sisto su Via Giulia	Camera di Commercio	set-98	nov-99	1 400 000 000	1 400 000 000																			
C3	Giardini di Castel Sant'Angelo. Interventi di manutenzione																								
C 98 010	Lavori di recupero ed manutenzione e gestione dei Giardini	Comune di Roma	gen-99	nov-99	3 300 000 000	3 300 000 000	70 000 000		70 000 000													70 000 000	70 000 000	
C 98 042	Lavori di recupero ed manutenzione del Museo	Comune di Roma	gen-99	gen-99	1 700 000 000	1 700 000 000	35 600 000		35 600 000													35 600 000	35 600 000	
C4	Giardini San Giovanni in Via Tiburtina. Interventi di manutenzione																								
C 98 01	Giardini di San Giovanni in Via Dante Alighieri (Roma) Giardini di via Tiburtina (Roma) Interventi di restauro e gestione	Comune di Roma	dic-98	set-99	3 300 000 000	3 300 000 000	175 000 000		175 000 000													175 000 000	175 000 000	
C7	Parco Cestio e Lungotevere Testaccio. Interventi di riqualificazione e verde																								
C 97 01	Parco Cestio e Lungotevere Testaccio. Giardini di via Ostiense (Roma)	Comune di Roma	dic-98	ott-99	2 000 000 000	2 000 000 000	224 000 000		224 000 000													224 000 000	224 000 000	
C8	Restauro del Parco di Villa Borghese																								
C 98 015	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro delle Cavallerizze Pinciane	Comune di Roma	gen-97	dic-98	1 720 816 795	1 720 816 795	85 500 000		85 500 000		1 397 763 926	2 795 527 790										1 483 363 926	2 881 027 790	
C 98 015	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro del Lago	Comune di Roma	ago-99	dic-98	3 000 000 000	3 000 000 000	150 000 000		150 000 000													150 000 000	150 000 000	
C 98 015	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro Tea Pompeiana e Ninfeo del parco monumentale	Comune di Roma	set-98	set-98	1 403 367 495	1 403 367 495	126 000 000		126 000 000		1 219 313 397	243 863 060										1 343 313 397	367 863 060	
C 98 014	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro Ninfeo dell'Aqua Paola	Comune di Roma	dic-98	gen-99	1 939 750 000	1 939 750 000	130 000 000		130 000 000		2 751 800 193	550 360 380										2 881 800 193	680 360 380	1 000 000 000
C 98 015	Restauro del parco di Villa Borghese: Ponte sul lago	Comune di Roma	gen-99	set-99	1 000 000 000	1 000 000 000	50 000 000		50 000 000													50 000 000	50 000 000	
C9	Riqualificazione del Portale delle Cafforelle e degli Acquedotti (Appio Latino)																								
C 98 01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Interventi di riqualificazione degli acquedotti	Comune di Roma	lug-98	lug-99	3 281 442 382	3 281 442 382	175 000 000		175 000 000		3 106 442 382	2 475 267 530										3 281 442 382	2 650 267 530	
C 98 031	Riqualificazione del portale delle Cafforelle e degli Acquedotti (Appio Latino) Parco delle Cafforelle, degli Acquedotti (Appio Latino) Parco delle Cafforelle, Villa Lazzaroni fino a via Tuscolana	Comune di Roma	set-98	nov-99	3 548 052 795	3 548 052 795	198 409 090		198 409 090		3 349 643 705											3 548 052 795	198 409 090	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile del procedimento	Termine ultimo procedimento	Termine ultimo completamento opere	RIPARTO FONDO CIPE DEL 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Effetti finanziari 1 Per Cento riserva	PROGETTAZIONE: Primo 6% Costo stimato	PROGETTAZIONE: Ulteriori finanziamenti non coperti dal 6% Costo stimato	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI: 80% a 95% Impegni di spesa	ACCONTI: oltre il 95% Impegni di spesa oltre il 95% costo stimato	ULTERIORI EROGAZIONI: 20% Impegni di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: Rate di ammontare dell'8% o 10% dell'importo di spesa	SALDO: 15% all'ottenimento del certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONE CONTROLLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Immediata" nel settore dell'immigrazione	REGIONE LAZIO (mandati diretti): Valore residuo	ALTRI SOGGETTI: per "immediata" nel settore delle attività culturali	PAGAMENTI	PAGAMENTI	altre fonti
C 10	**Restauro del Ponte di Villa Ada Savoia**																							
C 10 01	Restauro del ponte Villa Ada Savoia	Comune di Roma	dic-98	mar-99	5 500 000 000	5 500 000 000	326 590 910		326 590 910														326 590 910	326 590 910
C 10 02	Restauro del ponte Villa Ada Savoia, completamento, opere accessorie, sistemazione a giardino e completamento a carico del comune	Comune di Roma	ago-98	mar-99	2 568 974 787	2 568 974 787	300 000 000		500 000 000		2 268 974 787	1 134 487 393											2 568 974 787	1 434 487 393
C 11	**Recupero dell'area di San Gregorio al Celio**																							
C 11 01/1	Area archeologica del Clivo Scauro e del Celio: restauro e consolidamento	Comune di Roma	lug-98	lug-99	1 000 000 000	1 000 000 000	117 135 000		117 135 000														117 135 000	117 135 000
C 11 01/2	Area archeologica del Clivo Scauro e del Celio: restauro e consolidamento	Comune di Roma	set-98	set-99	3 500 000 000	3 500 000 000	350 717 600		350 717 600														350 717 600	350 717 600
C 11 02	Area archeologica del Clivo Scauro (lotto funzionale)	Comune di Roma	mag-98	giu-99	2 844 272 653	2 844 272 653					2 388 560 551												2 388 560 551	
C 11 03	Area archeologica del Clivo Scauro: restauro e fruizione	Comune di Roma	set-98	ago-99	1 281 987 551	1 281 987 551	108 444 600		108 444 600														108 444 600	108 444 600
C 11 04	Area archeologica del Clivo Scauro: restauro e valorizzazione	Comune di Roma	set-98	set-99	616 459 817	616 459 817																		
C 11 05	Passeggiata archeologica del Celio: restauro e fruizione tra via Labicana e via di San Gregorio	Comune di Roma	dic-98	lug-99	4 000 000 000	4 000 000 000																		
C 11 06	Area archeologica del Clivo Scauro e via di Valle Giulia	Comune di Roma	set-98	lug-99	2 500 000 000	2 500 000 000	149 083 200		149 083 200														149 083 200	149 083 200
C 11 07	Area archeologica del Celio: restauro e fruizione	Comune di Roma	set-98	mar-99	301 710 333	301 710 333																		
C 11 08	Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo (restauro)	Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma	mar-98	mar-98	396 909 888	396 909 888														450 000 000			450 000 000	450 000 000
C 11 09	Chiesa di San Gregorio Magno (restauro)	Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma	feb-99	feb-99	250 000 000	250 000 000														250 000 000			250 000 000	250 000 000

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Tipologia intervento	Tempi di completamento opere	TURISMO	TURISMO FONDO 1457 MILIARDI 2000	CURTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: I Rat Fondi 1% Conto chiusura	PROGETTAZIONE: Privati 8% Conto chiusura	PROGETTAZIONE: Cheschesi non superiori al 10% Conto chiusura	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% o 30% Impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% o altra Impegno di spesa a fine avanzamento lavori	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: 20% Impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: Non alla conservazione dell'80% o 90% della spesa di opere	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO: 10% del contributo di edilizia provvisoria	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Spostati" sul capitolo	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandati diretti): Valorizzazione risorse umane	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI BENEFICIARI	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
C 13	Ristrutturazione conservativa e parziale delle facciate di Monte Mario e Casale Mellini																							
C 13 015	Parco di Monte Mario – Casale Mellini: Recupero dei casali Mellini	Comune di Roma	ott.-98	nov.-99		2 317 332 996	2 317 332 996	274 376 000		274 376 000		274 376 000										274 376 000	274 376 000	
C 13 017	Parco di Monte Mario e casale Mellini: Interventi conservativi sugli immobili degli ex casali	Comune di Roma	gen.-99	nov.-99		4 300 000 000	4 300 000 000	123 000 000		123 000 000		123 000 000										123 000 000	123 000 000	
C 14	Bonifica della pineta del Circuncio																							
C 14 08	Pineta del Circuncio: Bonifica e risanamento delle aree a rischio	Comune di Roma	nov.-98	nov.-99		2 999 276 035	2 999 276 035	150 000 000		150 000 000		150 000 000										150 000 000	150 000 000	
C 15	Musealizzazione archeologica e restauro del Parco di Colle Oppio																							
C 15 01	Parco di Colle Oppio (Roma): Interventi di valorizzazione del patrimonio	Comune di Roma	dic.-98	lug.-99		1 000 000 000	1 000 000 000	50 000 000		50 000 000		50 000 000										50 000 000	50 000 000	
C 15 02	Parco di Colle Oppio (Roma): Restauro Domus Aurea e via Terme di Tito	Comune di Roma	ott.-98	ott.-99		1 440 867 730	1 440 867 730	60 000 000	20 000 000	40 000 000		60 000 000										60 000 000	60 000 000	
C 16	Riqualificazione ambientale nella periferia di Roma																							
C 16 01	Parco archeologico di pertinenza e immediato	Comune di Roma	nov.-97	giu.-99		1 000 000 000	1 000 000 000					716 742 041	358 371 020									716 742 041	358 371 020	
C 16 02	Recupero delle Tenute (Tenuta di Castelporziano, Tenuta di Decima e Tenuta di Capocotta)	Provincia di Roma	lug.-98	lug.-99		2 800 000 000	2 800 000 000	120 000 000	24 000 000	96 000 000		120 000 000										120 000 000	120 000 000	
C 16 03	Lotta antincendio in aree urbane	Comune di Roma	dic.-98	nov.-99		6 000 000 000	6 000 000 000	300 000 000		300 000 000												300 000 000	300 000 000	
C 16 04	Parco e aree rurali presso gli Orti di Torrenova (Tenuta Polline)	Provincia di Roma	gen.-99	set.-99		1 200 000 000	1 200 000 000	60 000 000	12 000 000	48 000 000												60 000 000	60 000 000	
C 19	Opere di risanamento igienico-sanitario dei bacini del Tevere e prime di raccolta differenziata dei rifiuti nel bacino dell'area metropolitana																							
C 19 0101	Opere di risanamento igienico-sanitario del bacino del Tevere: Costruzione delle reti fognarie e dei collettori di Roma, Fiumicino e Ostia (Adduttore acque reflue Laurentina e depuratore)	Comune di Roma	DESTINAZIONATO																					

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile del Procedimento	Termine ultimazione lavori	Tempi completamento opera	BAREME PONDO QUIBILLAO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Utilità Trasferi 1% Cluse stimate	PROGETTAZIONE: Preventivi 6% Costo stimato	PROGETTAZIONE: Ulteriori finanziamenti non ancora noti ed eventuali	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 30% o 20% impegni di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20%, o altra quota in caso di opere a lotti funzionali varie	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: 20% Impegni di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: Rate alla rendicontazione dell'80%, o 90% dell'impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO: 10% alla rendicontazione di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI E ARLE S TERRENI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (modello diretto): "Immobili" nel settore dell'occupazione	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (modello diretto): Volontariato risorse umane	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI BENEFICIARI: per "espropri" nel settore delle aree naturali	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
C 19 01b2	Ristrutturazione delle opere del Giubileo della zona Circonvallazione Ostiense Lavori parte archeologica Ministero Beni Culturali	Comune di Roma	dic-98	gen-99	8 000 000 000	8 000 000 000																		
C 19 01b3	Ristrutturazione Piazza Pia/Castel S.Angelo opere viarie Ponte e Lotti Lavoro	Regione Lazio	set-98	ott-99	10 000 000 000	10 000 000 000																		
C 19 01b3	Ristrutturazione Piazza Pia/Castel S.Angelo e Lotti Lavoro	Regione Lazio	set-98	mag-99	4 000 000 000	4 000 000 000																		
C 19 01b3	Progetto Riqualificazione Piazza Pia/Castel S.Angelo	Regione Lazio	lug-98	set-99	16 000 791 415	16 000 791 415																		
C 19 01b4	Opere di scavo del Tempio di Diana a Palestrina	Regione Lazio	set-98	ott-99	9 000 000 000	9 000 000 000																		
C 19 02	Parco delle Tombe di Roma Antica e di Ostia Antica	Provincia di Roma	dic-98	nov-99	8 000 000 000	8 000 000 000																		
C 20 01	Linea Battistini	Università La Sapienza	dic-98	nov-99	600 000 000	600 000 000																		
					573 907 454 756	572 217 454 756	15 418 848 190	1 898 606 000	11 799 973 190	2 267 578 000	61 547 466 915	19 868 854 225	51 756 000				4 498 566 000				81 856 815 105	39 766 439 425	-1 690 000 000

D SETTORE D - ACCESSIBILITA' E MOBILITA' NELL'AREA METROPOLITANA

D 2 Tram San Pietro/Aurelia

D 02 01	Linea ferroviaria S.Pietro Fiumicino	Comune di Roma			2 500 000 000		2 500 000 000		2 500 000 000												2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000

D 3 Tram Termini/Re Pietro

D 03 01	Tram Termini - Re Pietro - Via Nomentana	Comune di Roma			3 550 000 000		3 550 000 000		3 550 000 000												3 550 000 000	3 550 000 000	-3 550 000 000

D 4 Archeobus

D 04 01	Linea ferroviaria Archeobus	Comune di Roma			2 850 000 000		2 850 000 000		2 850 000 000												2 850 000 000	2 850 000 000	-2 850 000 000

D 5 Adeguamento dei materiali rotabili in dotazione e acquisto di nuovi treni, tram, autobus urbani ed extra urbani a basso impatto ambientale

D 06 01/1	Acquisto n. 200 autobus urbani da mt 12 mt	ATAC	giu-97	giu-98	105 744 100 000	105 744 100 000					89 476 100 000		28 842 300 000		54 988 302 500						89 476 100 000	80 931 132 500	
D 04 01/2	Acquisto di autobus urbani da metri vetture	ATAC	mag-97	apr-98	19 807 338 000	19 807 338 000					8 041 131 310		2 412 339 600		4 613 891 840						8 041 131 310	7 026 231 240	
D 06 01/3	Acquisto di 315 autobus urbani da 12 metri	ATAC	gen-98	dic-99	78 870 016 000	78 870 016 000					78 870 016 000		23 661 004 800								78 870 016 000	23 661 004 800	
D 06 01/4	Acquisto n. 150 autobus urbani da 10 mt	COTRAL	giu-97	ott-99	60 695 411 000	60 695 411 000					60 645 184 600		18 193 555 380								60 645 184 600	18 193 555 380	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Realizzatore dell'intervento	Tempi di realizzazione dell'intervento	Tempi completamento opera	BUDGET FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
							IMPEGNI IN SPESA	Utilizzi T-ratali 1% Costo stimato	Privati 0% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non imputabili al 10% Costo stimato	IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONI E AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	REGIONE LAZIO (mandati diretti)		ALTRI SOGGETTI			
												50% e 80% impegno di spesa	25% e 50% impegno di spesa in base ai lavori effettivamente eseguiti	20% impegno di spesa	fino alla concorrenza dell'80% e 100% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		(Decreto di variazione)	"Lavori di" sul tratto dell'anello ferroviario	Valorizzazione diverse entrate	per "lavori di" sul tratto della ferrovia regionale		
D 13	Miglioramento viabilità di collegamento (ivi la diversa area industriale di Aprilia e di accoglienza (Cisterna, Littoria e zone limitrofe)																						
D 13 01	Tor vata Cipolla, Collatina e via Prenestina	Comune di Roma	RISANAMENTO																				
D 13 41	Progetto e lavori di realizzazione della [illegible]	Provincia di Roma	dic-98	nov-99	1 500 000 000	1 500 000 000	30 000 000		30 000 000												30 000 000	30 000 000	
D 13 42	Progetto e lavori per [illegible]	Provincia di Roma	lug-98	set-99	1 171 016 811	1 171 016 811	30 000 000	15 000 000		15 000 000	1 141 016 811						376 000 000				1 547 016 811	406 000 000	
D 13 43	Progetto e lavori di [illegible]	Provincia di Roma	apr-98	set-99	1 061 373 765	1 061 373 765	30 000 000	15 000 000			1 031 373 765	515 784 880									1 061 373 765	345 784 880	
D 13 44	Progetto di [illegible] (Cisterna, Littoria)	Provincia di Roma	dic-97	nov-99	2 030 000 000	2 030 000 000	40 000 000			40 000 000											40 000 000	40 000 000	650 000 000
D 13 45	Progetto di [illegible]	Provincia di Roma	dic-97	ago-98	397 390 365	397 390 365	27 500 000	5 500 000		22 000 000	369 890 365	73 978 110	110 967 000	129 461 000							397 390 365	341 906 110	
D 13 46	Progetto e lavori per il [illegible]	Provincia di Roma	lug-98	giu-99	1 200 000 000	1 200 000 000	60 000 000	12 000 000		48 000 000											60 000 000	60 000 000	
D 13 47	Progetto e lavori [illegible]	Provincia di Roma	dic-98	nov-99	890 000 000	890 000 000	14 000 000	7 000 000		7 000 000											14 000 000	14 000 000	
D 13 48	1° lotto [illegible]	Provincia di Roma	set-98	dic-99	4 000 000 000	4 000 000 000	200 000 000	40 000 000		160 000 000											200 000 000	200 000 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Regione Provincia Autonoma Amministrazione	Termine ultimazione lavori	Termine completamento opere	BISOGNI FONDO LUNGO PERIODO	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI IN SPESA	PROGETTAZIONE: Utilità Terreni 15% Costo stimato	PROGETTAZIONE: Privati 5% Costo stimato	PROGETTAZIONE: Elevati finanziamenti all 85% Costo stimato	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI: 20% + 20% Impegno di spesa	ACCONTI: 20% + 20% Impegno + 20% non di Accordo fasi Procedura unica	ULTERIORI EROGAZIONI: 20% Impegno di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: Non sulla rimanenza dell' 20% + 20% dell'Impegno di spesa	SALDO: 10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO (Decreto di ripartizione)	REGIONE LAZIO (assunzioni diretti): "Impegnato" nel settore dell'investimento	REGIONE LAZIO (assunzioni diretti): Valorizzazione risorse umane	ALTRI BENEFICIARI: per "Impegni" nel settore delle opere infrastrutturali	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
D 13 98	87 Potenziamento dei Circuiti Elettrici, Protezione, Telecomunicazioni, Automazione e Telecontrollo della rete AT e AAT (Cassino, Roma Sud, Roma Ovest, Roma Nord, Roma Est, Roma Centro, Roma Tuscolana)	Provincia di Roma	mar-98	mar-99		1 978 634 954	150 970 000	30 000 000		120 000 000	1 756 864 954	843 433 400											1 886 864 954	1 018 433 400	
D 13 10	88 Cave Nuove (Cassino) Ampliamento della stazione esistente di Cassino e realizzazione di Raccordo in Doppia Terna	Provincia di Roma	set-98	nov-99		3 000 000 000	150 000 000	30 000 000		120 000 000												150 000 000	150 000 000	
D 13 11	89 Potenziamento (Trasformazione) Centro di sezionamento della Tuscania	Provincia di Roma	giu-98	dic-99		3 672 390 000	210 000 000	42 000 000		168 000 000												210 000 000	210 000 000	
D 13 12	Collegamento tra S.E.T. Valmontone - S.E. San Cesareo - via Collegno (Potenziamento)	Provincia di Roma	nov-98	nov-99		6 200 000 000	275 000 000		275 000 000													275 000 000	275 000 000	
D 14	Miglioramento della stabilità provinciale di collegamento tra Rieti e le aree di ritardo e di accoglienza ("ai modi radiali")																							
D 14 01	90 Ambiente (Rieti) Interventi per la tutela e la difesa del territorio	Provincia di Rieti	gen-98	mar-99		3 328 123 995	250 000 000	50 000 000		200 000 000	2 955 833 995	591 166 400	1 086 749 500								3 205 831 995	1 727 915 900	
D 14 02	91 Lavoratori (Rieti) Formazione delle risorse professionali (Rieti, Cittaducale)	Provincia di Rieti	mag-97	gen-98		1 743 772 155	100 000 000	20 000 000		60 000 000	1 643 772 155	328 754 430	1 068 431 900								1 743 772 155	1 497 206 230	
D 14 03	92 Lavoratori (ex CEA) Centro di aggregazione e orientamento	Provincia di Rieti	dic-98	dic-99		15 000 000 000	750 000 000		750 000 000													750 000 000	750 000 000	
D 14 04	93 Turismo (Rieti) Interventi nel Lago di Piediluco per il rilancio turistico	Provincia di Rieti	set-97	nov-99		2 908 319 995	225 000 000	45 000 000		180 000 000	2 683 320 000	536 664 000	804 996 000								2 908 320 000	1 366 660 000	
D 14 05	94 Turismo (Terni Narni Amelia) Centro di orientamento	Provincia di Rieti	set-98	dic-99		2 850 000 000	142 500 000		142 500 000		188 500 000								188 500 000		519 500 000	331 000 000	
D 14 06	95 Ambiente (Rieti) Interventi per la difesa del suolo	Provincia di Rieti	set-98	nov-99		9 210 000 000	250 000 000		250 000 000		432 446 400								432 446 400		1 114 892 800	682 446 400	
D 14 07	96 Trasporti e Mobilità (Rieti) Adeguamento e messa in sicurezza della viabilità provinciale (Rieti, Fiamignano)	Provincia di Rieti	set-98	dic-99		2 335 091 672	175 000 000	35 000 000		140 000 000	2 160 091 672										2 335 091 672	175 000 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Regione Amministrazione Beneficiaria	Termini ultimazione lavori	Tempi completamento opere	RISORSE POSTO CIPE DEL 21/12/2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI IN SPESA	PROGETTAZIONE: Ulteriori Fondi Vita Nuova stimata	PROGETTAZIONE: Privati 0% Costo stimato	PROGETTAZIONE: Ulteriori Investimenti Privati 10% Costo stimato	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI: 30% o 50% lavori giunti ad opera	ACCONTI: 30% o 50% impegno a carico dei soggetti privati	ULTERIORI EROGAZIONI: 20% lavori in opera	ULTERIORI EROGAZIONI: Non oltre complessivo dell'80% o 90% dell'impegno in opera	SALDO: 10% all'ultimazione ed accertamento di collaudo provvisorio	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ATTI INDIZIONI GARE E CONTRATTI (MUTUI)	AVVENUTO PAGAMENTO DA PARTE DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Assunzione" del relativo impegno dell'amministrazione	REGIONE LAZIO (mandati diretti): Valore definitivo	ALTRI ENTI DELLA PA: "Assunzione" dei relativi impegni delle singole amministrazioni	IMPEGNI	PAGAMENTI	altri fondi
D 14 08	Collegamento SP Ardeatina – SP Pomezia in Via Laurentina. Realizzazione del tratto di competenza	Provincia di Roma	dic-99		11 205 000 000	11 205 000 000	373 500 000				482 467 013						482 467 013					1 340 214 026	857 467 013	
D 14 08	Interventi di completamento del tratto pontino della strada provinciale Ardeatina (1° stralcio)	Provincia di Pomezia	set-98	set-99	17 500 000 000	17 500 000 000																		
D 14 10	Ampliamento e variante della provinciale da Roma a Tivoli (1° stralcio)	Provincia di Roma	set-98	set-99	17 500 000 000	17 500 000 000	171 500 000		171 500 000													171 500 000	171 500 000	
D 14 11	Ristrutturazione, variante provinciale ostiense-ardeatina (1° stralcio)	Provincia di Roma	set-98	set-99	17 500 000 000	17 500 000 000																		
D 14 12	Interventi per la riqualificazione della strada provinciale Ardeatina (1° stralcio)	Provincia di Roma	set-98	set-99	17 500 000 000	17 500 000 000																		
D 15	Potenziamento ferroviario della Linea Roma-Civitavecchia e Viterbo																							
D 15 01/N	Raddoppio ed elettrificazione della tratta Cesano-Vigna di Valle e Stazione di Vigna di Valle	Provincia della Regione Lazio	feb-98	dic-99	170 379 000 000	170 379 000 000																		
D 15 01/2	Ristrutturazione della linea ferroviaria Roma-Viterbo: tratta Cesano-Vigna di Valle e stazione di Formello-Isolotto	Provincia della Regione Lazio	feb-98	dic-99	13 341 000 000	13 341 000 000																		
D 16	Riqualificazione e prolungamento del terminale ferroviario del porto di Civitavecchia																							
D 16 01	Adeguamento funzionale del porto di Civitavecchia, tratto Quartiere Aurelio-Quartiere Fiumicino del quadrante infrastrutturale del porto (2° lotto)	Autorità portuale del porto di Civitavecchia	nov-97	mag-99	71 217 371 000	71 217 371 000	4 500 000 000	916 550 410	3 583 449 590													4 500 000 000	4 500 000 000	
D 16 02	Adeguamento funzionale del Lotto	Soc. Porto Civitavecchia	set-97	nov-99	11 000 000 000	11 000 000 000																		
D 16	Riqualificazione e potenziamento della linea A e B delle metropolitane e della ferrovia suburbana (stazioni e infrastrutture di servizio)										9 366 858 510	1 873 771 700		2 810 657 550							11 373 358 310	6 688 929 250	
D 16 01/1	Potenziamento tratta Trastevere	Comune di Roma	nov-97	nov-99	9 640 000 000	9 640 000 000	2 004 500 000		2 004 500 000															
D 16 01/2	Adeguamento nuovo A	Comune di Roma	DEFINAN ZIATO				5 495 500 000		5 495 500 000													5 495 500 000	5 495 500 000	
D 16 01/3a	Adeguamento nuovo A 1° stralcio	Comune di Roma	ago-98	nov-99	23 363 381 733	23 363 381 733																		
D 16 01/3b	Adeguamento nuovo A 2° stralcio	Comune di Roma	set-98	nov-99	53 037 266 010	53 037 266 010					50 873 238 009	25 436 619 000										50 873 238 009	25 436 619 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Termine procedurale di completamento	Termine completamento opere	RIPARTIZIONE FONDO CIPE DELIB. 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Ulteriori fabbisogni (10% / 5 anni)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI: 20% o 30% impegno di spesa	ACCONTI: 20% o 30% impegno di spesa su base di documentazione varia	ULTERIORI EROGAZIONI: 30% impegno di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: dato alla concorrenza dell'80% o 90% dell'impegno di spesa	SALDO: 10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (mandati diretti): "Immediati" sul relativo capitolo di competenza	REGIONE LAZIO (mandati diretti): A beneficiari diversi tramite	ALTRI BENEFICIARI: 20% "Immediati" sul relativo capitolo di competenza	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
D 18 40/1	Potenziamento Nodo Lodi	Comune di Roma	DEFINANZIATO				508 800 000													508 800 000	508 800 000	
D 18 40/4	Potenziamento Nodo Roma Est	Comune di Roma	set-98	nov-99		6 381 350 834			5 872 350 835											5 872 350 835		
D 18 40/5	Potenziamento Nodo Roma Est	COTRAL	ago-98	nov-99		2 000 000 000																
D 18 40/7	Potenziamento Nodo Prati	Comune di Roma	gen-99	nov-99		20 000 000 000	1 000 000 000													1 000 000 000	1 000 000 000	
D 18 93	Raccordo aeroporto Tiburtina	Omnia Network SPA	dic-98	nov-99		10 000 000 000																
D 18 94	Alta Velocità stazione Tiburtina	Omnia Network SPA	dic-98	nov-99		20 000 000 000																
D 19	Aree di parcheggio all'ingresso dei principali nodi di scambio per la sosta degli autobus turistici e delle autovetture																					
D 19 91	Nodo di scambio (Ferro/Gomma) e parcheggio auto lungososta Palmiro Togliatti	Comune di Roma	DEFINANZIATO																			
D 19 92	Interventi relativi a nodi lungososta a Tiburtina ed Ugo La Malfa	Provincia della Spezia	nov-98	nov-99		10 000 000 000	10 000 000 000															
D 19 93	Parcheggio di scambio sulla tangenziale ovest	ATAC	nov-98	nov-99		5 000 000 000	250 000 000													250 000 000	250 000 000	
D 19 98	Nodo di scambio Ferro/Gomma sulla Roma-Viterbo in via Ardeatina e via Ostiense	Comune di Roma	set-98	dic-99		4 099 249 944																
D 20	Controllo e gestione del traffico																					
D 20 91	Apparecchiature per la gestione della rete e per la regolazione del traffico e sistemi di informazione all'utenza	ATAC	set-98	dic-99		29 850 000 000	1 000 000 000													1 000 000 000	1 000 000 000	
D 20 92	Informazioni e segnaletica	ATAC	dic-98	dic-99		17 000 000 000	1 000 000 000													1 000 000 000	1 000 000 000	
D 20 93	Impianti per la regolazione semaforica	Roma Capitale	dic-98	dic-99		3 500 000 000																
D 21 91	Completamento del P.R. in variante per il potenziamento e riqualificazione	Comune di Roma	mar-99	nov-99		9 424 700 000																
D 22 40/1	Completamento della progettazione	Provincia di Roma	dic-98	nov-99		950 000 000																
D 22 40/2	Completamento della progettazione	Agenzia Romana per la progettazione del Giubileo	dic-98	nov-99		1 174 000 000																

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Tempi di realizzazione dell'intervento		Tempi completamento lavori opere	RIEPILOGO PERIODO CHIUSURA 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
								IMPEGNI IN SPESA	Lettere Tecnici (Art. 1 comma 1 decreto)	Perizie 8% Comma 1 decreto	Ulteriori disponibilità ex comma 1 art. 18 L. 109/94	IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	"ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	REGIONE LAZIO		ALTRE REGIONI		
													20% + 10% impegno di spesa	20% + 10% + 10% + 10

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Trimestre conclusione lavori	Trimestre completamento opere	RISORSE FONDO CIPE DEL 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Utilizzi Fondo 3% Comma ottavo	PROGETTAZIONE: Pertinenza 90% Comma ottavo	PROGETTAZIONE: Ulteriori fino a concorrenza del 10% Comma ottavo	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% e 30% fino a concorrenza del 90%	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% e 30% fino a concorrenza del 100%	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: 10% fino a concorrenza del 100%	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: fino alla concorrenza dell'80%, e 90%, dell'importo di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO: 10% all'ultimazione dei lavori, dietro presentazione del certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONI E AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Specificare di seguito)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (specificare di seguito): "Immediata" per ordinare dell'intervento	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (specificare di seguito): Valorizzazione risorse umane	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI BENEFICIARI: per "Immediata" ordinare dell'intervento	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
B 01 11	Asse di corso e aree limitrofe (Piazza Prefettura) e via nuova di corso e via Cassiodoro	Anas	gen-99	nov-99	2 500 000 000	3 901 000 000	125 000 000		125 000 000												125 000 000	125 000 000	1 101 000 000
B 01 12	Asse di corso e aree limitrofe (Piazza Prefettura) e via nuova di corso e via Pompeiana	Anas	gen-99	nov-99	3 952 563 752	5 008 563 752	200 000 000		200 000 000												250 000 000	250 000 000	1 056 000 000
B 01 13	Asse di corso e aree limitrofe (Piazza Prefettura) e via nuova di corso e via Pompeiana	Anas	dic-98	nov-99	403 321 235	539 321 235	25 000 000		25 000 000												25 000 000	25 000 000	136 000 000
B 01 14	Asse di corso e aree limitrofe (Piazza Prefettura) e via nuova di corso e via Pompeiana	Anas	gen-99	nov-99	2 000 000 000	3 213 000 000	100 000 000		100 000 000												100 000 000	100 000 000	1 213 000 000
B 01 15	Asse di corso e aree limitrofe (Piazza Prefettura) e via nuova di corso e via Pompeiana	Anas	gen-99	nov-99	2 000 000 000	2 500 000 000	100 000 000		100 000 000												100 000 000	100 000 000	300 000 000
B 01 16	Asse di corso e aree limitrofe (Piazza Prefettura) e via nuova di corso e via Pompeiana	Anas	dic-98	dic-99	5 672 839 000	6 252 839 000	95 000 000		95 000 000												95 000 000	95 000 000	580 000 000
B 01 17	Asse di corso e aree limitrofe (Piazza Prefettura) e via nuova di corso e via Pompeiana	Anas	dic-98	nov-99	4 000 000 000	6 585 000 000	200 000 000		200 000 000												200 000 000	200 000 000	2 585 000 000
B 01 18	Asse di corso e aree limitrofe (Piazza Prefettura) e via nuova di corso e via Ostiense	Anas	dic-98	nov-99	2 988 789 000	4 872 789 000	125 000 000		125 000 000												125 000 000	125 000 000	1 884 000 000
B 01 19	Asse di corso e aree limitrofe (Piazza Prefettura) e via nuova di corso e via Ostiense	Anas	set-98	nov-99	150 000 000	1 087 160 000	150 000 000		150 000 000												150 000 000	150 000 000	937 000 000
B 01 20	Asse di corso e aree limitrofe (Piazza Prefettura) e via nuova di corso e via Ostiense	Anas	gen-99	nov-99	970 000 000	3 000 000 000	300 000 000		300 000 000												300 000 000	300 000 000	2 130 000 000
B 01 21	Asse di corso e aree limitrofe (Piazza Prefettura) e via nuova di corso e via Ostiense	Anas	dic-98	nov-99	2 547 734 032	3 402 734 032	137 500 000		137 500 000												137 500 000	137 500 000	855 000 000
B 01 22	Completamento di corso Vittorio Emanuele e via Nazionale (ATAC)	Anas	lug-98	nov-99	1 073 360 864	1 073 360 864																	
B 01 24	Asse di corso e aree limitrofe (Piazza Prefettura) e via nuova di corso e via Cassiodoro	Anas	gen-99	nov-99	3 000 000 000	7 038 000 000	150 000 000		150 000 000												150 000 000	150 000 000	4 038 000 000

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Attuatore del Beneficiario	Tempi realizzazione opera	Tempi completamento opera	EROGAZIONI PREVISTE DAL CIPE	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
						IMPEGNI IN SPESA	Ulteriori Fin. Costo ultimo	Primati 9% Costo ultimo	Ulteriori Accantonamenti non impegnati in Fin. Costo ultimo	IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO		AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	REGIONI E LAZIO (contributi diversi)		ALTRI BENEFICIARI			
											30% o 50% Impegno di spesa	20% o 30% Impegno di spesa e Fine lavori (Consegna)	30% Impegno di spesa	Non oltre il 95% dell'Impegno di spesa	5% dell'ammontare dell'accantonamento previsto		(Decreto di trasferimento)	"Trasferimenti" sul conto dell'assegnatario	Valore contributo diverso dal 100%	per l'importo non coperto dalle altre risorse			
E 41 31	Sub A zona a rischio idrogeologico elevato (Fiume Fiumarella Catanzaro) (AAA) zona Lamezia Quadrante	AAA	dic 98	nov 99	7 400 000 000	300 000 000		300 000 000												300 000 000	300 000 000	1 140 000 000
E 41 261	Sub A zona a rischio idrogeologico elevato (Fiume Fiumarella Catanzaro) (AAA) zona Cosenza	AAA	dic 98	nov 99	989 442 000	10 000 000		10 000 000												10 000 000	10 000 000	140 000 000
E 41 267	Sub A zona a rischio idrogeologico elevato (Fiume Fiumarella Catanzaro) (AAA) zona Cosenza	AAA	lug 98	set 99	536 750 412	15 500 000		15 500 000												15 500 000	15 500 000	
E 41 271	Sistema di opere sull'asta del Fiume Fiumarella e sulla rete minore	AAA	feb 99	set 99	3 100 000 000																	
E 41 272	Sistema di opere sull'asta del Fiume Fiumarella e sulla rete minore	AAA	feb 99	nov 99	5 300 000 000																	
E 41 275	Sistema di interventi per la mitigazione del rischio idraulico Fiumarella zona pianura	AAA	gen 99	nov 99	1 600 000 000																	
E 41 28	Nuovo collettore AAA e Bonifica per il primo lotto	AAA	gen 99	nov 99	2 000 000 000	100 000 000		100 000 000												100 000 000	100 000 000	8 710 000 000
E 41 29	Adeguamento collettore fognario AAA e Bonifica per il primo lotto	AAA	gen 99	dic 99	7 000 000 000	350 000 000		350 000 000												350 000 000	350 000 000	2 520 000 000
E 41 30	Nuovo impianto pubblico depurazione acque reflue zona pianura	AAA	gen 99	nov 99	7 585 440 000	280 000 000		280 000 000												280 000 000	280 000 000	
E 41 31	Rete fognaria pubblica (Fiume Fiumarella) e impianto depurazione zona pianura completo	AAA	dic 98	set 99	1 400 000 000	1 400 000 000																
E 3	Contributo ai potenziamento servizi pubblici di emergenza servizio 118, mezzi di soccorso, presidio ospedaliero, rete radiotrasmissione 1° Stralcio					250 000 000		250 000 000												250 000 000	250 000 000	11 000 000 000
E 42 41	Ospedale Santa Barbara Sant'Agata di Esaro Interventi Adeguamento ai primi livelli	UPL Sud 8	mar 98	dic 99	22 531 000 000	37 531 000 000	250 000 000															

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile del Procedimento	Tempi amministrativi di realizzazione	Tempi completamento opera	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: UMts Tecnici (1% I° conv. ridotto)	PROGETTAZIONE: Privati 8% Cons. ridotto	PROGETTAZIONE: Ulteriori finanziamenti non imputabili al conv. ridotto	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	ACCANTONAMENTI: 10%	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ACCANTONAMENTI A CARICO DELLO STATO	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI RECAPITI	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
B 02 02	Circuito Ex Ospedale Psichiatrico Provinciale - Lotto 1° stralcio funzionale	Azienda Ospedaliera Arezzo	ago-98	nov-99	1 000 000 000		1 000 000 000						1 000 000 000	1 000 000 000	
B 02 04	Ospedale S.Donato a Arezzo - Ristrutturazione Dipartimento Emergenza Accettazione - Lotto 1° stralcio funzionale	USL 8 Arezzo	set-98	nov-99	1 500 000 000		1 500 000 000						1 500 000 000	1 500 000 000	
B 02 04	Ospedale Civile di Siena - Completamento delle Opere Edilizie - Dipartimento Emergenza Accettazione - Lotto 1° stralcio funzionale	USL 7 di Siena	giu-98	set-99	300 000 000		300 000 000						300 000 000	300 000 000	
B 02 06	Policlinico Careggi - Ristrutturazione del Dipartimento Emergenza Accettazione - Lotto 1° stralcio funzionale	Università degli Studi di Firenze	feb-98	nov-99	750 000 000		750 000 000		9 454 958 900				10 204 958 900	5 477 479 450	
B 02 08	Policlinico Careggi - Ristrutturazione e ampliamento Blocco Operatorio - Lotto funzionale	Università degli Studi di Firenze	gen-98	nov-99	350 000 000		350 000 000		5 681 191 061				6 031 191 061	3 190 595 530	
B 02 07	Policlinico Careggi - Ristrutturazione Blocco Operatorio e Terapia Intensiva - Lotto funzionale	Azienda Ospedaliera Careggi	giu-98	nov-99	500 000 000		500 000 000						500 000 000	500 000 000	
B 02 06/1	Ospedale San Filippo Neri (Roma) - Ristrutturazione dell'area Centrale - Lotto funzionale	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	gen-99	ago-99	1 632 372 000										
B 02 06/5	Ospedale San Filippo Neri (Roma) - Ristrutturazione dell'ala Nuova - Lotto funzionale	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	gen-99	ago-99	1 344 990 000										
B 02 08	Ospedale di Albese (Albese Nuova) - Ristrutturazione e ampliamento presidio	USL 9 di Grosseto	mag-98	mag-99	1 000 000 000		50 000 000						50 000 000	50 000 000	
B 02 10	Ospedale Regina Montis Regalis - Ristrutturazione del presidio	USL 8 di Mondovì	giu-98	set-98	1 000 000 000				824 999 000	824 999 000					
B 02 11	Ospedale specialistico Oftalmico Regina Montis Regalis - Ristrutturazione del presidio	USL 8 di Mondovì	dic-97	lug-98	1 066 442 000										

Codice	Titolo dell'intervento	Regione, Amministrazione, Ente beneficiario	Tempi realizzazione	Tempi completamento	RISORSE FONDO GENERALE 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI IN SPESA	PROGETTAZIONE: Ulteriori 5% Conto rilascio	PROGETTAZIONE: Primi 5% Conto rilascio	PROGETTAZIONE: Ulteriori Stanziamenti ad 10% Conto rilascio	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI IN SPESA	ACCONTI: 10% o 20% impegno di spesa	ACCONTI: 10% o 20% impegno di spesa con atto di liquidazione	ULTERIORI EROGAZIONI: 10% impegno di spesa	EROGAZIONI: Rate di ammontare dal 10% o 15% dell'impegno di spesa	SALDO: 10% all'ultimazione dei collaudi provvisorio	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO (Decreto di ripartizione)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (modalità diverse): "Anticipi" sul costo dell'intervento	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (modalità diverse): Videoconferenza Stazione unica	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI SOGGETTI: "Anticipi" sul costo dell'intervento richiesti	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
01	Ammodernamento della viabilità	ANAS	lug-98	set-99	5 000 000 000	5 000 000 000	250 000 000		250 000 000													250 000 000	250 000 000	
124	Lavori di completamento della variante alla strada statale n. 18 Tirrena Inferiore (tratto Lauria-Castrocucco)	Comune di Roma	gen-99	set-99	2 300 000 000	2 300 000 000																		
972	Lavori di ammodernamento della strada statale n. 18 Tirrena Inferiore (tratto Lauria-Castrocucco)	Comune di Roma	gen-99	set-99	1 000 000 000	1 000 000 000																		
973	Lavori di ammodernamento della strada statale n. 18 Tirrena Inferiore (tratto 2° stralcio Agri-Sinni)	Comune di Roma	gen-99	set-99	2 000 000 000	2 000 000 000																		
126	Lavori di ammodernamento ed adeguamento della strada statale n. 18 Tirrena Inferiore (tratto Pizzo-Falerna)	Comune di Roma	gen-99	dic-99	4 000 000 000	4 000 000 000																		
125	Lavori di ammodernamento della strada statale n. 18 Tirrena Inferiore (tratto Scalea-Praia a Mare)	Comune di Roma	gen-99	ott-99	500 000 000	500 000 000																		
95	Barre flottanti a Venezia per l'isola Lunga (Malamocco)	Comune di Roma	apr-98	set-99	3 805 237 367	3 805 237 367					3 180 297 800											3 180 297 800		
941	Costruzione dighe foranee a protezione del porto di Fiumicino	Comune di Roma	apr-99	set-99	1 700 000 000	1 700 000 000																		
942	Costruzione dighe foranee a protezione del porto di Fiumicino	Comune di Roma	apr-99	set-99	300 000 000	300 000 000																		
	Piano di ripartizione delle risorse annuali																							
94	Piano di ripartizione delle risorse annuali	Stanziamento Lazio	gen-98	dic-00	16 952 000 000	16 952 000 000					16 952 000 000											16 952 000 000	14 952 000 000	

Codice	Titolo dell'intervento	Progetto Preliminare (sì/no)	Termine progettazione preliminare	Termine progettazione esecutiva	EUROLIRE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI IN SPESA	PROGETTAZIONE: Ulteriori 1% Codice stimato	PROGETTAZIONE: Primati 4% Codice stimato	PROGETTAZIONE: Ulteriori Emendamenti al 10% Codice stimato	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI IN SPESA	ATTO/FITTI: 20% + 30% impegni di spesa	ATTO/FITTI: 20% + 30% impegni di spesa e loro pubblicazione	ULTERIORI EROGAZIONI: 30% impegni di spesa	ULTERIORI EROGAZIONI: Ben alla realizzazione dell'80% e 100% dell'impegno di spesa	SALDO: 10% all'ottenimento di milestone prestabilite	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (modalità diverse): "Per memoria" nel settore dell'immigrazione	REGIONE LAZIO (modalità diverse): Valorizzazione risorse umane	ALTRI SOGGETTI: per "trasferimenti nel settore delle attività culturali"	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
B 44 42	Piano di risanamento ambientale della laguna di Venezia: Rete fognaria, depuratori, collettamento e di arginatura perimetrale della Laguna e interventi nel bacino scolante nella laguna	Progetto Unico	gen-98	nov-99	1 100 000 000	1 100 000 000					1 100 000 000								1 100 000 000				1 100 000 000	1 100 000 000	
B 44 45	Piano di risanamento ambientale della laguna di Venezia: Rete fognaria, depuratori, collettamento e di arginatura perimetrale della Laguna e interventi nel bacino scolante nella laguna	Progetto Unico	gen-98	dic-00	5 200 000 000	9 040 000 000					5 200 000 000								5 200 000 000				5 200 000 000	3 840 000 000
B 44 46	Piano di risanamento ambientale della laguna di Venezia: Bonifiche, difesa dalle acque alte, salvaguardia fisica e morfologica, difesa spondale, progetto pilota	Progetto Unico	gen-98	dic-00	5 148 000 000	5 958 000 000					5 148 000 000								5 148 000 000				5 148 000 000	810 000 000
E 5	Sicurezza pubblica e protezione civile																								
B 44 015	Piano degli interventi per Giubileo 2000 - Progetti vari (Lazio e restante Italia)	Istruttoria approfondita	lug-97	dic-99	1 300 000 000	1 300 000 000					1 300 000 000							1 300 000 000				1 300 000 000	1 300 000 000	
B 44 012	Piano degli interventi per il Giubileo 2000 - Segnaletica stradale	Istruttoria approfondita	gen-97	dic-99	1 700 000 000	1 700 000 000					1 700 000 000							1 700 000 000				1 700 000 000	1 700 000 000	
B 44 016	Sistema di supporto e di coordinamento dei flussi di persone in occasione del Giubileo 2000	Valutazione fattibilità Presidenza Cons.	dic-98	dic-99	1 980 000 000	1 980 000 000																			
B 44 43	Piano sicurezza grandi flussi	Istruttoria approfondita	feb-98	set-99	12 000 000 000	12 000 000 000													12 000 000 000				12 000 000 000	12 000 000 000
B 44 44	Giubileo interventi (Competenza di Presidenza)	Istruttoria approfondita	mar-98	gen-99	27 598 000 000	27 598 000 000													24 984 000 000				24 984 000 000	24 984 000 000
B 44 45	Giubileo interventi Regioni e enti (Competenza di Presidenza)	Istruttoria approfondita	gen-99	nov-99	3 380 000 000	3 380 000 000													3 340 000 000				3 340 000 000	3 380 000 000
B 44 46	Giubileo interventi Regioni e enti (Competenza di Presidenza)	Istruttoria approfondita	mar-98	nov-99	5 602 000 000	5 602 000 000													8 252 000 000				8 252 000 000	8 252 000 000
B 44 47	Giubileo interventi Regioni e enti (Competenza di Presidenza)	Istruttoria approfondita	gen-99	nov-99	650 000 000	650 000 000													650 000 000				650 000 000	650 000 000

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Termine ultimazione lavori	Termine ultimazione opere	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Titolari Tit. I Conto capitale	PROGETTAZIONE: Privati 5% Conto capitale	PROGETTAZIONE: Titolari finanziamenti ex art. 10% Conto capitale	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 40% o 45% Impegni di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 45% o 50% Impegni di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: LIQUIDAZIONI EROGAZIONI: 50% Impegni di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: LIQUIDAZIONI EROGAZIONI: Non alla concorrenza dell'80% o 90% dell'impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO: 10% all'ultimazione dei lavori/delle provviste	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO: (Ministero di riferimento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandato diretto): "Immediata" ed ultimo dell'esercizio	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandato diretto): Volta/volta ritenuta stessa	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI BENEFICIARI: per "immediata" ed ultimo dell'esercizio successivo	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
S 98 10	Adeguamento del sistema viario in Via della Pineta e in Piazza di Siena in occasione di manifestazioni	Comune di Roma	set-97	lug-99	10 000 000 000	10 000 000 000	500 000 000	500 000 000												500 000 000	500 000 000	
S 98 09	Interventi Tram per Rebibbia (parte)	Ministero Difesa	lug-98	lug-99	200 000 000	200 000 000																
S 97 14	Adeguamento dei collettori fognari	Ministero Difesa																				
S 98 11	Adeguamento, potenziamento e completamento della viabilità radiale, tangenziale e anulare	Ministero Difesa	ott-98	set-99	4 800 000 000	4 870 000 000																
S 98 12	Potenziamento stradale Aurelia (Cancelli - Tarquinia)	Ministero Difesa - Anas da definire	mar-99	dic-99	1 995 000 000	1 995 000 000																
S 98 13	Potenziamento stradale Tiburtina (Ponte Tazio - Guidonia)	Ministero Lavori Pubblici	dic-98	dic-99	26 500 000 000	26 500 000 000																
S 98 14	Infrastrutture Direzionale Ostiense (Lotti ex Mercati Generali)	Ministero Difesa	dic-98	dic-99	19 000 000 000	19 000 000 000																
S 98 15	Infrastrutture Aurelia (quartiere Trionfale)	Ministero Difesa	feb-99	feb-99	697 000 000	697 000 000																
S 98 16	Caserma della Polizia di Stato "Tor di Quinto" (lotti del quartiere Flaminio)	Ministero Difesa	gen-99	dic-99	1 800 000 000	1 800 000 000																
S 98 17	Caserma della Polizia di Stato "Tuscolano Ostiense" (lotti del quartiere Ostiense)	Ministero Difesa	gen-99	dic-99	2 997 000 000	2 997 000 000																
S 98 18	Nuova caserma Polizia di Stato (Ponte Galeria)	Ministero Difesa	gen-98	dic-99	4 044 000 000	4 044 000 000																
S 98 19	Nuova caserma Polizia di Stato (Ponte Milvio)	Ministero Difesa	dic-98	set-99	11 000 000 000	11 000 000 000																
S 98 20	Completamento Circonvallazione Ostiense	Ministero Difesa - Anas da definire	gen-99	dic-99	1 500 000 000	1 500 000 000																
S 98 21	Interventi per la mobilità del personale	Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile	feb-98	dic-99	455 000 000	455 000 000																
S 98 22	Interventi per la mobilità del personale	Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile	gen-98	nov-99	539 000 000	539 000 000																
S 98 23	Ristrutturazione nuova caserma Carabinieri Via Cassia	Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile	gen-99	dic-99	500 000 000	500 000 000																

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Responsabile del finanziamento	Tempi di realizzazione dell'opera	Tempi completamento opera	REGIONE PONTE CHIBI ED ISMI	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Ulteriori 1% Conto rilascio	PROGETTAZIONE: Primati 0% Conto rilascio	PROGETTAZIONE: Ulteriori finanziamenti ma superiori al 10% Conto rilascio	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% e 50% Impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% e 50% Impegno di spesa non a disposizione	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: 20% Impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: Non alla compilazione dell'80% e 100% dell'impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO: 10% dell'ammontare del complesso previsionale	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandato diretto): "Trasferito" nel corso dell'esercizio	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (mandato diretto): Variazione chiusura esercizio	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI BENEFICIARI: per "trasferito" nella misura richiesta	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
E 40 39	Potenziamento e Trasformazione II	Trasporto Ordine alla Navigazione Civile	dal=98	dal=99	2 000 000 000	2 000 000 000																		
E 40 38	Acquisto rimorchiatore	Ministero Difesa Direzione Generale Civile	mag=98	set=98	11 000 000 000	11 000 000 000																		
E 40 37	Ampliamento e ristrutturazione della stazione radiotelegrafica del Dipartimento Civile	Presidente del Consiglio Dipartimento della Protezione Civile	dic=98	mar=99	399 000 000	399 000 000																		
E 40 36	Ampliamento e ristrutturazione della stazione radiotelegrafica del Dipartimento Civile	Presidente del Consiglio Dipartimento della Protezione Civile	dic=98	mar=99	697 000 000	697 000 000																		
E 40 35	Potenziamento e ammodernamento della rete radiotelegrafica per la sala operativa e la segreteria e di supporto	Presidente del Consiglio Dipartimento della Protezione Civile	nov=98	dic=99	3 983 000 000	3 983 000 000																		
E 40 34	Adeguamento e ammodernamento	Ministero Industria Comm. e artigian. VV.FF. Direzione Centrale	dic=98	set=99	5 000 000 000	5 000 000 000																		
E 40 33	Centro CC e sua Sede Centro di coordinamento CC minori	Ministero Interno	dic=98	set=99	1 000 000 000	1 000 000 000																		
E 40 32	Sale di coordinamento radio	Ministero Interno	dic=98	gen=99	5 500 000 000	5 500 000 000																		
E 6	Interventi a sostegno dell'occupazione																							
E 40 31	Costruzione e forma a disposizione per la navigazione di unità navali galleggianti	Ministero di Grazia e Giustizia	gen=98	dic=00	5 000 000 000	5 000 000 000																		
E 40 30	Centro di Coop. alla Pace Direzione Dipartimento ed altre opere	Ministero di Grazia e Giustizia	n.d.	n.d.	2 700 000 000	2 700 000 000																		
					499 716 936 332	551 116 936 332	9 288 000 000		9 288 000 000		74 526 943 846	18 941 433 929				52 366 000 000		43 745 000 000		137 252 943 846	116 868 433 929	64 925 000 000	

F Settore F - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO

F 1 Centro informativo, sale stampa e biblioteche per l'informazione

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario dell'intervento	Tempi amministrativi di realizzazione	Tempi completamento opere	RISORSE POSTO GRAVELLO 1998	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE: Ulteriori Trasferimenti 1% Conto chiuso	PROGETTAZIONE: Permessi 5% Conto chiuso	PROGETTAZIONE: Ulteriori Trasferimenti non superiori al 10% Conto chiuso	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE DI RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: IMPEGNI DI SPESA	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE DI RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% o 30% Impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE DI RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACCONTI: 20% o 30% Impegno di spesa (quota parte)	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE DI RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: 10% Impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE DI RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ULTERIORI EROGAZIONI: Sul 40% rimanente dopo il 60% dell'impegno di spesa	REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE DI RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: SALDO: 10% del costo dell'intervento	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (modello decreto): "Trasferimento" nel corso dell'esecuzione	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: REGIONE LAZIO (modello decreto): Volturazione risorse liquide	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE: ALTRI BENEFICIARI: per "trasferimento" nella gestione ordinaria	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
F 01 015	Corso di perfezionamento del Centro di ricerca per la storia e la memoria della Resistenza e della guerra di liberazione	Agenzia di Roma per la promozione del Cinema	mar-98	feb-99	5 673 712 000	5 673 712 000	48 000 000		48 000 000											48 000 000	48 000 000	
F 01 015	Corso di perfezionamento in Psicologia e Psicopatologia della Resistenza e della guerra di liberazione e della violenza politica	Agenzia di Roma per la promozione del Cinema	mar-98	feb-99	7 275 712 000	7 275 712 000	117 000 000		904 841 261											117 000 000	904 841 261	
F 01 02	Centro servizi museo Centro Sperimentale di Cinematografia	Agenzia di Roma per la promozione del Cinema	set-98	set-99	5 161 762 350	5 161 762 350	200 000 000		200 000 000		4 961 762 350	2 199 131 270								5 161 762 350	2 199 131 270	
F 01 05	Adeguamento ed allestimento di nuovi spazi espositivi e magazzini del Museo Civico Cinematografico presso la Mostra d'Oltremare	Agenzia di Roma per la promozione del Cinema	mag-97	giu-98	614 000 000	614 000 000	50 000 000		50 000 000		564 174 233				502 714 790					614 174 233	512 714 790	
F 01 04	Restauro ed adeguamento funzionale della Casa del Cinema	FEPA	dic-98	ott-99	3 810 000 000	3 810 000 000																
F 4	Contributo per attività organizzative ai sensi del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1994																					
F 04 01	Contributo per funzionamento ex Ente Autonomo di Gestione Cinema e Spettacolo (Legge 29 dicembre n.451	Agenzia di Roma per la promozione del Cinema			95 151 496 000	95 151 496 000	12 000 000 000		12 000 000 000		21 000 000 000	21 000 000 000								33 000 000 000	33 000 000 000	
F 04 02	Contributo per Centro Sperimentale di Cinematografia	Il Direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia			6 000 000 000	6 000 000 000																
F 5	Sistemi informativi e telematici per la gestione e la programmazione dell'Ente																					
F 04 01	Sistema di governo della rete informativa e telematica dell'Ente e per la gestione degli archivi storici	Agenzia di Roma per la promozione del Cinema	gen-99	set-99	8 613 240 000	8 613 240 000	300 000 000		300 000 000		5 700 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000						6 000 000 000	3 150 000 000	
F 04 02	Sistema di automazione e informatizzazione dei processi produttivi	Agenzia di Roma per la promozione del Cinema	lug-99	set-99	5 000 000 000	5 000 000 000	250 000 000		250 000 000											250 000 000	250 000 000	
F 04 05	Sistema informativo e telematico	Agenzia di Roma per la promozione del Cinema	gen-98	giu-99	7 613 000 000	7 613 000 000	150 000 000		150 000 000		2 850 000 000	750 000 000		675 000 000						3 900 000 000	1 575 000 000	

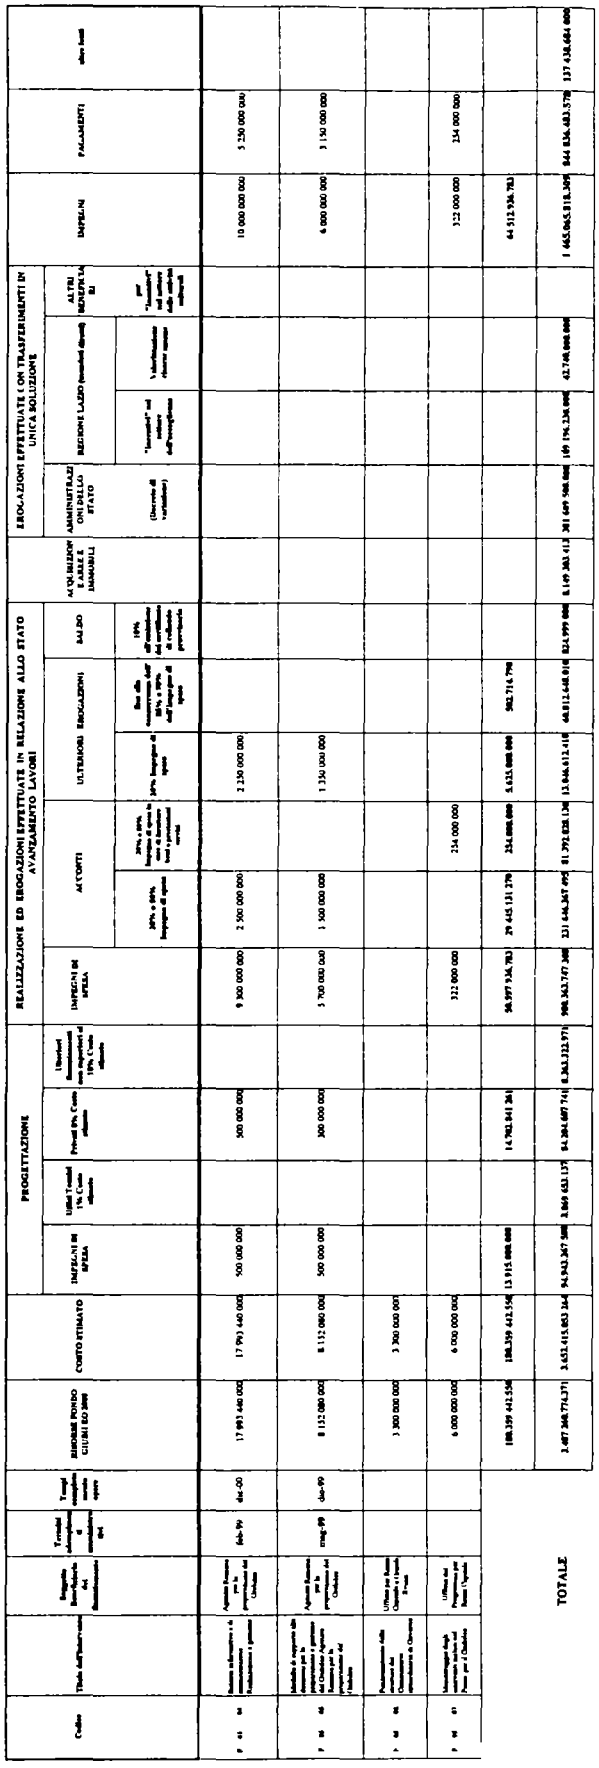

TOTALE

PAGINA BIANCA

3. Lo stato di attuazione per singolo intervento (istogrammi)

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

LEGENDA

FASI PROGRAMMATE DELL'ATTUAZIONE | FASI REALI DELL'ATTUAZIONE | FASI COINCIDENTI

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cauziere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
A	**SOCIALE ACCOGLIENZA**																									
A1 Creazione di strutture per l'accoglienza delle categorie disagiate																										
A	01	02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000	212.000	0																			
A	01	03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000	212.000	0																			
A	01	04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S.Margherita" - Roma	7.000.000	7.000.000	0																			
A	01	05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma). nell'edificio "S. Giuseppe Doria"	IPAB "S.Francesca Romana" - Roma	1.900.000	1.900.000	0																			
A	01	06	Comunità alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove	Comune di Roma - Dip. XII - III U.O.	1.500.000	1.500.000	0																			
A	01	07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.	Comune di Roma - Dip. XII - III U.O.	4.355.794	4.355.794	0																			
A	01	10	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune di in località Passoscuro	Comune di Fiumicino	600.000	600.000	0																			
A	01	11	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAC	10.995.000	10.995.000	0																			
A	01	12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	1.218.539	1.218.539	0																			
A	01	13	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Fiumicino	2.500.000	2.500.000	0																			
A	01	14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma) Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	1.538.000	1.538.000	0																			
A	01	15	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Monterotondo	260.000	260.000	0																			
A	01	16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	650.893	650.893	0																			
A	01	17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma) Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano	Comune di Civitavecchia	3.245.000	3.245.000	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																				
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive											Fasi Finali		
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Progr.mmaz.	Prog. Fattib.	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
A	01	18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio	149.250	149.250	0																					
A	01	19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	Provincia di Roma	1.165.066	1.165.066	0																					
A	01	21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola	Comune di Roma - Ufficio Città Storica	5.500.000	5.500.000	0																					
A	01	22	Segnalatori acustici per non vedenti sui mezzi pubblici	ATAC	3.000.000	3.000.000	0																					
A	01	23/1	Allestimento di centri di accoglienza per bambini nei musei comunali	Comune di Roma - Ufficio Speciale Citta dei Bambini	1.000.000	1.000.000	0																					
A	01	23/2	Ristrutturazione servizi di accettazione e pronto soccorso clinica pediatrica	Univ. La Sapienza - Policlinico Umberto I	2.000.000	2.000.000	0																					
A	01	24	Sistemazione del Centro Accoglienza Italiani nel Mondo (CAIM) presso la chiesa di S. Giovanni della pigna e locali annessi	Chiesa di S. Giovanni della Pigna	1.288.700	1.288.700	0																					
A	01	25	Riqualificazione di una struttura conventuale	Congregazione Suore Francescane del Sacri Cuori	3.438.000	3.438.000	0																					
A	01	26/1	Progetto di ristrutturazione e completamento architettonico e funzionale del complesso sito in Via della Isole	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida	2.349.442	2.349.442	0																					
A	01	26/2	Progetto di ristrutturazione e completamento architettonico e funzionale del complesso sito in Via Cassia	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida	1.922.091	1.922.091	0																					
A	01	27	Centro di accoglienza permanente per pellegrini portatori di handicap (primo stralcio)	Prov. Relig. Apostoli Pietro e Paolo - Opera Don Orione	16.000.000	16.000.000	0																					
A	01	28	Zona ricettiva - Casa per ferie	Direzione Generale Opere don Bosco	3.000.000	3.000.000	0																					
A	01	29	Centro attrezzato per la tutela della prima infanzia al servizio della famiglia disagiata	Congregaz. Figlie della Madonna del Divino Amore	6.909.000	1.000.000	5.909.000																					
A4	Restauro del complesso del Buon Pastore																											
A	04	01/1	Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma - Sopraintendenza Comunale	2.200.000	2.200.000	0																					
A	04	01/2	Complesso Buon Pastore (Roma). Restauro e recupero funzionale del corpo seicantesco	Comune di Roma - Dip. XII - IV U O	9.800.000	9.800.000	0																					
A5	Dismissione e riutilizzo Ospedale S.Maria della Pietà e dell'Istituto V.Emanuele di Ostia come centri di accoglienza per pellegrini																											

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																	
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
A	05	01/1	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Risanamento parco)	USL RM E	2.000.000	2.000.000	0																			
A	05	01/2	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)	USL RM E	1.000.000	1.000.000	0																			
A	05	01/3	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Straord. Manutenz. Padigl. Direzione)	USL RM E	5.086.000	5.086.000	0																			
A	05	01/4	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenzione ordinaria cappella e 3 padiglioni)	USL RM E	6.988.000	6.988.000	0																			
A	05	01/5	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)	USL RM E	9.927.000	9.927.000	0																			
A	05	02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturaz. ex colonia marina "V. Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	6.879.166	6.879.166	0																			
A6	Interventi per l'accoglienza dei pellegrini in condizioni disagiate: interventi pubblici di ristrutturazione e incentivi per interventi preivati ("privato sociale")																								
A	06	01	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.	Regione Lazio	10.000.000	10.000.000	0																			
A	06	02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipab e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati	Regione Lazio	20.800.000	20.800.000	0																			
A7	Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo																								
A	07	01	Centro di accoglienza turistica e convitto (Roma) Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi	Provincia di Roma	6.975.315	5.231.486	1.743.829																			
A	07	03	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	1.110.000	676.000	434.000																			
A	07	04	Ostello della giovent (Ci ampino/Roma)	Comune di Ciampino	3.538.201	2.538.201	1.000.000																			
A	07	05	Ostello della Giovent (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	Comune di Albano Laziale	550.000	375.000	175.000																			
A	07	06	Ostello della Giovent (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	4.632.849	3.282.849	1.350.000																			
A	07	07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	2.440.000	1.830.000	610.000																			
A	07	07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	560.000	420.000	140.000																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																				
								Fasi amministrative						Fasi Esecutive											Fasi Finali			
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
A 07	09		Campeggio (Fiano Romano/Roma). Completamento	Comune di Fiano Romano	889.922	589.922	300.000																					
A 07	10		Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama	350.000	150.000	200.000																					
A 07	11		Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	1.750.000	1.050.000	700.000																					
A 07	12		Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	500.000	375.000	125.000																					
A 07	13		Completamento Ostello Prataglia	Comune di Cervara	302.623	219.173	83.450																					
A 07	14		Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anticoli Corrado	874.500	656.000	218.500																					
A 07	15		Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma). Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi	Comune di Arsoli	964.700	764.700	200.000																					
A 07	16		Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Pirgus	Comune di S. Marinella	962.706	600.000	362.706																					
A 07	18		Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	400.000	300.000	100.000																					
A 07	19		Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento	Provincia di Viterbo	1.678.902	1.065.902	611.000																					
A 07	20		Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° stralcio funzionale)	Comune di Vitorchiano	991.503	741.503	250.000																					
A 07	21		Ostello della Gioventù "Torretta" (Tuscania/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi	Asilo infantile di Tuscania	500.000	338.000	162.000																					
A 07	22		Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monast. Clarisse di S. Rosa (VT)	1.167.077	834.077	333.000																					
A 07	23		Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Contigliano	2.200.000	1.650.000	550.000																					
A 07	24		Casa di accoglienza-ostello della gioventù in edifici storici a) Residenza Abati di Farfa; b) ex albergo (montopoli/Rieti)	Comune di Montopoli	800.000	600.000	200.000																					
A 07	25		Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	6.000.000	4.500.000	1.500.000																					

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																				
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive											Fasi Finali		
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
A	07	26	Casa di accoglienza - ostello della giovent (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di palazzo Sbraccia	Comune di Poggio Mirteto	972.000	729.000	243.000																				
A	07	27	Ostello della Giovent (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	1.600.000	1.200.000	400.000																				
A	07	28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	Comune di Magliano Sabina	2.700.000	2.025.000	675.000																				
A	07	29	Area camper (Frasso Sabino/Rieti) Realizzazione della pavimentazione, dei servizi e sistemazione degli accessi	Comune di Frasso Sabino	500.000	375.000	125.000																				
A	07	30	Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi	Comune di Montopoli	500.000	375.000	125.000																				
A	07	31	Ostello della giovent (Poggi o Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone	280.000	210.000	70.000																				
A	07	32	Ostello della Giovent (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico	Comune di Campodimele	298.250	206.250	92.000																				
A	07	33	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracolle	Comune di Lenola	380.239	230.239	150.000																				
A	07	34	Ostello della Giovent (Roccagorga/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphilj	Comune di Roccagorga	120.000	90.000	30.000																				
A	07	35	Ostello della Giovent (Maenza/Latina) Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna	Comune di Maenza	500.000	375.000	125.000																				
A	07	36	Ostello della Giovent (Bassi ano/Latina) Acquisto arredamento	Comune di Bassiano	200.000	150.000	50.000																				
A	07	37	Ostello della Giovent (Serm oneta/Latina) Realizzazione	Comune di Sermoneta	1.342.011	942.011	400.000																				
A	07	39	Ostello della Giovent (Apri lia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)	Comune di Aprilia	2.667.000	2.000.000	667.000																				
A	07	40	Centro di accoglienza (Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	Ist. Prof. di Stato San Benedetto	1.395.703	961.703	434.000																				
A	07	41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	1.067.000	800.000	267.000																				
A	07	42	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi	Comune di Veroli	2.000.000	1.500.000	500.000																				

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cont. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
A	07	43	Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) Ristrutturazione ed adeguamento della struttura	Comune di Villa S. Lucia	336.219	236.219	100.000																			
A	07	44	Centro di accoglienza nell'ex convento S. Nicola (Alvito/Frosinone) Adeguamento della struttura	Provincia di Frosinone	1.301.161	926.161	375.000																			
A	07	45	Ostello della giovent (San Donato Val Comino/Frosinone)	Comune di San Donato Val Comino	1.084.161	799.381	284.780																			
A	07	46	Ostello della giovent e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschetta	Comune di Alatri	2.667.000	2.000.000	667.000																			
A8	Incentivi per la riqualificazione delle strutture di accoglienza alberghiere ed extralberghiere																									
A	08	01	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio	99.653.000	99.653.000	0																			
A9	Allestimento di un centro di accoglienza per pellegrini nella Corsia Sistina dell'Ospedale Santo Spirito																									
A	09	01	Corsia Sistina-Ospedale S.Spirito: centro temporaneo d'accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di S.Pietro.Lavori di restauro ed allestimento	Azienda Sanitaria Roma E	650.000	650.000																				
A10	Interventi inerenti il Santuario del Divino Amore																									
A	10	01	Pavimentazione del sagrato del Santuario e dei viali processionali	Parrocchia S.Maria del Divino Amore	1.379.000	1.379.000	0																			
A	10	02	Deumidificazione dei piani inferiori degli edifici del 700 e della Chiesa del Santuario	Parrocchia S.Maria del Divino Amore	234.000	234.000	0																			
A	10	03	Eliminazione barriere architettoniche nei percorsi interni al comprensorio del Divino Amore	Parrocchia S.Maria del Divino Amore	917.000	917.000	0																			
B	**BENI CULTURALI**																									
B1	Area del Grande Campidoglio. Palazzo Senatorio e Musei Capitolini																									
B	01	02	Area del Grande Campidoglio. Progetto di restauro e sistemazione dei Musei Capitolini. 2° lotto funzionale.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	7.500.000	7.500.000	0																			
B2	Area dei Fori Imperiali: nuovi scavi, restauri e allestimenti museali																									
B	02	01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali. Museo dei Fori Imperiali ai Mercati Traianei (Roma).	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	5.000.000	5.000.000	0																			
B	02	01/2	Area archeologica dei Fori Imperiali. Museo dei Fori Imperiali. Allestimento dei materiali mobili restaurati.	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	990.000	990.000	0																			
B	02	01/3	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.322.277	2.322.277	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Fasi amministrative						Fasi Esecutive										Fasi Finali	
								Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B	02		Area archeologica dei Fori Imperiali: Restauri e sistemazioni esterne dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.168.124	2.168.124	0																			
B	02	03/1a	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi. area del Foro di Cesare	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	3.278.708	3.278.708	0																			
B	02	03/1b	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Tempio della Pace	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	4.283.934	4.283.934	0																			
B	02	03/1c	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi area del Foro di Traiano	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	5.844.358	5.844.358	0																			
B	02	03/2a	Area dei Fori Imperiali: Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Cesare	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	1.312.658	1.312.658	0																			
B	02	03/2b	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche. Tempio della Pace	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	1.360.490	1.360.490	0																			
B	02	03/2c	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Traiano	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	1.969.554	1.969.554	0																			
B3	Restauro e manutenzione del percorso delle Mura storiche																								
B	03	01	Mura di Roma. Restauro e valorizzazione di Porta S. Paolo.	Comune di Roma - Dip XII - IV U.O.	1.600.000	1.600.000	0																			
B	03	02/1	Mura di Roma. Restauro di Porta S. Sebastiano, Arco di Druso, Porta Latina, tratti di mura da Porta S. Sebastiano al Bastione Ardeatino	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.814.554	1.814.554	0																			
B	03	02/2	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro tratti murari tra Porta S. Sebastiano a Porta Metronia	Comune di Roma - Dip XII - IV U.O.	1.689.121	1.689.121	0																			
B	03	03	Mura di Roma. Restauro di Porta S.Giovanni e tratto di mura da Porta Asinaria all'anfiteatro Castrense	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	3.000.000	3.000.000	0																			
B	03	04/1	Mura di Roma. Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace	Comune di Roma - Dip XII - IV U.O.	2.600.000	2.600.000	0																			
B	03	04/2	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.088.736	1.088.736	0																			
B	03	05	Mura di Roma. Restauro conservativo e consolidamento del complesso monumentale di Porta Pia	Comune di Roma - Dip XII - IV U.O.	1.786.034	1.786.034	0																			
B	03	06	Mura di Roma. Restauro ed adeguamento della Porta del Popolo	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.730.752	1.730.752	0																			
B	03	07	Mura di Roma. Restauro, consolidamento, museallizzazione ed adeguamento alle normative di sicurezza dell'edificio di Porta San Pancrazio	Comune di Roma - Dip XII - IV U.O.	1.242.790	1.242.790	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative						Fasi Esecutive										Fasi Finali		
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B	03	08	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Gianicolensi nel tratto Porta S. Pancrazio - Porta Portese	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.774.396	1.774.396	0																			
B	03	09/1	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle Mura Aureliane nel tratto Campo Boario - largo Lazzarini	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.881.050	1.881.050	0																			
B	03	09/2	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle Mura Aureliane nel tratto largo Lazzarini - Bastione Ardeatino	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.225.208	2.225.208	0																			
B4	Palazzo delle Esposizioni: Restauro ed adeguamento funzionale																									
B	04	01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.128.057	1.128.057	0																			
B5	Palazzo Braschi (Museo di Roma): Restauro ed adeguamento funzionale																									
B	05	01/1	Restauro di Palazzo Braschi : Interventi preliminari.	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	1.608.000	1.608.000	0																			
B	05	01/2	Restauro di Palazzo Braschi . Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	10.673.194	10.673.194	0																			
B8	Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)																									
B	08	01	Palazzo Altemps (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo antiquario	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	6.808.900	4.808.900	2.000.000																			
B	08	02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.500.000	1.500.000	0																			
B	08	03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica": restauri e allestimenti	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	2.146.766	2.146.766	0																			
B	08	04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	2.367.818	2.367.818	0																			
B	08	05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, riallestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Cinquecento)	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	911.588	911.588	0																			
B	08	06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture diocleziane ed aree archeologiche, completamento restauro museo delle Cere	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	800.000	800.000	0																			
B	08	07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica - Sale dei Capolavori"	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	2.970.687	2.970.687	0																			
B	08	08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	8.700.000	8.700.000	0																			
B	08	09	Museo Nazionale Romano, Cripta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	28.222.533	8.222.533	20.000.000																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																	
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B9 Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)																									
B	09	01	Restauro del complesso di Palazzo Barberini (Roma) - primo stralcio	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	15.142.889	5.142.889	10.000.000																			
B10 Museo Nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia e Villa Poniatowski)																									
B	10	01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	BB. CC. AA. - (6) S. Archeol. Etr. Mer.	9.800.000	9.800.000	0																			
B	10	01/b	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	BB. CC. AA. - (6) S. Archeol. Etr. Mer.	9.800.000	9.800.000	0																			
B	10	01/c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stohl Fern)	BB. CC. AA. - (6) S. Archeol. Etr. Mer.	3.400.000	3.400.000	0																			
B11 Galleria Nazionale d'Atrte Moderna																									
B	11	01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	BB. CC. AA. - (6) Gal. Naz. Arte Mod.	24.124.859	9.124.859	15.000.000																			
B12 Interventi di restauro di immobili e complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)																									
B	12	01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	581.697	581.697	0																			
B	12	02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	3.103.076	3.103.076	0																			
B	12	03	Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	9.676.423	9.676.423	0																			
B	12	04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	3.000.000	3.000.000	0																			
B	12	05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.401.670	1.401.670	0																			
B	12	06/a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	2.208.104	2.208.104	0																			
B	12	06/b	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	267.073	267.073	0																			
B	12	08	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.654.140	1.654.140	0																			
B	12	09	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	300.000	300.000	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																				
								Fasi amministrative						Fasi Esecutive												Fasi Finali		
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Proge. Prelim	Proge. Def.	Proge.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B	12	10	Appia Antica - Cecilia Metella	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.860.559	1.860.559	0																				
B	12	11	Mausoleo di S.Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.206.441	1.206.441	0																				
B	12	12	Mausoleo "Berretta del Pretel" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.264.993	1.264.993	0																				
B	12	13	Parco archeologico della via Flaminia Arco - Casale di Malborghetto	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.000.000	1.000.000	0																				
B	12	14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	573.725	573.725	0																				
B	12	15	Rocca di Papa Castello di Palazzolo	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	923.047	923.047	0																				
B	12	16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	5.582.254	5.582.254	0																				
B	12	17	Antica Rocca (Civitavecchia/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	1.691.925	1.691.925	0																				
B	12	18	Forte Michelangelo (Civitavecchia/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	2.670.383	2.670.383	0																				
B	12	19	Castello di S.Severa (S.Marinella/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	4.965.905	4.965.905	0																				
B	12	20	Castello Odescalchi (Santa Marinella - Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	523.785	523.785	0																				
B	12	21	Castello Odescalchi (Bracciano/Roma) Rifacimento coperture	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	564.330	564.330	0																				
B	12	22	Castello di Monterone (Ladispoli/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	2.820.072	2.820.072	0																				
B	12	23	Completamento dei lavori di restauro e ripulitura dei prospetti, revisione dei tetti e lavori interni - Palazzo Stamperia	Presidenza Consiglio Ministri	1.500.000	1.500.000	0																				
B	12	24	Ripulitura delle facciate interne ed esterne, revisione e verniciatura dei relativi infissi e sistemazioni varie a Palazzo Chigi	Presidenza Consiglio Ministri	3.672.000	3.672.000	0																				
B	12	25	Restauro della casa di S. Brigida in P.zza Farnese	Ordine del SS Salvatore di Santa Brigida	600.000	600.000	0																				

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative						Fasi Esecutive											Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B 12	26		Passetto di Borgo - Restauro conservativo tratto Piazza Pia - Via del Campanile	BB. CC. AA. - (7)	1.000.000	1.000.000	0																			
B 12	27		Ex scuderie papali al Quirinale - Restauro e risanamento conservativo	BB. CC. AA. - (7)	8.897.000	8.897.000	0																			
B13 Restauri ed interventi conservativi di chiese, basiliche, Monasteri, Oratori lungo gli itinerari storici del Giubileo																										
B 13	01/1		Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	4.000.000	4.000.000	0																			
B 13	01/2		Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	927.720	927.720	0																			
B 13	02		Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	384.256	384.256	0																			
B 13	03		Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	500.000	500.000	0																			
B 13	04		Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	500.000	500.000	0																			
B 13	05		Chiesa SS. Quattro coronati	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	489.647	489.647	0																			
B 13	06		S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	890.906	890.906	0																			
B 13	07		Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.922.727	1.922.727	0																			
B 13	08		Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	700.000	700.000	0																			
B 13	09		Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	180.830	180.830	0																			
B 13	10		Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	1.000.000	1.000.000	0																			
B 13	11		Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	918.191	918.191	0																			
B 13	12		Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	800.000	800.000	0																			
B 13	13		Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	444.154	444.154	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																			
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B	13	14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	672.536	672.536	0																				
B	13	15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.000.000	1.000.000	0																				
B	13	16	Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	800.000	800.000	0																				
B	13	17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.388.727	1.388.727	0																				
B	13	18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina- prosecuzione del consolidamento e restauro	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	394.949	394.949	0																				
B	13	19	Chiesa S. Agnese in Agone	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.072.494	1.072.494	0																				
B	13	20	Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	2.500.000	2.500.000	0																				
B	13	21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	961.300	961.300	0																				
B	13	22	Chiesa di S. Susanna restauro prospetti int. rifacimento coperture	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	737.477	737.477	0																				
B	13	23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	500.000	500.000	0																				
B	13	24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	639.480	639.480	0																				
B	13	25/1	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro cappella Altemps e indagini archeologiche	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	500.000	500.000	0																				
B	13	25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altemps e della cappella Avila.Scavo archeologico e valorizzazione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	300.000	300.000	0																				
B	13	26	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	848.724	848.724	0																				
B	13	27	Restauro, bonifica e rifacimento tetti Chiesa S. Eustachio (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	749.391	749.391	0																				
B	13	28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	600.000	600.000	0																				

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

| Codici | | | Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento | | Risorse finanziarie (in migliaia) | | | Processo d'Attuazione | | |

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																				
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive												Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.-esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B	13	44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro del muro di cinta del convento	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	310.497	310.497	0																					
B	13	45/1	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma) Restauro degli interni	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	300.000	300.000	0																					
B	13	45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	400.000	400.000	0																					
B	13	46/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	470.650	470.650	0																					
B	13	46/2	Chiesa di S. Maria alle Fornaci: Restauro portici e facciate	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	711.336	711.336	0																					
B	13	46/3	Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	700.000	700.000	0																					
B	13	46/4	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	724.740	724.740	0																					
B	13	47/1	Chiese di S. Maria sopra Minerva. Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	550.000	550.000	0																					
B	13	47/2	Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	1.235.000	1.235.000	0																					
B	13	47/3	Chiese di S. Maria in Trivio. Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	350.000	350.000	0																					
B	13	47/4	Chiese di S. Silvestro al Quirinale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	220.000	220.000	0																					
B	13	47/5	Chiese di S.Vitale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	200.000	200.000	0																					
B	13	48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro della zona absidale	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	374.916	374.916	0																					
B	13	48/2	Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	470.435	470.435	0																					
B	13	48/3	Chiesa di S. Maria in Publicolis: Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	381.127	381.127	0																					
B	13	48/4	Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	600.000	600.000	0																					

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

| Codici | | | Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento | | Risorse finanziarie (in migliaia) | | | Processo d'Attuazione | | |

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

| Codici | | | Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento | | Risorse finanziarie (in migliaia) | | | Processo d'Attuazione | | |

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive									Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B	13	74	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Restauro e risanamento del soffitto artistico ligneo	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	580.000	580.000	0																		
B	13	75	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Rifacimento degli impianti di illuminazione ed elettrici	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	720.000	720.000	0																		
B	13	76	Nuove rampe per disabili e posto di pronto soccorso	Patriarcale Basilica di S. G. in Laterano	234.000	234.000	0																		
B	13	77	Restauri e rinnovo impianto elettrico	Patriarcale Basilica di S. G. in Laterano	2.057.000	2.057.000	0																		
B	13	78	Messa a norma dell'impianto elettrico e nuovo impianto per l'amplificazione e la diffusione	Pontificia Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo	2.000.000	2.000.000	0																		
B	13	79	Restauro dell'organo di Giovanni Corrado Verlè	Ord. Cistercense SS Vincenzo e Anastasio	249.000	249.000	0																		
B	13	80	Cappella S. Maria del Popolo	BB. CC. AA. - (7)	800.000	800.000	0																		
B14 Interventi di restauro e adeguamento funzionale di altri Musei Archeologici, Medievali, Moderni																								
B	14	01	Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova sede dell'Ist. Naz della Grafica	BB. CC. AA. - (6) Ist. Naz. Grafica	10.714.115	10.714.115	0																		
B	14	02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	6.984.526	6.984.526	0																		
B	14	03	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	747.867	747.867	0																		
B	14	04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.305.436	1.305.436	0																		
B	14	05	Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale	BB. CC. AA. - (6) Mus. Naz. C. S. Ang.	1.500.000	1.500.000	0																		
B	14	06	Museo delle navi romane (Nemi/Roma)	BB. CC. AA. - (6) S. Archeol. Lazio	800.000	800.000	0																		
B	14	07	Museo d'Arte Sacra	Parrocchia S. Giovanni dei Fiorentini	700.000	700.000	0																		
B	14	08	Completamento "Museo del Fiume"	Comune di Nazzano	900.000	900.000																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B15 Interventi sulle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano																										
B	15	01	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano	BB. CC. AA. - (4) S.B. Archeol. Ostia	4.000.000	4.000.000	0																				
B	15	02	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica)	BB. CC. AA. - (4) S.B. Archeol. Ostia	7.000.000	7.000.000	0																				
B	15	03	Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico	BB. CC. AA. - (4) S.B. Archeol. Ostia	2.000.000	2.000.000	0																				
B	15	04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale	BB. CC. AA. - (4) S.B. Archeol. Ostia	2.000.000	2.000.000	0																				
B	15	05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	BB. CC. AA. - (4) S.B. Archeol. Ostia	2.000.000	2.000.000	0																				
B	15	06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita	BB. CC. AA. - (4) S.B. Archeol. Ostia	1.500.000	1.500.000	0																				
B	15	07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)	BB. CC. AA. - (4) S.B. Archeol. Ostia	1.500.000	1.500.000	0																				
B16 Interventi di restauro e consolidamento di beni culturali archeologici																										
B	16	01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	893.929	893.929	0																				
B	16	02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	4.672.784	4.672.784	0																				
B	16	03	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.180.800	1.180.800	0																				
B	16	04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	2.339.255	2.339.255	0																				
B	16	05	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.886.029	1.886.029	0																				
B	16	06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	398.319	398.319	0																				
B	16	07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Portico Adrianeo antistante	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	2.117.286	2.117.286	0																				
B	16	08	Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	721.892	721.892	0																				

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative						Fasi Esecutive											Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B 16	09		Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	2.745.454	2.745.454	0																				
B 16	10		Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S.Maria Antiqua a S.Anastasia e a via di S.Gregorio Restauro e manutenzione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.780.174	1.780.174	0																				
B 16	11		Palatino - Foro Romano (Roma) Arcate Severiane e Terme Restauro	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.815.959	1.815.959	0																				
B 16	12		Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberini Ultimazione restauri	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	3.183.883	3.183.883	0																				
B 16	13		Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	902.260	902.260	0																				
B 16	14		Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	3.698.046	3.698.046	0																				
B 16	15		Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	893.463	893.463	0																				
B 16	16		Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	2.243.464	2.243.464	0																				
B 16	17		Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	274.975	274.975	0																				
B 16	18/01		Itinerari antichi e monum.ti archeol. connessi, materiali archeol. ed opere d'arte (Roma). Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Giardino di P.zo Barberini: scavo e restauro	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	792.578	792.578	0																				
B 16	18/02		Itinerari antichi e monum.ti archeol. connessi, materiali archeol. ed opere d'arte (Roma). Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	100.000	100.000	0																				
B 16	18/03		Itinerari antichi e monum.ti archeol. connessi, materiali archeol. ed opere d'arte (Roma). Conservazione, manutenzione e valorizzazione - S. Cecilia, realizzazione di copertura.	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol RM	97.922	97.922	0																				
B 16	18/04		Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbone	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	139.395	139.395	0																				
B 16	18/05		Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo -Carcere Mamertino	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	551.079	551.079	0																				
B 16	18/06		Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana località Casali Bianco	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	47.516	47.516	0																				
B 16	18/07		Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino nomentano	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	45.818	45.818	0																				

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B	16	18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Mitreo di S. Stefano Rotondo	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	91.597	91.597	0																			
B	16	18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	45.798	45.798	0																			
B	16	18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Ruderi in Piazza Iside	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	92.502	92.502	0																			
B	16	18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	901.046	901.046	0																			
B	16	18/12	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sette Bassi	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	100.000	100.000	0																			
B	16	18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura integrata del territorio	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	94.537	94.537	0																			
B	16	18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	50.000	50.000	0																			
B	16	18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	60.000	60.000	0																			
B	16	18/16	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano aula ottagona	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	122.102	122.102	0																			
B	16	18/17	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	675.516	675.516	0																			
B	16	18/18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana località Casalotti	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	93.184	93.184	0																			
B	16	18/19	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ottavii	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	25.000	25.000	0																			
B	16	18/20	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo -Villa romana in località Monte Colonnacce	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	576.929	576.929	0																			
B	16	18/21	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo -Necropoli Portuense in località Pozzo Pantaleo	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	470.392	470.392	0																			
B	16	18/22	Itinerari antichi e monumenti archeol. connessi, materiali archeol. ed opere d'arte. Conservaz., manutenz., scavo - Crustumerium - Itinerario di visita della città e di due necropoli	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	831.234	831.234	0																			
B	16	18/23	Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	100.000	100.000	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

| Codici | | | Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento | | Risorse finanziarie (in migliaia) | | | Processo d'Attuazione | | |

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																			
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali		
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaud	piena funzion.
B	18	05	Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero	Comune di Albano Laziale	1.000.000	1.000.000	0																				
B	18	06	Palazzo e Parco Chigi (Ariccia/Roma)	Comune di Ariccia	4.515.222	4.515.222	0																				
B	18	07	Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adeguamento funzionale	Provincia di Roma	514.044	514.044	0																				
B	18	08	Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata. 4° settore di intervento	XI^ Comunità Montana, Sede di Rocca Priora	500.000	500.000	0																				
B	18	09	Villa Mondragone (Monte Porzio catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	7.700.000	7.700.000	0																				
B	18	10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	Comune di Segni	1.350.000	1.257.000	93.000																				
B	18	11	Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero area archeologica	Comune di Valmontone	392.505	392.505	0																				
B	18	12	Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi	Comune di Palestrina	1.313.739	1.313.739	0																				
B	18	13	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità	Comune di Castel S.Pietro Romano	546.829	544.329	2.500																				
B	18	14	Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genazzano/Roma) Lavori di ristrutturazione	Provincia di Roma	405.771	405.771	0																				
B	18	16	Museo dell'Abbazia di S.Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione	Provincia di Roma	1.959.637	1.959.637	0																				
B	18	17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	397.686	397.686	0																				
B	18	18	Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	741.881	741.881	0																				
B	18	19	Ex chiesa di S.Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	Provincia di Roma	389.792	389.792	0																				
B	18	20	Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro	Comune di Fiano Romano	150.000	150.000	0																				
B	18	21	Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro	Comune di Civitella S.Paolo	254.200	254.200	0																				

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Fasi amministrative						Fasi Esecutive									Fasi Finali	
								Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B	18	22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	274.993	274.993	0																		
B	18	23	Area archeologica della Villa Neroniana (Anzio/Roma) Recupero	Comune di Anzio	1.230.000	1.230.000	0																		
B	18	24	Sistemazione area parcheggio adiacente parco Chigi e risanamento parco Primoli	Comune di Ariccia	1.000.000	1.000.000																			
B19	Valorizzazione del patrimonio culturale regionale (circuito abbazie, santuari e monasteri)																							
B	19	02	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	Regione Lazio	1.000.000	1.000.000	0																		
B	19	03	Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto)	Comune di Frascati	4.517.000	4.517.000	0																		
B	19	04/1	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra-I° stralcio	Comune di Bellegra	995.862	995.862	0																		
B	19	04/2	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra-II° stralcio	Comune di Bellegra	840.000	840.000	0																		
B	19	05	Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S.M. Novella	Comune di Bracciano	1.167.163	1.167.163	0																		
B	19	06	Restauro conservativo della Cappella votiva di S. Bellarmino	Comune di Trevignano	402.000	402.000	0																		
B	19	07	Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima fase)	Comune di Anguillara Sabazia	995.034	995.034	0																		
B	19	08	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi	Comune di Genazzano	5.774.000	5.774.000	0																		
B	19	09	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	548.829	548.829	0																		
B	19	10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	100.000	100.000	0																		
B	19	12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineto Romano/Roma)	Comune di Carpineto Romano	1.242.089	1.242.089	0																		
B	19	13	Chiesa di Santa Maria e San Mauro, Santuario Madonna degli Angeli (Canterano/Roma) Restauro e ristrutturazione	Comune di Canterano	300.000	300.000	0																		
B	19	14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	764.429	764.429	0																		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																				
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali			
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	cerif.collaudo	piena funzion.		
B	19	15	Recupero e risanamento della Chiesa di San Rocco.	Comune di Gallicano nel Lazio	212.890	172.890	40.000																					
B	19	16	Chiesa di Santa Liberata (Sant'Angelo Romano/Roma) Restauro	Comune di Sant'Angelo Romano	470.520	470.520	0																					
B	19	17	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)	Comune di Palombara Sabina	200.000	200.000	0																					
B	19	18	Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche	Comune di Vicovaro	150.000	150.000	0																					
B	19	19	Santuario di Vallepietra (Vallepietra/Roma) Centro di documentazione	Comune di Vallepietra	65.000	65.000	0																					
B	19	20/1	Restauro delle Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	372.274	372.274	0																					
B	19	20/2	Restauro della Chiesa di S. Terenziano (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	627.504	627.504	0																					
B	19	20/3	Pavimentazione del corso Petrarca ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	445.246	445.246	0																					
B	19	20/4	Sistemazione di Via della Mattonara (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	820.925	820.925	0																					
B	19	20/5	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	453.724	453.724	0																					
B	19	20/6	Sistemazione del piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	560.327	560.327	0																					
B	19	21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesiano	Diocesi di Viterbo	3.070.104	3.070.104	0																					
B	19	22	Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Ges	2.366.953	2.366.953	0																					
B	19	23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di VT	2.128.411	2.128.411	0																					
B	19	24/1	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	Comune di Tarquinia	162.388	162.388	0																					
B	19	24/2	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Tarquinia	122.789	122.789	0																					

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																				
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Fasi amministrative						Fasi Esecutive												Fasi Finali		
								Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaud	piena funzion.
B	19	24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edilizio Santuario S. Maria in Valverde	Comune di Tarquinia	2.087.815	2.087.815	0																					
B	19	25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	300.000	300.000	0																					
B	19	25/2	Sistemazione dell'Oasi francescana	Comune di Poggio Bustone	200.000	200.000	0																					
B	19	26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.600.000	1.600.000	0																					
B	19	27	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauro e sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.850.000	1.850.000	0																					
B	19	28/1	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	804.000	804.000	0																					
B	19	28/2	Lavori di sistemazione della piazza del presepio vivente. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	488.429	488.429	0																					
B	19	28/3	Lavori di sistemazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Greggio capoluogo (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	216.075	201.075	15.000																					
B	19	29	Completamento funzionale dell'Abbazia di S. Quirico e Giuditta	Comune di Micigliano	499.791	499.791	0																					
B	19	30	Complesso di S. Alessandro (Toffia/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Comune di Toffia in Sabina	1.500.000	1.500.000	0																					
B	19	31	Riqualificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro del Monastero con riallestimento del Museo	Comune di Fara in Sabina	4.729.000	4.729.000	0																					
B	19	32	S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S.Carlo da Sezze	Comune di Sezze	400.000	400.000	0																					
B	19	33	Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina) Completamento della ristrutturazione (prima fase)	Provincia di Latina	4.998.903	1.998.903	3.000.000																					
B	19	34	Lavori di consolidamento restauro Chiesa S. Maria della Pietà collegiata	Comune di Cori	1.000.000	1.000.000	0																					
B	19	35	Itinerario storico naturalistico P.R.U.M.O. Comune di Gaeta ambito area museale aperta della Città Vecchia di Gaeta e del promontorio di Monte Orlando	Comune di Gaeta	1.000.000	1.000.000	0																					
B	19	36	Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina) Sistemazione via e parcheggio	Comune di Fondi	1.000.000	1.000.000	0																					

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																			
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive											Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Proge. Prelim	Proge. Def.	Proge.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B	19	37	Castello Frangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione	Comune di Terracina	1.000.000	1.000.000	0																				
B	19	38	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro	Comune di Castelforte	200.000	200.000	0																				
B	19	39	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	1.250.000	1.250.000	0																				
B	19	40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante	Provincia di Latina	683.400	683.400	0																				
B	19	41/1	Restauro e risanamento conservativo e funzionale del convento di S. Francesco	Comune di Minturno	224.856	224.856	0																				
B	19	41/2	Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata	Comune di Minturno	130.642	130.642	0																				
B	19	42	Illuminazione viabilità di accesso al Santuario della Madonna della Sorresca	Comune di Sabaudia	105.594	105.594	0																				
B	19	43	Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata	Comune di Sabaudia	179.311	179.311	0																				
B	19	44	Chiesa di SS. Cosma e Damiano, Restauro	Comune di Santi Cosma e Damiano	120.000	120.000	0																				
B	19	45	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro	Provincia di Latina	650.000	650.000	0																				
B	19	46	Progetto pubblica illuminazione delle aree adiacenti il santuario Madonna del Colle	Comune di Lenola	99.961	99.961	0																				
B	19	47	Recupero de Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa	Comune di Formia	936.087	936.087	0																				
B	19	48	Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) restauro	Comune di Sezze	700.000	700.000	0																				
B	19	49	Madonna della Civita (Itri/Latina) Adeguamento della strada di accesso	Provincia di Latina	1.300.000	1.300.000	0																				
B	19	50	Museo storico bonifaciano (Ariegni/Frosinone) Ristrutturazione	Congregazione suore Cistercensi della Carità	650.302	650.302	0																				
B	19	51	Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale, del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera	Comune di Aquino	989.007	989.007	0																				

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																				
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Fasi amministrative						Fasi Esecutive												Fasi Finali		
								Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B	19	52	Sistemazione area attrezzata esterna al Santuario della Madonna di Canneto	Comune di Settefrati	252.425	252.425	0																					
B	19	53	Santa Maria Assunta (Alvia/Frosinone) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	615.300	615.300	0																					
B	19	54	Ristrutturazione Chiesa di Santo Stefano (Settefrati/Frosinone)	Comune di Settefrati	313.880	313.880	0																					
B	19	55	Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	Ente Chiesa di S. Maria Salomone	240.000	240.000	0																					
B	19	56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	4.000.000	4.000.000	0																					
B	19	57	Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica/Frosinone) Restauro	Comune di Boville Ernica	256.272	256.272	0																					
B	19	58	Consolidamento statico e restauro conservativo Chiesa di San Pietro in Monte (S. Giovanni Campano)	Comune di Monte San Giovanni Campano	430.000	430.000	0																					
B	19	59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	Comune di Fumone	300.000	300.000	0																					
B	19	60	Chiese S. Maria a Fiume, San Nicola, (Ceccano/Frosinone) Restauro	Comune di Ceccano	483.803	483.803	0																					
B	19	61	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Frosinone)	Diocesi di Anagni-Alatri	363.475	363.475	0																					
B	19	63/1	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	1.071.006	571.006	500.000																					
B	19	63/2	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza - Forniture	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	164.443	164.443	0																					
B	19	64	Cattedrale di San Paolo (Alatri)	Comune di Alatri	683.007	683.007	0																					
B	19	65	Chiesa della S.S. Annunziata (Frosinone) Restauro	Comune di Frosinone	870.224	870.224	0																					
B	19	66	Risanamento e ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - Santuario di San Cataldo	Comune di Supino	422.384	422.384	0																					
B	19	67	Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Ristrutturazione e allestimento museale	Comune di Ferentino	2.750.000	2.750.000	0																					

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento			Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
								Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B	19	68	Chiesa di S. Restituta (Sora/Frosinone) Restauro	Comune di Sora	675.357	675.357	0																			
B	19	69	Chiesa di San Mito	Comune di Roccasecca	300.000	300.000	0																			
B	19	70	Chiesa di Santa Maria Assunta (Piedimonte San Germano/Frosinone) Restauro	Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Piedimonte Alto	100.000	100.000	0																			
B	19	71	Abbazia di Trisulti-Casamari (Varcoli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	1.110.846	1.110.846	0																			
B	19	72	Ampliamento della Chiesa in località Grunuolo facente parte della Parrocchia di S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	60.000	60.000	0																			
B	19	73	Rifacimento copertura, facciata esterna e Sistemazione area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	100.000	100.000	0																			
B	19	74	Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo. Parrocchia S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	40.000	40.000	0																			
B	19	75	Abbazia di Casamari	Ordine Cistercense	1.000.000	1.000.000																				
B20	Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse al Giubileo																									
B	20	01.1	Opera lirica Programma da svolgersi a Roma e negli altri comuni del Lazio	Teatro dell'Opera di Roma	15.000.000	15.000.000	0																			
B	20	01.2	Musica Programma da svolgersi a Roma e negli altri comuni del Lazio	Accademia di Santa Cecilia	13.000.000	13.000.000																				
B	20	01.3	Prosa Programma da svolgersi a Roma e negli altri comuni del Lazio	Teatro Roma	7.000.000	7.000.000																				
B	20	01.4	Mostre. Programma di esposizione d'arte da svolgersi nelle Scuderie Papali	Agenzia Romana Prep. Giubileo	5.000.000	5.000.000																				
B	20	01.5	Convegno internazionale	Agenzia Romana Prep. Giubileo	2.000.000	2.000.000																				
B	20	01.6	Concorsi finalizzati all'arricchimento del patrimonio culturale	Agenzia Romana Prep. Giubileo	5.000.000	5.000.000																				
B	20	01.7	Incentivi dell'offerta culturale di Roma	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000																				
B	20	01.8	Incentivi dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	1.000.000	1.000.000																				

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
B	20	01.9	Incentivi dell'offerta culturale nella Regione Lazio	Regione Lazio	1.000.000	1.000.000																				
B	20	02	Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Piccolomini - Villa del Sole	Fondazione Niccolò Piccolomini	2.985.000	2.985.000	0																				
C MANUTENZIONE E ARREDO URBANO PATRIMONIO AMBIENTALE																										
C1 Programma di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone maggiormente sensibili e programma di abbattimento barriere architettoniche																										
C	01	01	Restauro conservativo dei ponti Vittorio Emanuele II, Umberto I, Regina Margherita e Cavour	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	7.009.952	7.009.952	0																				
C	01	02	Restauro conservativo di ponte Caio Cestio, ponte Duca D'Aosta, cavalcavia sul Muro Torto	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	8.151.363	8.151.363	0																				
C	01	03	Restauro conservativo di ponte Flaminio ed impermeabilizzazione di ponte Testaccio	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	8.622.872	8.622.872	0																				
C	01	04	Restauro conservativo di ponte Risorgimento	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.689.000	2.689.000	0																				
C	01	05	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	Comune di Roma - Dip. VI - Uff. Città Storica	3.334.070	3.334.070	0																				
C	01	06	Restauro conservativo di ponte Fabricio	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.138.804	2.138.804	0																				
C	01	07	Restauro conservativo di ponte Nomentano	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.554.975	2.554.975	0																				
C	01	10	P.zze S.Pietro in Vincoli, S.Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riqualificaz. Ambient., risagomatura strade e ripristino selciati	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	3.245.965	3.245.965	0																				
C	01	11	Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.228.822	2.228.822	0																				
C	01	12	Progetto per interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Percorso "C": v.le Trastevere, via Morosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.894.625	2.894.625	0																				
C	01	13/1	Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Lungotevere di sinistra e di destra da ponte Sublicio a ponte Matteotti. Ristrutturazione marciapiedi e sistema fognante	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	4.500.000	4.500.000	0																				
C	01	13/2	Interventi di manutenzione delle sedi stradali del lungotevere di sinistra e di destra da ponte Sublicio a ponte Matteotti e zone limitrofe	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	7.000.000	7.000.000	0																				
C	01	14	Via S.Gregorio, via G.Lanza, via Washington : Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	8.205.316	8.205.316	0																				

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																
								Fasi amministrative					Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Fattib.	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
C	01	15/1	Via Appia Antica. 1° Lotto. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale da piazza Numa Pompilio a via di Cecilia Metella	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	3.587.523	3.587.523	0																			
C	01	15/2	Via Appia Antica. 2° Lotto. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale dal tratto da piazza Numa Pompilio al G.R.A.	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	9.681.076	9.681.076	0																			
C	01	18/1	Villa Borghese. Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, propilei neoclassici, prospetti di piazza delle Canestre	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.000.000	2.000.000	0																			
C	01	18/2	Villa Borghese: propilei egizi. Fontana del Flocco, perimetri murari e scogliere di viale F. La Guardia. Restauro degli arredi architettonici.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.165.000	2.165.000	0																			
C	01	19	Villa Borghese. Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.098.161	1.098.161	0																			
C	01	20	Villa Borghese. Parco dei Daini (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	875.456	875.456	0																			
C	01	21/1	Villa Doria Pamphilj (Roma): sistemaz. esterne ed allestim. del museo di Villa Vecchia , restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati - Illuminaz. esterna.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	3.000.000	3.000.000	0																			
C	01	21/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.355.000	2.355.000	0																			
C	01	22/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Giovio.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.694.480	1.694.480	0																			
C	01	22/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Falsetti e dell'area annessa.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.497.997	1.497.997	0																			
C	01	23	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.550.959	1.550.959	0																			
C	01	24	Villa Pamphilj (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.789.261	1.789.261	0																			
C	01	25	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro dell'Arco dei Quattro Venti e delle aree limitrofe	Comune di Roma - Dip XII - IV U.O.	1.190.000	1.190.000	0																			
C	01	26/A	Riqualificazione Teatro Marcello-Piazza di Monte Savello, via Catalana, via dei Tempio, via S. Angelo in Pescheria, via Tribuna Campitelli	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	9.000.000	9.000.000	0																			
C	01	28	Potenziamento meccanizzazione servizio giardini	Comune di Roma - Dip. X	2.412.000	2.412.000	0																			
C	01	29	Lavori per l'impianto del verde nel Parco S. Maria della Pietà	Comune di Roma - Dip. X	1.970.000	1.970.000	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
C	01	30	Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relativi a percorsi ATAC e sedi stradali adiacenti	Comune di Roma - Dip. XII	5.000.000	5.000.000	0																			
C2	Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, itinerari giubilari e catacombe)																									
C	02	A	Area delle Basiliche di San Pietro in Vaticano S. Giovanni, S. M. Maggiore e S. Croce in Gerusalemme. Realizzaz. impianti semaforici ed installaz. pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale	STA	2.625.700	2.625.700																				
C	02	01/1/1	"BOR":progetto di riqualificazione ambientale di borgo s.spirito	Comune di Roma	5.347.538	5.347.538	0																			
C	02	01/1/2	"RIS":progetto riqualificazione ambientale piazza Risorgimento	Comune di Roma	9.425.458	9.425.458	0																			
C	02	01/1/3	"CON":progetto di riqualificazione ambientale via della Conciliazione	Comune di Roma	4.583.604	4.583.604	0																			
C	02	01/2	Area della Basilica di San Pietro in Vaticano. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	1.869.560	1.869.560	0																			
C	02	01/4	Area della Basilica di S.Pietro in Vaticano	AMA	907.430	907.430	0																			
C	02	01/5	Area della Basilica di San Pietro in Vaticano. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza	Ministero dell'Interno	2.805.000	2.805.000	0																			
C	02	01/6	Area della Basilica di San Pietro in Vaticano. Stazione S. Pietro: allestimenti per strutture di servizio ai pellegrini e realizzazione del percorso pedonale protetto lungo Ponte Gelsomino	Roma 2000	1.446.500	1.446.500	0																			
C	02	01/7	Infrastrutture area stazione di S.Pietro II^lotto	Roma 2000	9.240.000	9.240.000	0																			
C	02	02/1	Demolizione dei dismessi depositi ATAC di via Carlo Felice	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	1.786.438	1.786.438	0																			
C	02	02/2.1	Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali	Comune di Roma	400.000	400.000	0																			
C	02	02/2.2	"GIO":progetto di riqualificazione ambientale piazza San Giovanni	Comune di Roma	9.932.494	9.932.494																				
C	02	02/2.3	"MER":progetto di riqualificazione ambientale via Merulana	Comune di Roma	4.943.262	4.943.262																				
C	02	02/2.4	"MAR":progetto di riqualificazione ambientale piazza santa Maria Maggiore	Comune di Roma	5.213.681	5.213.681																				
C	02	02/2.5	"CRO":progetto di riqualificazione ambientale piazza santa Croce in Gerusalemme	Comune di Roma	1.909.836	1.909.836																				

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																	
								Fasi amministrative						Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
C	02	02/2.6	"QUA":progetto di riqualificazione ambientale via Santi Quattro Coronati	Comune di Roma	1.410.753	1.410.753																			
C	02	02/3	Recupero funzionale e valorizzazione edifici storici ospedale san Giovanni	Azienda Compplesso Ospedaliero S.Giovanni Addolorata	14.129.000	14.129.000	0																		
C	02	02/5	Area delle Basiliche:san Giovanni,Santa Maria Maggiiore,Santa Croce in Gerusalemme: disinfestazione	AMA	1.456.866	1.456.866	0																		
C	02	02/6	Area delle Basiliche di S. Giovanni, S. M. Maggiore e S. Croce in Gerusalemme. Installaz. impianti tecnologici TVCC e di rilevaz.; realizzaz. ed allestim. di strutture temporanee per la sicurezza	Ministero dell'Interno	2.385.350	2.385.350	0																		
C	02	02/7	Area delle Basiliche:san Giovanni,Santa Maria Maggiiore,Santa Croce in Gerusalemme: interventi illuminazione	ACEA	3.864.003	3.864.003	0																		
C	02	03/1/1	"PAO":progetto di riqualificazione ambientale piazza San Paolo	Comune di Roma	8.934.648	8.934.648	0																		
C	02	03/1/2	"LUN":progetto di riqualificazione ambientale lungotevere San Paolo	Comune di Roma	1.482.518	1.482.518	0																		
C	02	03/1/3	"OST":progetto di riqualificazione ambientale via Ostiense	Comune di Roma	820.627	820.627	0																		
C	02	03/2	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	1.943.700	1.943.700	0																		
C	02	03/4	Area basilica San Paolo: disinfestazione	AMA	386.536	386.536	0																		
C	02	03/5	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza	Ministero dell'Interno	1.491.600	1.491.600	0																		
C	02	03/6	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Restauro e consolidamento della Basilica di S. Paolo fuori le mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S. Paolo	P. Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo	1.256.320	1.256.320	0																		
C	02	04/1	Itinerari giubilari e storici: manutenzione sedi stradali	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000	0																		
C	02	04/2	Contributo interventi manutenzione sedi stradali	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000	0																		
C	02	05	Contributo interventi manutenzione sedi stradali	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	5.000.000	5.000.000	0																		
C	02	06	Ponti pedonali temporanei nella città di Roma	Comune di Roma - Dip. VI - Uff. Città Storica	7.400.000	7.400.000	0																		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																	
								Fasi amministrative						Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
C	02	08	Interventi speciali di illuminazione cittadina	ACEA	3.000.000	3.000.000	0																		
C	02	09	"ATT" fornitura e posa in opera attrezzature temporanee basiliche san Pietro, San Giovanni e San Paolo	Comune di Roma	7.264.911	7.264.911	0																		
C3	arredo urbano, manutenzione delle facciate degli edifici storici ed incentivi per l'adeguamento delle insegne commerciali																								
C	03	01	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riqualificazione delle sedi stradali	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.400.000	2.400.000	0																		
C	03	02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	405.668	405.668	0																		
C	03	03	Via delle Muratte	Comune di Roma - Dip VI - Uff. Città Storica	2.353.909	2.353.909	0																		
C	03	04	Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	3.257.956	3.257.956	0																		
C	03	06	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (primo stralcio)	Comune di Roma - Dip. IX	112.500.000	112.500.000	0																		
C	03	07	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (secondo stralcio)	Comune di Roma - Dip. IX	27.500.000	27.500.000	0																		
C	03	08	Contributi ristrutturazione bagni locali pubblici e insegne esercizi commerciali	Comune di Roma - Dip. VIII	5.000.000	5.000.000	0																		
C	03	09	Incentivi per riqualificazione strutture commerciali	Regione Lazio	2.000.000	2.000.000	0																		
C4	Area di Castel Gandolfo. Adeguamento delle infrastrutture																								
C	04	A	Terminal bus	Comune di CastelGandolfo	1.300.000	1.300.000	0																		
C	04	B	Centro servizi di prima necessità	Comune di CastelGandolfo	1.500.000	1.500.000	0																		
C	04	C	Sottopasso pedonale di via Maremmana	Comune di CastelGandolfo	300.000	300.000	0																		
C	04	D	Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico	Comune di CastelGandolfo	550.000	550.000	0																		
C	04	E	Sistemazion e della viabilità urbana	Comune di CastelGandolfo	3.500.000	3.500.000	0																		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative						Fasi Esecutive											Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
C	04	F	Sistemazione della passeggiata sul lungolago	Comune di CastelGandolfo	2.500.000	2.500.000	0																			
C	04	H	Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	1.400.000	1.400.000	0																			
C5	Giardini di Castel Sant'Angelo. Interventi di manutenzione																									
C	05	01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma - Dip. X	3.300.000	3.300.000	0																			
C	05	01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma - Dip. X	1.700.000	1.700.000	0																			
C6	Giardini San Giovanni/Via Carlo Felice. Interventi di manutenzione																									
C	06	01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma - Dip. X	3.500.000	3.500.000	0																			
C7	Parco Casilino-Labicano. Interventi di sistemazione e verde																									
C	07	01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma - Dip. X	2.000.000	2.000.000	0																			
C8	Restauro del Parco di Villa Borghese																									
C	08	01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma - Dip. X	1.720.817	1.720.817	0																			
C	08	01/2	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago	Comune di Roma - Dip. X	3.000.000	3.000.000	0																			
C	08	01/3	Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via pinciana,Giardini del lago, cancelli d'ingresso,Parco dei Daini.	Comune di Roma - Dip. X	1.405.367	1.405.367	0																			
C	08	01/4	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione	Comune di Roma - Dip. X	2.929.750	1.929.750	1.000.000																			
C	08	01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma - Dip. X	1.000.000	1.000.000	0																			
C9	Riqualificazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica)																									
C	09	01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti	Comune di Roma - Dip. X	3.281.442	3.281.442	0																			
C	09	02/1	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica). Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma - Dip. X	3.548.053	3.548.053	0																			
C	09	02/2	Riqualificaz. parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S.Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca	Comune di Roma - Dip. X	5.500.000	5.500.000	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																			
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
C10 Restauro del Parco di Villa Ada Savoia																											
C	10	01	Restauro del parco Villa Ada - Savoia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo	Comune di Roma - Dip. X	2.568.975	2.568.975	0																			
C11 Recupero dell'area di San gregorio al Celio																											
C	11	01/1	Area archeologica del Celio. via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.000.000	1.000.000	0																			
C	11	01/2	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	3.500.000	3.500.000	0																			
C	11	02	Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.866.273	2.866.273	0																			
C	11	03	Area archeologica del Celio. Sezione polizia turistica e banda nella ex palestra dei vigili.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.281.088	1.281.088	0																			
C	11	04	Area archeologica del Celio. Restauro del Casale quattrocentesco dell'Abate Commendatario	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	616.460	616.460	0																			
C	11	05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	Comune di Roma - Dip. X	4.000.000	4.000.000	0																			
C	11	06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione)	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.500.000	2.500.000	0																			
C	11	07	Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico.	Comune di Roma	301.710	301.710	0																			
C	11	08	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	396.510	396.510	0																			
C	11	09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	250.000	250.000	0																			
C	11	10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	272.377	272.377	0																			
C	11	11	Torre medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, paramenti murari)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	274.766	274.766	0																			
C	11	12	Archi del Clivo di Scauro	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	747.072	747.072	0																			
C	11	13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.353.310	1.353.310	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																	
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
C	11	14	Fronti laterizie sul Clivo di Scauro	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	628.337	628.337	0																			
C	11	15	Biblioteca di Papa Agapito ed insulae romane adiacenti	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.044.466	1.044.466	0																			
C	11	16	Arco di Silano e Dolabella e soprastante Acquedotto Celimontano	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	448.352	448.352	0																			
C	11	17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	216.500	216.500	0																			
C	11	18	Chiesa di S. Maria in Domenica	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	190.000	190.000	0																			
C	11	19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	53.300	53.300	0																			
C	11	20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	630.700	630.700	0																			
C	11	21	Attività di formazione	Provincia di Roma	191.500	191.500	0																			
C	11	22	Riscaldamento S. Gregorio e Cappella Salvati	ITALGAS	170.000	170.000	0																			
C	11	23	Musealizzazione e finalizzazione all'accoglienza di visitatori alla casa romana sotto i SS Giovanni e Paolo al Celio	BB. CC. AA. - (7)	600.000	600.000	0																			
C12	Restauro del Parco di Villa Doria Pamphilj																									
C	12	01	Villa Doria Pamphilj (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma - Dip. X	4.600.000	4.600.000	0																			
C	12	02	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma - Dip. X	3.000.000	3.000.000	0																			
C	12	03	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini	Comune di Roma - Dip. X	699.384	699.384	0																			
C	12	04/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro.	Comune di Roma - Dip. X	1.000.000	1.000.000	0																			
C	12	04/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini dei Cedrati, di Villa Vecchia, delle Serre	Comune di Roma - Dip. X	698.934	698.934	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
C13 Sistemazione ambientale e paesistica delle pendici di Monte Mario e Casale Mellini																										
C	13	01/1	Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei casali Mellini.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.317.533	2.317.533	0																				
C	13	01/2	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma - Dip. X	4.300.000	4.300.000	0																				
C14 Bonifica delle pendici del Gianicolo																										
C	14	01	Pendici del Gianicolo (Roma) Riqualificazione delle aree a verde	Comune di Roma - Dip. X	2.999.278	2.999.278	0																				
C15 Manutenzione straordinaria e restauro del Parco di Colle Oppio																										
C	15	01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	Comune di Roma - Dip. X	1.000.000	1.000.000	0																				
C	15	02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Esedre Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.440.668	1.440.668	0																				
C18 Riqualificazione ambientale nella provincia di Roma																										
C	18	01	Piano straordinario di prevenzione e sicurezza	Comune di Nemi	1.000.000	1.000.000	0																				
C	18	02	Santuario della Mentorella (Pisoniano-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riqualificazione ambientale dei territori viciniori	Provincia di Roma	2.800.000	2.800.000	0																				
C	18	03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	6.000.000	6.000.000	0																				
C	18	04	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione	Provincia di Roma	1.200.000	1.200.000	0																				
C19 Opere di risanamento igienico sanitario del bacino del tevere e piano di raccolta differenziata dei rifiuti nei luoghi di visita dell'area metropolitana																										
C	19	01/a2	Sistemazione idraulica del fosso dell'acqua Mariana	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	8.000.000	8.000.000	0																				
C	19	01/b1	Risanamento Fosso Patatona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	10.000.000	10.000.000	0																				
C	19	01/b2	Risanamento Fosso Patatona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	4.000.000	4.000.000	0																				
C	19	01/b3	Risanamento Fosso Patatona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	16.000.791	16.000.791	0																				
C	19	01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene	Regione Lazio	9.000.000	9.000.000	0																				

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																			
								Fasi amministrative						Fasi Esecutive										Fasi Finali			
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
C	19	02	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita	Provincia di Roma	8.000.000	8.000.000	0																			
C20 Orto Botanico																											
C	20	01	Orto Botanico	Università La Sapienza	600.000	600.000	0																				
D ACCESIBILITA' E MOBILITA' NELL'AREA METROPOLITANA																											
D5 Adeguamento del materiale rotabile in dotazione e acquisto di nuovi tram, treni, autobus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale																											
D	05	01/1	Fornitura di 240 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.	ATAC	105.744.100	105.744.100	0																				
D	05	01/2	Fornitura di autobus urbani di media capacità	ATAC	19.807.338	19.807.338	0																				
D	05	01/3	Fornitura di 18 vetture tranviarie di grande capacità.	ATAC	78.870.016	78.870.016	0																				
D	05	01/4	Fornitura di 130 autobus extraurbani di tipo lungo da 12 mt.	COTRAL	60.695.411	60.695.411	0																				
D	05	01/5	Fornitura di 30 autobus extraurbani di media capacità	COTRAL	13.472.353	13.472.353	0																				
D	05	01/6	Fornitura equipaggiamento "Chopper" per motrici linea metro "A"	COTRAL	7.891.000	7.891.000	0																				
D	05	01/7	Fornitura di 5 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo	COTRAL	36.190.000	36.190.000	0																				
D	05	01/8	Fornitura materiale rotabile ferrovia Roma-Pantano	COTRAL	12.200.000	12.200.000	0																				
D	05	02	Fornitura di autobus da 18 metri	ATAC	44.000.000	44.000.000	0																				
D7 Realizzazione del sottopasso Castel Sant'Angelo																											
D	07	02	Sottovia Lungotevere in Sassia	Provveditorato OO. PP. del Lazio	33.309.568	33.309.568	0																				
D8 Riqualificazione dell'area del Gianicolo																											
D	08	01	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta (Realizzazione galleria scatolare di m. 10,50 di larghezza e m. 6,30 di altezza - lunghezza totale m. 850 - lunghezza in sotterraneo m. 676).	Provveditorato OO. PP. del Lazio	56.050.000	56.050.000	0																				

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione
								Fasi amministrative
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.
D	08	02	Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	80.000.000	40.000.000	40.000.000	
D	08	03	Interconnessioni tra il parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato OO. PP. del Lazio	15.390.000	15.390.000	0	
D9	Infrastrutture dell'area della Stazione Tiburtina							
D	09	01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	92.491.695	92.491.695	0	
D10	Terza Corsia dell'Autostrada Roma-Fiumicino							
D	10	01/a	Autostrada Roma/Fiumicino. Realizzazione terza corsia (lotto 2°)	ANAS	69.867.135	65.773.624	4.093.511	
D	10	01/b	Autostrada Roma/Fiumicino. Realizzazione terza corsia (lotto 3°)	ANAS	15.748.076	15.571.357	176.719	
D11	Adeguamento del Grande Raccordo Anulare nel tratto Pisana-Aurelia							
D	11	01	GRA tratto Pisana-Aurelia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)	ANAS	45.950.000	45.950.000	0	
D13	Miglioramento viabilità di collegamento tra le diverse aree submetropolitane di visita e di accoglienza (Castelli Romani, Litorale e nodi ferroviari)							
D	13	01	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000	0	
D	13	02	Parcheggio a raso per nodo di scambio (Colleferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio del traffico locale sulla linea FM6 Roma - Cassino	Provincia di Roma	1.171.017	1.171.017	0	
D	13	03	Parcheggio di scambio (Zagarolo/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	Provincia di Roma	1.061.574	1.061.574	0	
D	13	04	Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma)	Comune di Genazzano	2.030.000	1.380.000	650.000	
D	13	05	Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Guidonia - Tiburtina	Provincia di Roma	397.391	397.391	0	
D	13	06	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Civitavecchia	Provincia di Roma	1.200.000	1.200.000	0	
D	13	07	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli	Provincia di Roma	880.000	880.000	0	
D	13	08	S.P. Marino due Santi (Marino/Roma) Allargamento dal Km 0+000 al Km 3+800 dalla S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi	Provincia di Roma	4.000.000	4.000.000	0	

Processo d'Attuazione																				
Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
D	13	09	S.P. Pedemontana dei Castelli (Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Marino/Roma) Manut. straord. Km 0+0-10+5, da SS Casilina a SS via dei Laghi (colleg. Tivoli-Palestrina e Castelli Romani)	Provincia di Roma	1.978.635	1.978.635	0																			
D	13	10	SP Casa Romana (Zagarolo, S.Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	3.000.000	3.000.000	0																			
D	13	11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A25	Provincia di Roma	3.672.391	3.672.391	0																			
D	13	12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)	Provincia di Roma	6.200.000	6.200.000	0																			
D14	Miglioramento della viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza ("strade radiali")																									
D	14	01	SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 9+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	3.228.124	3.228.124	0																			
D	14	02	SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	1.743.772	1.743.772	0																			
D	14	03	S.P. Laurentina dal GRA fino al KM 19,500	Provincia di Roma	15.000.000	15.000.000	0																			
D	14	04	S.P. Tiberina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 (Prima Porta) al km 18+000 (svincolo autostradale)	Provincia di Roma	2.908.320	2.908.320	0																			
D	14	05	SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento	Provincia di Roma	2.850.000	2.850.000	0																			
D	14	06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	6.210.000	6.210.000	0																			
D	14	07	SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento con l'area aeroportuale (Roma, Pomezia)	Provincia di Roma	2.335.092	2.335.092	0																			
D	14	08	Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	11.205.000	11.205.000	0																			
D	14	09	Interventi di manutenzione ed adeguamento della rete viaria provinciale interessata da itinerari turistico-religiosi (primo e secondo stralcio)	Provincia di Frosinone	17.500.000	17.500.000	0																			
D	14	10	Miglioramento della viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza (primo e secondo stralcio)	Provincia di Latina	17.500.000	17.500.000	0																			
D	14	11	Sistemazione viabilità provinciale connessa con gli itinerari spirituali e religiosi (primo e secondo stralcio)	Provincia di Rieti	17.500.000	17.500.000	0																			
D	14	12	Interventi per la manutenzione e riqualificazione delle rete stradale provinciale (primo e secondo stralcio)	Provincia di Viterbo	17.500.000	17.500.000	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione														
								Fasi amministrative					Fasi Esecutive								Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
D15 Passante ferroviario dei laghi Bracciano-Castelli ed elettrificazione fino a Viterbo																										
D	15	01/1	Raddoppio ed elettrificazione del tratto La Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo	Ferrovie dello Stato	170.379.000	170.379.000	0																			
D	15	01/2	Potenziamento della linea Ciampino-Velletri con realizzazione della nuova fermata S. Gennaro e nuovi posti di incrocio di Parona e Lanuvio	Ferrovie dello Stato	13.341.000	13.341.000	0																			
D16 Riqualificazione e prolungamento del terminal turistico del porto di Civitavecchia																										
D	16	01	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (I° lotto)	Autorità portuale del porto di Civitavecchia	71.217.371	71.217.371	0																			
D	16	02	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (II° lotto)	Ente Porto Civitavecchia	11.000.000	11.000.000	0																			
D18 Riqualificazione e potenziamento delle linee A e B della metropolitana e delle ferrovie concesse (stazioni e infrastrutture di servizio)																										
D	18	01/1	Potenziamento nodo Termini	Comune di Roma - Dip VII	9.640.000	9.640.000	0																			
D	18	01/2a	Linea metropolitana. Adeguamento metro A. 1° stralcio	Comune di Roma - Dip VII	25.363.382	25.363.382	0																			
D	18	01/2b	Linea metropolitana. Adeguamento metro A. 2° stralcio	Comune di Roma - Dip VII	55.037.266	55.037.266	0																			
D	18	02/1a	Ferrovie concesse. Potenziamento linea Roma - Lido	Comune di Roma - Dip. VII	6.381.331	6.381.331	0																			
D	18	02/1b	Ferrovie concesse. Potenziamento linea Roma - Lido. Manutenzione	COTRAL	2.000.000	2.000.000	0																			
D	18	02/2	Ferrovie concesse: potenziamento Roma Nord	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000	0																			
D	18	03	Sicurezza stazione Termini	Grandi Stazioni S.p.A.	10.000.000	10.000.000	0																			
D	18	04	Ala Mazzoni - stazione Termini	Grandi Stazioni S.p.A.	20.000.000	20.000.000	0																			
D19 Aree di parcheggio attrezzate nei principali nodi di scambio per la sosta degli autobus turistici e delle autovetture																										
D	19	02	Interventi relativi a nodi di scambio e stazioni ferroviarie Stazione Aurelia	Ferrovie dello Stato	10.000.000	10.000.000	0																			
D	19	03	Parcheggi di scambio con strutture mobili	STA	5.000.000	5.000.000	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																	
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
D	19	04	Stralcio funzionale. Nodo di scambio Valle Aurelia con intersezione tra Via Anastasio II e Via Angelo Emo. Circoscrizione XVII-XVIII	Comune di Roma - Dip. XII	4.099.250	4.099.250	0																			
D20 Controllo e gestione del traffico																									
D	20	01	Aggiornamento delle rete semaforica, segnaletica e uso di tecnologie per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roma)	STA	20.650.000	20.650.000	0																			
D	20	02	Rifacimento e manutenzione segnaletica	STA	17.000.000	17.000.000	0																			
D	20	03	Iniziative per una mobilità sostenibile a Roma	Ministero dell'Ambiente	3.500.000	3.500.000	0																			
D21 Riorganizzazione nodo di scambio largo Torre Argentina																									
D	21	01	Riorganizzazione nodo di scambio largo Torre Argentina	Comune di Roma - Dip. VII	9.424.700	9.424.700	0																			
D22 Area per Grandi Eventi - Tor Vergata																									
D	22	01/1	Coordinamento delle progettazioni	Provveditorato Opere Pubbliche Lazio	950.000	950.000	0																			
D	22	01/2	Organizzazione manifestazioni	Agenzia Romana Prep. Giubileo	1.174.000	1.174.000																				
D	22	01/3	Progettazione interventi ricadenti area Tor Vergata	Università Tor Vergata	876.000	876.000																				
E			**SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE**																							
E1 Contributo al sistema di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti delle aree di maggior afflusso di visitatori nel territorio urbano e metropolitano																									
E	01	01	Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale (Roma). Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti	AMA	5.304.689	3.304.689	2.000.000																			
E	01	02	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Cassonetti movimentabili con automezzi Side Loader	AMA	12.095.040	5.795.040	6.300.000																			
E	01	03	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti	AMA	10.257.968	8.857.968	1.400.000																			
E	01	04	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Minicompattatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani	AMA	1.959.900	1.459.900	500.000																			
E	01	05	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile	AMA	700.000	600.000	100.000																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																
								Fasi amministrative					Fasi Esecutive									Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim.	Prog. Def.	Proge.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
E	01	06	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Spazzatrici.	AMA	1.308.000	908.000	400.000																			
E	01	07	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.	AMA	600.000	500.000	100.000																			
E	01	08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali.	AMA	3.346.920	2.646.920	700.000																			
E	01	09/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Adeguamento locali della sede di zona via dei Cappellari	AMA	375.000	0	375.000																			
E	01	09/2	Fornitura di N. 1600 cestini stradali	AMA	2.600.000	2.500.000	100.000																			
E	01	11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza	AMA	3.601.000	2.500.000	1.101.000																			
E	01	12	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri.	AMA	5.008.566	3.952.566	1.056.000																			
E	01	13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via Giolitti.	AMA	539.521	403.521	136.000																			
E	01	14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Populonia.	AMA	3.213.000	2.000.000	1.213.000																			
E	01	15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino	AMA	2.500.000	2.000.000	500.000																			
E	01	16	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini	AMA	6.252.839	5.672.839	580.000																			
E	01	17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Bellani	AMA	6.585.000	4.000.000	2.585.000																			
E	01	18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.	AMA	4.872.789	2.988.789	1.884.000																			
E	01	19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Saxa Rubra. (1° lotto funzionale)	AMA	1.087.000	150.000	937.000																			
E	01	20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli.	AMA	3.000.000	670.000	2.330.000																			
E	01	22/1	Ristrutturazione opere civili nell'Area Intermedia Attrezzata (A.I.A.) Via Sannio	AMA	3.402.734	2.547.734	855.000																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
E	01	22/2	Fornitura attrezzatura: Compattatori su semirimorchi e motrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sannio	AMA	1.073.501	1.073.501	0																			
E	01	24	Sedi di zona ed aree intermedie attrezzate. (via di Torrevecchia)	AMA	7.038.000	3.000.000	4.038.000																			
E	01	25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino.	AMA	8.740.000	7.600.000	1.140.000																			
E	01	26/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoboario.	AMA	1.179.462	989.462	190.000																			
E	01	26/2	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoboario.	AMA	536.750	536.750	0																			
E	01	27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.	AMA	3.100.000	3.100.000	0																			
E	01	27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.	AMA	5.300.000	5.300.000	0																			
E	01	27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento.	AMA	1.600.000	1.600.000	0																			
E	01	28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	10.710.000	2.000.000	8.710.000																			
E	01	29	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	9.520.000	7.000.000	2.520.000																			
E	01	30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.	AMA	7.585.460	7.585.460	0																			
E	01	31	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti.	AMA	1.400.000	1.400.000	0																			
E2	Contributo al potenziamento servizi pubblici di emergenza: servizio 118, mezzi di soccorso, pronto soccorso ospedaliero, rete ambulatoriale I° livello																									
E	02	01	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	USL RM E	37.531.000	22.531.000	15.000.000																			
E	02	02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Azienda S. Giovanni Addolorata	10.000.000	10.000.000	0																			
E	02	03	Ospedale Sant'Eugenio (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	30.000.000	30.000.000	0																			
E	02	04	Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM D	5.067.347	5.067.347	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																
								Fasi amministrative						Fasi Esecutive									Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
E 02	05		Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	12.184.478	12.184.478	0																			
E 02	06		Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità protetta	Università Cattolica del Sacro Cuore	6.031.191	6.031.191	0																			
E 02	07		Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	10.000.000	10.000.000	0																			
E 02	08/1		Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (forniture)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.632.572	1.632.572	0																			
E 02	08/2		'Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.366.990	1.366.990	0																			
E 02	09		Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	USL RM H	1.000.000	1.000.000	0																			
E 02	10		Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM G	1.000.000	1.000.000	0																			
E 02	11		Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM F	1.066.442	1.066.442	0																			
E 02	12		Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo	Regione Lazio	4.500.000	4.500.000	0																			
E 02	13		Rete di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani	I.R.C.C.S. Lazzaro Spallanzani	8.219.647	8.219.647	0																			
E 02	14		Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	7.140.000	7.140.000	0																			
E 02	15		Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	Az. Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	10.500.000	10.500.000	0																			
E 02	16/a		Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica	Regione Lazio	4.700.000	4.700.000	0																			
E 02	16/b		Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale	Protettorato S. Giuseppe	1.800.000	1.800.000	0																			
E 02	17		Ristrutturazione P. M.P. Via Saredo Roma	USL RM B	5.000.000	5.000.000	0																			
E 02	18		Ospedale "Fatebene Fratelli" Isola tiberina - Roma. Ampliamento della rianimazione	Casa Generalizia "Fatebene Fratelli"	2.615.000	2.615.000	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative						Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
E	02	19	Programma di potenziamento dell'ospedale S. Carlo di Nancy (primo stralcio)	Istituto Demopatico dell'Immacolata	3.000.000	3.000.000	0																			
E	02	20	Campus bio-medico	Libero Ist. Univ. "Campus bio-medico" di Roma	8.225.887	8.225.887	0																			
E	02	21	Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) di II livello per area pediatrica	I.R.C.C.S. - Osped. Pediatrico "Bambino Ges "	2.470.000	2.470.000	0																			
E	02	22	Fornitura natanti di soccorso al servizio dell'aeroporto di Fiumicino (1° stralcio)	Comando Generale della Capitaneria di Porto	3.000.000	3.000.000	0																			
E	02	23	Acquisto mezzi soccorso capitaneria di porto Fiumicino	Comando Generale della Capitaneria di Porto	3.300.000	3.300.000	0																			
E3 Modernizzazione della vigilanza urbana (logistica e tecnologica)																										
E	03	01	Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani	STA	5.000.000	5.000.000	0																			
E	03	02/1	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in Viale Trastevere N. 18, Roma (ex Ufficio Contravvenzioni)	Comune di Roma - Dip. XII	2.500.000	2.500.000	0																			
E	03	02/2	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in Via Ferruccio N. 9, Roma sede Comando Vigili Urbani I gruppo	Comune di Roma - Dip. XII	1.000.000	1.000.000	0																			
E	03	02/3	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in Via Palmiro Togliatti N. 987, Roma sede del VII gruppo Vigili Urbani	Comune di Roma - Dip. XII	2.000.000	2.000.000	0																			
E	03	02/4	Lavori di manut. straord., restauro ed adeguam. impianti di porzione del fabbricato "ex Istituto Luce", p.za Cinecittà 11, Roma, per sede di Scuola del personale di Polizia Municipale	Comune di Roma - Dip. XII	4.000.000	4.000.000	0																			
E	03	02/5	Lavori di rifacimento delle coperture dell'edificio sito in Via della Consolazione N. 4, Roma sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale	Comune di Roma - Dip. XII	500.000	500.000	0																			
E	03	03	Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma)	Comune di Roma - Dip. XII	3.805.237	3.805.237	0																			
E	03	04/1	Acquisto apparecchiature elettroniche per attività esterne	Comune di Roma - VV.UU.	1.700.000	1.700.000	0																			
E	03	04/2	Acquisto apparecchiature elettroniche per scuola di polizia	Comune di Roma - VV.UU.	300.000	300.000	0																			
E4 Piano di valorizzazione delle risorse umane																										
E	04	01	Piano di valorizzaz. risorse umane coinvolte nella preparaz. dell'Anno 2000 (Lazio). Formaz. e aggiornam. professionale addetti Pubblica Amministraz.. Impiego operatori in servizio civile.	Regione Lazio	16.952.000	16.952.000	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
E	04	02	Piano di valorizzaz. risorse umane coinvolte nella preparaz. dell'Anno 2000 (Lazio). Formaz. e aggiornam. professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo	Regione Lazio	1.100.000	1.100.000	0																			
E	04	03	Piano di valorizzaz. risorse umane coinvolte nella preparaz. dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali.	Regione Lazio	9.040.000	5.200.000	3.840.000																			
E	04	04	Piano di valorizz. risorse umane (Lazio) Strumenti formativi per l'autoapprendimento; riqualificazione centri di formazione professionale, progetti interregionali, pilotaggio programma	Regione Lazio	3.958.000	3.148.000	810.000																			
E5	Sicurezza pubblica e protezione civile																									
E	05	01/1	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Acquisto rete LAN e materiale hardware	Ministero dell'Interno	1.300.000	1.300.000	0																			
E	05	01/2	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Integrazione software	Ministero dell'Interno	3.700.000	3.700.000	0																			
E	6	2A	sistemi ed impianti di telecomunicazioni sedi operative VV.FF.	Ministero dell'Interno-Dipartimento Protezione Civile	3.980.000	3.980.000	0																			
E	05	03	Progetto sicurezza grandi basiliche	Ministero dell'interno	12.000.000	12.000.000	0																			
E	05	04	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'interno	27.598.000	27.598.000	0																			
E	05	05	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'interno	3.380.000	3.380.000	0																			
E	05	06	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'interno	5.602.000	5.602.000	0																			
E	05	07	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'interno	650.000	650.000	0																			
E	05	08	Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	10.000.000	10.000.000	0																			
E	05	09	Acquisto di 7 torri per illuminazione	Ministero Difesa	200.000	200.000	0																			
E	05	11	Adeguamento, potenziamento e ripristino infrastrutture destinate alloggio operatori volontari e pellegrini militari italiani ed esteri	Ministero Difesa	4.800.000	4.800.000	0																			
E	05	12	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Talamo"	Ministero Difesa - Arma Carabinieri	1.995.000	1.995.000	0																			
E	05	13	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Tor di Quinto"	ministero LL.PP.	26.500.000	26.500.000	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

| Codici | | | Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento | | | | | Risorse finanziarie (in migliaia) | | | Processo d'Attuazione | | | | |

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive										Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
E	05	32	Caserma CC P.za Dante - Lavori di ristrutturazione (1° stralcio)	Ministero dell'Interno	1.000.000	1.000.000	0																			
E	05	33	Rete di radio comunicazioni della Polizia	Ministero dell'Interno	5.500.000	5.500.000	0																			
E6	Interventi a sostegno dell'occupazione																									
E	06	01	Contributo a favore di Imprese giovanili per la promozione di occupazione connessa alle attività giubilari	Comune di Roma - Uff. Spec. Politiche del Lavoro	5.000.000	5.000.000	0																			
E7	Contributo attività straordinaria corpo Polizia Municipale																									
E	07	01	Attività del corpo di polizia municipale per assicurare funzionamento cantieri giubilari	Comune di Roma	2.700.000	2.700.000	0																			
F	INFORMAZIONE COMUNICAZIONE PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO																									
F1	Centro informativo, sala stampa e iniziative per l'informazione																									
F	01	01/1	Centro informativo del museo Risorgimento. Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana Prep. Giubileo	5.675.712	5.675.712	0																			
F	01	01/2	Centro informativo di Via della Conciliazione. Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana Prep. Giubileo	7.275.712	7.275.712	0																			
F	01	02	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	Agenzia Romana Prep. Giubileo	5.161.763	5.161.763	0																			
F	01	03	Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	Agenzia Romana Prep. Giubileo	614.000	614.000	0																			
F	01	04	Sistema di informazione al pubblico - nodo di Roma	Ferrovie dello Stato	3.810.000	3.810.000	0																			
F 4	Contributo per attività organizzative ai sensi del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996																									
F	04	01	Contributo assolvimento compiti indicati comma 4, legge 651	Agenzia Romana Prep. Giubileo	95.151.496	95.151.496	0																			
F	04	02	Osservatorio sul Piano del Giubileo	Uff. Progr. Roma Capitale	6.000.000	6.000.000	0																			
F5	Sistemi informatici e telematici per la gestione e la preparazione del Giubileo																									
F	05	01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana Prep. Giubileo	8.613.240	8.613.240	0																			
F	05	02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana Prep. Giubileo	5.000.000	5.000.000	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																				
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive											Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
F	05	03	Sistema unitario di prenotazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana Prep. Giubileo	7.612.000	7.612.000	0																				
F	05	04	Sistema informativo e di comunicazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana Prep. Giubileo	17.993.440	17.993.440	0																				
F	05	05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana Prep. Giubileo	8.152.080	8.152.080	0																				
F	05	06	Funzionamento delle strutture del Commissario straordinario di Governo	Presid. Cons. Ministri - Uff. Roma Capitale	3.300.000	3.300.000	0																				
G	**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI**																											
G1	Monitoraggio																											
G	I	I	Monitoraggio interventi	Presid. Cons. Ministri - Uff. Roma Capitale	6.000.000	6.000.000																					

PRIMO TIRMESTRE 1999

PAGINA BIANCA

1. Sintesi del quinto rapporto trimestrale

2.8 Struttura attuale del piano

Nel corso del I° trimestre 1999 non sono state effettuate riunioni della Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre Province del Lazio, di conseguenza dal 31 dicembre 1998 *(4° trimestre '98)* al 31 marzo 1999 *(1° trimestre '99)* il Piano degli interventi per il grande Giubileo del 2000 nel Lazio non ha subito alcuna modificazione nella struttura e nell'articolazione rispetto a quelle già rappresentate nella precedente relazione al Parlamento.

Si ritiene utile, comunque, riportare in sintesi la situazione strutturale al 31 marzo 1999.

Il Piano comprende ancora n. 754 interventi per un investimento complessivo di 3.652 miliardi a fronte di un onere totale a carico della Legge 651/96 di circa 3.471 miliardi e la ripartizione degli interventi, per numero e per entità finanziaria risulta così articolata:

A. Per Categorie

- N.	438	Lavori	per un importo di 2050,8 miliardi
- N.	90	Forniture	per un importo di 785,8 miliardi
- N.	209	Beni Culturali	per un importo di 323,0 miliardi
- N	17	Incentivi	per un importo di 312,7 miliardi

B. Per settore

- N.	85	Sociale e accoglienza	per un importo di 300,4 miliardi
- N.	352	Beni culturali	per un importo di 557,3 miliardi
- N.	136	Manutenzione e arredo urbano	per un importo di 571,2 miliardi
- N	63	Accessibilità e mobilità	per un importo di 1372,4 miliardi
- N	104	Servizi speciali e formazione	per un importo di 489,7 miliardi
- N	14	Informazione e preparazione evento	per un importo di 180,4 miliardi

C. Per localizzazione

- N.	499	Comune di Roma	per un importo di 2578 miliardi
- N.	141	Provincia di Roma	per un importo di 540,2 miliardi
- N.	29	Provincia di Frosinone	per un importo di 40,5 miliardi
- N	32	Provincia di Latina	per un importo di 36,4 miliardi
- N	20	Provincia di Rieti	per un importo di 41,3 miliardi
- N	17	Provincia di Viterbo	per un importo di 33,7 miliardi
- N	16	Senza riferimenti territoriali	per un importo di 201,2 miliardi

D. Per categorie di soggetti beneficiari

– N.	257	Amministrazioni centrali	per un importo di 1034,8 miliardi
– N.	62	Amm. regionali e Provinciali	per un importo di 389,9 miliardi
– N.	278	Amministrazioni comunali	per un importo di 851,9 miliardi
– N	157	Altri soggetti	per un importo di 1194,8 miliardi

2.9 Lo stato di attuazione

Migliorata risulta, invece, la situazione sullo stato di attuazione a confronto con il trimestre precedente; infatti, nel corso degli ultimi tre mesi sono giunti a completamento circa 30 ulteriori interventi facendo così crescere il numero delle ultimazioni da 70 a 100.

Anche il numero degli interventi in fase di realizzazione è cresciuto dal 31 dicembre scorso ad oggi. La crescita è di sole 31 unità, passando gli interventi in cantiere dai 432 agli attuali 463, ma va tenuto conto che, sommando anche gli interventi conclusi, il numero degli interventi in fase di realizzazione, pari a 563, raggiunge il 74,67% del totale.

L'avanzamento medio nel processo attuativo è aumentato dal 62% al 70% , ma resta un ritardo medio di 104 giorni negli affidamenti rispetto alla programmazione iniziale, leggermente superiore a quello, di 100 giorni, registrato a dicembre '98.

Rispetto all'articolazione in «categorie», quella dei «Beni Culturali» risulta in più avanzato stato di attuazione, essendo quasi tutti gli interventi già appaltati, mentre nella categoria «lavori» solo l'81,5% è in cantiere rispetto al 99,7% programmato e nelle «forniture/incentivi» la percentuale scende al 66,2% rispetto al 98,2%.

Anche l'esame dello stato di attuazione, per «settori d'intervento», registra il valore più alto di cantierizzazione nel settore dei «Beni Culturali» (N.B. che non coincide con la categoria Beni Culturali) pari al 90,34%, con 78 interventi interamente ultimati, seguono il settore della «accessibilità e mobilità» con il 76,19% e n. 7 interventi ultimati, quello del «sociale ed accoglienza» con il 75,29%, quello della «informazione e preparazione evento» con il 64,29%, quello della «manutenzione ed arredo urbano» con il 56,62% ed infine il settore dei «servizi speciali e formazione» con il 45,19%.

Rispetto all'articolazione del Piano per ambiti di «localizzazione», gli interventi in cantiere in provincia di Frosinone raggiungono il 96,55%, seguono la provincia di Rieti con il 95,00%, la provincia di Viterbo con il 94,11%, la provincia di Roma con l'86,53%, la provincia di Latina, il Comune di Roma con il 69,94% e con 78 interventi ultimati e, da ultimo, con il 25,00% gli interventi senza riferimento territoriale.

La categoria di «soggetti beneficiari», che registra il valore più alto di cantierizzazione è quella delle «Amministrazioni centrali» con 69 interventi interamente ultimati, seguono la categoria delle «Amministrazioni regionali e Provinciali» con il 72,58 % ma con 2 soli interventi ultimati, le «Amministrazioni comunali» con il 72,31% e con 16 interventi ultimati ed infine, gli «Altri soggetti» con il 56,69% e 13 ultimazioni.

2.10 Valutazione del rischio di ritardo finale

Con riferimento alle date di completamento programmate, si osserva un notevole «affollamento» di interventi che si troveranno in fase di esecuzione nell'ultimo trimestre del '99. Questo fenomeno, già segnalato in precedenza, comporta che solo il 66% degli interventi, per un importo equivalente all'84% del totale del Piano terminerà, presumibilmente e secondo i programmi aggiornati, tra ottobre e dicembre '99. Ciò fa aumentare il rischio di possibile superamento, per alcuni di essi della data di inizio del Giubileo; la contemporaneità di tanti cantieri, potrebbe, infatti, avere un impatto crescente sulla città di Roma ed implicare ulteriori difficoltà operative.

La valutazione di rischio di ritardo finale[1)] fornisce il seguente quadro nel quale gli importi indicati sono riferiti ai finanziamenti ex Lege 651/96:

- «Alto rischio» n. 75 per un importo totale di 1157 miliardi (36%)
- «Medio rischio» n. 248 per un importo totale di 1131 miliardi (35%)
- «Basso rischio» n. 288 per un importo totale di 648 miliardi (20%)
- «Rischio nullo» n. 103 per un importo totale di 288 miliardi (9%)

Rispetto alla valutazione di dicembre '98 il numero di interventi ad alto rischio è aumentato (da 52 a 75) e così anche l'importo totale (aumentato da 978 a 1157 miliardi).

I 75 interventi giudicati ad alto rischio, sono così ripartiti tra le categorie:

	totale	lavori	beni culturali	forniture	incentivi
- non appaltati	32	25	/	6	1
- appaltati	43	37	2	2	2

2.11 Considerazioni complessive

Alcune considerazioni basate sui risultati emersi dal monitoraggio effettuato nel trimestre, sono esposte di seguito:

- in termini generali l'attuazione del Piano registra un discreto progresso rispetto al trimestre precedente raggiungendo il 70% dell'avanzamento globale; tuttavia, rispetto alla programmazione iniziale, che indicava la quasi totalità degli interventi in fase di esecuzione entro il 31 marzo, l'obiettivo è stato raggiunto solamente dal 64% degli interventi; quindi oltre un terzo degli interventi registra un ritardo rispetto al cronoprogramma;

1) Si ricorda che gli interventi ad alto rischio sono quelli la cui data di completamento è a ridosso delle scadenze giubilari, che hanno accumulato sensibilmente ritardo e che, tenuto conto delle problematiche d'attuazione/esecuzione, mostrano un alto rischio di non completamento entro i termini giubilari, anche alla luce di quanto realizzato negli ultimi mesi. Gli interventi a rischio nullo sono quelli la cui fase esecutiva è già stata completata.
Gli altri interventi, valutati a medio e basso rischio, sono quelli per i quali non è individuabile, alla data attuale, un rischio particolare che ne possa impedire il completamento entro la scadenza giubilare. Tuttavia, i primi (a medio rischio) per dimensione, complessità e programmi d'esecuzione non presentano margini di sicurezza tali da permettere il recupero di ritardi dovuti ad imprevisti. Margini che invece esistono per gli interventi considerati a basso rischio.

- due fattori possono aver contribuito a frenare l'avanzamento del Piano:
  a) il maltempo, che nel 1° trimestre '99 ha certamente avuto un effetto negativo su alcuni cantieri;
  b) l'entrata in vigore di nuove procedure di affidamento degli appalti, che ha provocato di fatto un allungamento nei tempi di affidamento, anche per le necessità di adeguare bandi e capitolati alle nuove regole;
- gli interventi valutati ad «alto rischio» sono aumentati rispetto al trimestre precedente, in quanto alcuni di questi, precedentemente valutati a «medio rischio», sono passati nel livello superiore di rischio per non avere mostrato progressi significativi nel trimestre, viceversa solo un esiguo numero di interventi è progredito tanto da scendere da alto a «medio rischio». Inoltre sono entrati nel livello di «alto rischio» interventi di recente inserimento nel Piano;
- restano ad «alto rischio» alcuni degli interventi dimensionalmente più significativi sulle infrastrutture di trasporto (n.8 per un importo totale di circa 507 miliardi) in ragione della loro complessità esecutiva e/o dei ritardi di esecuzione osservati. E' opportuno però segnalare che 2 di questi:
  a) il «Sottovia di Lungotevere in Sassia»;
  b) le «Interconnessioni al parcheggio del Gianicolo»;

  hanno mostrato significativi progressi, pur dovendo ancora recuperare molto ritardo; mentre si è ulteriormente incrementato il ritardo dei lavori relativi a:
  a) «Autostrada Roma – Fiumicino» - 2° lotto;
  b) «Stazione Tiburtina»;
  c) «Passante ferroviario dei Laghi»;
  d) «Porto di Civitavecchia»;

  inoltre i 2 interventi della «metropolitana "A"» hanno tempi di esecuzione molto compressi e data di completamento a ridosso delle scadenze giubilari;
- la «Galleria P.A.S.A.», precedentemente valutata ad «alto rischio», a fronte di un notevole recupero del ritardo e del completamento delle attività di cantiere più critiche, viene ora valutata a «medio rischio»;
- vanno anche segnalati diversi interventi di dimensione media (tra 10 e 30 miliardi) valutati ad «alto rischio», tra questi:
  a) n. 5 interventi del «Ministero dell'Interno» e dei «Carabinieri»;
  b) n. 5 strade della «Provincia di Roma»;
  c) n. 1 intervento affidato alla «STA» per la realizzazione di un «sistema automatico di controllo degli accessi al centro storico»;
  d) n. 3 interventi consistenti in «incentivi per l'edilizia», «incentivi per le attività alberghiere» ed «incentivi per le attività extra-alberghiere»;
  e) «ospedale Sant'Eugenio»;
  f) «ospedale Agostino Gemelli»;
  g) la «riqualificazione dell'Appia Antica», per il quale i lavori del 2° lotto sono stati sospesi;
- tra gli interventi valutati ad «alto rischio» è evidente che quelli di elevato importo hanno maggiori difficoltà di recupero del ritardo rispetto a quelli, più numerosi, di importo ridotto;
- in generale gli interventi di dimensione ridotta e quelli dei Beni Culturali procedono bene.

In conclusione, si può prendere atto che il miglioramento registrato nell'ultimo trimestre, nella realizzazione di alcuni grandi interventi strategici di «viabilità nell'area di S. Pietro» è stato ottenuto anche a seguito del rafforzamento del management dei relativi cantieri.

Analogo rafforzamento è auspicabile per altri grandi interventi ad «alto rischio», in corso di esecuzione, finalizzato ad ottenere una più alta produttività da parte delle imprese senza che ciò vada a scapito di qualità e sicurezza nell'esecuzione delle opere.

2.12 Situazione finanziaria

2.12.1 Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Situazione al 31 dicembre 1998:

-	impegni assunti	L.	1.083.456.318.309
-	variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
-	Totale risorse attivate	L.	1.456.065.818.309
-	pagamenti effettuati	L.	503.826.983.578
-	variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
-	Totale risorse trasferite	L.	884.836.483.578

Situazione al 31 marzo 1999:

-	impegni assunti	L.	1.479.440.332.132
-	variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
-	Totale risorse attivate	L.	1.861.049.832.132
-	pagamenti effettuati	L.	997.963.805.282
-	variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
-	Totale risorse trasferite	L.	1.379.573.305.282

in dettaglio al 31 marzo 1999:

Settore «A»

-	impegni assunti	L.	184.176.165.898
-	pagamenti effettuati	L.	157.160.122.968

Settore «B»

-	impegni assunti	L.	125.488.521.687
-	pagamenti effettuati	L.	57.954.434.675

Settore «C»

-	impegni assunti	L.	260.035.921.643
-	pagamenti effettuati	L.	195.280.166.635

Settore «D»

-	impegni assunti	L.	709.555.487.357
-	pagamenti effettuati	L.	452.234.134.763
	Settore «E»		
-	impegni assunti	L.	118.300.538.764
-	pagamenti effettuati	L.	80.751.498.920
	Settore «F»		
-	impegni assunti	L.	81.883.696.783
-	pagamenti effettuati	L.	54.583.447.321

Pertanto le variazioni sulle singole voci, rispetto al 31 dicembre 1998 sono le seguenti:

-	maggiori impegni assunti	L.	395.984.013.823
-	variazioni di bilancio	L.	0
-	Differenza sul tot. risorse attivate	L.	395.984.013.823
-	ulteriori pagamenti effettuati	L.	494.136.821.704
-	variazioni di bilancio	L.	0
-	Differenza sul tot. risorse trasf.	L.	494.136.821.704

2 Allegati

2.1 Graficizzazione dello stato di attuazione

2.2 Tabulato dell'attuazione finanziaria

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 (L.651/96) AL 31 MARZO 1999

LEGENDA

FASI PROGRAMMATE DELL'ATTUAZIONE | FASI REALI DELL'ATTUAZIONE | FASI COINCIDENTI

Codici			Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																
								Fasi amministrative							Fasi Esecutive									Fasi Finali	
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmaz.	Prog. Prelim	Prog. Def.	Prog.esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funzion.
A	**SOCIALE ACCOGLIENZA**																									
A1 Creazione di strutture per l'accoglienza delle categorie disagiate																										
A	01	02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000	212.000	0																		
A	01	03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000	212.000	0																		
A	01	04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S.Margherita" - Roma	7.000.000	7.000.000	0																		
A	01	05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma), nell'edificio "S. Giuseppe Doria"	IPAB "S.Francesca Romana" - Roma	1.900.000	1.900.000	0																		
A	01	06	Comunit alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove	Comune di Roma - Dip. XII - III U.O.	1.500.000	1.500.000	0																		
A	01	07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di propriet comunale.	Comune di Roma - Dip. XII - III U.O.	4.355.794	4.355.794	0																		
A	01	10	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune di in localit Passoscuro	Comune di Fiumicino	600.000	600.000	0																		
A	01	11	Piano di accessibilit e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAC	10.995.000	10.995.000	0																		
A	01	12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	1.218.539	1.218.539	0																		
A	01	13	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Fiumicino	2.500.000	2.500.000	0																		
A	01	14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	1.538.000	1.538.000	0																		
A	01	15	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Monterotondo	260.000	260.000	0																		
A	01	16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	650.893	650.893	0																		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

| | | |

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

A	05	01/3	Santa Maria della Piet . Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Straord. Manutenz. Padigl. Direzione)	USL RM E	5.086.000	5.086.000	0
A	05	01/4	Santa Maria della Piet . Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenzione ordinaria cappella e 3 padiglioni)	USL RM E	6.988.000	6.988.000	0
A	05	01/5	Santa Maria della Piet . Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)	USL RM E	9.927.000	9.927.000	0
A	05	02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturaz. ex colonia marina "V. Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	6.879.166	6.879.166	0
A6	Interventi per l'accoglienza dei pellegrini in condizioni disagiate: interventi pubblici di ristrutturazione e incentivi per interventi preivati ("privato sociale")						
A	06	01	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.	Regione Lazio	10.000.000	10.000.000	0
A	06	02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipab e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.	Regione Lazio	20.800.000	20.800.000	0
A7	Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella citt metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo						
A	07	01	Centro di accoglienza turistica e convitto (Roma) Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi	Provincia di Roma	6.975.315	5.231.486	1.743.829
A	07	03	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di propriet provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Piet	Provincia di Roma	1.110.000	676.000	434.000
A	07	04	Ostello della giovent (Ciampino/Roma)	Comune di Ciampino	3.538.201	2.538.201	1.000.000
A	07	05	Ostello della Giovent (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	Comune di Albano Laziale	550.000	375.000	175.000
A	07	06	Ostello della Giovent (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	4.632.849	3.282.849	1.350.000
A	07	07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	2.440.000	1.830.000	610.000
A	07	07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	560.000	420.000	140.000
A	07	09	Campeggio (Fiano Romano/Roma). Completamento	Comune di Fiano Romano	889.922	589.922	300.000
A	07	10	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama	350.000	150.000	200.000
A	07	11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	1.750.000	1.050.000	700.000
A	07	12	Ostello della Giovent (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	500.000	375.000	125.000
A	07	13	Completamento Ostello Prataglia	Comune di Cervara	302.623	219.173	83.450

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

A	07	14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anticoli Corrado	874.500	656.000	218.500		
A	07	15	Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma). Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi	Comune di Arsoli	964.700	764.700	200.000		
A	07	16	Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Pirgus	Comune di S. Marinella	962.706	600.000	362.706		
A	07	18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	400.000	300.000	100.000		
A	07	19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento	Provincia di Viterbo	1.676.902	1.065.902	611.000		
A	07	20	Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° stralcio funzionale)	Comune di Vitorchiano	991.503	741.503	250.000		
A	07	21	Ostello della Gioventù "Torretta" (Tuscania/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi	Asilo infantile di Tuscania	500.000	338.000	162.000		
A	07	22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monast. Clarisse di S. Rosa (VT)	1.167.077	834.077	333.000		
A	07	23	Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Contigliano	2.200.000	1.650.000	550.000		
A	07	24	Casa di accoglienza-ostello della gioventù in edifici storici: a) Residenza Abati di Farfa; b) ex albergo (montopoli/Rieti)	Comune di Montopoli	800.000	600.000	200.000		
A	07	25	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	6.000.000	4.500.000	1.500.000		
A	07	26	Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di palazzo Sbraccia	Comune di Poggio Mirteto	972.000	729.000	243.000		
A	07	27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	1.600.000	1.200.000	400.000		
A	07	28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	Comune di Magliano Sabina	2.700.000	2.025.000	675.000		
A	07	29	Area camper (Frasso Sabino/Rieti) Realizzazione della pavimentazione, dei servizi e sistemazione degli accessi	Comune di Frasso Sabino	500.000	375.000	125.000		
A	07	30	Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi	Comune di Montopoli	500.000	375.000	125.000		
A	07	31	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone	280.000	210.000	70.000		
A	07	32	Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico	Comune di Campodimele	298.250	206.250	92.000		
A	07	33	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracolle	Comune di Lenola	380.239	230.239	150.000		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

A 07	34	Ostello della Giovent (Roccagorga/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphilj	Comune di Roccagorga	120.000	90.000	30.000	
A 07	35	Ostello della Giovent (Maenza/Latina) Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna.	Comune di Maenza	500.000	375.000	125.000	
A 07	36	Ostello della Giovent (Bassiano/Latina) Acquisto arredamento	Comune di Bassiano	200.000	150.000	50.000	
A 07	37	Ostello della Giovent (Sermoneta/Latina) Realizzazione	Comune di Sermoneta	1.342.011	942.011	400.000	
A 07	39	Ostello della Giovent (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)	Comune di Aprilia	2.667.000	2.000.000	667.000	
A 07	40	Centro di accoglienza (Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	Ist. Prof. di Stato San Benedetto	1.395.703	961.703	434.000	
A 07	41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	1.067.000	800.000	267.000	
A 07	42	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi	Comune di Veroli	2.000.000	1.500.000	500.000	
A 07	43	Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) Ristrutturazione ed adeguamento della struttura	Comune di Villa S. Lucia	336.219	236.219	100.000	
A 07	44	Centro di accoglienza nell'ex convento S. Nicola (Alvito/Frosinone) Adeguamento della struttura	Provincia di Frosinone	1.301.161	926.161	375.000	
A 07	45	Ostello della giovent (San Donato Val Comino/Frosinone)	Comune di San Donato Val Comino	1.084.161	799.381	284.780	
A 07	46	Ostello della giovent e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette	Comune di Alatri	2.667.000	2.000.000	667.000	
A8 Incentivi per la riqualificazione delle strutture di accoglienza alberghiere ed extralberghiere							
A 08	01	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio	99.653.000	99.653.000	0	
A9 Allestimento di un centro di accoglienza per pellegrini nella Corsia Sistina dell'Ospedale Santo Spirito							
A 09	01	Corsia Sistina-Ospedale S.Spirito: centro temporaneo d'accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di S.Pietro.Lavori di restauro ed allestimento	Azienda Sanitaria Roma E	650.000	650.000		
A10 Interventi inerenti il Santuario del Divino Amore							
A 10	01	Pavimentazione del sagrato del Santuario e dei viali processionali	Parrocchia S.Maria del Divino Amore	1.379.000	1.379.000	0	
A 10	02	Deumidificazione dei piani inferiori degli edifici del 700 e della Chiesa del Santuario	Parrocchia S.Maria del Divino Amore	234.000	234.000	0	
A 10	03	Eliminazione barriere architettoniche nei percorsi interni al comprensorio del Divino Amore	Parrocchia S.Maria del Divino Amore	917.000	917.000	0	

B BENI CULTURALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B1 Area del Grande Campidoglio, Palazzo Senatorio e Musei Capitolini

B	01	02	Area del Grande Campidoglio. Progetto di restauro e sistemazione dei Musei Capitolini. 2° lotto funzionale.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	7.500.000	7.500.000	0

B2 Area dei Fori Imperiali: nuovi scavi, restauri e allestimenti museali

B	02	01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali. Museo dei Fori Imperiali ai Mercati Traianei (Roma).	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	5.000.000	5.000.000	0
B	02	01/2	Area archeologica dei Fori Imperiali. Museo dei Fori Imperiali. Allestimento dei materiali mobili restaurati.	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	990.000	990.000	0
B	02	01/3	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilit Torre delle Milizie.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.322.277	2.322.277	0
B	02	02	Area archeologica dei Fori Imperiali; Restauri e sistemazioni esterne dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.168.124	2.168.124	0
B	02	03/1a	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Cesare	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	3.278.708	3.278.708	0
B	02	03/1b	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Tempio della Pace	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	4.283.934	4.283.934	0
B	02	03/1c	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Traiano	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	5.844.358	5.844.358	0
B	02	03/2a	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Cesare	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	1.312.658	1.312.658	0
B	02	03/2b	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Tempio della Pace	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	1.360.490	1.360.490	0
B	02	03/2c	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Traiano	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	1.969.554	1.969.554	0

B3 Restauro e manutenzione del percorso delle Mura storiche

B	03	01	Mura di Roma. Restauro e valorizzazione di Porta S. Paolo.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.600.000	1.600.000	0
B	03	02/1	Mura di Roma. Restauro di Porta S. Sebastiano, Arco di Druso, Porta Latina, tratti di mura da Porta S. Sebastiano al Bastione Ardeatino	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.814.554	1.814.554	0
B	03	02/2	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro tratti murari tra Porta S. Sebastiano a Porta Metronia	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.689.121	1.689.121	0
B	03	03	Mura di Roma. Restauro di Porta S.Giovanni e tratto di mura da Porta Asinaria all'anfiteatro Castrense	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	3.000.000	3.000.000	0
B	03	04/1	Mura di Roma. Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.600.000	2.600.000	0
B	03	04/2	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.088.736	1.088.736	0
B	03	05	Mura di Roma. Restauro conservativo e consolidamento del complesso monumentale di Porta Pia	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.786.034	1.786.034	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

| | | |

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 09	01	Restauro del complesso di Palazzo Barberini (Roma) - primo stralcio	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	15.142.869	5.142.869	10.000.000		
B10 Museo Nazionale di Villa Giulia e Villa Poniatowski								
B 10	01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	BB. CC. AA. - (6) S. Archeol. Etr. Mer.	9.800.000	9.800.000	0		
B 10	01/b	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	BB. CC. AA. - (6) S. Archeol. Etr. Mer.	9.800.000	9.800.000	0		
B 10	01/c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stohl Fern)	BB. CC. AA. - (6) S. Archeol. Etr. Mer.	3.400.000	3.400.000	0		
B11 Galleria Nazionale d'Arte Moderna								
B 11	01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	BB. CC. AA. - (6) Gal. Naz. Arte Mod.	24.124.859	9.124.859	15.000.000		
B12 Interventi di restauro di immobili e complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)								
B 12	01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	581.697	581.697	0		
B 12	02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento dei restauro della facciata	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	3.103.076	3.103.076	0		
B 12	03	Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	9.676.423	9.676.423	0		
B 12	04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	3.000.000	3.000.000	0		
B 12	05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.401.670	1.401.670	0		
B 12	06/a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	2.208.104	2.208.104	0		
B 12	06/b	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	267.073	267.073	0		
B 12	08	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.654.140	1.654.140	0		
B 12	09	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	300.000	300.000	0		
B 12	10	Appia Antica - Cecilia Metella	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.860.559	1.860.559	0		
B 12	11	Mausoleo di S.Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.206.441	1.206.441	0		
B 12	12	Mausoleo "Berretta del Prete" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.264.993	1.264.993	0		
B 12	13	Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Casale di Malborghetto	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.000.000	1.000.000	0		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B	12	14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	573.725	573.725	0
B	12	15	Rocca di Papa: Castello di Palazzolo	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	923.047	923.047	0
B	12	16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	5.582.254	5.582.254	0
B	12	17	Antica Rocca (Civitavecchia/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	1.691.925	1.691.925	0
B	12	18	Forte Michelangelo (Civitavecchia/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	2.670.383	2.670.383	0
B	12	19	Castello di S.Severa (S.Marinella/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	4.965.905	4.965.905	0
B	12	20	Castello Odescalchi (Santa Marinella - Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	523.785	523.785	0
B	12	21	Castello Odescalchi (Bracciano/Roma) Rifacimento coperture	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	564.330	564.330	0
B	12	22	Castello di Monterone (Ladispoli/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	2.820.072	2.820.072	0
B	12	23	Completamento dei lavori di restauro e ripulitura dei prospetti, revisione dei tetti e lavori interni - Palazzo Stamperia	Presidenza Consiglio Ministri	1.500.000	1.500.000	0
B	12	24	Ripulitura delle facciate interne ed esterne, revisione e verniciatura dei relativi infissi e sistemazioni varie a Palazzo Chigi	Presidenza Consiglio Ministri	3.672.000	3.672.000	0
B	12	25	Restauro della casa di S. Brigida in P.zza Farnese	Ordine del SS Salvatore di Santa Brigida	600.000	600.000	0
B	12	26	Passetto di Borgo - Restauro conservativo tratto Piazza Pia - Via del Campanile	BB. CC. AA. - (7)	1.000.000	1.000.000	0
B	12	27	Ex scuderie papali al Quirinale - Restauro e risanamento conservativo	BB. CC. AA. - (7)	8.897.000	8.897.000	0
B13	Restauri ed interventi conservativi di chiese, basiliche, Monasteri, Oratori lungo gli itinerari storici del Giubileo						
B	13	01/1	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	4.000.000	4.000.000	0
B	13	01/2	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	927.720	927.720	0
B	13	02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	384.256	384.256	0
B	13	03	Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	500.000	500.000	0
B	13	04	Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	500.000	500.000	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B	13	05	Chiesa SS. Quattro coronati	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	489.647	489.647	0	
B	13	06	S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	890.906	890.906	0	
B	13	07	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.922.727	1.922.727	0	
B	13	08	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	700.000	700.000	0	
B	13	09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	180.830	180.830	0	
B	13	10	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	1.000.000	1.000.000	0	
B	13	11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	918.191	918.191	0	
B	13	12	Chiesa del Ges (Roma) Restauro delle opere d'arte	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	800.000	800.000	0	
B	13	13	Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	444.154	444.154	0	
B	13	14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	672.536	672.536	0	
B	13	15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.000.000	1.000.000	0	
B	13	16	Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	800.000	800.000	0	
B	13	17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.388.727	1.388.727	0	
B	13	18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina- prosecuzione del consolidamento e restauro	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	394.949	394.949	0	
B	13	19	Chiesa S. Agnese in Agone	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.072.494	1.072.494	0	
B	13	20	Chiesa San Carlo al Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	2.500.000	2.500.000	0	
B	13	21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	961.300	961.300	0	
B	13	22	Chiesa di S. Susanna restauro prospetti int. rifacimento coperture	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	737.477	737.477	0	
B	13	23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	500.000	500.000	0	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B	13	24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	639.480	639.480	0
B	13	25/1	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro cappella Altemps e indagini archeologiche	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	500.000	500.000	0
B	13	25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altemps e della cappella Avila.Scavo archeologico e valorizzazione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	300.000	300.000	0
B	13	26	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	848.724	848.724	0
B	13	27	Restauro, bonifica e rifacimento tetti Chiesa S. Eustachio (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	749.391	749.391	0
B	13	28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	600.000	600.000	0
B	13	29	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	189.614	189.614	0
B	13	30	Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	778.810	778.810	0
B	13	31	Oratorio del Caravita (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	761.915	761.915	0
B	13	32/1	Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	450.000	450.000	0
B	13	32/2	Restauro Oratorio del SS. Crocifisso	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	416.993	416.993	0
B	13	33	Oratorio dei Filippini (Roma). Restauro prospetti del cortile Borrominiano	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	350.000	350.000	0
B	13	34	Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma) Restauro della facciata	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	736.893	736.893	0
B	13	35	Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	500.000	500.000	0
B	13	36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	1.300.000	1.300.000	0
B	13	38	Chiesa di S. Bartolomeo de Insula (Roma) Restauro dei prospetti	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	449.273	449.273	0
B	13	39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica fondale.	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	518.457	518.457	0
B	13	40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	713.806	713.806	0
B	13	41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	494.332	494.332	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B	13	42	Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	94.874	94.874	0
B	13	43	Chiesa dei SS. Domenico e Sisto	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	700.000	700.000	0
B	13	44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	640.000	640.000	0
B	13	44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro del muro di cinta del convento	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	310.497	310.497	0
B	13	45/1	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma) Restauro degli interni	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	300.000	300.000	0
B	13	45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	400.000	400.000	0
B	13	46/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	470.650	470.650	0
B	13	46/2	Chiesa di S. Maria alle Fornaci: Restauro portici e facciate	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	711.336	711.336	0
B	13	46/3	Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	700.000	700.000	0
B	13	46/4	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	724.740	724.740	0
B	13	47/1	Chiese di S. Maria sopra Minerva. Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	550.000	550.000	0
B	13	47/2	Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	1.235.000	1.235.000	0
B	13	47/3	Chiese di S. Maria in Trivio. Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	350.000	350.000	0
B	13	47/4	Chiese di S. Silvestro al Quirinale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	220.000	220.000	0
B	13	47/5	Chiese di S.Vitale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	200.000	200.000	0
B	13	48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro della zona absidale	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	374.916	374.916	0
B	13	48/2	Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso: Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	470.435	470.435	0
B	13	48/3	Chiesa di S. Maria in Publicolis: Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	381.127	381.127	0
B	13	48/4	Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori: Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	600.000	600.000	0

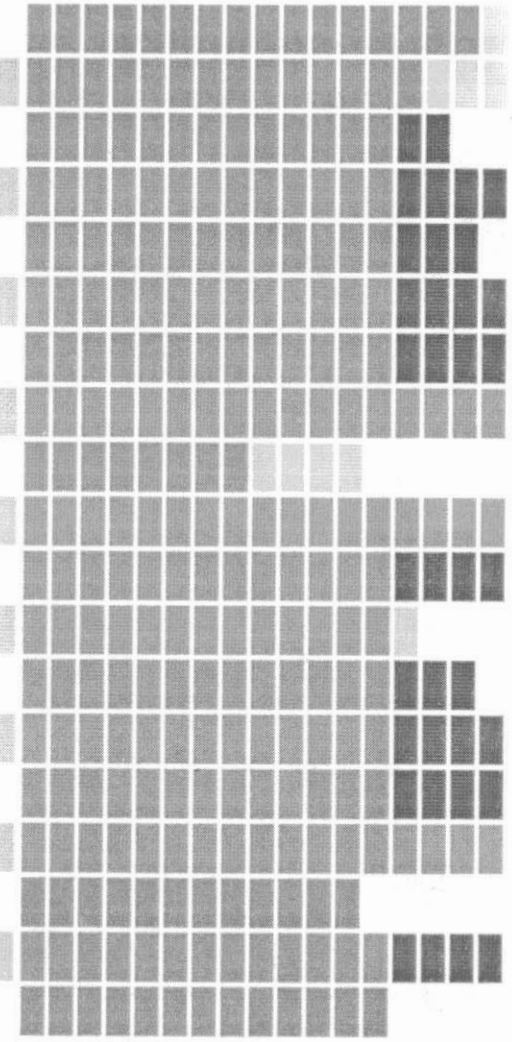

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B	13	48/5	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro delle coperture e dell'apparato decorativo interno alla navata centrale	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	300.000	300.000	0	
B	13	48/6	Chiesa di S. Maria in Traspontina: Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	550.000	550.000	0	
B	13	48/7	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dell'apparato decorativo delle cappelle (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	230.610	230.610	0	
B	13	49/1	Chiesa di S. Michele: Restauro della cripta	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	400.000	400.000	0	
B	13	49/2	Chiesa di S. Pantaleo	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	385.915	385.915	0	
B	13	49/3	Chiesa di S. Pietro in Montorio. Restauro Globale (1° fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	359.283	359.283	0	
B	13	49/4	Chiesa di S. Prisca	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	268.344	268.344	0	
B	13	49/5	Chiesa di S. Salvatore in Lauro.Restauro Globale	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	480.237	480.237	0	
B	13	49/6	Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento: Restauro Globale	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	979.794	979.794	0	
B	13	50	Chiese di S. Tommaso in Parione (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	354.100	354.100	0	
B	13	51	Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.372.433	1.372.433	0	
B	13	52	Chiesa della Annunziatella Consolidamento e restauro del complesso	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	687.983	687.983	0	
B	13	54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassettonato ligneo seicentesco muratura e tetti nella Chiesa di S. Pancrazio	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	828.882	828.882	0	
B	13	55	Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	5.572.953	5.572.953	0	
B	13	56	Chiesa di S. Zotico - Catacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.000.000	1.000.000	0	
B	13	57	Convento di San Francesco (Velletri/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	898.721	898.721	0	
B	13	58	Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	2.296.693	2.296.693	0	
B	13	59	Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	458.902	458.902	0	
B	13	60	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento di Palazzolo (Rocca di Papa/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	877.562	877.562	0	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 13	61	Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	1.122.389	1.122.389	0		
B 13	62	Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano Romano/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	2.859.922	2.859.922	0		
B 13	63	Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	958.897	958.897	0		
B 13	64	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	890.516	890.516	0		
B 13	65	Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	929.344	929.344	0		
B 13	66	Eremo della Trinit (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	1.690.887	1.690.887	0		
B 13	67	Santuario della Madonna di Cibona (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	1.791.996	1.791.996	0		
B 13	68	Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	936.885	936.885	0		
B 13	69	Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiumicino/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	1.868.045	1.868.045	0		
B 13	70	Restauro delle edicole sacre del centro storico di Roma	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	1.700.000	1.700.000	0		
B 13	71	Restauro organo (Alatri)	Chiesa di S. Maria Maggiore	100.000	100.000	0		
B 13	72	Ristrutturazione	Parrocchia S.Maria degli Angeli - Roma	1.770.000	1.770.000	0		
B 13	73	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, rampa per disabili	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	110.000	110.000	0		
B 13	74	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Restauro e risanamento del soffitto artistico ligneo	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	580.000	580.000	0		
B 13	75	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Rifacimento degli impianti di illuminazione ed elettrici	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	720.000	720.000	0		
B 13	76	Nuove rampe per disabili e posto di pronto soccorso	Patriarcale Basilica di S. G. in Laterano	234.000	234.000	0		
B 13	77	Restauri e rinnovo impianto elettrico	Patriarcale Basilica di S. G. in Laterano	2.057.000	2.057.000	0		
B 13	78	Messa a norma dell'impianto elettrico e nuovo impianto per l'amplificazione e la diffusione	Pontificia Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo	2.000.000	2.000.000	0		
B 13	79	Restauro dell'organo di Giovanni Corrado Verl	Ord. Cistercense SS Vincenzo e Anastasio	249.000	249.000	0		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 13	80	Cappella S. Maria del Popolo	BB. CC. AA. - (7)	800.000	800.000	0
B14 Interventi di restauro e adeguamento funzionale di altri Musei Archeologici, Medievali, Moderni						
B 14	01	Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova sede dell'ist. Naz della Grafica	BB. CC. AA. - (6) Ist. Naz. Grafica	10.714.115	10.714.115	0
B 14	02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	6.984.526	6.984.526	0
B 14	03	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	747.867	747.867	0
B 14	04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.305.436	1.305.436	0
B 14	05	Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale	BB. CC. AA. - (6) Mus. Naz. C. S. Ang.	1.500.000	1.500.000	0
B 14	06	Museo delle navi romane (Nemi/Roma)	BB. CC. AA. - (6) S. Archeol. Lazio	800.000	800.000	0
B 14	07	Museo d'Arte Sacra	Parrocchia S. Giovanni dei Fiorentini	700.000	700.000	0
B 14	08	Completamento "Museo del Fiume"	Comune di Nazzano	900.000	900.000	
B15 Interventi sulle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano						
B 15	01	Citt di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano	BB. CC. AA. - (4) S.B. Archeol. Ostia	4.000.000	4.000.000	0
B 15	02	Citt di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica)	BB. CC. AA. - (4) S.B. Archeol. Ostia	7.000.000	7.000.000	0
B 15	03	Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico	BB. CC. AA. - (4) S.B. Archeol. Ostia	2.000.000	2.000.000	0
B 15	04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale	BB. CC. AA. - (4) S.B. Archeol. Ostia	2.000.000	2.000.000	0
B 15	05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	BB. CC. AA. - (4) S.B. Archeol. Ostia	2.000.000	2.000.000	0
B 15	06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita	BB. CC. AA. - (4) S.B. Archeol. Ostia	1.500.000	1.500.000	0
B 15	07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)	BB. CC. AA. - (4) S.B. Archeol. Ostia	1.500.000	1.500.000	0
B16 Interventi di restauro e consolidamento di beni culturali archeologici						
B 16	01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	893.929	893.929	0
B 16	02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	4.672.784	4.672.784	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

| | | |

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 16	18/05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo -Carcere Mamertino	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	551.079	551.079	0		
B 16	18/06	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana località Casali Bianco	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	47.516	47.516	0		
B 16	18/07	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino nomentano	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	45.818	45.818	0		
B 16	18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Mitreo di S. Stefano Rotondo	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	91.597	91.597	0		
B 16	18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	45.798	45.798	0		
B 16	18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Ruderi in Piazza Iside	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	92.502	92.502	0		
B 16	18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	901.046	901.046	0		
B 16	18/12	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sette Bassi	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	100.000	100.000	0		
B 16	18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura integrata del territorio	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	94.537	94.537	0		
B 16	18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	50.000	50.000	0		
B 16	18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	60.000	60.000	0		
B 16	18/16	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano aula ottagona	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	122.102	122.102	0		
B 16	18/17	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	675.516	675.516	0		
B 16	18/18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana località Casalotti	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	93.184	93.184	0		
B 16	18/19	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ottavi	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	25.000	25.000	0		
B 16	18/20	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo -Villa romana in località Monte Colombaccio	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	576.929	576.929	0		
B 16	18/21	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo -Necropoli Portuense in località Pozzo Pantaleo	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	470.392	470.392	0		
B 16	18/22	Itinerari antichi e monumenti archeol. connessi, materiali archeol. ed opere d'arte. Conservaz., manutenz., scavo - Crustumerium - Itinerario di visita della citt e di due necropoli	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	831.234	831.234	0		
B 16	18/23	Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	100.000	100.000	0		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 16	18/24	Palazzo Baldassini - Scavi di strutture antiche nei sotterranei	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	300.000	300.000	0
B 16	18/25	Tempio rettangolare al Foro Boario - Restauri tetto ed esterni	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	130.000	130.000	0
B 16	19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.869.968	1.869.968	0
B 16	20	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale (Appia Antica)	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	5.469.913	5.469.913	0
B 16	22	Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	2.659.556	2.659.556	0
B 16	24	Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	8.076.283	8.076.283	0
B 16	25	Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area archeologica	BB. CC. AA. - (6) S. Archeol. Etr. Mer.	600.000	600.000	0
B 16	26	Antica citt di Gabii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase)	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	4.705.715	4.705.715	0
B 16	27	Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.458.180	1.458.180	0
B 16	28	Antro delle Sorti (Palestrina/Roma)	BB. CC. AA. - (6) S. Archeol. Lazio	560.000	560.000	0
B 16	29	Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Torre di Roccabruna e Cento Camerelle	BB. CC. AA. - (6) S. Archeol. Lazio	1.060.000	1.060.000	0
B 16	30	Recupero del "Barco Borghese" e delle sostituzioni della Villa Romana	Comune di Monteporzio Catone	3.000.000	3.000.000	
B18 Valorizzazione del patrimonio culturale nei luoghi di culto e di visita nella provincia di Roma						
B 18	01	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Ninfeo del Santuario	Comune di Albano Laziale	500.000	500.000	0
B 18	02	Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Arena e spazi circostanti	Comune di Albano Laziale	800.000	800.000	0
B 18	03	Terme di Cellomalo e chiesa di S. Pietro (Albano Laziale/Roma) Restauro delle terme e del campanile della chiesa	Comune di Albano Laziale	500.000	500.000	0
B 18	04	Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo del campanile	Comune di Albano Laziale	200.000	200.000	0
B 18	05	Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero	Comune di Albano Laziale	1.000.000	1.000.000	0
B 18	06	Palazzo e Parco Chigi (Ariccia/Roma)	Comune di Ariccia	4.515.222	4.515.222	0
B 18	07	Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adeguamento funzionale	Provincia di Roma	514.044	514.044	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B	18	08	Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata. 4° settore di intervento	XI^ Comunit Montana, Sede di Rocca Priora	500.000	500.000	0
B	18	09	Villa Mondragone (Monte Porzio catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria	Universit degli studi di Roma "Tor Vergata"	7.700.000	7.700.000	0
B	18	10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	Comune di Segni	1.350.000	1.257.000	93.000
B	18	11	Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero area archeologica	Comune di Valmontone	392.505	392.505	0
B	18	12	Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi	Comune di Palestrina	1.313.739	1.313.739	0
B	18	13	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilit	Comune di Castel S.Pietro Romano	546.829	544.329	2.500
B	18	14	Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genazzano/Roma) Lavori di ristrutturazione	Provincia di Roma	405.771	405.771	0
B	18	16	Museo dell'Abbazia di S.Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione	Provincia di Roma	1.959.637	1.959.637	0
B	18	17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	397.686	397.686	0
B	18	18	Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	741.881	741.881	0
B	18	19	Ex chiesa di S.Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	Provincia di Roma	389.792	389.792	0
B	18	20	Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro	Comune di Fiano Romano	150.000	150.000	0
B	18	21	Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro	Comune di Civitella S.Paolo	254.200	254.200	0
B	18	22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	274.993	274.993	0
B	18	23	Area archeologica della Villa Neroniana (Anzio/Roma) Recupero	Comune di Anzio	1.230.000	1.230.000	0
B	18	24	Sistemazione area parcheggio adiacente parco Chigi e risanamento parco Primoli	Comune di Ariccia	1.000.000	1.000.000	
B19 Valorizzazione del patrimonio culturale regionale (circuito abbazie, santuari e monasteri)							
B	19	02	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	Regione Lazio	1.000.000	1.000.000	0
B	19	03	Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto)	Comune di Frascati	4.517.000	4.517.000	0
B	19	04/1	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra-i° stralcio	Comune di Bellegra	995.862	995.862	0

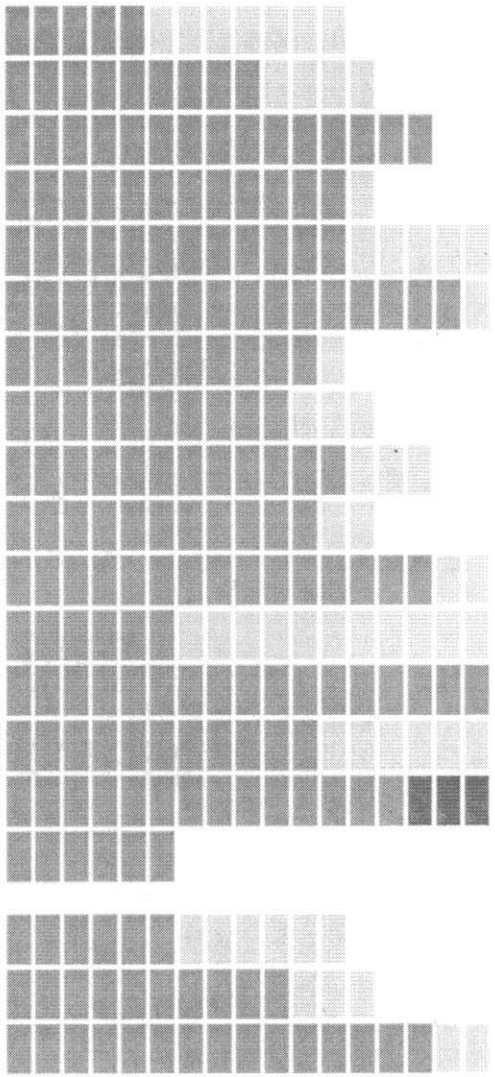

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B	19	04/2	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra-II° stralcio	Comune di Bellegra	840.000	840.000	0
B	19	05	Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S.M. Novella	Comune di Bracciano	1.167.163	1.167.163	0
B	19	06	Restauro conservativo della Cappella votiva di S. Bellarmino	Comune di Trevignano	402.000	402.000	0
B	19	07	Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima fase)	Comune di Anguillara Sabazia	995.034	995.034	0
B	19	08	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi	Comune di Genazzano	5.774.000	5.774.000	0
B	19	09	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	548.829	548.829	0
B	19	10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	100.000	100.000	0
B	19	12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineto Romano/Roma)	Comune di Carpineto Romano	1.242.089	1.242.089	0
B	19	13	Chiesa di Santa Maria e San Mauro, Santuario Madonna degli Angeli (Canterano/Roma) Restauro e ristrutturazione	Comune di Canterano	300.000	300.000	0
B	19	14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	764.429	764.429	0
B	19	15	Recupero e risanamento della Chiesa di San Rocco.	Comune di Gallicano nel Lazio	212.890	172.890	40.000
B	19	16	Chiesa di Santa Liberata (Sant'Angelo Romano/Roma) Restauro	Comune di Sant'Angelo Romano	470.520	470.520	0
B	19	17	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)	Comune di Palombara Sabina	200.000	200.000	0
B	19	18	Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche	Comune di Vicovaro	150.000	150.000	0
B	19	19	Santuario di Vallepietra (Vallepietra/Roma) Centro di documentazione	Comune di Vallepietra	65.000	65.000	0
B	19	20/1	Restauro delle Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	372.274	372.274	0
B	19	20/2	Restauro della Chiesa di S. Terenziano (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	627.504	627.504	0
B	19	20/3	Pavimentazione del corso Petrarca ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	445.246	445.246	0
B	19	20/4	Sistemazione di Via della Mattonara (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	820.925	820.925	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B	19	20/5	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	453.724	453.724	0	
B	19	20/6	Sistemazione del piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	560.327	560.327	0	
B	19	21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesiano	Diocesi di Viterbo	3.070.104	3.070.104	0	
B	19	22	Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Ges	2.366.953	2.366.953	0	
B	19	23	Museo della cristianit	Capitolo della Basilica Cattedrale di VT	2.128.411	2.128.411	0	
B	19	24/1	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	Comune di Tarquinia	162.388	162.388	0	
B	19	24/2	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Tarquinia	122.789	122.789	0	
B	19	24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edilizio Santuario S. Maria in Valverde	Comune di Tarquinia	2.087.815	2.087.815	0	
B	19	25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	300.000	300.000	0	
B	19	25/2	Sistemazione dell'Oasi francescana	Comune di Poggio Bustone	200.000	200.000	0	
B	19	26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.600.000	1.600.000	0	
B	19	27	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauro e sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.850.000	1.850.000	0	
B	19	28/1	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio. Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato . (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	804.000	804.000	0	
B	19	28/2	Lavori di sistemazione della piazza del presepio vivente. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	488.429	488.429	0	
B	19	28/3	Lavori di sistemazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Greggio capoluogo (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	216.075	201.075	15.000	
B	19	29	Completamento funzionale dell'Abbazia di S. Quirico e Giuditta	Comune di Micigliano	499.791	499.791	0	
B	19	30	Complesso di S. Alessandro (Toffia/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Comune di Toffia in Sabina	1.500.000	1.500.000	0	
B	19	31	Riqualificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro del Monastero con riallestimento del Museo	Comune di Fara in Sabina	4.729.000	4.729.000	0	
B	19	32	S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S.Carlo da Sezze	Comune di Sezze	400.000	400.000	0	

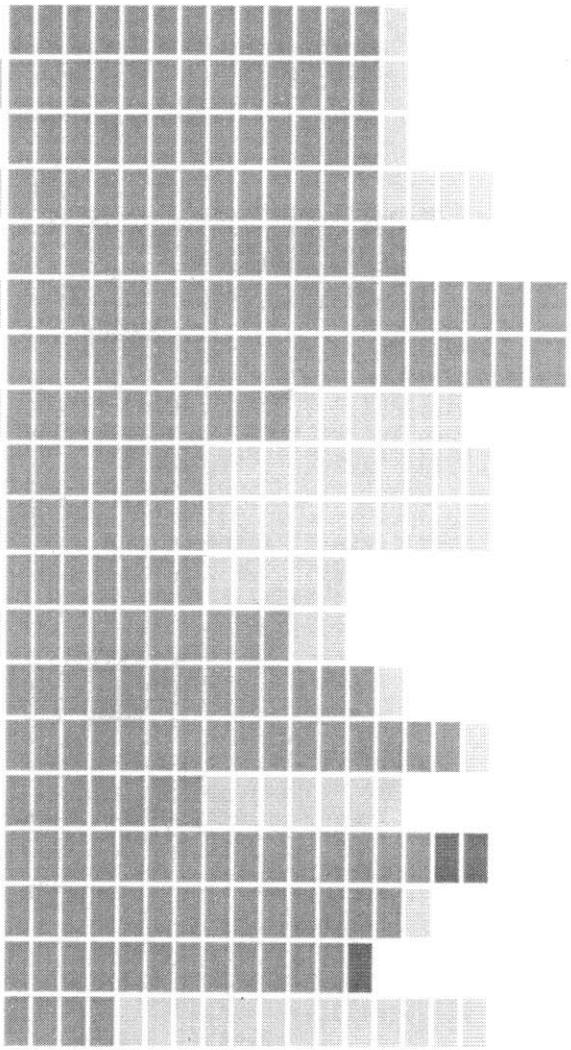

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B	19	33	Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina) Completamento della ristrutturazione (prima fase)	Provincia di Latina	4.898.903	1.898.903	3.000.000		
B	19	34	Lavori di consolidamento restauro Chiesa S. Maria della Piet collegiata	Comune di Cori	1.000.000	1.000.000	0		
B	19	35	Itinerario storico naturalistico P.R.U.M.O. Comune di Gaeta ambito area museale aperta della Citt Vecchia di Gaeta e del promontorio di Monte Orlando	Comune di Gaeta	1.000.000	1.000.000	0		
B	19	36	Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina) Sistemazione via e parcheggio	Comune di Fondi	1.000.000	1.000.000	0		
B	19	37	Castello Frangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione	Comune di Terracina	1.000.000	1.000.000	0		
B	19	38	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro	Comune di Castelforte	200.000	200.000	0		
B	19	39	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	1.250.000	1.250.000	0		
B	19	40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante	Provincia di Latina	683.400	683.400	0		
B	19	41/1	Restauro e risanamento conservativo e funzionale del convento di S. Francesco	Comune di Minturno	224.856	224.856	0		
B	19	41/2	Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata	Comune di Minturno	130.642	130.642	0		
B	19	42	Illuminazione viabilit di accesso al Santuario della Madonna della Sorresca	Comune di Sabaudia	105.594	105.594	0		
B	19	43	Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata	Comune di Sabaudia	179.311	179.311	0		
B	19	44	Chiesa di SS. Cosma e Damiano. Restauro	Comune di Santi Cosma e Damiano	120.000	120.000	0		
B	19	45	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro	Provincia di Latina	650.000	650.000	0		
B	19	46	Progetto pubblica illuminazione delle aree adiacenti il santuario Madonna del Colle	Comune di Lenola	99.961	99.961	0		
B	19	47	Recupero de Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa	Comune di Formia	936.087	936.087	0		
B	19	48	Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) restauro	Comune di Sezze	700.000	700.000	0		
B	19	49	Madonna della Civita (Itri/Latina) Adeguamento della strada di accesso	Provincia di Latina	1.300.000	1.300.000	0		
B	19	50	Museo storico bonifaciano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione	Congregazione suore Cistercensi della Carit	650.302	650.302	0		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B	19	51	Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale, del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera	Comune di Aquino	989.007	989.007	0		
B	19	52	Sistemazione area attrezzata esterna al Santuario della Madonna di Canneto	Comune di Settefrati	252.425	252.425	0		
B	19	53	Santa Maria Assunta (Atina/Frosinone) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	615.300	615.300	0		
B	19	54	Ristrutturazione Chiesa di Santo Stefano (Settefrati/Frosinone)	Comune di Settefrati	313.880	313.880	0		
B	19	55	Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	Ente Chiesa di S. Maria Salomone	240.000	240.000	0		
B	19	56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	4.000.000	4.000.000	0		
B	19	57	Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica/Frosinone) Restauro	Comune di Boville Ernica	256.272	256.272	0		
B	19	58	Consolidamento statico e restauro conservativo Chiesa di San Pietro in Monte (S. Giovanni Campano)	Comune di Monte San Giovanni Campano	430.000	430.000	0		
B	19	59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	Comune di Fumone	300.000	300.000	0		
B	19	60	Chiese S. Maria a Fiume, San Nicola (Ceccano/Frosinone) Restauro	Comune di Ceccano	483.803	483.803	0		
B	19	61	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Frosinone)	Diocesi di Anagni-Alatri	363.475	363.475	0		
B	19	63/1	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	1.071.006	571.006	500.000		
B	19	63/2	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza - Forniture	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	164.443	164.443	0		
B	19	64	Cattedrale di San Paolo (Alatri)	Comune di Alatri	683.007	683.007	0		
B	19	65	Chiesa della S.S. Annunziata (Frosinone) Restauro	Comune di Frosinone	870.224	870.224	0		
B	19	66	Risanamento e ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - Santuario di San Cataldo	Comune di Supino	422.384	422.384	0		
B	19	67	Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Ristrutturazione e allestimento museale	Comune di Ferentino	2.750.000	2.750.000	0		
B	19	68	Chiesa di S. Restituta (Sora/Frosinone) Restauro	Comune di Sora	675.357	675.357	0		
B	19	69	Chiesa di San Mito	Comune di Roccasecca	300.000	300.000	0		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 19 70	Chiesa di Santa Maria Assunta (Piedimonte San Germano/Frosinone) Restauro	Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Piedimonte Alto	100.000	100.000	0	
B 19 71	Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilit	Provincia di Frosinone	1.110.846	1.110.846	0	
B 19 72	Ampliamento della Chiesa in localit Grunuolo facente parte della Parrocchia di S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	60.000	60.000	0	
B 19 73	Rifacimento copertura, facciata esterna e Sistemazione area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	100.000	100.000	0	
B 19 74	Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo. Parrocchia S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	40.000	40.000	0	
B 19 75	Abbazia di Casamari	Ordine Cistercense	1.000.000	1.000.000		
B20 Incentivi per attivit culturali di iniziativa pubblica e privata connesse al Giubileo						
B 20 01.1	Opera lirica.Programma da svolgersi a Roma e negli altri comuni del Lazio	Teatro dell'Opera di Roma	15.000.000	15.000.000	0	
B 20 01.2	Musica.Programma da svolgersi a Roma e negli altri comuni del Lazio	Accademia di Santa Cecilia	13.000.000	13.000.000		
B 20 01.3	Prosa.Programma da svolgersi a Roma e negli altri comuni del Lazio	Teatro Roma	7.000.000	7.000.000		
B 20 01.4	Mostre. Programma di esposizione d'arte da svolgersi nelle Scuderie Papali	Agenzia Romana Prep. Giubileo	5.000.000	5.000.000		
B 20 01.5	Convegno Internazionale	Agenzia Romana Prep. Giubileo	2.000.000	2.000.000		
B 20 01.6	Concorsi finalizzati all'arricchimento del patrimonio culturale	Agenzia Romana Prep. Giubileo	5.000.000	5.000.000		
B 20 01.7	Incentivi dell'offerta culturale di Roma	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		
B 20 01.8	Incentivi dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	1.000.000	1.000.000		
B 20 01.9	Incentivi dell'offerta culturale nella Regione Lazio	Regione Lazio	1.000.000	1.000.000		
B 20 02	Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Piccolomini - Villa del Sole	Fondazione Niccol Piccolomini	2.985.000	2.985.000	0	

C MANUTENZIONE E ARREDO URBANO PATRIMONIO AMBIENTALE

C1 Programma di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone maggiormente sensibili e programma di abbattimento barriere architettoniche

C 01 01	Restauro conservativo dei ponti Vittorio Emanuele II, Umberto I, Regina Margherita e Cavour	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	7.009.952	7.009.952	0	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C	01	02	Restauro conservativo di ponte Caio Cestio, ponte Duca D'Aosta, cavalcavia sul Muro Torto	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	8.151.363	8.151.363	0		
C	01	03	Restauro conservativo di ponte Flaminio ed impermeabilizzazione di ponte Testaccio	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	6.622.872	6.622.872	0		
C	01	04	Restauro conservativo di ponte Risorgimento	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.689.000	2.689.000	0		
C	01	05	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	Comune di Roma - Dip. VI - Uff. Citt Storica	3.334.070	3.334.070	0		
C	01	06	Restauro conservativo di ponte Fabricio	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.138.804	2.138.804	0		
C	01	07	Restauro conservativo di ponte Nomentano	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.554.975	2.554.975	0		
C	01	10	P.zze S.Pietro in Vincoli, S.Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riqualificaz. Ambient., risagomatura strade e ripristino selciati	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	3.245.965	3.245.965	0		
C	01	11	Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Clodia, via Giuliana (Roma): Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.228.822	2.228.822	0		
C	01	12	Progetto per interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Percorso "C": v.le Trastevere, via Morosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.894.625	2.894.625	0		
C	01	13/1	Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Lungotevere di sinistra e di destra da ponte Sublicio a ponte Matteotti. Ristrutturazione marciapiedi e sistema fognante	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	4.500.000	4.500.000	0		
C	01	13/2	Interventi di manutenzione delle sedi stradali del lungotevere di sinistra e di destra da ponte Sublicio a ponte Matteotti e zone limitrofe	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	7.000.000	7.000.000	0		
C	01	14	Via S.Gregorio, via G.Lanza, via Washington : interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	8.205.316	8.205.316	0		
C	01	15/1	Via Appia Antica. 1° Lotto. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale da piazza Numa Pompilio a via di Cecilia Metella	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	3.587.523	3.587.523	0		
C	01	15/2	Via Appia Antica. 2° Lotto. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale del tratto da piazza Numa Pompilio al G.R.A.	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	9.681.076	9.681.076	0		
C	01	18/1	Villa Borghese: Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, propilei neoclassici, prospetti di piazza delle Canestre	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.000.000	2.000.000	0		
C	01	18/2	Villa Borghese: propilei egizi. Fontana del Flocco, perimetri murari e scogliere di viale F. La Guardia. Restauro degli arredi architettonici.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.165.000	2.165.000	0		
C	01	19	Villa Borghese: Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.098.161	1.098.161	0		
C	01	20	Villa Borghese: Parco dei Daini (Roma): Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	875.456	875.456	0		
C	01	21/1	Villa Doria Pamphilj (Roma): sistemaz. esterne ed allestim. del museo di Villa Vecchia , restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati - illuminaz. esterna.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	3.000.000	3.000.000	0		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C 01	21/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.355.000	2.355.000	0
C 01	22/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Giovio.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.694.480	1.694.480	0
C 01	22/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Falsetti e dell'area annessa.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.497.997	1.497.997	0
C 01	23	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.550.959	1.550.959	0
C 01	24	Villa Pamphilj (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.789.261	1.789.261	0
C 01	25	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro dell'Arco dei Quattro Venti e delle aree limitrofe	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.190.000	1.190.000	0
C 01	26/A	Riqualificazione Teatro Marcello-Piazza di Monte Savello, via Catalana, via del Tempio, via S. Angelo in Pescheria, via Tribuna Campitelli	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	9.000.000	9.000.000	0
C 01	28	Potenziamento meccanizzazione servizio giardini	Comune di Roma - Dip. X	2.412.000	2.412.000	0
C 01	29	Lavori per l'impianto del verde nel Parco S. Maria della Piet	Comune di Roma - Dip. X	1.970.000	1.970.000	0
C 01	30	Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relativi a percorsi ATAC e sedi stradali adiacenti	Comune di Roma - Dip. XII	5.000.000	5.000.000	0
C2	Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilit e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, itinerari giubilari e catacombe)					
C 02	A	Area delle Basiliche di San Pietro in Vaticano S. Giovanni, S. M. Maggiore e S. Croce in Gerusalemme. Realizzaz. impianti semaforici ed installaz. pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilit e di segnaletica pedonale	STA	2.625.700	2.625.700	
C 02	01/1/1	"BOR":progetto di riqualificazione ambientale di borgo s.spirito.	Comune di Roma	5.347.538	5.347.538	0
C 02	01/1/2	"RIS":progetto riqualificazione ambientale piazza Risorgimento.	Comune di Roma	9.425.458	9.425.458	0
C 02	01/1/3	"CON":progetto di riqualificazione ambientale:via della Conciliazione	Comune di Roma	4.583.604	4.583.604	0
C 02	01/2	Area della Basilica di San Pietro in Vaticano. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	1.869.560	1.869.560	0
C 02	01/4	Area della Basilica di S.Pietro in Vaticano	AMA	907.430	907.430	0
C 02	01/5	Area della Basilica di San Pietro in Vaticano. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza	Ministero dell'Interno	2.805.000	2.805.000	0
C 02	01/6	Area della Basilica di San Pietro in Vaticano. Stazione S. Pietro: allestimenti per strutture di servizio ai pellegrini e realizzazione del percorso pedonale protetto lungo Ponte Gelsomino	Roma 2000	1.446.500	1.446.500	0
C 02	01/7	Infrastrutture area stazione di S.Pietro II^lotto	Roma 2000	9.240.000	9.240.000	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C	02	02/1	Demolizione dei dismessi depositi ATAC di via Carlo Felice	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	1.786.438	1.786.438	0		
C	02	02/2.1	Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali	Comune di Roma	400.000	400.000	0		
C	02	02/2.2	"GIO":progetto di riqualificazione ambientale piazza San Giovanni	Comune di Roma	9.932.494	9.932.494			
C	02	02/2.3	"MER":progetto di riqualificazione ambientale via Merulana	Comune di Roma	4.843.262	4.843.262			
C	02	02/2.4	"MAR":progetto di riqualificazione ambientale piazza santa Maria Maggiore	Comune di Roma	5.213.681	5.213.681			
C	02	02/2.5	"CRO":progetto di riqualificazione ambientale piazza santa Croce in Gerusalemme	Comune di Roma	1.909.836	1.909.836			
C	02	02/2.6	"QUA":progetto di riqualificazione ambientale via Santi Quattro Coronati	Comune di Roma	1.410.753	1.410.753			
C	02	02/3	Recupero funzionale e valorizzazione edifici storici ospedale san Giovanni	Azienda Ospedaliera Compl.esso Ospedaliero S.Giovanni Addolorata	14.129.000	14.129.000	0		
C	02	02/5	Area delle Basiliche:san Giovanni,Santa Maria Maggiore,Santa Croce in Gerusalemme: disinfestazione	AMA	1.456.866	1.456.866	0		
C	02	02/6	Area delle Basiliche di S. Giovanni, S. M. Maggiore e S. Croce in Gerusalemme. Installaz. impianti tecnologici TVCC e di rilevaz.; realizzaz. ed allestim. di strutture temporanee per la sicurezza	Ministero dell'Interno	2.385.350	2.385.350	0		
C	02	02/7	Area delle Basiliche:san Giovanni,Santa Maria Maggiore,Santa Croce in Gerusalemme: interventi illuminazione	ACEA	3.864.003	3.864.003	0		
C	02	03/1/1	"PAO":progetto di riqualificazione ambientale piazza San Paolo	Comune di Roma	8.934.648	8.934.648	0		
C	02	03/1/2	"LUN":progetto di riqualificazione ambientale lungotevere San Paolo	Comune di Roma	1.482.518	1.482.518	0		
C	02	03/1/3	"OST":progetto di riqualificazione ambientale via Ostiense	Comune di Roma	820.827	820.827	0		
C	02	03/2	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	1.943.700	1.943.700	0		
C	02	03/4	Area basilica San Paolo: disinfestazione	AMA	386.538	386.538	0		
C	02	03/5	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza	Ministero dell'Interno	1.491.600	1.491.600	0		
C	02	03/6	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Restauro e consolidamento della Basilica di S. Paolo fuori le mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S. Paolo	P. Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo	1.256.320	1.256.320	0		
C	02	04/1	Itinerari giubilari e storici: manutenzione sedi stradali	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000	0		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C	02	04/2	Contributo interventi manutenzione sedi stradali	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000	0		
C	02	05	Contributo interventi manutenzione sedi stradali	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	5.000.000	5.000.000	0		
C	02	06	Ponti pedonali temporanei nella citt di Roma	Comune di Roma - Dip. VI - Uff. Citt Storica	7.400.000	7.400.000	0		
C	02	08	Interventi speciali di illuminazione cittadina	ACEA	3.000.000	3.000.000	0		
C	02	09	"ATT"fornitura e posa in opera attrezzature temporanee basiliche san Pietro, San Giovanni e San Paolo	Comune di Roma	7.264.911	7.264.911	0		
C3 arredo urbano, manutenzione delle facciate degli edifici storici ed incentivi per l'adeguamento delle insegne commerciali									
C	03	01	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riqualificazione delle sedi stradali	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.400.000	2.400.000	0		
C	03	02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	405.668	405.668	0		
C	03	03	Via delle Mura te	Comune di Roma - Dip. VI - Uff. Citt Storica	2.353.909	2.353.909	0		
C	03	04	Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	3.257.956	3.257.956	0		
C	03	06	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (primo stralcio)	Comune di Roma - Dip. IX	112.500.000	112.500.000	0		
C	03	07	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (secondo stralcio)	Comune di Roma - Dip. IX	27.500.000	27.500.000	0		
C	03	08	Contributi ristrutturazione bagni locali pubblici e insegne esercizi commerciali	Comune di Roma - Dip. VIII	5.000.000	5.000.000	0		
C	03	09	Incentivi per riqualificazione strutture commerciali	Regione Lazio	2.000.000	2.000.000	0		
C4 Area di Castel Gandolfo. Adeguamento delle infrastrutture									
C	04	A	Terminal bus	Comune di CastelGandolfo	1.300.000	1.300.000	0		
C	04	B	Centro servizi di prima necessit	Comune di CastelGandolfo	1.500.000	1.500.000	0		
C	04	C	Sottopasso pedonale di via Maremmana	Comune di CastelGandolfo	300.000	300.000	0		
C	04	D	Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico	Comune di CastelGandolfo	550.000	550.000	0		
C	04	E	Sistemazion e della viabilit urbana	Comune di CastelGandolfo	3.500.000	3.500.000	0		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C 04	F	Sistemazione della passeggiata sul lungolago	Comune di CastelGandolfo	2.500.000	2.500.000	0	
C 04	H	Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	1.400.000	1.400.000	0	
C5 Giardini di Castel Sant'Angelo. Interventi di manutenzione							
C 05	01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma - Dip. X	3.300.000	3.300.000	0	
C 05	01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma - Dip. X	1.700.000	1.700.000	0	
C6 Giardini San Giovanni/via Carlo Felice. Interventi di manutenzione							
C 06	01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma - Dip. X	3.500.000	3.500.000	0	
C7 Parco Casilino-Labicano. Interventi di sistemazione e verde							
C 07	01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma - Dip. X	2.000.000	2.000.000	0	
C8 Restauro del Parco di Villa Borghese							
C 08	01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma - Dip. X	1.720.817	1.720.817	0	
C 08	01/2	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago	Comune di Roma - Dip. X	3.000.000	3.000.000	0	
C 08	01/3	Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via pinciana,Giardini del lago, cancelli d'ingresso,Parco dei Daini.	Comune di Roma - Dip. X	1.405.367	1.405.367	0	
C 08	01/4	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione	Comune di Roma - Dip. X	2.929.750	1.929.750	1.000.000	
C 08	01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma - Dip. X	1.000.000	1.000.000	0	
C9 Riqualificazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica)							
C 09	01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti	Comune di Roma - Dip. X	3.281.442	3.281.442	0	
C 09	02/1	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica). Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma - Dip. X	3.548.053	3.548.053	0	
C 09	02/2	Riqualificaz. parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica). Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S.Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca	Comune di Roma - Dip. X	5.500.000	5.500.000	0	
C10 Restauro del Parco di Villa Ada Savoia							
C 10	01	Restauro del parco Villa Ada - Savoia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo	Comune di Roma - Dip. X	2.568.975	2.568.975	0	
C11 Recupero dell'area di San gregorio al Celio							
C 11	01/1	Area archeologica del Celio. via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.000.000	1.000.000	0	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C 11	01/2	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	3.500.000	3.500.000	0	
C 11	02	Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.866.273	2.866.273	0	
C 11	03	Area archeologica del Celio. Sezione polizia turistica e banda nella ex palestra dei vigili.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.281.088	1.281.088	0	
C 11	04	Area archeologica del Celio. Restauro del Casale quattrocentesco dell'Abate Commendatario	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	616.460	616.460	0	
C 11	05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio colle dei Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	Comune di Roma - Dip. X	4.000.000	4.000.000	0	
C 11	06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione)	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.500.000	2.500.000	0	
C 11	07	Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico.	Comune di Roma	301.710	301.710	0	
C 11	08	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi). Cappella di Santa Barbara (prospetto). Biblioteca di Papa Agapito (portale)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	396.510	396.510	0	
C 11	09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	250.000	250.000	0	
C 11	10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	272.377	272.377	0	
C 11	11	Torre medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, paramenti murari)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	274.766	274.766	0	
C 11	12	Archi del Clivo di Scauro	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	747.072	747.072	0	
C 11	13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.353.310	1.353.310	0	
C 11	14	Fronti laterizie sul Clivo di Scauro	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	628.337	628.337	0	
C 11	15	Biblioteca di Papa Agapito ed insulae romane adiacenti	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.044.466	1.044.466	0	
C 11	16	Arco di Silano e Dolabella e sopraslante Acquedotto Celimontano	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	448.352	448.352	0	
C 11	17	Basilica SS. Giovenni e Paolo	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	216.500	216.500	0	
C 11	18	Chiesa di S. Maria in Domenica	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	190.000	190.000	0	
C 11	19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	53.300	53.300	0	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C 11 20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	630.700	630.700	0	
C 11 21	Attivit di formazione	Provincia di Roma	191.500	191.500	0	
C 11 22	Riscaldamento S. Gregorio e Cappella Salvati	ITALGAS	170.000	170.000	0	
C 11 23	Musealizzazione e finalizzazione all'accoglienza di visitatori alla casa romana sotto i SS Giovanni e Paolo al Celio	BB. CC. AA. - (7)	600.000	600.000	0	
C12 Restauro del Parco di Villa Doria Pamphilj						
C 12 01	Villa Doria Pamphilj (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma - Dip. X	4.600.000	4.600.000	0	
C 12 02	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma - Dip. X	3.000.000	3.000.000	0	
C 12 03	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini	Comune di Roma - Dip. X	699.384	699.384	0	
C 12 04/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro.	Comune di Roma - Dip. X	1.000.000	1.000.000	0	
C 12 04/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini dei Cedrati, di Villa Vecchia, delle Serre	Comune di Roma - Dip. X	698.934	698.934	0	
C13 Sistemazione ambientale e paesistica delle pendici di Monte Mario e Casale Mellini						
C 13 01/1	Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei casali Mellini.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.317.533	2.317.533	0	
C 13 01/2	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma - Dip. X	4.300.000	4.300.000	0	
C14 Bonifica delle pendici del Gianicolo						
C 14 01	Pendici del Gianicolo (Roma) Riqualificazione delle aree a verde	Comune di Roma - Dip. X	2.999.278	2.999.278	0	
C15 Manutenzione straordinaria e restauro del Parco di Colle Oppio						
C 15 01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	Comune di Roma - Dip. X	1.000.000	1.000.000	0	
C 15 02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Esedre Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.440.668	1.440.668	0	
C18 Riqualificazione ambientale nella provincia di Roma						
C 18 01	Piano straordinario di prevenzione e sicurezza	Comune di Nemi	1.000.000	1.000.000	0	
C 18 02	Santuario della Mentorella (Pisoniano-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riqualificazione ambientale dei territori viciniori	Provincia di Roma	2.800.000	2.800.000	0	
C 18 03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	6.000.000	6.000.000	0	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C 18 04	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione	Provincia di Roma	1.200.000	1.200.000	0	
C19 Opere di risanamento igienico sanitario del bacino del tevere e piano di raccolta differenziata dei rifiuti nei luoghi di visita dell'area metropolitana						
C 19 01/a2	Sistemazione idraulica del fosso dell'acqua Mariana	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	8.000.000	8.000.000	0	
C 19 01/b1	Risanamento Fosso Patatona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	10.000.000	10.000.000	0	
C 19 01/b2	Risanamento Fosso Patatona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	4.000.000	4.000.000	0	
C 19 01/b3	Risanamento Fosso Patatona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	16.000.791	16.000.791	0	
C 19 01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene	Regione Lazio	9.000.000	9.000.000	0	
C 19 02	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita	Provincia di Roma	8.000.000	8.000.000	0	
C20 Orto Botanico						
C 20 01	Orto Botanico	Universit La Sapienza	600.000	600.000	0	

D ACCESIBILITA' E MOBILITA' NELL'AREA METROPOLITANA

D 05 Adeguamento del materiale rotabile in dotazione e acquisto di nuovi tram, treni, autobus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale						
D 05 01/1	Fornitura di 240 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.	ATAC	105.744.100	105.744.100	0	
D 05 01/2	Fornitura di autobus urbani di media capacit	ATAC	19.807.338	19.807.338	0	
D 05 01/3	Fornitura di 18 vetture tranviarie di grande capacit .	ATAC	78.870.016	78.870.016	0	
D 05 01/4	Fornitura di 130 autobus extraurbani di tipo lungo da 12 mt.	COTRAL	60.695.411	60.695.411	0	
D 05 01/5	Fornitura di 30 autobus extraurbani di media capacit	COTRAL	13.472.353	13.472.353	0	
D 05 01/6	Fornitura equipaggiamento "Chopper" per motrici linea metro "A"	COTRAL	7.891.000	7.891.000	0	
D 05 01/7	Fornitura di 5 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo	COTRAL	36.190.000	36.190.000	0	
D 05 01/8	Fornitura materiale rotabile ferrovia Roma-Pantano	COTRAL	12.200.000	12.200.000	0	
D 05 02	Fornitura di autobus da 18 metri	ATAC	44.000.000	44.000.000	0	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

D7 Realizzazione del sottopasso Castel Sant'Angelo									
D	07	02	Sottovia Lungotevere in Sassia	Provveditorato OO. PP. del Lazio	33.309.568	33.309.568	0		
D8 Riqualificazione dell'area del Gianicolo									
D	08	01	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta (Realizzazione galleria scatolare di m. 10,50 di larghezza e m. 6,30 di altezza - lunghezza totale m. 850 - lunghezza in sotterraneo m. 676).	Provveditorato OO. PP. del Lazio	56.050.000	56.050.000	0		
D	08	02	Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	80.000.000	40.000.000	40.000.000		
D	08	03	Interconnessioni tra il parcheggio del Gianicolo e la viabilit esterna	Provveditorato OO. PP. del Lazio	15.380.000	15.380.000	0		
D9 Infrastrutture dell'area della Stazione Tiburtina									
D	09	01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	92.491.695	92.491.695	0		
D10 Terza Corsia dell'Autostrada Roma-Fiumicino									
D	10	01/a	Autostrada Roma/Fiumicino. Realizzazione terza corsia (lotto 2°)	ANAS	69.867.135	65.773.624	4.093.511		
D	10	01/b	Autostrada Roma/Fiumicino. Realizzazione terza corsia (lotto 3°)	ANAS	15.748.076	15.571.357	176.719		
D11 Adeguamento del Grande Raccordo Anulare nel tratto Pisana-Aurelia									
D	11	01	GRA tratto Pisana-Aurelia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)	ANAS	45.950.000	45.950.000	0		
D13 Miglioramento viabilit di collegamento tra le diverse aree submetropolitane di visita e di accoglienza (Castelli Romani, Litorale e nodi ferroviari) .									
D	13	01	Parcheggio a raso e viabilit di accesso alla stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000	0		
D	13	02	Parcheggio a raso per nodo di scambio (Colleferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio del traffico locale sulla linea FM6 Roma - Cassino	Provincia di Roma	1.171.017	1.171.017	0		
D	13	03	Parcheggio di scambio (Zagarolo/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	Provincia di Roma	1.061.574	1.061.574	0		
D	13	04	Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma)	Comune di Genazzano	2.030.000	1.380.000	650.000		
D	13	05	Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Guidonia - Tiburtina	Provincia di Roma	397.391	397.391	0		
D	13	06	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Civitavecchia	Provincia di Roma	1.200.000	1.200.000	0		
D	13	07	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli	Provincia di Roma	880.000	880.000	0		
D	13	08	S.P. Marino due Santi (Marino/Roma) Allargamento dal Km 0+000 al Km 3+900 dalla S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi	Provincia di Roma	4.000.000	4.000.000	0		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

D 13	09	S.P. Pedemontana dei Castelli (Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Marino/Roma) Manut. straord. Km 0+0-10+5, da SS Casilina a SS via dei Laghi (colleg. Tivoli-Palestrina e Castelli Romani)	Provincia di Roma	1.978.635	1.978.635	0			
D 13	10	SP Casa Romana (Zagarolo, S.Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	3.000.000	3.000.000	0			
D 13	11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A25	Provincia di Roma	3.672.391	3.672.391	0			
D 13	12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)	Provincia di Roma	6.200.000	6.200.000	0			
D14	Miglioramento della viabilit provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza ("strade radiali")								
D 14	01	SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 9+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	3.228.124	3.228.124	0			
D 14	02	SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	1.743.772	1.743.772	0			
D 14	03	S.P. Laurentina dal GRA fino al KM 19,500	Provincia di Roma	15.000.000	15.000.000	0			
D 14	04	S.P. Tiberina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 (Prima Porta) al km 18+000 (svincolo autostradale)	Provincia di Roma	2.908.320	2.908.320	0			
D 14	05	SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento	Provincia di Roma	2.850.000	2.850.000	0			
D 14	06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	6.210.000	6.210.000	0			
D 14	07	SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento con l'area aeroportuale (Roma, Pomezia)	Provincia di Roma	2.335.092	2.335.092	0			
D 14	08	Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	11.205.000	11.205.000	0			
D 14	09	Interventi di manutenzione ed adeguamento della rete viaria provinciale interessata da itinerari turistico-religiosi (primo e secondo stralcio)	Provincia di Frosinone	17.500.000	17.500.000	0			
D 14	10	Miglioramento della viabilit provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza (primo e secondo stralcio)	Provincia di Latina	17.500.000	17.500.000	0			
D 14	11	Sistemazione viabilit provinciale connessa con gli itinerari spirituali e religiosi (primo e secondo stralcio)	Provincia di Rieti	17.500.000	17.500.000	0			
D 14	12	Interventi per la manutenzione e riqualificazione delle rete stradale provinciale (primo e secondo stralcio)	Provincia di Viterbo	17.500.000	17.500.000	0			
D15	Passante ferroviario dei laghi Bracciano-Castelli ed elettrificazione fino a Viterbo								
D 15	01/1	Raddoppio ed elettrificazione del tratto La Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo	Ferrovie dello Stato	170.379.000	170.379.000	0			
D 15	01/2	Potenziamento della linea Ciampino-Velletri con realizzazione della nuova fermata S. Gennaro e nuovi posti di incrocio di Pavona e Lanuvio	Ferrovie dello Stato	13.341.000	13.341.000	0			

D16 Riqualificazione e prolungamento del terminal turistico del porto di Civitavecchia

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

D 16 01	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (I° lotto)	Autorit portuale del porto di Civitavecchia	71.217.371	71.217.371	0	
D 16 02	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (II° lotto)	Ente Porto Civitavecchia	11.000.000	11.000.000	0	
D18 Riqualificazione e potenziamento delle linee A e B della metropolitana e delle ferrovie concesse (stazioni e infrastrutture di servizio)						
D 18 01/1	Potenziamento nodo Termini	Comune di Roma - Dip. VII	9.640.000	9.640.000	0	
D 18 01/2a	Linea metropolitana. Adeguamento metro A. 1° stralcio	Comune di Roma - Dip. VII	25.363.382	25.363.382	0	
D 18 01/2b	Linea metropolitana. Adeguamento metro A. 2° stralcio	Comune di Roma - Dip. VII	55.037.266	55.037.266	0	
D 18 02/1a	Ferrovie concesse. Potenziamento linea Roma - Lido	Comune di Roma - Dip. VII	6.381.331	6.381.331	0	
D 18 02/1b	Ferrovie concesse. Potenziamento linea Roma - Lido. Manutenzione	COTRAL	2.000.000	2.000.000	0	
D 18 02/2	Ferrovie concesse: potenziamento Roma Nord	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000	0	
D 18 03	Sicurezza stazione Termini	Grandi Stazioni S.p.A.	10.000.000	10.000.000	0	
D 18 04	Ala Mazzoni - stazione Termini	Grandi Stazioni S.p.A.	20.000.000	20.000.000	0	
D19 Aree di parcheggio attrezzate nei principali nodi di scambio per la sosta degli autobus turistici e delle autovetture						
D 19 02	Interventi relativi a nodi di scambio e stazioni ferroviarie. Stazione Aurelia	Ferrovie dello Stato	10.000.000	10.000.000	0	
D 19 03	Parcheggi di scambio con strutture mobili	STA	5.000.000	5.000.000	0	
D 19 04	Stralcio funzionale. Nodo di scambio Valle Aurelia con intersezione tra Via Anastasio II e Via Angelo Emo. Circoscrizione XVII-XVIII	Comune di Roma - Dip. XII	4.099.250	4.099.250	0	
D20 Controllo e gestione del traffico						
D 20 01	Aggiornamento delle rete semaforica, segnaletica e uso di tecnologie per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roma)	STA	20.650.000	20.650.000	0	
D 20 02	Rifacimento e manutenzione segnaletica	STA	17.000.000	17.000.000	0	
D 20 03	Iniziative per una mobilit sostenibile a Roma	Ministero dell'Ambiente	3.500.000	3.500.000	0	
D21 Riorganizzazione nodo di scambio largo Torre Argentina						
D 21 01	Riorganizzazione nodo di scambio largo Torre Argentina	Comune di Roma - Dip. VII	9.424.700	9.424.700	0	
D22 Area per Grandi Eventi - Tor Vergata						

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

D	22	01/1	Coordinamento delle progettazioni	Provveditorato Opere Pubbliche Lazio	950.000	950.000	0
D	22	01/2	Organizzazione manifestazioni	Agenzia Romana Prep. Giubileo	1.174.000	1.174.000	
D	22	01/3	Progettazione interventi ricadenti area Tor Vergata	Universit Tor Vergata	876.000	876.000	

E SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE

E1 Contributo al sistema di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti delle aree di maggior afflusso di visitatori nel territorio urbano e metropolitano

E	01	01	Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale (Roma). Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti	AMA	5.304.689	3.304.689	2.000.000
E	01	02	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Cassonetti movimentabili con automezzi Side Loader	AMA	12.095.040	5.795.040	6.300.000
E	01	03	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti	AMA	10.257.968	8.857.968	1.400.000
E	01	04	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Minicompattatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani	AMA	1.959.900	1.459.900	500.000
E	01	05	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile.	AMA	700.000	600.000	100.000
E	01	06	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Spazzatrici.	AMA	1.308.000	908.000	400.000
E	01	07	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.	AMA	600.000	500.000	100.000
E	01	08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali.	AMA	3.346.920	2.646.920	700.000
E	01	09/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Adeguamento locali della sede di zona via dei Cappellari.	AMA	375.000	0	375.000
E	01	09/2	Fornitura di N. 1800 cestini stradali	AMA	2.600.000	2.500.000	100.000
E	01	11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza	AMA	3.601.000	2.500.000	1.101.000
E	01	12	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri.	AMA	5.008.566	3.952.566	1.056.000
E	01	13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via Giolitti.	AMA	539.521	403.521	136.000
E	01	14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Populonia.	AMA	3.213.000	2.000.000	1.213.000
E	01	15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino.	AMA	2.500.000	2.000.000	500.000

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

E 01	16	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini.	AMA	6.252.839	5.672.839	580.000			
E 01	17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Bellani.	AMA	6.585.000	4.000.000	2.585.000			
E 01	18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.	AMA	4.872.789	2.988.789	1.884.000			
E 01	19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Saxa Rubra. (I° lotto funzionale).	AMA	1.087.000	150.000	937.000			
E 01	20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli.	AMA	3.000.000	670.000	2.330.000			
E 01	22/1	Ristrutturazione opere civili nell'Area Intermedia Attrezzata (A.I.A.) Via Sannio.	AMA	3.402.734	2.547.734	855.000			
E 01	22/2	Fornitura attrezzature: Compattatori su semirimorchi e motrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sannio	AMA	1.073.501	1.073.501	0			
E 01	24	Sedi di zona ed aree intermedie attrezzate. (via di Torrevecchia)	AMA	7.038.000	3.000.000	4.038.000			
E 01	25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino.	AMA	8.740.000	7.600.000	1.140.000			
E 01	26/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoboario.	AMA	1.179.462	989.462	190.000			
E 01	26/2	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoboario.	AMA	536.750	536.750	0			
E 01	27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.	AMA	3.100.000	3.100.000	0			
E 01	27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.	AMA	5.300.000	5.300.000	0			
E 01	27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento.	AMA	1.600.000	1.600.000	0			
E 01	28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	10.710.000	2.000.000	8.710.000			
E 01	29	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	9.520.000	7.000.000	2.520.000			
E 01	30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.	AMA	7.585.460	7.585.460	0			
E 01	31	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti.	AMA	1.400.000	1.400.000	0			
E2	Contributo al potenziamento servizi pubblici di emergenza: servizio 118, mezzi di soccorso, presidi soccorso ospedaliero, rete ambulatoriale I° livello								
E 02	01	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	USL RM E	37.531.000	22.531.000	15.000.000			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

E 02	02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Azienda S. Giovanni Addolorata	10.000.000	10.000.000	0		
E 02	03	Ospedale Sant'Eugenio (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	30.000.000	30.000.000	0		
E 02	04	Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM D	5.067.347	5.067.347	0		
E 02	05	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Universit Cattolica del Sacro Cuore	12.184.478	12.184.478	0		
E 02	06	Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalit protetta	Universit Cattolica del Sacro Cuore	6.031.191	6.031.191	0		
E 02	07	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	10.000.000	10.000.000	0		
E 02	08/1	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento delfunit di terapia intensiva (forniture)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.632.572	1.632.572	0		
E 02	08/2	"Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento delfunit di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.366.980	1.366.980	0		
E 02	09	Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	USL RM H	1.000.000	1.000.000	0		
E 02	10	Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM G	1.000.000	1.000.000	0		
E 02	11	Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM F	1.066.442	1.066.442	0		
E 02	12	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo	Regione Lazio	4.500.000	4.500.000	0		
E 02	13	Rete di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani	I.R.C.C.S. Lazzaro Spallanzani	8.219.647	8.219.647	0		
E 02	14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	7.140.000	7.140.000	0		
E 02	15	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	Az. Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	10.500.000	10.500.000	0		
E 02	16/a	Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica	Regione Lazio	4.700.000	4.700.000	0		
E 02	16/b	Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale	Protettorato S. Giuseppe	1.800.000	1.800.000	0		
E 02	17	Ristrutturazione P. M. P. Via Saredo Roma	USL RM B	5.000.000	5.000.000	0		
E 02	18	Ospedale "Fatebene Fratelli" Isola tiberina - Roma. Ampliamento della rianimazione	Casa Generalizia "Fatebene Fratelli"	2.615.000	2.615.000	0		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

E 02	19	Programma di potenziamento dell'ospedale S. Carlo di Nancy (primo stralcio)	Istituto Demopatico dell'Immacolata	3.000.000	3.000.000	0		
E 02	20	Campus bio-medico	Libero Ist. Univ. "Campus bio-medico" di Roma	8.225.887	8.225.887	0		
E 02	21	Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) di II livello per area pediatrica	I.R.C.C.S. - Osped. Pediatrico "Bambino Ges "	2.470.000	2.470.000	0		
E 02	22	Fornitura natanti di soccorso al servizio dell'aeroporto di Fiumicino (1° stralcio)	Comando Generale della Capitaneria di Porto	3.000.000	3.000.000	0		
E 02	23	Acquisto mezzi soccorso capitaneria di porto Fiumicino	Comando Generale della Capitaneria di Porto	3.300.000	3.300.000	0		
E3 Modernizzazione della vigilanza urbana (logistica e tecnologica)								
E 03	01	Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani	STA	5.000.000	5.000.000	0		
E 03	02/1	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in Viale Trastevere N. 18, Roma (ex Ufficio Contravvenzioni)	Comune di Roma - Dip. XII	2.500.000	2.500.000	0		
E 03	02/2	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in Via Ferruccio N. 9, Roma sede Comando Vigili Urbani I gruppo	Comune di Roma - Dip. XII	1.000.000	1.000.000	0		
E 03	02/3	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in Via Palmiro Togliatti N. 987, Roma sede del VII gruppo Vigili Urbani	Comune di Roma - Dip. XII	2.000.000	2.000.000	0		
E 03	02/4	Lavori di manut. straord., restauro ed adeguam. impianti di porzione del fabbricato "ex Istituto Luce", p.za Cinecittà 11, Roma, per sede di Scuola del personale di Polizia Municipale	Comune di Roma - Dip. XII	4.000.000	4.000.000	0		
E 03	02/5	Lavori di rifacimento delle coperture dell'edificio sito in Via della Consolazione N. 4, Roma sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale	Comune di Roma - Dip. XII	500.000	500.000	0		
E 03	03	Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma)	Comune di Roma - Dip. XII	3.805.237	3.805.237	0		
E 03	04/1	Acquisto apparecchiature elettroniche per attività esterne	Comune di Roma - VV.UU.	1.700.000	1.700.000	0		
E 03	04/2	Acquisto apparecchiature elettroniche per scuola di polizia	Comune di Roma - VV.UU.	300.000	300.000	0		
E4 Piano di valorizzazione delle risorse umane								
E 04	01	Piano di valorizzaz. risorse umane coinvolte nella preparaz. dell'Anno 2000 (Lazio). Formaz. e aggiornam. professionale addetti Pubblica Amministraz. Impiego operatori in servizio civile.	Regione Lazio	16.952.000	16.952.000	0		
E 04	02	Piano di valorizzaz. risorse umane coinvolte nella preparaz. dell'Anno 2000 (Lazio). Formaz. e aggiornam. professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo.	Regione Lazio	1.100.000	1.100.000	0		
E 04	03	Piano di valorizzaz. risorse umane coinvolte nella preparaz. dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali.	Regione Lazio	9.040.000	5.200.000	3.840.000		
E 04	04	Piano di valorizz. risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autoapprendimento; riqualificazione centri di formazione professionale; progetti interregionali; pilotaggio programma.	Regione Lazio	3.958.000	3.148.000	810.000		
E5 Sicurezza pubblica e protezione civile								

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

E	05	01/1		Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Acquisto rete LAN e materiale hardware	Ministero dell'Interno	1.300.000	1.300.000	0		
E	05	01/2		Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Integrazione software	Ministero dell'Interno	3.700.000	3.700.000	0		
E	6	2A		sistemi ed impianti di telecomunicazioni: sedi operative VV.FF.	Ministero dell'Interno-Dipartimento Protezione Civile	3.980.000	3.980.000	0		
E	05	03		Progetto sicurezza grandi basiliche	Ministero dell'Interno	12.000.000	12.000.000	0		
E	05	04		Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	27.598.000	27.598.000	0		
E	05	05		Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	3.380.000	3.380.000	0		
E	05	06		Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	5.602.000	5.602.000	0		
E	05	07		Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	650.000	650.000	0		
E	05	08		Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	10.000.000	10.000.000	0		
E	05	09		Acquisto di 7 torri per illuminazione	Ministero Difesa	200.000	200.000	0		
E	05	11		Adeguamento, potenziamento e ripristino infrastrutture destinate alloggio operatori volontari e pellegrini militari italiani ed esteri	Ministero Difesa	4.800.000	4.800.000	0		
E	05	12		Potenziamento strutture logistiche Caserma "Talamo"	Ministero Difesa - Arma Carabinieri	1.995.000	1.995.000	0		
E	05	13		Potenziamento strutture logistiche Caserma "Tor di Quinto"	ministero LL.PP.	26.500.000	26.500.000	0		
E	05	14		Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Ministero dell'Interno	19.000.000	19.000.000	0		
E	05	15		Infrastrutture - Ristrutturazione Servizi Logistici caserma "Piave"	Ministero dell'Interno	697.000	697.000	0		
E	05	16		Caserma della polizia di Stato "Villa Tevere" sede del reparto scorte	Ministero dell'Interno	1.800.000	1.800.000	0		
E	05	17		Caserma della polizia di Stato "Maurizio Giglio" sede del reparto volanti	Ministero dell'Interno	2.997.000	2.997.000	0		
E	05	18		Nuovo complesso polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	Ministero dell'Interno	4.046.000	4.046.000	0		
E	05	19		Nuovo complesso polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	Ministero dell'Interno	11.000.000	11.000.000	0		

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

E 05	20	Coordinamento Centrali operative interforze	Ministero Difesa - Arma Carabinieri	1.500.000	1.500.000	0
E 05	21	Iniziative per la formazione del personale	Ministero dell'Interno - Dip. Prot. Civ. - VV.FF.	455.000	455.000	0
E 05	22	Iniziative per la formazione del personale	Ministero dell'Interno - Dip. Prot. Civ. - VV.FF.	539.000	539.000	0
E 05	23	Realizzazione nuovo galleggiante distaccamento fluviale	Ministero dell'Interno - Dip. Prot. Civ. - VV.FF.	500.000	500.000	0
E 05	24	Ampliamento e ristrutturazione sede Tuscolano II	Ministero dell'Interno - Dip. Prot. Civ. - VV.FF.	2.000.000	2.000.000	0
E 05	25	Acquisto eliambulanza	Ministero dell'Interno - Dip. Prot. Civ. - VV.FF.	11.000.000	11.000.000	0
E 05	27	Adeguamento e potenziamento della centrale telefonica del dipartimento della protezione civile	Presid. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civ.	399.000	399.000	0
E 05	28	Adeguamento e potenziamento della funzionalit della sala operativa del dipartimento della protezione civile	Presid. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civ.	697.000	697.000	0
E 05	29	Predisposizione di circa 150 moduli containerizzati pluriuso/ sociali per le aree periferiche di supporto logistico e di accoglienza	Presid. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civ.	3.983.000	3.983.000	0
E 05	30	Acquisto mezzi e attrezzature varie	Ministero dell'Interno - Dip. Prot. Civ. - VV.FF.	5.000.000	5.000.000	0
E 05	32	Caserma CC P.za Dante - Lavori di ristrutturazione (1° stralcio)	Ministero dell'Interno	1.000.000	1.000.000	0
E 05	33	Rete di radio comunicazioni della Polizia	Ministero dell'Interno	5.500.000	5.500.000	0
E6 Interventi a sostegno dell'occupazione						
E 06	01	Contributo a favore di Imprese giovanili per la promozione di occupazione connessa alle attivit giubilari	Comune di Roma - Uff. Spec. Politiche del Lavoro	5.000.000	5.000.000	0
E7 Contributo attivit straordinaria corpo Polizia Municipale						
E 07	01	Attivit del corpo di polizia municipale per assicurare funzionamento cantieri giubilari	Comune di Roma	2.700.000	2.700.000	0

F INFORMAZIONE COMUNICAZIONE PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO

F1 Centro informativo, sala stampa e iniziative per l'informazione						
F 01	01/1	Centro informativo del museo Risorgimento. Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana Prep. Giubileo	5.675.712	5.675.712	0
F 01	01/2	Centro informativo di Via della Conciliazione. Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana Prep. Giubileo	7.275.712	7.275.712	0
F 01	02	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	Agenzia Romana Prep. Giubileo	5.161.763	5.161.763	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

F	01	03	Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	Agenzia Romana Prep. Giubileo	614.000	614.000	0
F	01	04	Sistema di informazione al pubblico - nodo di Roma	Ferrovie dello Stato	3.810.000	3.810.000	0
F 4 Contributo per attivit organizzative ai sensi del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996							
F	04	01	Contributo assolvimento compiti indicati comma 4, legge 651	Agenzia Romana Prep. Giubileo	95.151.496	95.151.496	0
F	04	02	Osservatorio sul Piano del Giubileo	Uff. Progr. Roma Capitale	6.000.000	6.000.000	0
F5 Sistemi informatici e telematici per la gestione e la preparazione del Giubileo							
F	05	01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana Prep. Giubileo	8.613.240	8.613.240	0
F	05	02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilit Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana Prep. Giubileo	5.000.000	5.000.000	0
F	05	03	Sistema unitario di prenotazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana Prep. Giubileo	7.612.000	7.612.000	0
F	05	04	Sistema informativo e di comunicazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana Prep. Giubileo	17.993.440	17.993.440	0
F	05	05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana Prep. Giubileo	8.152.080	8.152.080	0
F	05	06	Funzionamento delle strutture del Commissario straordinario di Governo	Presid. Cons. Ministri - Uff. Roma Capitale	3.300.000	3.300.000	0
G MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI							
G1 Monitoraggio							
G	1	1	Monitoraggio interventi	Presid. Cons. Ministri - Uff. Roma Capitale	6.000.000	6.000.000	

L'EVOLUZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL GIUBILEO DA GIUGNO 1998 A MARZO 1999

(dati ITALCONSULT integrati con informazioni dell'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi)

PARAMETRI	TOTALE				LAVORI				BENI CULTURALI				FORNITURE			
	mar.99	dic. 98	set. 98	giu. 98	mar.99	dic. 98	set. 98	giu. 98	mar.99	dic. 98	set. 98	giu. 98	mar.99 (5)	dic. 98	set. 98	giu. 98
Numero interventi																
totali	754(1)	754(1)	720 (1)	720 (2)	438	438	435	447	209	209	205	205	107(1)	90	71	63
non appaltati o senza inform.	120	226	224	304	78	148	181	257	1	7	0	1	41	57	43	45
appaltati	587	528(2)	487	411	328	290	254	190	205	202	205	204	52	33	28	18
in realizzazione	463	432(3)	359	307	301	262	161	102	132	148	192	201	28	21	6	4
completati	100	76	19	7	19	17	4	3	78	54	9	1	12	5	6	3
Indicatori procedurali																
Avanzam. Medio (%)	70%	62%	55%	40%	66%	58%	52%	42%	83%	75%	65%	41%	52%	45%	41%	35%
Ritardo affidamento (gg)	104	100	94	57	113	109	100	75	71	74	74	18	141	136	129	124
Margine finale (gg)	124(4)	50	61	80	96	58	78	93	198	44	44	83	76	19	14	-27
Indicatori di costo																
Finanziamento L.651 (mld)	3471	3471	3265	3380	2054	2054	2083	2350	324	324	306	325	1098	785	591	565
Costo totale (mld)	3652	3652	3407	3550	2174	2174	2163	2432	371	371	354	379	1104	799	606	595
Economie (mld)	338	303	118	110	290	247	86	102	43	52	50	28	5	4	-18	-20
% economie	14%	8,3%	3,5%	3,1%	14%	11,4%	4,0%	4,2%	12%	14,0%	14,1%	7,4%	0,50%	0,5%	-3,0%	-3,4%
Valutazione di criticit																
Alta criticit	68	85	99	98	48	66	66	83	3	4	20	25	17	15	11	14
Media criticit	147	147	167	219	106	90	109	126	21	35	37	41	20	22	21	26
Bassa criticit	479	377	317	276	259	230	165	127	180	129	138	138	40	18	13	10
Valutazione di rischio																
Alto rischio	75	52	37	73	62	45	36	70	2	0	0	0	11	7	1	3
Medio rischio	248	238	250	214	175	178	156	126	41	30	68	66	32	30	26	22
Basso rischio	288	322	308	313	163	155	155	149	91	138	127	138	34	29	26	26
Rischio nullo	103	58	23	8	21	13	8	5	70	36	9	0	12	9	6	3
Importo Alto rischio (mld)	1157	978	882	933	873	912	877	917	8	0	0	0	277	66	5	16
Importo Medio rischio (mld)	1131	1092	1118	1114	764	781	648	700	144	67	178	124	224	244	292	290
Importo Basso rischio (mld)	648	804	696	647	330	369	364	226	107	271	172	254	211	164	160	167
Importo rischio Nullo (mld)	288	190	133	110	48	18	12	11	48	15	3	0	191	157	118	99

(1) - compresi 17 incentivi (2) - compresi 3 incentivi (3) compreso 1 incentivo e 10 interventi di cui non si hanno informazioni
(4) non raffrontabile:criterio di calcolo modificato (5)include gli incentivi

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI AL GIUBILEO NEL LAZIO (LEGGE 651/96)

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER SETTORE

SETTORE	*NUMERO*		*FINANZIAMENTI ACCORDATI*		*COSTO INTERVENTI*		*QUOTA % DI COFINANZ.*	*INTER. IN FASE DI REALIZZAZIONE*		*INTERVENTI COMPLETATI*	
		%	milioni	*%*	milioni	*%*		*numero*	*%*	*numero*	*%*
A - SOCIALE ED ACCOGLIENZA	85	11,3	300.432	8,7	323.469	8,9	7,1	64	75,29	0	0,00
B - BENI CULTURALI	352	46,7	557.320	16,1	607.971	16,6	8,3	240	68,18	78	22,16
C - MANUTENZIONE E ARREDO URBANO	136	18,0	571.217	16,5	572.217	15,7	0,2	70	51,47	7	5,15
D - ACCESSIBILITA' E MOBILITA'	63	8,4	1.372.361	39,5	1.417.281	38,8	3,2	41	65,08	7	11,11
E - SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE	104	13,8	489.717	14,1	551.117	15,1	11,1	41	39,42	6	5,77
F- INFORMAZIONE, PREPARAZIONE EVENTO	14	1,9	180.359	5,2	180.359	4,9	0,0	7	50,00	2	.14,29
TOTALE	754	100,0	3.471.407	100,0	3.652.415	100,0	5,0	463	61,41	100	13,26

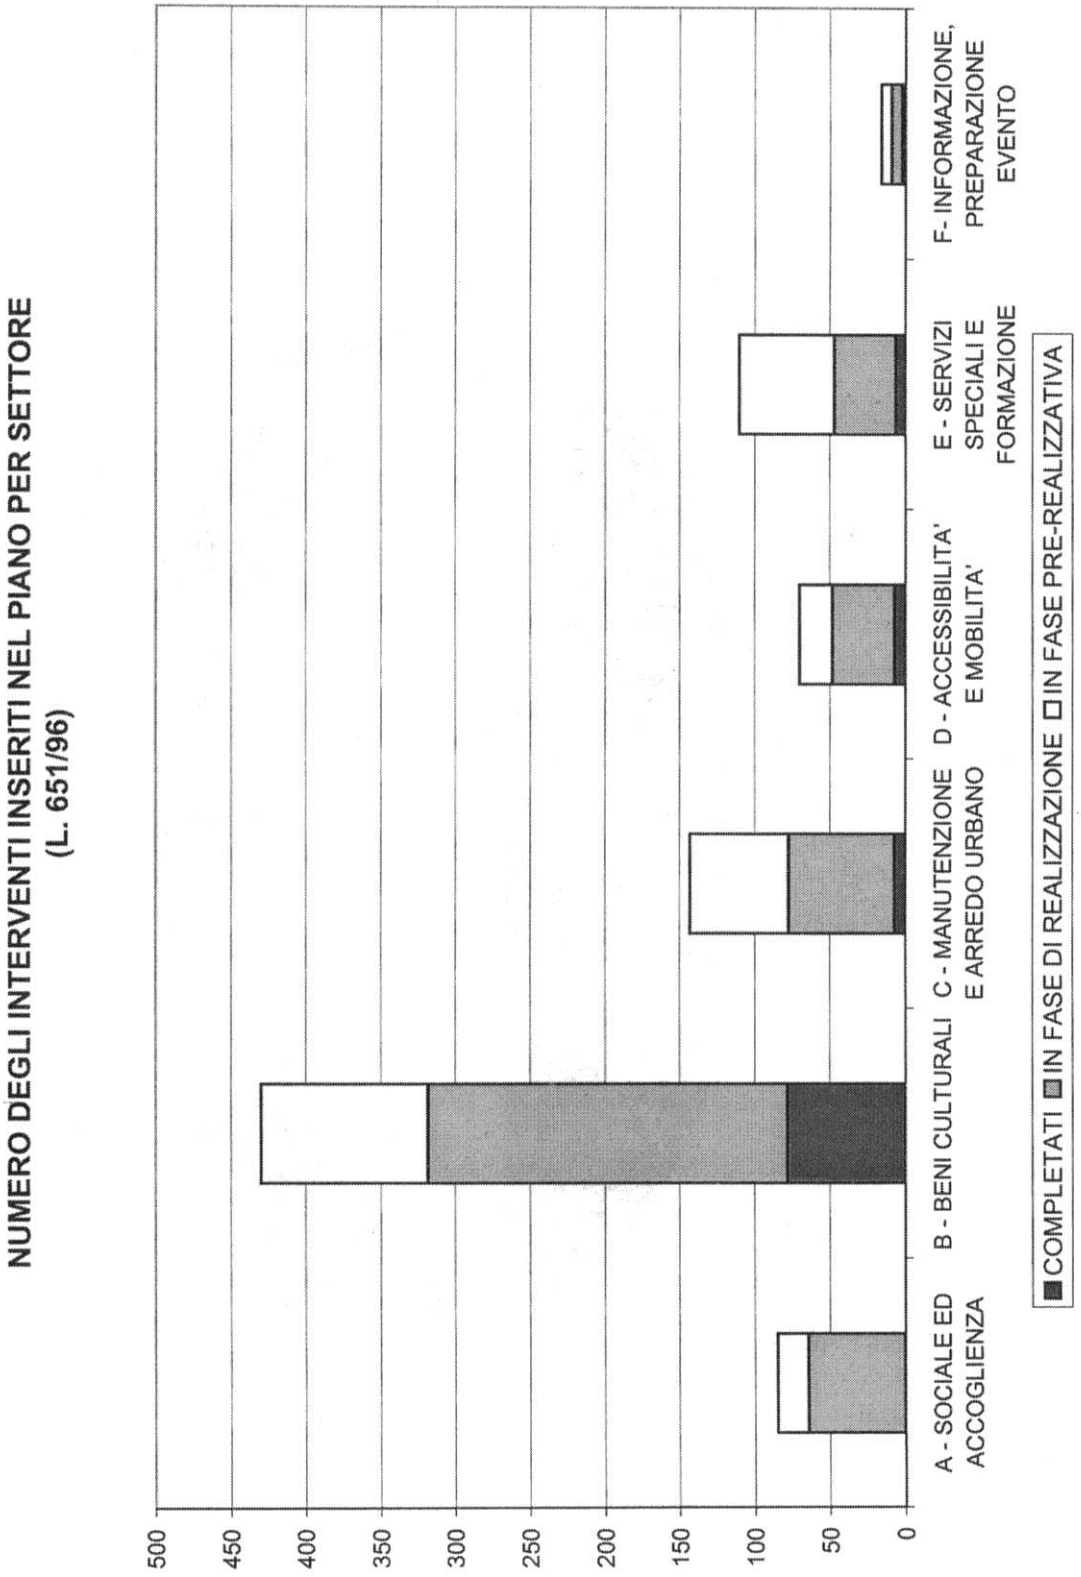
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SETTORE
(L. 651/96)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
A - SOCIALE ED ACCOGLIENZA
B - BENI CULTURALI
C - MANUTENZIONE E ARREDO URBANO
D - ACCESSIBILITA' E MOBILITA'
E - SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE
F- INFORMAZIONE, PREPARAZIONE EVENTO
COMPLETATI
IN FASE DI REALIZZAZIONE
IN FASE PRE-REALIZZATIVA

PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER SETTORE
(L.651/96)

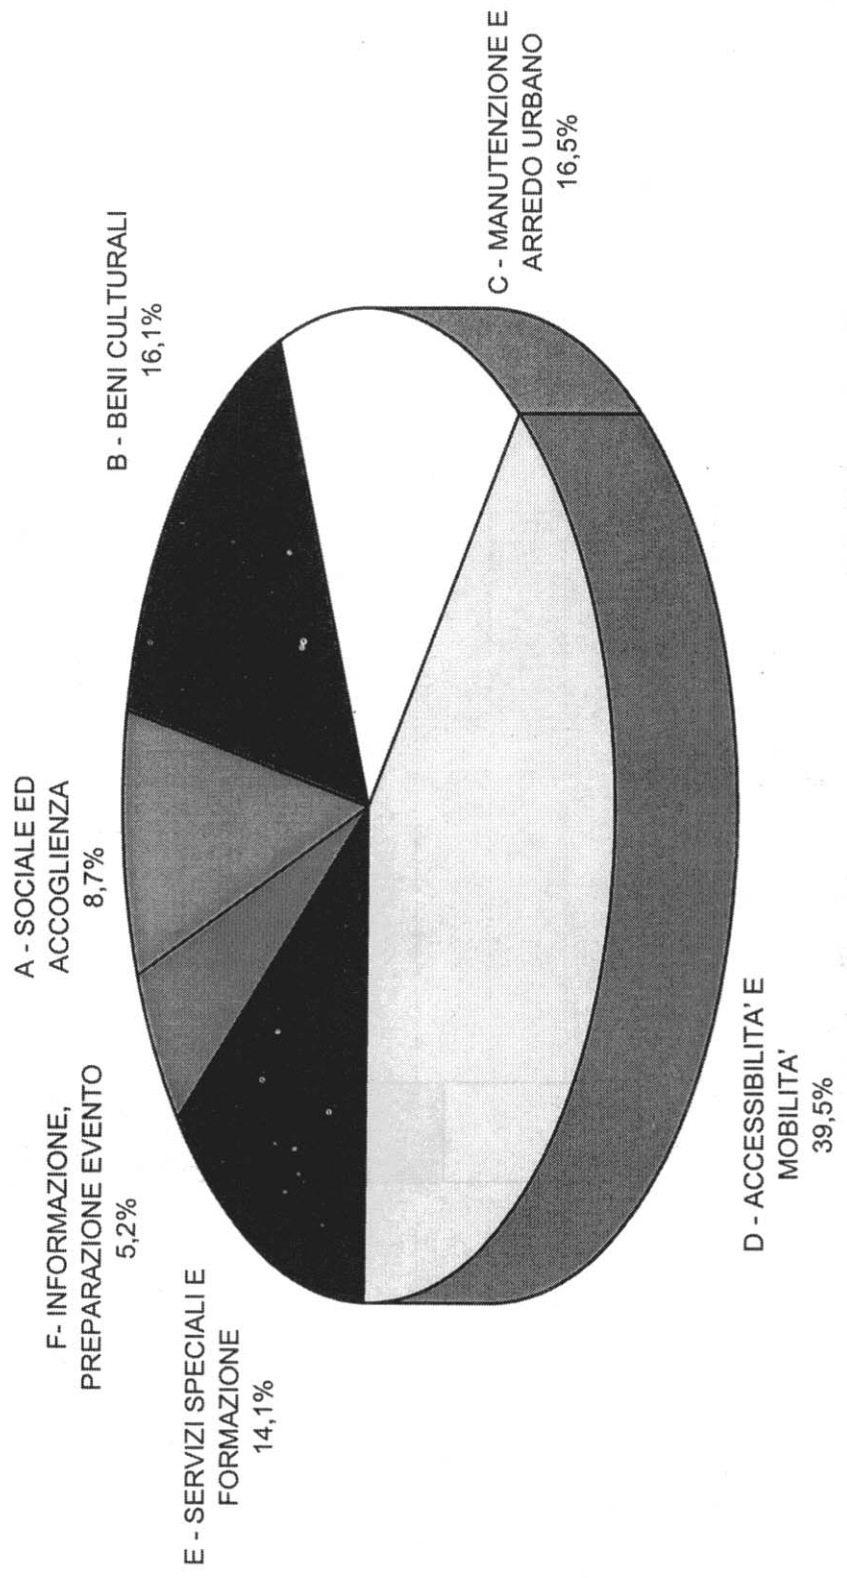

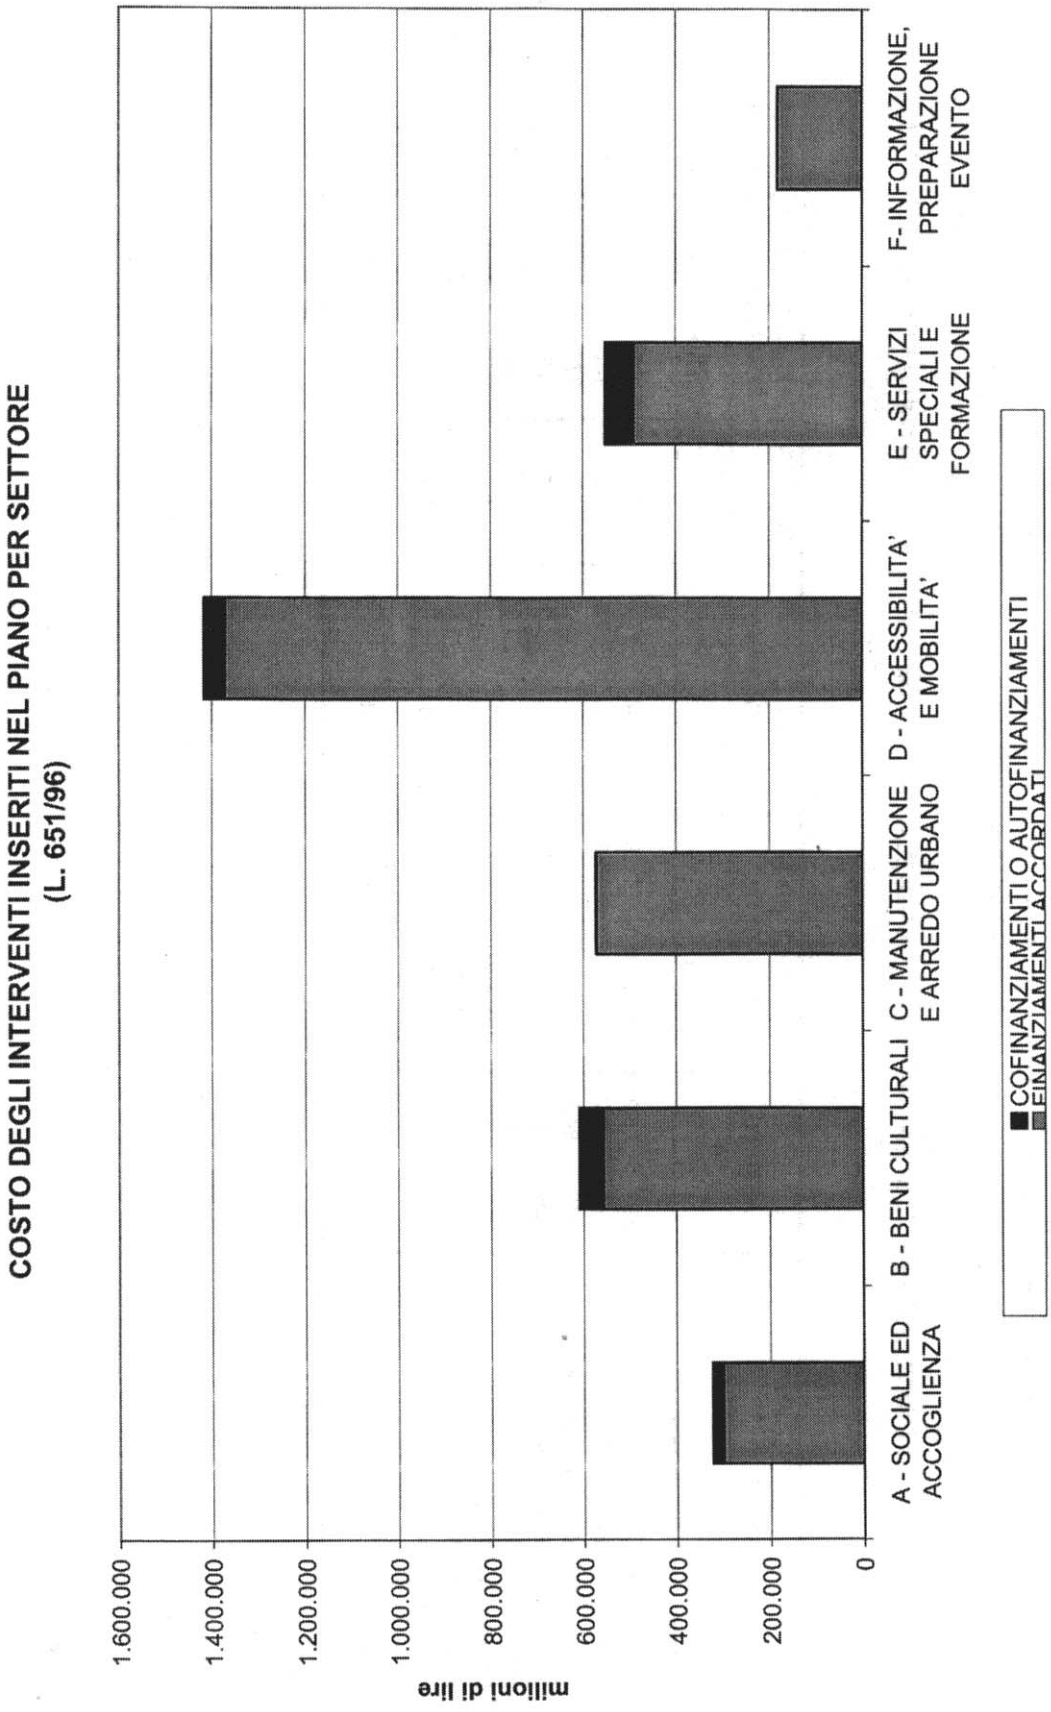
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SETTORE
(L. 651/96)
milioni di lire
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
A - SOCIALE ED ACCOGLIENZA
B - BENI CULTURALI
C - MANUTENZIONE E ARREDO URBANO
D - ACCESSIBILITA' E MOBILITA'
E - SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE
F- INFORMAZIONE, PREPARAZIONE EVENTO
COFINANZIAMENTI O AUTOFINANZIAMENTI
FINANZIAMENTI ACCORDATI

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI AL GIUBILEO NEL LAZIO
(LEGGE 651/96)

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER LOCALIZZAZIONE

Localizzazione	*NUMERO*		*FINANZIAMENTI ACCORDATI*		*COSTO INTERVENTI*		*QUOTA % DI COFINANZ.*	*INTER. IN FASE DI REALIZZAZIONE*		*INTERVENTI COMPLETATI*	
		%	milioni	%	milioni	%		*numero*	%	*numero*	%
Comune di Roma	499	66,2	2.578.005	74,3	2.732.934	74,8	5,7	271	54,31	78	15,63
altri comuni in prov. Roma	141	18,7	540.258	15,6	548.786	15,0	1,6	106	75,18	16	11,35
Totale Provincia di Roma	640	84,9	3.118.262	89,8	3.281.720	89,9	5,0	377	58,91	0	0,00
Provincia di Frosinone	29	3,8	40.503	1,2	42.930	1,2	5,7	25	86,21	3	10,34
Provincia di Latina	32	4,2	36.434	1,0	41.649	1,1	12,5	24	75,00	1	3,13
Provincia di Rieti	20	2,7	41.336	1,2	45.239	1,2	8,6	19	95,00	0	0,00
Provincia di Viterbo	17	2,3	33.698	1,0	35.054	1,0	3,9	14	82,35	2	11,76
senza riferimenti territoriali	16	2,1	201.173	5,8	205.823	5,6	2,3	4	25,00	0	0,00
TOTALE	754	100,0	3.471.407	100,0	3.652.415	100,0	5,0	463	61,41	100	13,26

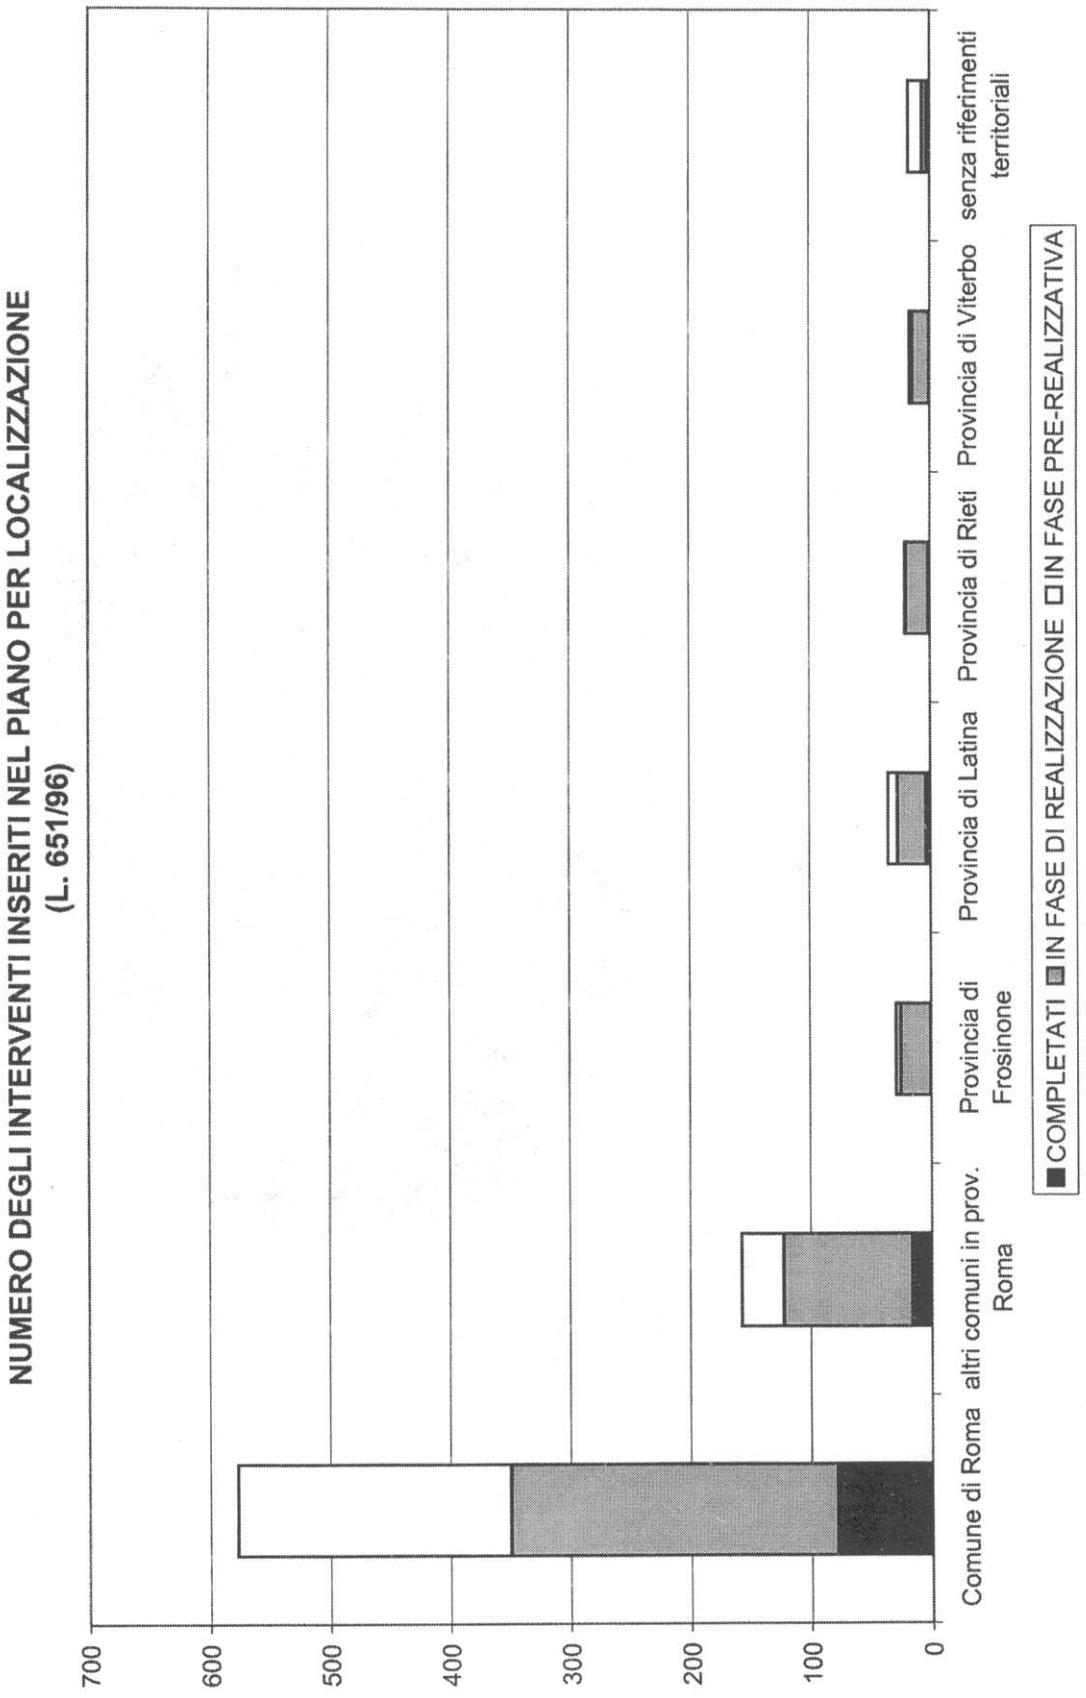
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER LOCALIZZAZIONE
(L. 651/96)
700
600
500
400
300
200
100
0
Comune di Roma
altri comuni in prov. Roma
Provincia di Frosinone
Provincia di Latina
Provincia di Rieti
Provincia di Viterbo
senza riferimenti territoriali
COMPLETATI
IN FASE DI REALIZZAZIONE
IN FASE PRE-REALIZZATIVA

PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER LOCALIZZAZIONE (L.651/96)

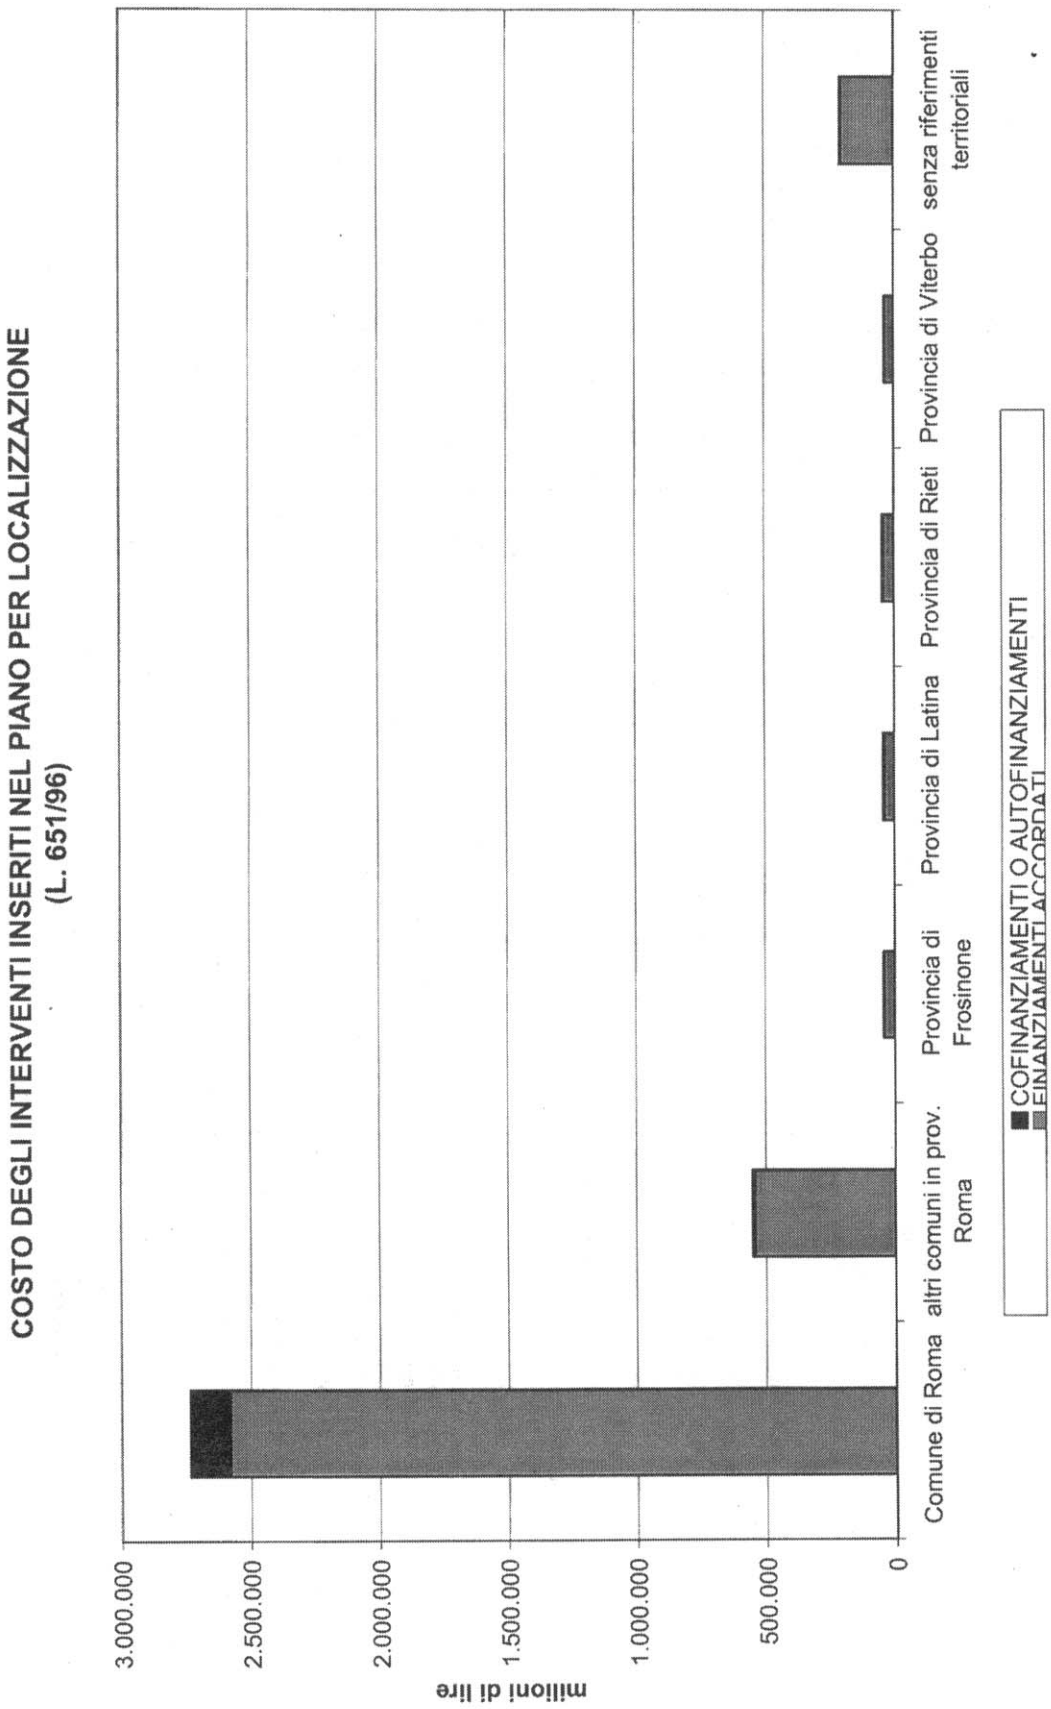
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER LOCALIZZAZIONE
(L. 651/96)
milioni di lire
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Comune di Roma
altri comuni in prov. Roma
Provincia di Frosinone
Provincia di Latina
Provincia di Rieti
Provincia di Viterbo
senza riferimenti territoriali
COFINANZIAMENTI O AUTOFINANZIAMENTI
FINANZIAMENTI ACCORDATI

(LEGGE 651/96)

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER SOGGETTO BENEFICIARIO

Soggetto beneficiario	NUMERO		FINANZIAMENTI ACCORDATI		COSTO INTERVENTI		QUOTA % DI COFINANZ.	INTER. IN FASE DI REALIZZAZIONE		INTERVENTI COMPLETATI	
		%	milioni	%	milioni	%		numero	%	numero	%
AMMINISTRAZIONI CENTRALI											
Min. BB. CC. AA.	206	27,3	317.320	9,1	364.320	10,0	12,9	133	64,56	69	33,50
Min. Interni	25	3,3	130.426	3,8	130.426	3,6	0,0	10	40,00	0	0,00
Min. LL. PP.	5	0,7	132.200	3,8	132.200	3,6	0,0	4	80,00	0	0,00
altri Ministeri	13	1,7	37.546	1,1	37.546	1,0	0,0	5	38,46	0	0,00
ANAS	3	0,4	127.295	3,7	131.565	3,6	3,2	3	100,00	0	0,00
FS	5	0,7	290.022	8,4	290.022	7,9	0,0	4	80,00	0	0,00
Totale Amm. Centrali	257	34,1	1.034.808	29,8	1.086.079	29,7	4,7	159	61,87	69	26,85
AMM. REGIONALE E PROVINCIALE											
Regione Lazio	16	2,1	214.194	6,2	218.844	6,0	2,1	6	37,50	0	0,00
Provincia di Roma	35	4,6	97.971	2,8	100.149	2,7	2,2	27	77,14	2	5,71
Provincia di Frosinone	3	0,4	19.537	0,6	19.912	0,5	1,9	3	100,00	0	0,00
Provincia di Latina	5	0,7	22.132	0,6	25.132	0,7	11,9	5	100,00	0	0,00
Provincia di Rieti	1	0,1	17.500	0,5	17.500	0,5	0,0	1	100,00	0	0,00
Provincia di Viterbo	2	0,3	18.566	0,5	19.177	0,5	3,2	1	50,00	0	0,00
Totale Amm. Regionale e Provinc.	62	8,2	389.900	11,2	400.714	11,0	2,7	43	69,35	2	3,23
AMM. COMUNALI											
Roma	139	18,4	697.285	20,1	698.285	19,1	0,1	76	54,68	4	2,88
altri Comuni in Prov di Roma	66	8,8	93.788	2,7	100.138	2,7	6,3	50	75,76	6	9,09
Comuni in Prov. di Frosinone	18	2,4	17.262	0,5	18.814	0,5	8,2	15	83,33	3	16,67
Comuni in Prov. di Latina	26	3,4	13.340	0,4	15.121	0,4	11,8	18	69,23	1	3,85
Comuni in Prov. di Rieti	19	2,5	23.836	0,7	27.739	0,8	14,1	18	94,74	0	0,00
Comuni in Prov. di Viterbo	10	1,3	6.394	0,2	6.644	0,2	3,8	8	80,00	2	20,00
Totale Amm. Comunali	278	36,9	851.906	24,5	866.741	23,7	1,7	185	66,55	16	5,76
ALTRI SOGGETTI											
Istituzioni sanitarie	29	3,8	184.115	5,3	199.115	5,5	7,5	19	65,52	2	6,90
Agenzia Romana Giubileo	14	1,9	174.423	5,0	174.423	4,8	0,0	6	42,86	2	14,29
AMA	36	4,8	97.394	2,8	139.144	3,8	30,0	11	30,56	4	11,11
STA	5	0,7	50.276	1,4	50.276	1,4	0,0	1	20,00	0	0,00
ACEA	4	0,5	10.677	0,3	10.677	0,3	0,0	3	75,00	0	0,00
ATAC-COTRAL	12	1,6	394.865	11,4	394.865	10,8	0,0	4	33,33	4	33,33
Istituzioni culturali	7	0,9	47.161	1,4	47.161	1,3	0,0	1	14,29	0	0,00
Enti religiosi	36	4,8	95.809	2,8	142.551	3,9	32,8	22	61,11	1	2,78
altri beneficiari	14	1,9	140.074	4,0	140.670	3,9	0,4	9	64,29	0	0,00
Totale altri soggetti	157	20,8	1.194.793	34,4	1.298.881	35,6	8,0	76	48,41	13	8,28
TOTALE	754	100,0	3.471.407	100,0	3.652.415	100,0	5,0	463	61,41	100	13,26

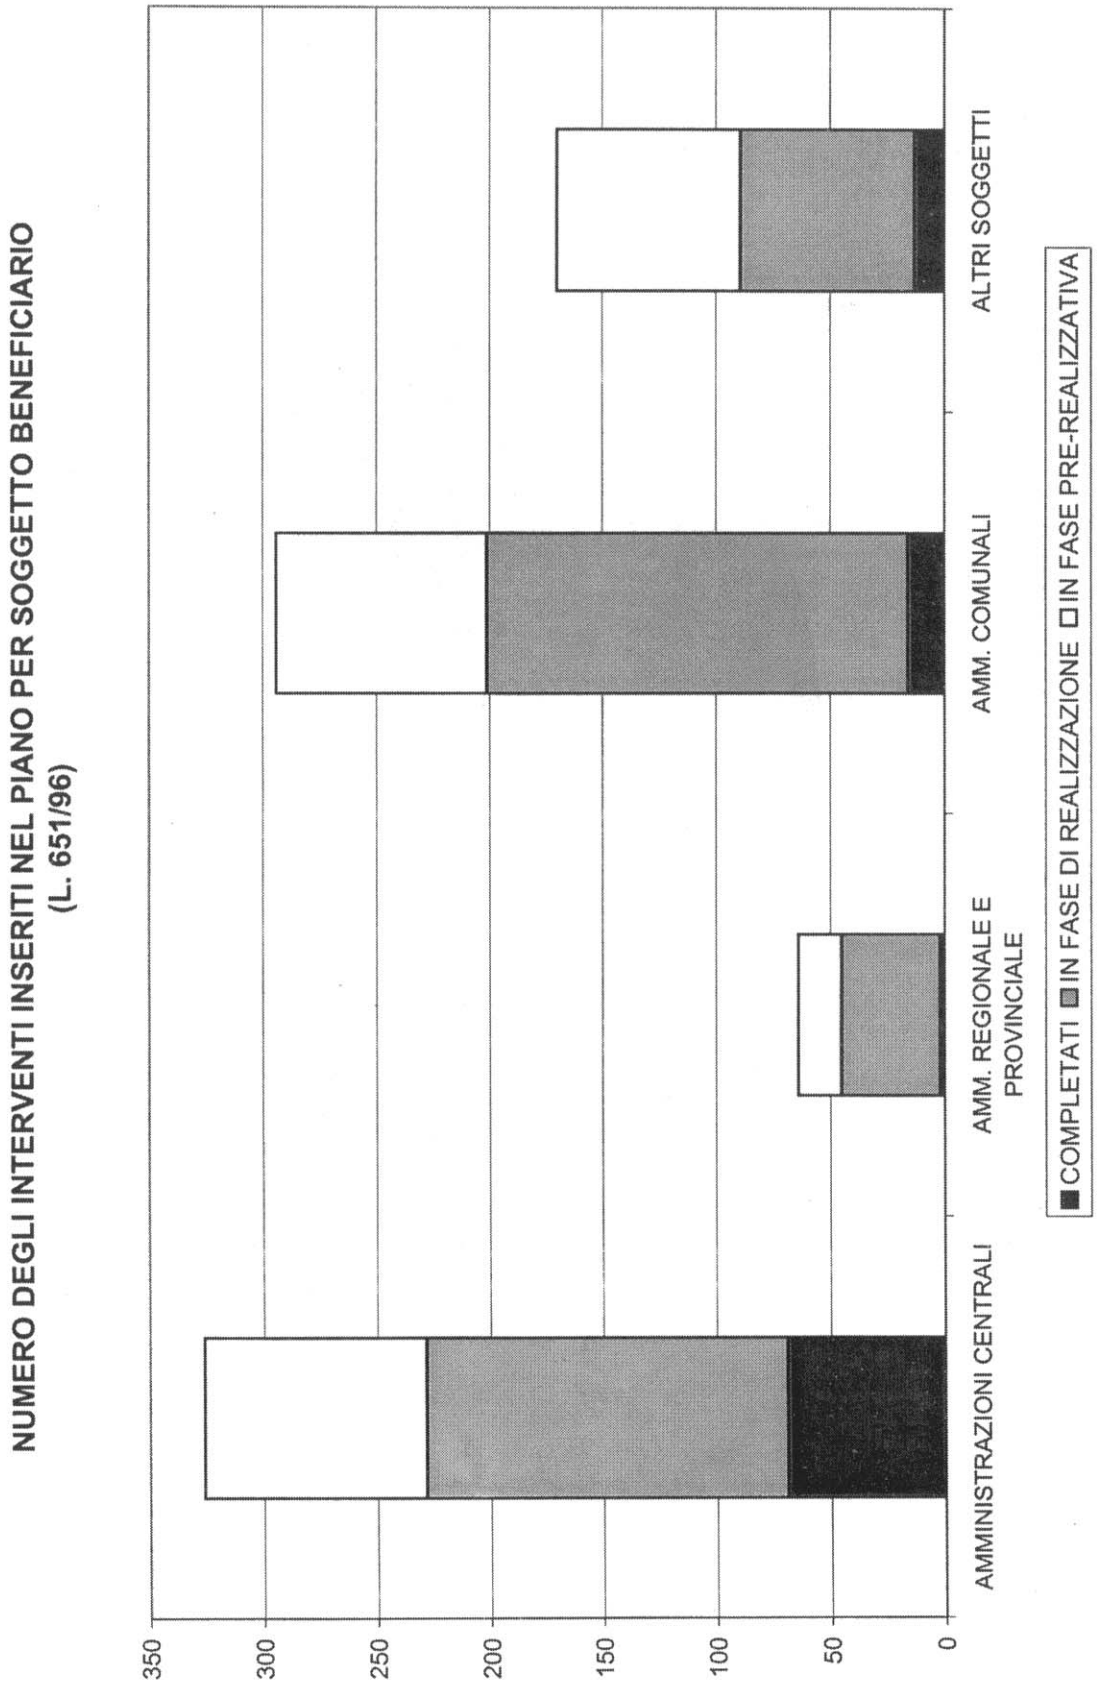
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SOGGETTO BENEFICIARIO
(L. 651/96)
350
300
250
200
150
100
50
0
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AMM. REGIONALE E PROVINCIALE
AMM. COMUNALI
ALTRI SOGGETTI
COMPLETATI
IN FASE DI REALIZZAZIONE
IN FASE PRE-REALIZZATIVA

PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER SOGGETTO BENEFICIARIO (L.651/96)

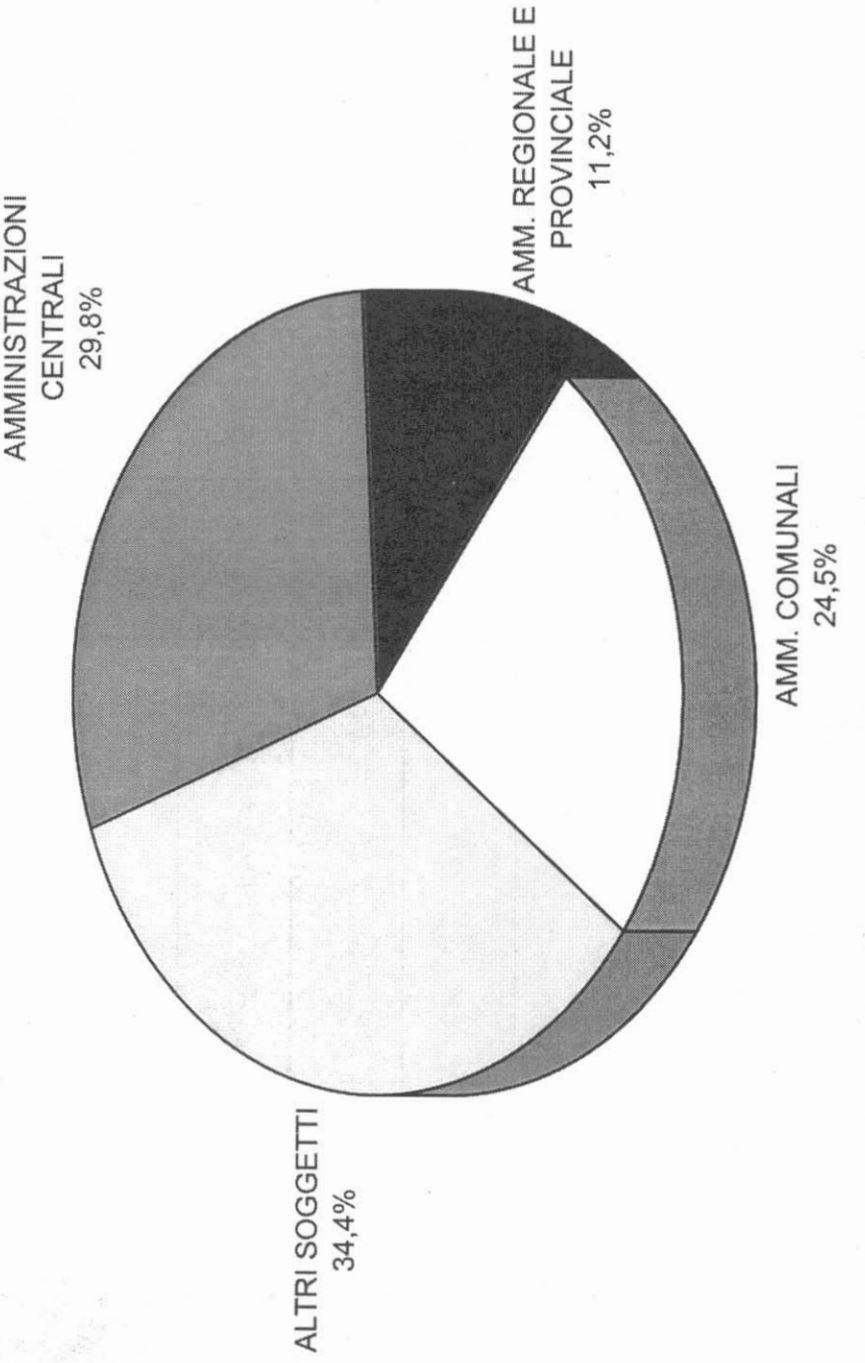

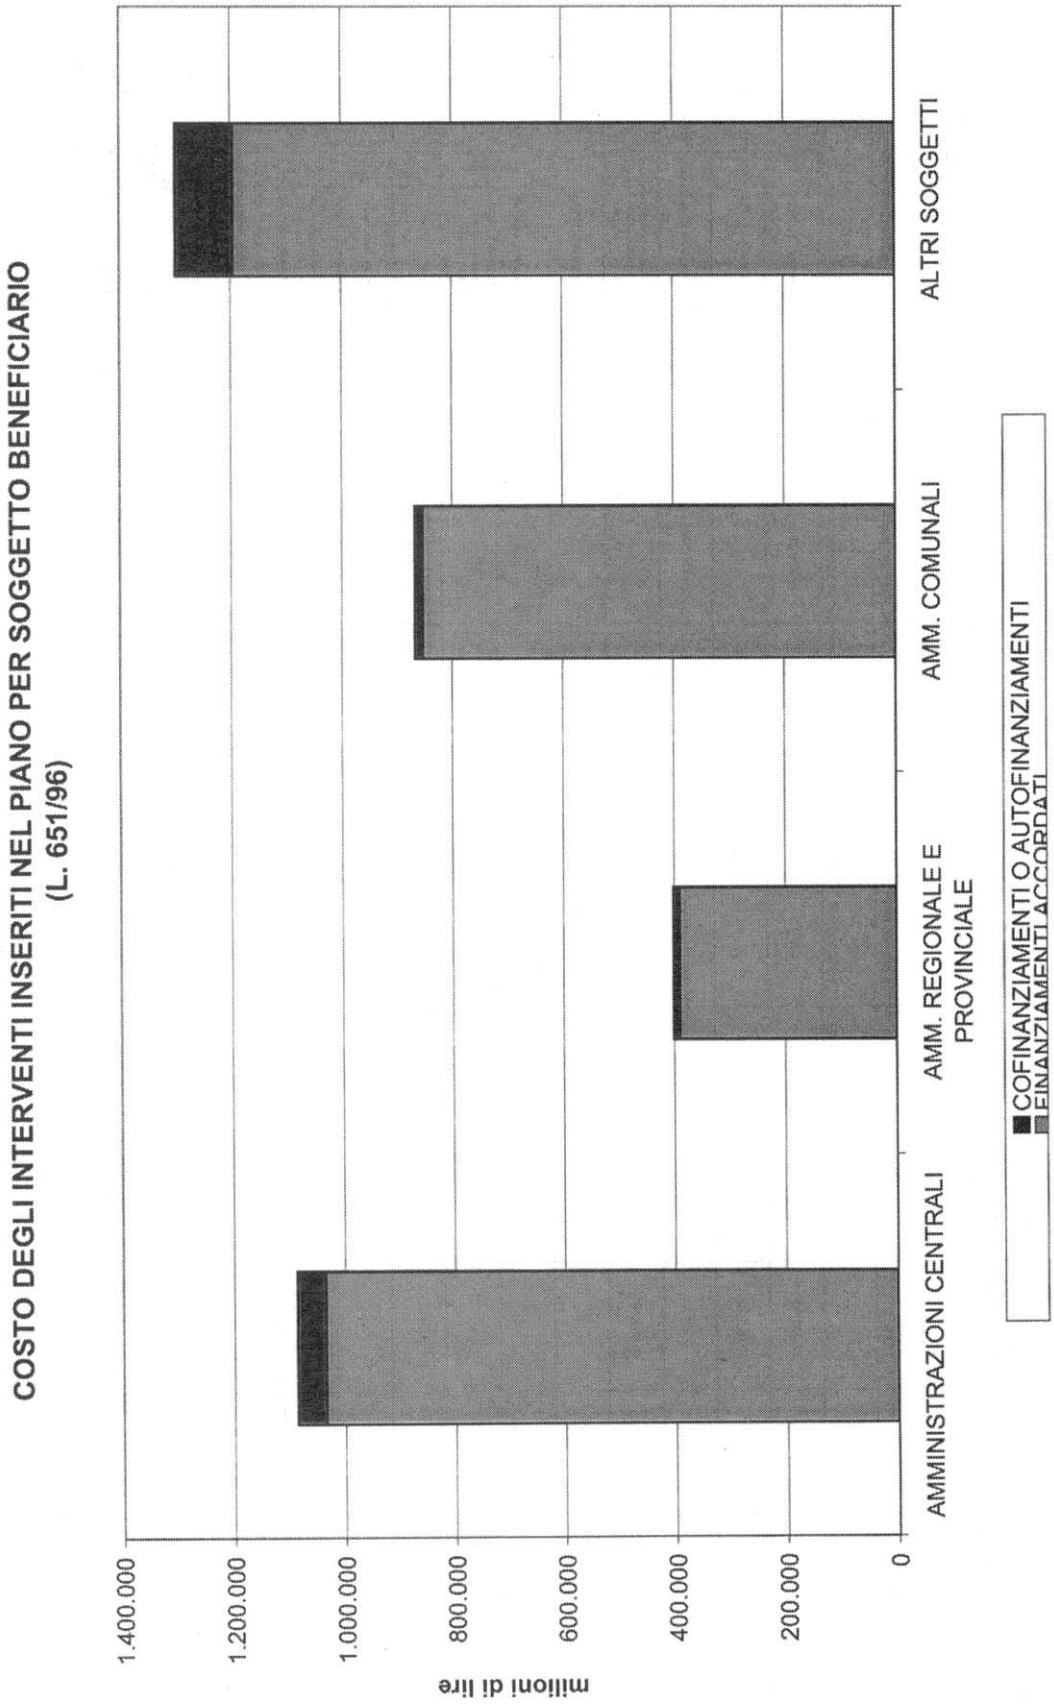
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SOGGETTO BENEFICIARIO
(L. 651/96)
milioni di lire
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AMM. REGIONALE E PROVINCIALE
AMM. COMUNALI
ALTRI SOGGETTI
COFINANZIAMENTI O AUTOFINANZIAMENTI
FINANZIAMENTI ACCORDATI

ATTUAZIONE FINANZIARIA AL 31 Marzo 1999

UFFICIO ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

Codice	A 01 11	A 01 10	A 01 09	A 01 08	A 01 07	A 01 06	A 01 05	A 01 04	A 01 03	A 01 02	A 01 01	A 1
Titolo dell'intervento	Piano di recuperabilità e ripristino per disabili (Roma), lotta alla illegalità e degrado nei servizi e chiusura non mezzi pubblici senza barriere ambientali	Centro di smaltimento rifiuti (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune di in località Passoscuro	Cen di smaltimento temporaneo per pellegrini (Roma). Ristrutturazione dell'immobile ex fattoio Modigliani	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (vicino Monte Mario)	Centro di smaltimento temporaneo per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso sui vari di proprietà comunale	Comunale alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione di un immobile a Villa Nazzo	Centro di smaltimento di orsi per pellegrini e per animali (Roma). Intervento "S. Giuseppe Diana"	Centro di smaltimento per pellegrini accolti a quello	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma) Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	Centro di smaltimento per persone tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	Centri diurni per persone senza fissa dimora (Roma).Allestimento delle strutture presso gli ospedali Santa Spirito e Spallanzani	Creazione di strutture per l'assistenza e l'accoglienza alle categorie disagiate
Soggetto Beneficiario del finanziamento	ATAC	Comune di Fiumicino	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	IPAB "S Francesco Assisi" - Roma	IPAB "S Margherita" - Roma	USL RM A	USL RM A	Comune di Roma	
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	10.995.000.000	600.000.000		50.000.000	4.355.794.364	1.500.000.000	1.900.000.000	7.000.000.000	212.000.000	212.000.000		
COSTO STIMATO	10.995.000.000	600.000.000			4.355.794.364	1.500.000.000	1.900.000.000	7.000.000.000	212.000.000	212.000.000		
PROGETTAZIONE – IMPEGNI DI SPESA		30.000.000		50.000.000		50.000.000		350.000.000	10.600.000	10.600.000		
PROGETTAZIONE – Uffici Tecnici 1% Costo stimato				10.000.000		10.000.000						
PROGETTAZIONE – Privati 5% Costo stimato		30.000.000						350.000.000	10.600.000	10.600.000		
PROGETTAZIONE – Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato				40.000.000		40.000.000						
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI – IMPEGNI DI SPESA					3.629.828.636		1.410.572.960	5.371.860.480				
ACCONTI – 20% e 50% impegno di spesa					1.814.914.320		705.286.480	1.685.930.240				
ACCONTI – 30% impegno di spesa in caso di strutture boxi e prefabbricati servizi												
ULTERIORI EROGAZIONI – 30% impegno di spesa												
ULTERIORI EROGAZIONI – fino alla concorrenza dell' 85% e 95% dell'impegno di spesa												
SALDO – 10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio												
ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI												
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)												
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – REGIONE LAZIO												
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – ALTRI BENEFICIARI per "finanziati" nel settore delle autorità cittadine												
IMPEGNI		30.000.000		50.000.000	3.629.828.636	50.000.000	1.410.572.960	5.721.860.480	10.600.000	10.600.000		
PAGAMENTI		30.000.000		50.000.000	1.814.914.320	50.000.000	705.286.480	3.035.930.240	10.600.000	10.600.000		
altro fondi				-50.000.000								

| Codice | | |

| Codice | | |

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONI ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO (Decreto di trasferimento)				
										30% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" ad attività immobiliare - Risorse residue	"Incentivi" ad attività culturali			
A 05	Demolizione e ristrutturazione Ospedale S. Maria della Pietà e dell'annesso V																			
A 05 01/1	Roma Maria della Pietà. Centro di coordinamento temporaneo pellegrini e turismo giovani (Ristrutturazione padiglioni)	USL RM E	2.000.000.000	2.000.000.000	100.000.000		100.000.000		1.465.930.939	732.965.470								1.565.930.939	832.965.470	
A 05 01/2	Roma Maria della Pietà. Centro di coordinamento temporaneo pellegrini e turismo giovani (Padiglioni)	USL RM E	1.000.000.000	1.000.000.000	50.000.000		50.000.000											50.000.000	50.000.000	
A 05 01/3	Roma Maria della Pietà. Centro di coordinamento temporaneo pellegrini e turismo giovani (Direzioni Ministeri, Padiglioni Direzione)	USL RM E	5.086.000.000	5.086.000.000	210.000.000		210.000.000		3.035.282.875	1.517.641.440								3.245.282.875	1.727.641.440	
A 05 01/4	Roma Maria della Pietà. Centro di coordinamento temporaneo pellegrini e turismo giovani (Ministeri, ex. ospedale e 3 padiglioni)	USL RM E	6.988.000.000	6.988.000.000	297.000.000		297.000.000		5.184.646.009	2.592.323.000								5.481.646.009	2.889.323.000	
A 05 01/5	Roma Maria della Pietà. Centro di coordinamento temporaneo pellegrini e turismo giovani (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)	USL RM E	9.927.000.000	9.927.000.000	410.000.000		410.000.000		7.837.419.330	3.918.709.660								8.247.419.330	4.328.709.660	
A 05 02	Roma Maria della Pietà. Centro di coordinamento temporaneo pellegrini e turismo giovani (Ristrutturazione ex edificio scolastico "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale))	Comune di Roma	6.879.166.414	6.879.166.414					6.879.166.414	3.439.583.210								6.879.166.414	3.439.583.210	
A 06 01	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglimento di pellegrini in occasione dell'Anno Santo. Investimenti integrativi dei programmi della Azienda di pubblicità.	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma	10.000.000.000	10.000.000.000												9.543.230.000		9.543.230.000	9.543.230.000	
A 06 02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (parchi e luoghi) per l'accoglimento ed il pellegrini durante	Regione Lazio	20.800.000.000	20.800.000.000																
A 07	Completamento delle reti degli autobus e metropolitana e nelle																			
A 07 01	Centro di coordinamento turistico e ricettivo (Roma). Costruzione nuovo edificio nuovo all'Istituto Tecnico Agrario O. Garibaldi	Provincia di Roma	5.231.486.400	6.975.315.293	337.500.000	67.500.000			4.893.986.400	978.797.280		1.468.195.920						5.231.486.400	2.784.493.300	1.743.828.893
A 07 02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma). Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "O. Garibaldi"	Provincia di Roma	16.900.000		16.900.000	3.380.000	13.520.000											16.900.000	16.900.000	-16.900.000
A 07 03	Campeggio (Roma). Realizzazione nell'area di proprietà provinciale attualmente l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	676.000.000	1.110.000.000	16.900.000	3.380.000	13.520.000											16.900.000	16.900.000	434.000.000

| Codice | | |

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
					IMPEGNI DI SPESA	Utilità Totale (1% Costo stimato	Privati (5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non reperiti (il 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di ripartizione)	REGIONE LAZIO	ALTRI BENEFICIARI per "Immobili" nel settore delle aree urbane			
										20% e 90% Impegno di spesa 20% e 30% Impegno di spesa in caso di Perizia base e prestazioni servili		20% Impegno di spesa Fino alla concorrenza dell' 85% e 99% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Immobili" nel settore energetico - Risorse ambientali				
A 07 27	Comune di Poggio Mirteto	Comune di Poggio Mirteto	1.200.000.000	1.600.000.000	60.000.000		60.000.000		865.152.000	432.576.000								915.152.000	493.576.000	400.000.000
A 07 26	Comune di Poggio Mirteto (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di un palazzetto di proprietà comunale in Piazza Mario Dassoni	Comune di Poggio Mirteto	729.000.000	972.000.000	36.450.000		36.450.000		577.657.602	288.828.800								614.107.602	315.278.800	243.000.000
A 07 25	Centro di aggregazione turistico (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione del complesso conventuale di S Francesco e S Fara	Comune di Fara in Sabina	4.500.000.000	6.000.000.000																1.500.000.000
A 07 24	Casa di aggregazione sociale delle giovani in edilizia storica ex) Residence Abati di Forlì - hotel albergo (Giuseppe/Forlì)	Comune di Montepoli	600.000.000	800.000.000	30.000.000		30.000.000		443.361.128	221.680.560								473.361.128	251.680.560	200.000.000
A 07 23	Centro di aggregazione (Castiglione/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Castiglione	1.650.000.000	2.200.000.000	82.500.000	16.500.000	66.000.000		1.309.000.000					1.309.000.000				2.700.500.000	1.391.500.000	550.000.000
A 07 22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per consolidam. delle pareti grid	Monastero delle Clarisse di S Rosa di Viterbo	834.077.495	1.167.077.495	50.000.000		50.000.000		784.077.495	156.815.500								834.077.495	206.815.500	333.000.000
A 07 21	Ostello della Gioventù Tuscania (Tuscania/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, adeguamento, arredi	Ambi Industria di Tuscania	338.800.000	500.000.000	16.900.000		16.900.000		317.626.977	158.813.490		111.169.440						334.526.977	286.883.930	162.000.000
A 07 20	Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) Ristrutturazione di un ex. convento e adeguamento (1° stralcio funzionale)	Comune di Vitorchiano	741.502.620	991.502.620	37.500.000		37.500.000		704.002.620	140.800.520		457.601.700						741.502.620	635.902.220	250.000.000
A 07 19	Ostello di completamento per turismo sociale (Il Martello al Chiostro/Viterbo) Restauro di un ex edificio e adeguamento	Provincia di Viterbo	1.065.901.523	1.676.901.523					1.065.901.523	533.950.760								1.065.901.523	533.950.760	611.000.000
A 07 18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex istituto San Francesco e funzione sociale	Comune di Nettuno	300.000.000	400.000.000																100.000.000
A 07 16	Ostello della Gioventù (Il Martello/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Pepoli	Comune di S. Marinella	600.000.000	962.706.000																362.706.000
A 07 15	Centro di aggregazione turistico (Anzio/Roma) Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e funzione sociale	Comune di Anzio	764.700.000	964.700.000																200.000.000
A 07 27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Ampliamento ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	1.200.000.000	1.600.000.000	60.000.000		60.000.000		865.152.000	432.576.000								915.152.000	493.576.000	400.000.000

| Codice | | |

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI							EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fasi
					IMPEGNI DI SPESA	Utilità Tecnici 1% Costo stimato	Previsti 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non reperiti al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONE AREE E DOMICILI	AMMORTIZZAZIONI DELLO STATO (Decreto del ventennio)	REGIONE LAZIO (Contributo in conto interessi)	ALTRI BENEFICIARI per "lavori" nel settore delle attività culturali			
										20% o 30% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di direttori lavori e prestazioni servizi	20% Impegno di spesa	Non alle concorrenze dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		"Investiti" nel settore pubblico - Risorse statali				
A 10 03	Eliminazione barriere architettoniche nei percorsi interni al complesso del Divino Amore	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	917.000.000	917.000.000																
A 10 02	Diversità di misura dei piani lavatori degli edifici del '700 e delle chiese del Santuario	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	234.000.000	234.000.000																
A 10 01	Pavimentazione esterna del Santuario e dei vari promontori	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	1.379.000.000	1.379.000.000																
A 09 01	Corso Sutri - Ospedale S. Spirito: opere temporanee di completezza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma) Lavori di restauro e allestimento	USL RM B	650.000.000	650.000.000																
A 9	Adeguamento di un centro di accoglienza per pellegrini nella Corsia Sistina																			
A 08 01	Incentivi per la ristrutturazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio		99.653.000.000					99.653.000.000							99.653.000.000		199.306.000.000	99.653.000.000	
A 8	Adeguamento e ristrutturazione delle strutture di accoglienza																			
A 07 46	Centro della giovanili e campeggio (Anticoli Corrado) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschetto	Comune di Anticoli		2.667.000.000	100.000.000		100.000.000											100.000.000	100.000.000	667.000.000
A 07 45	Centro della giovanili (San Donato Val Comino/Frosinone)	Comune di San Donato Val Comino	799.380.500	1.084.160.500	40.000.000		40.000.000		730.574.630	146.114.930	219.172.390		255.701.120	40.000.000				810.574.630	700.988.440	284.780.000
A 07 44	Centro di accoglienza nella canonica S. Nicola (Anticoli/Frosinone) Adeguamento della struttura	Provincia di Frosinone	926.160.740	1.301.160.740	56.250.000		56.250.000		826.274.740	165.254.950	247.882.420		389.194.160					882.524.740	758.583.530	375.000.000
A 07 43	Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS ma della Civita (Villa S Lucia/Frosinone) Ristrutturazione ed adeguamento della struttura	Comune di Villa S Lucia	336.218.865	336.218.865					236.418.865	118.209.430								236.418.865	118.209.430	100.000.000
A 07 42	Centro di accoglienza turistica, (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filosofi	Comune di Veroli	1.500.000.000	2.000.000.000	75.000.000		75.000.000		1.195.388.515	597.694.250								1.270.388.515	672.694.250	500.000.000
A 07 41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	800.000.000	1.067.000.000																267.000.000

| Codice | | |

| Codice | | |

Codice	B 08 06	B 08 05	B 08 04	B 08 03	B 08 02	B 08 01	B 8	B 05 01/2	B 05 01/1	B 5	B 04 01	B 4	B 03 09/2	B 03 09/1
Titolo dell'intervento	Terme di Diocleziano (Roma) Intervento strutture Diocleziano e area archeologica (chiostri via Cernaia, via Parigi, Ottavo), completamento restauro Museo delle Cere	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Intervento opere d'arte, riallestimento, adeguamento sagrestia grande (giardino verso piazza dei Cinquecento)	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Ottocento Arte"	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica" restauro e allestimenti	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimento del "Corpo di fabbrica della Farmacia, Via Enrico Stevenson"	Palazzo Altemps (Roma) Restauro e sistemazione sorella, allestimento e completamento del Museo omonimo	Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)	Restauro di Palazzo Braschi - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	Restauro di Palazzo Braschi Intervento preliminare	Palazzo Ruspoli (Museo di Roma). Restauro ed adeguamento funzionale	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	Palazzo delle Esposizioni. Restauro ed adeguamento funzionale	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento della mura Aureliane nel tratto largo Lanzarini - Basilica Archimede	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento della mura Aureliane nel tratto Campo Boario - largo Lanzarini
Soggetto Beneficiario del finanziamento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali		Comune di Roma	Comune di Roma		Comune di Roma		Comune di Roma	Comune di Roma
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	800.000.000	911.587.600	2.367.818.207	2.146.765.526	1.500.000.000	4.808.900.000		10.673.193.647	1.608.000.000		1.128.056.575		2.225.208.278	1.881.049.714
COSTO STIMATO		911.587.600	2.367.818.207	2.146.765.526	1.500.000.000	6.808.900.000		10.673.193.647	1.608.000.000		1.128.056.575		2.225.208.278	1.881.049.714
PROGETTAZIONE – IMPEGNI DI SPESA											98.409.600			
PROGETTAZIONE – Uffici Tecnici 1% Costo stimato														
PROGETTAZIONE – Privati 5% Costo stimato											98.409.600			
PROGETTAZIONE – Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato														
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI – IMPEGNI DI SPESA	2.100.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	2.200.000.000	1.500.000.000	5.000.000.000		8.894.328.040	1.608.000.000		1.029.646.976		1.854.340.232	1.567.541.428
ACCONTI – 20% a 50% Impegno di spesa									804.000.000				927.170.120	783.770.710
ACCONTI – 30% e 50% Impegno di spesa in caso di primitivo bando o procedimenti arrestati														
ULTERIORI EROGAZIONI – 30% Impegno di spesa														
ULTERIORI EROGAZIONI – Fino alla concorrenza dell'85% e 90% dell'Impegno di spesa														
SALDO – 10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio														
ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI														
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	2.100.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	2.200.000.000	1.500.000.000	5.000.000.000								
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – REGIONI E ENTI LOCALI "Straordinari" ed ordinari beneficiari - Risorse correnti														
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – ALTRI BENEFICIARI (per "Straordinari" ed ordinari) "Accordi" ed ordinari nella materia culturali														
IMPEGNI	2.100.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	2.200.000.000	1.500.000.000	5.000.000.000		8.894.328.040	1.608.000.000		1.128.056.576		1.854.340.232	1.567.541.428
PAGAMENTI	2.100.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	2.200.000.000	1.500.000.000	5.000.000.000		-	804.000.000		98.409.600		927.170.120	783.770.710
altre fonti	-800.000.000					2.000.000.000								

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI								EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fasi
											ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO			AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONI e ENTI locali (vedasi dopo)				
						IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	20% e 50% impegno di spesa 30% e 50% impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi	30% impegno di spesa fino alla concorrenza degli 85% e 90% dell'impegno di spesa	15% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI		"Immobili" nel senso tecnico. Rientra anche	ALTRI BENEFICIARI per "Immobili" nel senso della tecnica catastale			
B 08 07		Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimento "Stanze epigrafiche - Ede dei Capidoveri"	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.970.686.700	2.970.686.700													3.000.000.000			3.000.000.000	3.000.000.000	
B 08 08		Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Ceramica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	8.700.000.000	8.700.000.000													8.700.000.000			8.700.000.000	8.700.000.000	
B 08 09		Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Restauro dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	8.222.533.439	28.222.533.439													10.000.000.000			10.000.000.000	20.000.000.000	
B 9		Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)																					
B 09 01		Restauro del complesso di Palazzo Barberini (Roma) - primo stralcio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	5.142.888.597	15.142.888.597													6.000.000.000			6.000.000.000	10.000.000.000	
B 10		Museo Nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia e Villa Poniatowski)																					
B 10 01/a		Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	9.800.000.000	9.800.000.000													9.800.000.000			9.800.000.000	9.800.000.000	
B 10 01/b		Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	9.800.000.000	9.800.000.000													9.800.000.000			9.800.000.000	9.800.000.000	
B 10 01/c		Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Medici Fiore)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.400.000.000	3.400.000.000													3.400.000.000			3.400.000.000	3.400.000.000	
B 11		Galleria Nazionale d'Arte Moderna																					
B 11 01		Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Ristrutturazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Colonna (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	9.124.858.514	24.124.858.514													10.000.000.000			10.000.000.000	10.000.000.000	
B 12		Interventi di restauro di immobili e complessi di interesse storico ed artistico																					
B 12 01		Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento statico e progetto	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	581.696.931	581.696.931													600.000.000			600.000.000	600.000.000	
B 12 02		Teatro di Marcello (Roma) Completamento dei restauri delle facciate	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.103.075.537	3.103.075.537													3.500.000.000			3.500.000.000	3.500.000.000	

Codice	B 12 14	B 12 13	B 12 12	B 12 11	B 12 10	B 12 09	B 12 08	B 12 06/b	B 12 06/a	B 12 05	B 12 04	B 12 03
Titolo dell'intervento	Tor Sta. Maddalena (Roma) Interventi di consolidamento	Parco archeologico della via Flaminia, Area - Castle di Malborghetto (Roma) Scavi archeologici, restauri, protezione struttura medioevali ad Ipso orientale, rimozione	Mausoleo "Barretta del Prete" e mausoleo lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	Mausoleo di S Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, ricezione del complesso monumentale	Appia Antica - Castilia Metella	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	Palazzo di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	Palazzo "Sepienza" (Roma) Restauro e sistemazione dei cortili	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli stucchi	Vittoriano (Roma) Monumento dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro
Soggetto Beneficiario del finanziamento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	573.725.000	1.000.000.000	1.264.993.182	1.206.440.570	1.860.558.753	300.000.000	1.654.139.863	267.073.336	2.208.104.197	1.401.670.060	3.000.000.000	9.676.423.063
COSTO STIMATO	573.725.000	1.000.000.000	1.264.993.182	1.206.440.570	1.860.558.753	300.000.000	1.654.139.863	267.073.336	2.208.104.197	1.401.670.060	3.000.000.000	9.676.423.063
PROGETTAZIONE – IMPEGNI DI SPESA												
PROGETTAZIONE – Ufficio Tecnici 1% Costo stimato												
PROGETTAZIONE – Privati 5% Costo stimato												
PROGETTAZIONE – Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato												
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI – IMPEGNI DI SPESA												
ACCONTI – 20% e 50% Impegno di spesa												
ACCONTI – 30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi												
ULTERIORI EROGAZIONI – 30% Impegno di spesa												
SALDO – Fino alla concorrenza del 15% e 90% dell'impegno di spesa												
SALDO – 10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio												
ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI												
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di ripartizione)	600.000.000	1.000.000.000	1.400.000.000	1.300.000.000	2.700.000.000	300.000.000	1.800.000.000	300.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – REGIONE LAZIO – "Lavoratori" nel settore famiglione – Risorse vincolate												
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – ALTRI BENEFICIARI per "Lavoratori" nel settore delle attività culturali												
IMPEGNI	600.000.000	1.000.000.000	1.400.000.000	1.300.000.000	2.700.000.000	300.000.000	1.800.000.000	300.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000
PAGAMENTI	600.000.000	1.000.000.000	1.400.000.000	1.300.000.000	2.700.000.000	300.000.000	1.800.000.000	300.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000
sito Reti												

| Codice | | |

| Codice | | |

Codice		B 13 22	B 13 21	B 13 20	B 13 19	B 13 18	B 13 17	B 13 16	B 13 15	B 13 14	B 13 13	B 13 12	B 13 11
Titolo dell'intervento		Chiesa di S. Saverio a Via Merulana (Roma) Interventi di restauro conservativo	Chiesa di S. Giovanni in Laterano (Roma) Interventi sulla copertura	Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	Chiesa di S. Agnese in Agone	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina - protezione dal microclima e restauro	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro ambientale	Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	Chiesa di Maria della Pace (Roma) Completamento del Restauro della chiesa barocca	Chiesa di Alessio (Roma) Restauro del chiostro	Restauro ed intervento conservativo del progetto della chiesa di S. Gregorio al Celio	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimento interno e pertinenze (prima fase)
Soggetto Beneficiario del finanziamento		Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000		737.477.273	961.300.000	2.500.000.000	1.072.494.418	394.948.790	1.388.727.272	800.000.000	1.000.000.000	672.536.182	444.153.774	800.000.000	918.190.682
COSTO STIMATO		737.477.273	961.300.000	2.500.000.000	1.072.494.418	394.948.790	1.388.727.272	800.000.000	1.000.000.000	672.536.182	444.153.774	800.000.000	918.190.682
PROGETTAZIONE	DIPEGNI DI SPESA												
	Utili Tecnici 1% Costo stimato												
	Privati 5% Costo stimato												
	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato												
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI	DIPEGNI DI SPESA												
ACCONTI	20% o 50% impegno di spesa												
	30% o 50% impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi												
ULTERIORI EROGAZIONI	30% impegno di spesa												
	Non oltre concorrenza dell' 85% o 95% dell'impegno di spesa												
SALDO	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio												
ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI													
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	800.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	1.200.000.000	400.000.000	1.500.000.000	800.000.000	1.000.000.000	700.000.000	500.000.000	800.000.000	1.000.000.000
	"Tesorerie" nel settore pubblico - Banche nazionali												
	ALTRI BENEFICIARI per "Tesorerie" nel settore delle attività culturali												
IMPEGNI		800.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	1.200.000.000	400.000.000	1.500.000.000	800.000.000	1.000.000.000	700.000.000	500.000.000	800.000.000	1.000.000.000
PAGAMENTI		800.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	1.200.000.000	400.000.000	1.500.000.000	800.000.000	1.000.000.000	700.000.000	500.000.000	800.000.000	1.000.000.000
altre fonti													

Codice		B 13 32/2	B 13 32/1	B 13 31	B 13 30	B 13 29	B 13 28	B 13 27	B 13 26	B 13 25/2	B 13 25/1	B 13 24	B 13 23
Titolo dell'intervento		Restauro Oratorio dei SS Crocifisso	Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi	Oratorio del Carmine (Roma) Lavori di restauro strutturale e restauro	Restauro e intervento conservativo della Chiesa S Maria in Campitelli	Chiesa S Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	Chiesa S Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	Restauro, bonifica e risanamento nell Chiesa S Eustachio (Roma)	Chiesa S Giovanni dei Fiorentini (Roma)	Basilica di S Maria in Trastevere (Roma) Restauro strutturale, recupero degli impianti, Abbrego e delle cappelle Avola Sinistra archeologico e valorizzazione	Basilica di S Maria in Trastevere (Roma) Restauro strutturale, recupero degli impianti, Abbrego e indagini archeologiche	Chiesa S Andrea al Quirinale (Roma)	Chiesa S Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale della facciata/Restauro ed interventi sulla copertura
Soggetto Beneficiario del finanziamento		Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000		416.992.500	450.000.000	761.914.618	778.810.000	189.613.919	600.000.000	749.391.200	848.723.637	300.000.000	500.000.000	639.479.710	500.000.000
COSTO STIMATO		416.992.500	450.000.000	761.914.618	778.810.000	189.613.919	600.000.000	749.391.200	848.723.637	300.000.000	500.000.000	639.479.710	500.000.000
PROGETTAZIONE	IMPEGNI DI SPESA												
	Uffici Tecnici 1% Costo stimato												
	Privati 5% Costo stimato												
	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato												
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPEGNI DI SPESA												
ACCONTI	10% o 50% Impegno di spesa												
	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi												
ULTERIORI EROGAZIONI	30% Impegno di spesa												
	Max alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa												
SALDO	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio												
ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI													
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	450.000.000	450.000.000	800.000.000	800.000.000	200.000.000	600.000.000	800.000.000	1.000.000.000	300.000.000	500.000.000	800.000.000	500.000.000
	REGIONE CASSE Tesoriere del comune												
	Tesoriere" sul conto consolidato c. Banca mutuo												
	ALTRI BENEFICIARI (per Tesoriere" sul conto delle risorse statali												
IMPEGNI		450.000.000	450.000.000	800.000.000	800.000.000	200.000.000	600.000.000	800.000.000	1.000.000.000	300.000.000	500.000.000	800.000.000	500.000.000
PAGAMENTI		450.000.000	450.000.000	800.000.000	800.000.000	200.000.000	600.000.000	800.000.000	1.000.000.000	300.000.000	500.000.000	800.000.000	500.000.000
altre fonti													

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE AL LO STATO AVANZAMENTO LAVORI							EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
					IMPEGNI DI SPESA	Utili Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non reperiti al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO	ALTRI BENEFICIARI			
										10% o 30% in ragione di spesa	30% o 50% in ragione di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi	30% in ragione di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% nella ragione di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Assunti" nel numero complessivo - Numero unità	"Assunti" nel numero complessivo - Numero unità			
B 13 33	Ostuni (Brindisi) - Restauro del prospetti del cortile Borromeo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	350.000.000	350.000.000												350.000.000			350.000.000	350.000.000	
B 13 34	Ostuni (Brindisi) Seminario Borromeo - Restauro della Facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	736.893.440	736.893.440												800.000.000			800.000.000	800.000.000	
B 13 35	Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei rivestimenti lignei	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500.000.000	500.000.000												500.000.000			500.000.000	500.000.000	
B 13 36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.300.000.000	1.300.000.000												1.300.000.000			1.300.000.000	1.300.000.000	
B 13 38	Chiesa di S. Bartolomeo de Isola (Roma) Restauro dei prospetti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	449.272.727	449.272.727												500.000.000			500.000.000	500.000.000	
B 13 39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica Basilica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	518.456.900	518.456.900												550.000.000			550.000.000	550.000.000	
B 13 40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro Fontane (Roma) Restauro degli interni e delle facciate	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	713.805.802	713.805.802												800.000.000			800.000.000	800.000.000	
B 13 41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	494.332.254	494.332.254												560.000.000			560.000.000	560.000.000	
B 13 42	Chiesa di S. Clemente (Roma) Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	94.873.950	94.873.950												100.000.000			100.000.000	100.000.000	
B 13 43	Chiesa del SS. Domenico e Biagio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	700.000.000	700.000.000												700.000.000			700.000.000	700.000.000	
B 13 44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del ciclo di maioliche	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	640.000.000	640.000.000												640.000.000			640.000.000	640.000.000	
B 13 44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro del museo di storia del convento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	310.496.600	310.496.600												360.000.000			360.000.000	360.000.000	

| Codice | | |

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI							EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			DISPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
					DISPEGNI DI SPESA	Utilità Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	DISPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO	ALTRI BENEFICIARI (per "Roma 2000" sul sistema delle stabilità cittadine)			
										25% o 50% in ragione di anno 50% o 30% in ragione di anno in caso di forniture beni e prestazioni servizi		20% in ragione di anno	Non alle concorrenze dell' 85% o 95% dell'importo di anno	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		"Lazio" nel settore competenza - Roma nel resto				
B 13 45/1	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000	300.000.000											300.000.000			300.000.000	300.000.000	
B 13 45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	400.000.000	400.000.000											400.000.000			400.000.000	400.000.000	
B 13 46/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone, restauro della facciata e presentazione del restauro e consolidamento del complesso	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	470.650.000	470.650.000											500.000.000			500.000.000	500.000.000	
B 13 46/2	Chiesa di S. Maria alle Fornaci Restauro portale e finestra	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	711.335.619	711.335.619											750.000.000			750.000.000	750.000.000	
B 13 46/3	Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	700.000.000	700.000.000											700.000.000			700.000.000	700.000.000	
B 13 46/4	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	724.740.182	724.740.182											800.000.000			800.000.000	800.000.000	
B 13 47/1	Chiesa di S. Maria sopra Minerva, Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	550.000.000	550.000.000											550.000.000			550.000.000	550.000.000	
B 13 47/2	Chiesa di S. Maria in Monti, Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.235.000.000	1.235.000.000											1.235.000.000			1.235.000.000	1.235.000.000	
B 13 47/3	Chiesa di S. Maria in Trivio, Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	350.000.000	350.000.000											350.000.000			350.000.000	350.000.000	
B 13 47/4	Chiesa di S. Silvestro al Quirinale, Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	220.000.000	220.000.000											220.000.000			220.000.000	220.000.000	
B 13 47/5	Chiesa di S. Vitale, Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	200.000.000	200.000.000											200.000.000			200.000.000	200.000.000	
B 13 48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto, Restauro della zona absidale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	374.916.000	374.916.000											400.000.000			400.000.000	400.000.000	

| Codice | | |

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONI				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE: IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI							EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
					IMPEGNI DI SPESA	Utilizz finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	Preved 5% Costo stimato	Utilizz finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO	ALTRI BENEFICIARI per "interventi" nel settore delle attività culturali			
										10% a 50% impegno di spesa	30% a 50% impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi	30% impegno di spesa	fino alla concorrenza dal 85% a 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore energetico - Risorse umane				
B 13 74	Basilica S Maria Maggiore in Roma - Restauro e risanamento strutture del soffitto ligneo.	Parrocchia Basilica S Maria Maggiore	Basilica S Maria Maggiore in Roma - Realizzazione di servizi igienici, presidio sicurezza e ronda per disabili	Parrocchia S Maria degli Angeli - Roma	Chiesa S Maria Maggiore	Restauro edificio sacro	Convento di Roma	Episcopio dioceseno di S Rufina (Fiumicino/Roma)	Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma)	Restauro della Madonna di Chiesa (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	Ecomo della Trinità (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento	Restauro della Madonna della Sughera (Tivoli/Roma)	Monastero dei Cappuccini (Tivoli/Roma)	Chiesa di S Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo						
580.000.000			110.000.000	1.770.000.000	100.000.000	1.700.000.000	1.888.045.480	936.685.000	1.791.998.016	1.890.886.900	929.344.460	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	890.516.477	958.897.396	1.000.000.000			1.000.000.000	1.000.000.000	
580.000.000			110.000.000	1.770.000.000	100.000.000	1.700.000.000	1.888.045.480	936.685.000	1.791.998.016	1.890.886.900	929.344.460	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	890.516.477	958.897.396	1.000.000.000			1.000.000.000	1.000.000.000	
580.000.000				88.500.000																
580.000.000				1.117.965.050	99.500.000		88.500.000													
290.000.000				558.982.520	49.750.000										2.000.000.000	1.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000	
					49.750.000															
															2.000.000.000	1.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000	

| Codice | | |

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI								EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			PAGAMENTI	altre fonti
					IMPEGNI DI SPESA	Utili Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non coperti al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Somme al netto delle variazioni)	Istituzioni Locali (Somme al netto delle variazioni)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	IMPEGNI		
										10% o 50% Impegno di spesa	50% o 90% Impegno di spesa in caso di direttori lavori e prestazioni servizi	50% Impegno di spesa	Max 90% somma erogata dall' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore progettazione - Risorse esterne				
B 14 07	Mausoleo d'Ara Sacra	Parrocchia S. Giovanni dei Fiorentini	700.000.000	700.000.000																	
B 14 08	Completamento "Palazzo dei Bruzi"	Comune di Napoli	900.000.000	900.000.000																	
B 15	Intervento sulla cinta archeologica di Corso Antico e del Parco di Traiano																				
B 15 01	Città di Pietra (Pianabello/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e conversione del Parco di Traiano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.000.000.000	4.000.000.000												4.000.000.000			4.000.000.000		
B 15 02	Città di Pietra (Pianabello/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Castel Terbuzia, Castello Monte Giulio, area universitaria)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	7.000.000.000	7.000.000.000												7.000.000.000			7.000.000.000		
B 15 03	Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di allarme e predisposizione materiale Multimediale e didattico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000												2.000.000.000			2.000.000.000		
B 15 04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento delle ristrutturazione e adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000												2.000.000.000			2.000.000.000		
B 15 05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000												2.000.000.000			2.000.000.000		
B 15 06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e viabilità	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000												1.500.000.000			1.500.000.000		
B 15 07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (mura Aurelie)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000												1.500.000.000			1.500.000.000		
B 16	Intervento di [illegible] archeologica di																				
B 16 01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e ristrutturazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.000.000.000	893.928.572												5.000.000.000			1.000.000.000		
B 16 02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e ristrutturazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.672.784.441	4.672.784.441															5.000.000.000		

Codice		B 16 14	B 16 13	B 16 12	B 16 11	B 16 10	B 16 09	B 16 08	B 16 07	B 16 06	B 16 05	B 16 04	B 16 03
Titolo dell'intervento		Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio, Restauro e sistemazione	Palatino - Foro Romano (Roma) Area di Costantino Completamento e restauro	Palatino - Foro Romano (Roma) Aree della Vigna Barberini. Ulteriore restauri	Palatino - Foro Romano (Roma) Aree Severiane e Terme Restauro	Palatino - Foro Romano (Roma) Passaggio da S.Maria Antiqua a S.Anastasia e a via di S.Gregorio Restauro e manutenzione	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e accesso ai Boschetti Farnesiani Restauro e manutenzione	Palatino - Foro Romano (Roma) C'ivo della Vittoria Restauro e manutenzione	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, tempi di Domizano, Oratorio dei XL Martiri e Portico Adriano esterno	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauri, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro
Soggetto Beneficiario del finanziamento		Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000		3.698.046.394	902.259.741	3.183.883.190	1.815.958.548	1.780.173.676	2.745.453.709	721.892.086	2.117.285.925	398.319.328	1.886.029.019	2.339.254.745	1.180.799.560
COSTO STIMATO		3.698.046.394	902.259.741	3.183.883.190	1.815.958.548	1.780.173.676	2.745.453.709	721.892.086	2.117.285.925	398.319.328	1.886.029.019	2.339.254.745	1.180.799.560
PROGETTAZIONE	IMPEGNI DI SPESA												
	Uffici Tecnici 1% Costo stimato												
	Privati 5% Costo stimato												
	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato												
REALIZZAZIONI, LIQUIDAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPEGNI DI SPESA												
ACCONTI	20% e 50% (impegno di spesa)												
	30% e 50% (impegno di spesa in base di fornitura beni e prestazioni servizi)												
ULTERIORI EROGAZIONI	50% (impegno di spesa												
	Max alla concorrenza dell' 85% e 95% dell'impegno di spesa												
SALDO	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio												
ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI													
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	4.000.000.000	1.000.000.000	3.400.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	800.000.000	2.300.000.000	400.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000	1.200.000.000
	"Incentivi" sul settore energetico, Risparmio energetico												
	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" sul settore delle attività culturali												
IMPEGNI		4.000.000.000	1.000.000.000	3.400.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	800.000.000	2.300.000.000	400.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000	1.200.000.000
PAGAMENTI		4.000.000.000	1.000.000.000	3.400.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	800.000.000	2.300.000.000	400.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000	1.200.000.000
altre fonti													

| Codice | | |

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI							EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN		DISPONI	PAGAMENTI	altre fonti
					DISPONI DI SPESA	Utili Tremiti 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	DISPONI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO		AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO			
										20% e 50% impegno di spesa	20% e 30% impegno di spesa per la cura di particolari beni e prestazioni servizi	20% impegno di spesa	Per ulteriori impegni dall'85% e 95% dell'impegno di spesa	10% all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI		"finanziati" nel settore trasporti - Risorse statali	ALTRI BENEFICIARI per "interventi" nel settore delle attività culturali			
B 16 18/10	Interni antichi e monumenti archeologici esumati, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, rivalutazione, restauro - Ruderi in Piazza Lucio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	92.502.439	92.502.439												100.000.000			100.000.000	
B 16 18/11	monumenti archeologici esumati, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, rivalutazione, restauro - Area recintata di Tempio di Saturno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	901.046.434	901.046.434												1.000.000.000			1.000.000.000	
B 16 18/12	Interni antichi e monumenti archeologici esumati, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, rivalutazione, restauro - Villa del Foro Boario	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	100.000.000	100.000.000												100.000.000			100.000.000	
B 16 18/13	monumenti archeologici esumati, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, rivalutazione, restauro - Obelì - Castiglione. Lavori integrati del territorio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	94.536.639	94.536.639												100.000.000			100.000.000	
B 16 18/14	Interni antichi e monumenti archeologici esumati, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, rivalutazione, restauro - Ose Archeologo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	50.000.000	50.000.000												50.000.000			50.000.000	
B 16 18/15	Interni antichi e monumenti archeologici esumati, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, rivalutazione, restauro - Archivio biologico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	60.000.000	60.000.000												60.000.000			60.000.000	
B 16 18/16	monumenti archeologici esumati, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, rivalutazione, restauro - Terme di Diocleziano sale chiuse	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	122.102.475	122.102.475												135.000.000			135.000.000	
B 16 18/17	Interni antichi e monumenti archeologici esumati, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, rivalutazione, restauro - Area di Tito	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	675.515.500	675.515.500												750.000.000			750.000.000	
B 16 18/18	Interni antichi e monumenti archeologici esumati, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, rivalutazione, restauro - Villa romana località Casalotti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	93.184.317	93.184.317												100.000.000			100.000.000	
B 16 18/19	Interni antichi e monumenti archeologici esumati, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, rivalutazione, restauro - Ipogeo degli Ottavi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	25.000.000	25.000.000												25.000.000			25.000.000	
B 16 18/20	monumenti archeologici esumati, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, rivalutazione, restauro - Villa romana in località Monte Colasanto	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	576.928.744	576.928.744												600.000.000			600.000.000	
B 16 18/21	monumenti archeologici esumati, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, rivalutazione, restauro - Necropoli Pervenute in località Ponte Postolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	470.392.287	470.392.287												500.000.000			500.000.000	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONE EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	oltre 2002
					IMPEGNI DI SPESA	Utilità Residui 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI: 20% o 30% impegno di spesa	ACCONTI: 20% o 30% impegno di spesa in caso di lavori boni e prestazioni servizi	ULTERIORI EROGAZIONI: 20% impegno di spesa	SALDO: fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	SALDO: 10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di ripartizione)	REGIONI, ENTI LOCALI (Decreti ed atti di ripartizione e di riparto)	ALTRI BENEFICIARI (per "beneficiari" nel settore delle attività culturali)			
B 16 18/22	interventi tecnologici sostitutivi, integrativi, tecnologici ed opere d'arte Conservazione, restauro, manutenzione, opere Conservazione - Interventi di valo della città e di dim	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	831.233.933	831.233.933											900.000.000			900.000.000	900.000.000	
B 16 18/23	Chiesa Monistero - Restauro e nuovo disegno al Tevere	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	100.000.000	100.000.000											100.000.000			100.000.000	100.000.000	
B 16 18/24	Palazzo Baldassini - Interventi di struttura antisismici	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000	300.000.000											300.000.000			300.000.000	300.000.000	
B 16 18/25	Tempio rotondo al Foro Boario - Restauri interni ed esterni	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	130.000.000	130.000.000											130.000.000			130.000.000	130.000.000	
B 16 19	Tuscania (Roma) Riserva, restauro Porta Borbale restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.869.967.700	1.869.967.700											2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000	
B 16 20	Villa dei Quintili (Roma) Varchi, restauri, studi, valorizzazione Castelli (Appia Antica)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	5.469.913.397	5.469.913.397											5.900.000.000			5.900.000.000	5.900.000.000	
B 16 21	Acquisizione delle Villa dei Quintili	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali													1.000.000.000			1.000.000.000	1.000.000.000	
B 16 22	Parco della Torraccia della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.459.556.200	2.459.556.200											4.580.000.000			4.580.000.000	4.580.000.000	
B 16 23	Pianiziie Villa di Livia, Tombe Celsi, Basa Relia, Circonvallazione, Tor di Quinto (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	680.000.000												3.000.000.000			3.000.000.000	3.000.000.000	-680.000.000
B 16 24	Parchi, giardini e zone monumentali Mura e varchi (Roma) Manutenzione e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	8.076.283.107	8.076.283.107											8.700.000.000			8.700.000.000	8.700.000.000	
B 16 25	Parco archeologico di Veio (Roma) Riforestazione area archeologica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	600.000.000	600.000.000											600.000.000			600.000.000	600.000.000	
B 16 26	Antica città di Ostia (Roma) Scavi, restauro monumenti isolati, restauro del tessuto di Ostia antica e di fabbricati e adeguamenti funzionali (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.705.714.979	4.705.714.979											5.000.000.000			5.000.000.000	5.000.000.000	

Codice	B 18 08	B 18 07	B 18 06	B 18 05			B 18 03	B 18 02	B 18 01	B 18	B 16 30	B 16 29	B 16 28	B 16 27
Titolo dell'intervento	Progetto di recupero ambientale dei ruderi in stretta connessione al Orto Botanico, 4° settore di intervento	Ex-convento Ordine S. Lucia (Martino/Ranna) Restauro e adeguamento funzionale	Palazzo a Parco Chigi (Ariccia/Roma)	Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero	Cortile "A" (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo e ampliamento	Terme di Caffarnaio e chiesa di S. Pietro (Albano Laziale/Roma) Restauro delle terme e del campanile della chiesa	Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Area e spazi circostanti	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Nicchio del Santuario	Recupero del "Parco Borghese" e della sistemazione della Villa Romana	Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavi, consolidamento, recupero funzionale delle Terme di Roccabruna e Cento Camerelle	Antro delle Sorti (Palestrina/Roma)	Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche
Soggetto Beneficiario del finanziamento														
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	500.000.000	514.043.646	4.515.221.571	1.000.000.000	200.000.000	500.000.000	800.000.000	500.000.000	25.000.000	3.000.000.000	1.060.000.000	560.000.000	1.458.180.311	
COSTO STIMATO	500.000.000	514.043.646	4.515.221.571	1.000.000.000	200.000.000	500.000.000	800.000.000	500.000.000	25.000.000	3.000.000.000	1.060.000.000	560.000.000	1.458.180.311	
PROGETTAZIONE – IMPEGNI DI SPESA	25.000.000	30.000.000	250.000.000	50.000.000	10.000.000	25.000.000	40.000.000	25.000.000						
PROGETTAZIONE – Uffici Tecnici 1% Costo stimato		6.000.000												
PROGETTAZIONE – Privati 5% Costo stimato	25.000.000		250.000.000	50.000.000	10.000.000	25.000.000	40.000.000	25.000.000						
PROGETTAZIONE – Ulteriori finanziamenti non coperti al 10% Costo stimato		24.000.000												
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI – IMPEGNI DI SPESA		484.043.646	3.865.221.571	730.821.681	166.040.918	420.935.534	634.008.350	399.370.526						
ACCONTI – 20% e 50% impegno di spesa		242.021.820	1.932.610.780	365.410.840	83.020.460	210.467.770	317.004.180	199.685.260						
ACCONTI – 20% e 50% impegno di spesa; 30% e 50% impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi														
ULTERIORI EROGAZIONI – 30% impegno di spesa														
ULTERIORI EROGAZIONI – fino alla concorrenza dell'85% e 90% dell'impegno di spesa					58.114.320									
SALDO – 10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio														
ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI														
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)											1.060.000.000	560.000.000	1.500.000.000	
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – "Immobili" nel numero complessivo – Bilancio ente														
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – ALTRI BENEFICIARI per "Immobili" nel settore delle attività culturali														
IMPEGNI	25.000.000	514.043.646	4.115.221.571	780.821.681	176.040.918	445.935.534	674.008.350	424.370.526			1.060.000.000	560.000.000	1.500.000.000	
PAGAMENTI	25.000.000	272.021.820	2.182.610.780	415.410.840	151.134.780	235.467.770	357.004.180	224.685.260			1.060.000.000	560.000.000	1.500.000.000	
altre fonti														

| Codice | | |

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fasi
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	ALTRI BENEFICIARI per "lavori" nel settore dello attività culturali				
										20% o 50% impegno di spesa	30% o 50% impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi	50% impegno di spesa	Non alla conservazione dell' 15% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		"lavori" nel settore immobiliare - Ristrutturazione				
B 19 08	Caserma Colonna (Osteria/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi	Comune di Genzano	5.774.000.000	5.774.000.000	300.000.000		300.000.000		4.760.583.580	952.116.720		1.428.175.070						5.060.583.580	2.680.291.790	
B 19 07	Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima fase)	Comune di Anguillara Sabazia	995.034.076	995.034.076	50.000.000		50.000.000		894.369.076	447.184.540								944.369.076	497.184.540	
B 19 06	Restauro conservativo della Cappella votiva di S Bernardino	Comune di Trevignano	402.000.000	402.000.000	20.000.000		20.000.000		377.757.075	188.878.520			132.214 970					397.757.075	341.093.490	
B 19 05	Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S.M. Novella	Comune di Bracciano	1.167.162.876	1.167.162.876	70.000.000		70.000.000		1.097.162.876	548.581.440								1.167.162.876	618.581.440	
B 19 04/2	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra - II stralcio	Comune di Bellegra	840.000.000	840.000.000																
B 19 04/1	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra - I stralcio	Comune di Bellegra	995.863.486	995.863.486	60.000.000		60.000.000		917.076.559	183.415.310	-	275.123.970						977.076.559	518.538.280	
B 19 03	Completamento della ristrutturazione dell'ex Ente e allestimento del Museo Tuscolano (prima fase)	Comune di Frascati	4.517.000.000	4.517.000.000																
B 19 02	Centro per laureati, manifestazioni e produzioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e costruzione della attrezzatura tecnica	Regione Lazio	1.000.000.000	1.000.000.000																
B 19 01	Stenografia, documentazione Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo (Roma). Restauro degli arredi arredi della Cinque Scole del Ghetto. Adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio	Comune di Roma																		
B 19	Verificazione del patrimonio culturale regionale (mostre, abbazie, musei e																			
B 18 24	Sistemazione area parcheggio adiacente Porta Clusa e rimessa in Porta Pinciana	Comune di Ariccia		1.000.000.000																
B 18 23	Area archeologica della Villa Neroniana (Anzio/Roma) Recupero	Comune di Anzio	1.230.000.000	1.230.000.000	70.000.000		70.000.000		1.111.806.829	222.761.360		334.142.050						1.183.806.829	626.903.410	
B 18 22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	274.992.886	274.992.886	15.000.000		15.000.000		259.992.886	129.996.440								274.992.886	144.996.440	

Codice		B 19 20/1	B 19 19	B 19 18	B 19 17	B 19 16	B 19 15	B 19 14	B 19 13	B 19 12	B 19 11	B 19 10	B 19 09
Titolo dell'intervento		Restauro delle Chiese di S. Ruffina e S. Percia (Capranica Viterbo)	Restauro di Vallepietra (Vallepietra/Roma) Centro di Ammonizione	Adeguamento del Cinquecento di S. Cosimato ed ampliamento delle barriere architettoniche	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)	Chiesa di Santa Lucia (Sant'Angelo Romano/Roma) Restauro	Restauro e ritrovamento della Chiesa di San Rocco.	Ritrovamento e consolidamento della Pentedola di S. Michele Arcangelo	Chiesa di Santa Maria e San Marco, Battesimo Medioevo degli Angeli (Cantoniera/Roma) Restauro e valorizzazione	Centro documentazione dell'area antica Lucus XIII (Carpineto Romano/Roma)	Monastero di S. Benedetto (Subiaco/Roma) - restauro	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro
Soggetto Beneficiario del finanziamento		Comune di Capranica	Comune di Vallepietra	Comune di Vicovaro	Comune di Palombara Sabina	Comune di Sant'Angelo Romano	Comune di Guidonia sul Lazio	Comune di Capena	Comune di Castelnuovo	Comune di Carpineto Romano	Comune di Subiaco	Comune di Valmontone	Comune di Valmontone
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000		372.274.000	65.000.000	150.000.000	200.000.000	470.519.547	172.890.475	764.429.110	300.000.000	1.242.089.443		100.000.000	548.829.313
COSTO STIMATO		372.274.000	65.000.000	150.000.000	200.000.000	470.519.547	212.890.475	764.429.110	300.000.000	1.242.089.443		100.000.000	548.829.313
PROGETTAZIONE	IMPEGNI DI SPESA	40.000.000		7.500.000					15.000.000				
	Ufficio Tecnico 1% Costo stimato												
	Privati 5% Costo stimato	40.000.000		7.500.000					15.000.000				
	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato												
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPEGNI DI SPESA	312.966.000			173.993.233	470.519.547	172.890.475	764.429.110	285.000.000	1.154.739.443			548.829.313
ACCONTI	25% o 50% Impegno di spesa	156.483.000			86.996.620	235.259.770	86.445.240	382.214.550	142.500.000	577.169.720			274.414.650
	50% e 75% Impegno di spesa in caso di finanziamenti parziali												
ULTERIORI EROGAZIONI	50% Impegno di spesa												
	Fino alla concorrenza dell'85% o 95% dell'impegno di spesa					164.681.840		267.550.190					
SALDO	15% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio												
	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI									87.750.000			
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN	(AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)												
	RISCOSSIONE CASSA Somme a favore	"Somme" ad ordini emessi : Somme erogate											
	(ALTRI BENEFICIARI per "Somme" ad ordini della autorità centrale)												
IMPEGNI		351.966.000			173.993.233	470.519.547	172.890.475	764.429.110	300.000.000	1.242.489.443			548.829.313
PAGAMENTI		196.483.000			86.996.620	399.941.610	86.445.240	649.764.740	157.500.000	664.919.720			274.414.650
altre fonti							40.000.000						

Ciclo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non reperiti al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di ripartizione)	REGIONE LAZIO	ALTRI BENEFICIARI per "lavori/e" nel settore dell'edilizia culturale			
										20% e 50% impegno di spesa 30% e 50% impegno di spesa in caso di ritardato inizio e procedure speciali		30% impegno di spesa	Fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		"lavori/e" nel settore energetico - Risorse umane				
B 19 25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione della area esterna	Comune di Poggio Bustone	200.000.000	300.000.000	15.000.000			15.000.000										15.000.000	15.000.000	
B 19 24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edilizio Santuario S. Maria la Valverde	Comune di Torquinia	2.087.815.000	2.087.815.000	120.000.000	24.000.000		96.000.000	1.967.814.106	983.907.050								2.087.814.106	1.103.907.050	
B 19 24/2	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Torquinia	122.788.972	122.788.972	7.500.000	1.500.000		6.000.000	115.288.972	57.644.490								122.788.972	65.144.490	
B 19 24/1	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	Comune di Torquinia	162.388.321	162.388.321	10.000.000	2.000.000		8.000.000	152.388.321					129.530.070				162.388.321	139.530.070	
B 19 23	Museo della orientalità	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo	2.128.411.478	2.128.411.478	100.000.000		100.000.000		1.778.811.478	355.762.290	120.772.800	412.870.640						1.878.811.478	989.405.730	
B 19 22	Convento di S. Francesco (Tessennano/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Gesù	2.366.953.308	2.366.953.308	120.000.000	120.000.000			2.246.953.308	449.390.660		674.085.990	786.433.660					2.366.953.308	2.029.910.310	
B 19 21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesano	Diocesi di Viterbo	3.070.104.360	3.070.104.360	175.000.000		175.000.000		2.895.104.360	1.447.558.180								3.070.104.360	1.622.558.180	
B 19 20/6	Sistemazione del piazzale antistante la Madonna della Grotte (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	560.327.000	560.327.000	66.000.000		66.000.000		481.249.900	240.624.950								547.249.900	306.624.950	
B 19 20/5	Restauro della Chiesa della Madonna della Grotte (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	453.724.000	453.724.000	52.000.000		52.000.000		388.901.000	194.450.500								440.901.000	246.450.500	
B 19 20/4	Sistemazione di Via della Mattonara (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	820.925.000	820.925.000	92.000.000		92.000.000		709.591.000	354.795.500								801.591.000	446.795.500	
B 19 20/3	Pavimentazione del Corso Petrosa ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capranica/ Viterbo)	Comune di Capranica	445.246.000	445.246.000	50.000.000		50.000.000		380.407.000	190.203.000								430.407.000	240.203.000	
B 19 20/2	Restauro della Chiesa di S. Tommaso (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	627.504.000	627.504.000	70.000.000		70.000.000		539.626.000	269.813.000								609.626.000	339.813.000	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI							EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			DISPENDI	PAGAMENTI	altre fonti
					DISPENDI DI SPESA	Utili Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non reperiti al 100% Costo stimato	DISPENDI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	ENTI LOCALI	ALTRI BENEFICIARI per "Immobili" nel settore delle attività culturali			
										20% o 30% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di finanziamenti mirati e procedimenti speciali	50% Impegno di spesa	Fino alla concorrenza dell' 85% o 95% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		"Immobili" nel settore beni culturali: - Ministero competente; - Ministero tesoro				
B 19 34	Lavori di consolidamento statico Chiesa S. Maria della Pietà collegiata	Comune di Cori	1.000.000.000	1.000.000.000																	
B 19 33	Monastero della Clarisse (Rieti/Latina) Completamento della ristrutturazione (prima fase)	Provincia di Latina	1.998.903.343	4.998.903.343					828.577.028	414.288.510				290.001.940					828.577.028	704.290.470	3.000.000.000
B 19 32	S. Carlo (Rieti/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della zona annessa al S. Carlo da Sezze	Comune di Sezze	400.000.000	400.000.000					80.000.000						80.000.000				160.000.000	80.000.000	
B 19 31	Riqualificazione urbana del Borgo di Forlì e restauro del Monastero con ridistribuzione dei blocchi	Comune di Fara in Sabina	4.729.000.000	4.729.000.000	275.000.000		275.000.000		4.376.844.692	1.888.422.350	300.000.000								4.451.844.692	2.463.422.350	
B 19 30	Ampliamento di S. Antimmondo (Teffia/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Comune di Toffia in Sabina	1.500.000.000	1.500.000.000	75.000.000		75.000.000		1.244.718.000	248.943.000	373.414.050			435.650.250					1.319.715.000	1.133.007.300	
B 19 29	Completamento funzionale dell'Abbazia di S. Quirico e Giuditta	Comune di Mompeo	499.790.619	499.790.619	25.000.000		25.000.000		417.790.619	83.558.120	125.337.190			146.236.720					442.790.619	380.122.030	
B 19 28/3	Lavori di demolizione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Poggio regnano (1° stralcio funzionale)	Comune di Orvinio	201.075.000	216.075.000	10.000.000		10.000.000							162.200.170					10.000.000	10.000.000	15.000.000
B 19 28/2	Lavori di demolizione della parte del piccolo vivaio (1° stralcio funzionale)	Comune di Orvinio	488.429.056	488.429.056	25.000.000		25.000.000		463.429.056	231.714.530									488.429.056	418.914.700	
B 19 28/1	dell'area del Santuario del presepio. Ristoro di due fabbricati per la formazione di ostelleria e costruzione di cinema a parcheggio e verde attrezzato (1° stralcio funzionale)	Comune di Orvinio	804.000.000	804.000.000	40.000.000		40.000.000		738.138.650	369.069.320									778.138.650	409.069.320	
B 19 27	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauro e ristrutturazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.850.000.000	1.850.000.000	92.250.000		92.250.000		1.408.023.000	704.011.500									1.500.273.000	796.261.500	
B 19 26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Ristrutturazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.600.000.000	1.600.000.000	80.000.000		80.000.000												80.000.000	80.000.000	
B 19 25/2	Ristrutturazione dell'Orto Francescano	Comune di Poggio Bustone	200.000.000	200.000.000	10.000.000		10.000.000												10.000.000	10.000.000	

Codice	B 19 35	B 19 36	B 19 37	B 19 38	B 19 39	B 19 40	B 19 41/1	B 19 41/2	B 19 42	B 19 43	B 19 44	B 19 45
Titolo dell'intervento	Intervento storico sostitutivo P.R.U.M.O. Comune di Ceprano ente attuatore area immobile aperta della Città Vecchia di Ceprano e del promontorio di Monte Orlando	Santuario Madonna della Rocca (Frosolo/Latina) Sistemazione via e parcheggio	Chiesa di San Oliverio (Castelforte/Latina) Restauro	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Ristrutturazione area cortilizia	Ristauro e rimessaggio conservativo e funzionale del convento di S Francesco	Progetto di ristrutturazione della Chiesa di S Antonino	Manutenzione straordinaria Chiesa S Annunziata	Chiesa di SS Cosma e Damiano Pontinia	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro
Beneficiario del finanziamento	Comune di Ceccano	Comune di Frosolone	Comune di Terracina	Comune di Castelforte	Provincia di Latina	Comune di Minturno	Comune di Minturno	Comune di Sabaudia	Comune di Sonni Cosma e Damiano	Provincia di Latina
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	200.000.000	683.400.000	224.855.727	130.642.227	105.593.680	179.311.434	120.000.000
COSTO STIMATO	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	200.000.000	683.400.000	224.855.727	130.642.227	105.593.680	179.311.434	120.000.000
PROGETTAZIONE – IMPEGNI DI SPESA	50.000.000									
PROGETTAZIONE – Uffici Tecnici 1% Costo stimato										
PROGETTAZIONE – Privati 5% Costo stimato	50.000.000					11.750.000	7.000.000	6.250.000	10.000.000	5.000.000
PROGETTAZIONE – Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato										
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI – IMPEGNI DI SPESA	652.166.380					213.105.727	123.642.227			84.375.226
ACCONTI – 20% e 50% (seguito di spese da terzi di fiduciari e provinciali servizi)	316.083.190					42.611.150	24.728.450			42.187.610
ACCONTI – 20% e 30% (seguito di spese da terzi di fiduciari e provinciali servizi)						63.931.720	37.092.670			
ULTERIORI EROGAZIONI – 20% (seguito di spese)										
ULTERIORI EROGAZIONI – Non oltre concorrenza dell' 85% e 90% dell'importo di spese										
SALDO – 10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio										
ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI										
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)										
ALTRI BENEFICIARI per "incentivi" nel settore agricolo										
IMPEGNI	702.166.380					224.855.727	130.642.227	6.250.000	10.000.000	89.375.226
PAGAMENTI	376.083.190					118.302.870	68.821.120	6.250.000	10.000.000	47.187.610
altre fonti										

| Codice | | |

Codice	B 19 69	B 19 68	B 19 67	B 19 66	B 19 65	B 19 64	B 19 63/2	B 19 63/1	B 19 61	B 19 60	B 19 59	B 19 58
Titolo dell'intervento	Chiesa di San Milo	Chiesa di S. Restituta (Sorre/Fondazione) Restauro	Convento di S. Antonio Abate (Convento/Fondazione) Ristrutturazione e adeguamento statico	Ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - Sacrestia di San Cataldo	Chiesa della S.S. Annunziata (Fondazione) Restauro	Cattedrale di San Paolo (Alatri)	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Fondazione) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza - Terzo lotto	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Fondazione) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Fondazione)	Chiesa S. Maria a Fiarm. San Nicola, (Cisterna/Fondazione) Restauro	Chiesa di Santa Maria Assunta (Patrona/Fondazione) Restauro	Consolidamento statico e restauro conservativo Chiesa di San Pietro in Monte (I Giovenali Campano)
Soggetto Beneficiario del finanziamento	Comune di Roccasecca	Comune di Sora	Comune di Ferentino	Comune di Supino	Comune di Frosinone	Comune di Alatri	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	Diocesi di Anagni-Alatri	Comune di Cisterna	Comune di Fiuggi	Comune di Monte San Giovanni Campano
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	300.000.000	675.357.148	2.750.000.000	422.384.000	870.224.170	683.006.900	164.443.125	571.006.279	363.475.000	483.803.180	300.000.000	430.000.000
COSTO STIMATO	300.000.000	675.357.148	2.750.000.000	422.384.000	870.224.170	683.006.900	164.443.125	1.071.006.279	363.475.000	483.803.180	300.000.000	430.000.000
PROGETTAZIONE – IMPEGNI DI SPESA			300.000.000	25.000.000	87.083.550	40.000.000		41.777.850	20.000.000	25.000.000		22.500.000
PROGETTAZIONE – Uffici Tecnici 1% Costo stimato												
PROGETTAZIONE – Privati 5% Costo stimato			300.000.000	25.000.000	87.083.550	40.000.000		41.777.850	20.000.000	25.000.000		22.500.000
PROGETTAZIONE – Ulteriori finanziamenti non reperiti al 10% Costo stimato												
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI – IMPEGNI DI SPESA			2.005.922.000	397.384.000	782.276.535	643.006.900	150.000.000	529.228.429	339.875.710	398.802.960	291.919.095	407.500.000
ACCONTI – 25% e 90% Impegno di spesa; 35% e 50% Impegno di spesa in caso di finanziamento bancario			992.961.000	198.692.000	391.138.270	321.503.450	75.000.000	264.614.210	169.937.850	79.760.590	145.959.550	203.750.000
ULTERIORI EROGAZIONI – 30% Impegno di spesa										119.640.890		
SALDO – Fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa					312.910.610					139.581.040		
SALDO – 10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio												
ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI												
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)												
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – ENTI LOCALI (Decreto di variazione)												
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – ALTRI BENEFICIARI (per "lavori" nel settore delle attività culturali)												
IMPEGNI		675.357.148	2.305.922.000	412.384.000	869.360.085	683.006.900	150.000.000	571.006.279	359.875.710	423.802.960	291.919.095	430.000.000
PAGAMENTI		337.678.570	1.292.961.000	223.692.000	791.132.430	361.503.450	75.000.000	306.392.060	#VALORE!	363.982.520	145.959.550	226.250.000
altre fonti								500.000.000				

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI							EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
					IMPEGNI DI SPESA	Utiliz Tremiti 11% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non reperiti al 16% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE Lazio e Comuni (Legge)	ALTRI BENEFICIARI per "finanziamenti" nel settore delle attività culturali			
										20% o 50% liquidato all'atto della consegna dei lavori, 30% o 50% liquidato al posto in cui di Direttore lavori e provvisori verbali		20% liquidato all'approvazione del collaudo provvisorio	Pari alla concessione dall' 85% o 99% dell'impegno di spesa	1.0% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"finanziati" nel settore competenza - Bilancio comunale				
B 19 70	Chiesa di Santa Maria Assunta (Fondazione San Germano/Predazzo) Restauro	San Chiara di S. Maria Assunta in Piedimonte Alto	100.000.000	100.000.000					85.233.700	42.616.850								85.233.700	42.616.850	
B 19 71	Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione della biblioteriazione per l'immobilità	Provincia di Frosinone	1.110.846.077	1.110.846.077	75.000.000	75.000.000			1.035.846.077	207.169.210								1.110.846.077	282.169.210	
B 19 72	Ampliamento della Chiesa in loc. Ornacchi Santa pare della Parrocchia di S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	60.000.000	60.000.000																
B 19 73	Ristrutturazione impianto, finitura esterna e ristrutturazione area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	100.000.000	100.000.000																
B 19 74	Ristrutturazione impianto Chiesa di S. Lorenzo Parrocchia di S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	40.000.000	40.000.000																
B 19 75	Abbazia di Casamari	Ordine Cistercense	1.000.000.000	1.000.000.000																
B 20	Interventi per attività culturali di rilevante interesse pubblico e previsti dal Giubileo																			
B 20 01.1	Opere Varie, Programma da svolgersi in Roma, nel centro della Provincia di Roma e altre province del Lazio	Tesoro dell'Opera di Roma	15.000.000.000	15.000.000.000																
B 20 01.2	Metro, Programma da svolgersi in Roma, nel centro della Provincia di Roma e altre province del Lazio	Assessorato ai Lavori Pubblici di Roma	13.000.000.000	13.000.000.000																
B 20 01.3	Ferro, Programma da svolgersi in Roma, nel centro della Provincia di Roma e altre province del Lazio	Tesoro Roma	7.000.000.000	7.000.000.000																
B 20 01.4	Metro, Programma di ampliamento e linea di prolungamento Nuovo Tuscolo di Roma	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000.000	5.000.000.000																
B 20 01.5	Convegno Internazionale	Agenzia Romana per il Giubileo	2.000.000.000	2.000.000.000																
B 20 01.6	Consorzi finalizzati all'urbanizzazione del patrimonio immobiliare (di Comune, Provincia e Regione)	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000.000	5.000.000.000																

| Codice | | |

| Codice | | |

Codice	C 01 25	C 01 24	C 01 23	C 01 22/2	C 01 22/1	C 01 21/2	C 01 21/1	C 01 20	C 01 19	C 01 18/2	C 01 18/1	C 01 17
Titolo dell'intervento	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro dell'Area del Quattro Venti e delle aree lavorative	Villa Pamphilj (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del patrimonio monumentale del Giardino del Teatro	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e adeguamento manuale delle Cancelle Falierie e dell'area annessa.	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e riconsiderazione di Canale di Ovovio	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle aree archeologiche	(Roma). sistemazione esterna del allineamento del muro di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle aree del Quartiere del Cardoni - Riformazione esterna.	Villa Borghese Parco dei Daini (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del patrimonio monumentale	Villa Borghese Giardino Segreto, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni	Villa Borghese: pergolati egizi, fontana del Fiocco, parterres esterni e recupero di viale F. La Chiesa e del giardino del lago, restauro degli arredi architettonici.	Villa Borghese Portico del leoni, Museo dell'Acque Felice, Area di Settimio Severo, pergolati tecoloniali, prospetti di piazza della Canonica	Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da via La Nibbia a Forte Bravetti
Soggetto Beneficiario del finanziamento	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	1.190.000.000	1.789.260.680	1.550.958.910	1.497.997.384	1.694.479.906	2.355.000.000	3.000.000.000	875.455.525	1.098.160.620	2.165.000.000	2.000.000.000	300.000.000
COSTO STIMATO	1.190.000.000	1.789.260.680	1.550.958.910	1.497.997.384	1.694.479.906	2.355.000.000	3.000.000.000	875.455.525	1.098.160.620	2.165.000.000	2.000.000.000	
PROGETTAZIONE – IMPEGNI DI SPESA			63.000.000	100.000.000	114.100.000	117.750.000	150.000.000	36.000.000		100.825.000	100.000.000	300.000.000
PROGETTAZIONE – Uffici Tecnici 1% Costo stimato			21.420.000	20.000.000	22.840.000	23.550.000	30.000.000	11.900.000		21.650.000	20.000.000	140.000.000
PROGETTAZIONE – Privati 5% Costo stimato												
PROGETTAZIONE – Ulteriori finanziamenti non riportati al 15% Costo stimato			41.580.000	80.000.000	91.360.000	94.200.000	120.000.000	24.100.000		79.200.000	80.000.000	160.000.000
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI – IMPEGNI DI SPESA	897.773.060	1.789.260.680	1.487.958.909		1.580.279.906			839.455.520	915.133.850			
ACCONTI – 20% e 50% Impegno di spesa					790.139.950							
ACCONTI – 30% e 50% Impegno di spesa in caso di ferrivitro beni e provvisioni servizi												
ULTERIORI EROGAZIONI – 30% Impegno di spesa												
ULTERIORI EROGAZIONI – fino alla concorrenza dell' 85% e 95% dell'impegno di spesa												
SALDO – 10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio												
ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI												
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)												
REGIONI LAZIO – "incentivi" nel settore energetico – Risorse vincolate												
ALTRI BENEFICIARI per "incentivi" nel settore delle attività culturali												
IMPEGNI	897.773.060	1.789.260.680	1.550.958.909	100.000.000	1.694.479.906	117.750.000	150.000.000	875.455.520	915.133.850	100.825.000	100.000.000	300.000.000
PAGAMENTI			63.000.000	100.000.000	904.339.950	117.750.000	150.000.000	36.000.000		100.850.000	100.000.000	300.000.000
altre fonti												-300.000.000

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI							EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fasi
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	REGIONE LAZIO	ALTRI BENEFICIARI per "incentivi" nel settore delle attività culturali			
										20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa per le cose di particolare beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore beni culturali, Ricerca scientifica	"Incentivi" nel settore delle attività culturali			
C 01 26	(Roma) via dei Fabbricanti, piazza Mattei, via del Fienili, piazza Lovatelli, piazza Campitelli, piazza Monte Savello, via Teatro Marcello, via Montanara e area del Foro Olitorio.	Comune di Roma	9.000.000.000	9.000.000.000					6.317.039.476									6.317.039.476		
C 01 28	Potenziamento manutenzione/convivibilità giardini	Comune di Roma	2.412.000.000	2.412.000.000																
C 01 29	Lavori per l'impianto del verde sul parco S. Maria della Pietà	Comune di Roma	1.970.000.000	1.970.000.000																
C 01 30	Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche	Comune di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000																
C2	[illegible]																			
C 02 A	Piazza in Vaticano, S. Giovanni, Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme e San Paolo fuori le mura. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli	RTA	2.625.700.000	2.625.700.000																
C 02 01	Area della Basilica di San Pietro (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture stradali e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma			1.282.308.210		1.282.308.210													
C 01 1.1	"POR" Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	5.347.538.000	5.347.538.000																
C 01 1.2	"PIT" Progetto di riqualificazione urbanistica ed ambientale di piazza Pio Programma ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	9.425.458.000	9.425.458.000																
C 01 1.3	"CON" Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	4.583.604.000	4.583.604.000																
C 02 01/2	Area della Basilica di San Pietro in Vaticano. Interventi sull'illuminazione pubblica esterna e realizzazione di nuove illuminazioni	ACEA	1.869.560.000	1.869.560.000																
C 02 01/4	Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano - Interventi di Adeguamento, disinquinamento e decontaminazione per il risanamento igienico ambientale	AMA	907.430.000	907.430.000																
C 02 01/5	Pietro in Vaticano Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione, realizzazione e abbattimento di strutture temporanee destinati alla sicurezza.	Ministero dell'Interno	2.805.000.000	2.805.000.000																

Codice	C 02 02/5	C 02 02/3	C 02 02.1.6	C 02 02.2.5	C 02 02.2.4	C 02 02.2.3	C 02 02.2.2	C 02 02.2.1	C 02 02/2	C 02 02/1	C 02 01/7	C 02 01/6
Titolo dell'intervento	Ottavia, S.M. Maggiore, S. Cyriaca in Ottaviano, Istituto di distribuzione, disinfestazione e derattizzazione per il risanamento igienico ambientale	Recupero funzionale e valorizzazione edifici storici capitolini S. Giovanni in Laterano, Cavalleggeri, Ramo Cavaggeri, Residenziale ed Obitorio per l'ampliamento dei padiglioni	"COLA" Progetto di riqualificazione ambientale di via Statti Quattro Coronati ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	"CRO" Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Croce in Gerusalemme ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	"MAR" Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Maria Maggiore ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	"MER" Progetto di riqualificazione ambientale di via Merulana ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	"ORO" Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Giovanni ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Concorsi di progettazione preliminare di piani pubblici	Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme in Roma (Roma) - lavori di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di	Demolizione rimessa ATAC via Carlo Felice tra Basilica S. Giovanni e S. Croce	Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro (II Lotto)	Infrastrutturazione urbana area stazione di Pietro - Prima Lotto
Soggetto Beneficiario del finanziamento	Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni-Addolorata	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Roma 2000 S.p.A.	Roma Domitia
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	14.129.000.000	1.410.753.000	1.909.836.000	5.213.681.000	4.943.262.000	9.932.494.000	400.000.000		1.786.437.855	9.240.000.000	1.446.500.000
COSTO STIMATO	14.129.000.000	1.410.753.000	1.909.836.000	5.213.681.000	4.943.262.000	9.932.494.000	400.000.000		1.786.437.855	9.240.000.000	1.446.500.000
PROGETTAZIONE – IMPEGNI DI SPESA	706.450.000							1.321.981.510				
PROGETTAZIONE – Uffici Tecnici 1% Costo stimato												
PROGETTAZIONE – Privati 5% Costo stimato	706.450.000							1.321.981.510				
PROGETTAZIONE – Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	706.450.000											
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI – IMPEGNI DI SPESA									1.732.062.489			
ACCONTI – 20% o 50% Impegno di spesa									1.558.056.240			
ACCONTI – 50% e 70% Impegno di spesa in caso di Istituti bancari e previdenziali enti												
ULTERIORI EROGAZIONI – 30% Impegno di spesa												
ULTERIORI EROGAZIONI – Fino alla concorrenza dell'80% o 90% dell'impegno di spesa												
SALDO – 10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio												
ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI												
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)												
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – ENTRATE LORO – "Incassi" ed entrate proprie - Ricorso mercato												
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN – ALTRI BENEFICIARI per "Incassi" ed entrate delle attività culturali												
IMPEGNI	706.450.000							1.321.981.510	1.732.062.489			
PAGAMENTI	1.412.900.000							1.321.981.510	1.558.056.240			
altre Fasi												

| Codice | | |

| Codice | | |

| Ciclo | | |

Codice		C 08 01/4	C 08 01/3	C 08 01/2	C 08 01/1	C 8	C 07 01	C 7	C 06 01	C 6	C 05 01/2	C 05 01/1	C 5	C 04 H	C 04 F
Titolo dell'intervento		Restauro del parco di Villa Borghese Impianto d'irrigazione	Restauro del parco di Villa Borghese Ambulacro lungo Via pinciana,Obelisco del lago, cancelli d'ingresso,Viale dei Daini	Restauro del parco di Villa Borghese Restauro del Giardino del Lago	Restauro del parco di Villa Borghese Restauro del Giardino Segreto	Restauro del Parco di Villa Borghese	Parco Casilino Labicano Villa De Sanctis - Catacombe di Sta Marcellino (Roma) Sistemazione della area a verde	Parco Casilino-Labicano Intervento di ristrutturazione a verde	Giardini di Sta Onorata Via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Giardini San Onoratavia Carlo Felice Intervento di ristrutturazione	Lavori di recupero infrastrutturale del Ramo	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale giardini del bastione	Giardini di Castel Sant'Angelo Intervento di ristrutturazione	Potenziamento struttura ferrovia ferroviaria "La Villetta"	Sistemazione della passeggiata sul lungo lago
Soggetto Beneficiario del finanziamento		Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma	Comune di Roma		Comune di Roma		Comune di Roma		Comune di Roma	Comune di Roma		Comune di Castel Gandolfo	Comune di Castel Gandolfo
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000							2.000.000.000		3.500.000.000		1.700.000.000	3.300.000.000		1.400.000.000	2.500.000.000
COSTO STIMATO		1.929.750.000	1.405.367.495	3.000.000.000	1.720.816.797		2.000.000.000		3.500.000.000		1.700.000.000	3.300.000.000		1.400.000.000	2.500.000.000
PROGETTAZIONE	IMPEGNI DI SPESA	2.929.750.000	1.405.367.495	3.000.000.000	1.720.816.797		2.000.000.000		3.500.000.000		1.700.000.000	3.300.000.000		1.400.000.000	2.500.000.000
	Ufficî Tecnici 1% Costo stimato	130.000.000	124.000.000	150.000.000	85.500.000		224.000.000		175.000.000		35.600.000	70.000.000			
	Privati 5% Costo stimato	130.000.000	124.000.000	150.000.000	85.500.000		224.000.000		175.000.000		35.600.000	70.000.000			
	Ulteriori finanziamenti non imputati al 10% Costo stimato														
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPEGNI DI SPESA	2.751.800.192	1.219.315.297	1.397.763.926											
ACCONTI	20% e 50% Impegno di spesa	550.360.380	243.863.060	279.552.780											
	30% e 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni e prestazioni servizi														
ULTERIORI EROGAZIONI	90% Impegno di spesa		365.794.590	419.329.180											
	fino alla concorrenza dell' 85% e 95% dell'impegno di spesa														
SALDO	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio														
ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI															
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)															
REGIONE LAZIO (Decreto di variazione)	"Immobili" nel comune bonificato - Risorse vincolate														
ALTRI BENEFICIARI (per "Immobili" nel settore delle attività culturali															
IMPEGNI		2.881.800.192	1.343.315.297	150.000.000	1.483.263.926		224.000.000		175.000.000		35.600.000	70.000.000			
PAGAMENTI		680.160.380	733.657.650	150.000.000	784.381.960		224.000.000		175.000.000		35.600.000	70.000.000			
altre fasi		1.000.000.000													

| Codice | | |

Codice		C 11 17	C 11 16	C 11 15	C 11 14	C 11 13	C 11 12	C 11 11	C 11 10	C 11 09	C 11 08	C 11 07	C 11 06
Titolo dell'intervento		Restauro SS. Giovanni e Paolo	Area di Sillaro e Dolcetta e approvvigionamento Acquedotto Collinamiero	Biblioteca di Papa Agapito ed annesse torrette adiacenti	Fronti lapicidi sul Clivo di Scauro	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	Arcate del Clivo di Scauro	Terme meridionali - ISNP (consolidamento, copertura, pavimento mosaici)	Chiesa di S. Tommaso in Formis (copertura)	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e sostruzioni)	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (progetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)	Area archeologica del Colle Palatino Recupero del palatino di S Domitiano	Area archeologica del Colle Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta (Manutenzione)
Soggetto Beneficiario del finanziamento		Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Comune di Roma	Comune di Roma
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000		216.500.000	448.352.303	1.044.466.371	628.336.602	1.353.310.311	747.071.636	274.765.900	272.377.273	250.000.000	396.509.888	301.710.233	2.500.000.000
COSTO STIMATO		216.500.000	448.352.303	1.044.466.371	628.336.602	1.353.310.311	747.071.636	274.765.900	272.377.273	250.000.000	396.509.888	301.710.233	2.500.000.000
PROGETTAZIONE	IMPEGNI DI SPESA												149.083.200
	Uffici Tecnici 1% Costo stimato												
	Privati 5% Costo stimato												149.083.200
	Ulteriori finanziamenti non reperiti al 10% Costo stimato												
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPEGNI DI SPESA											301.710.230	1.730.133.210
ACCONTI	20% e 50% In pagam. di opere 30% e 30% In pagam. di opere in caso di forniture beni e prestazioni servizi												
ULTERIORI EROGAZIONI	50% In pagam. di opere												
	Fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'importo di opere												
SALDO	10% all'emissione del certificato di collaud. provvisorio												
	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI												
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di ratifica/ecc)				700.000.000	1.400.000.000	800.000.000	300.000.000	300.000.000	250.000.000	450.000.000	301.710.230	
	ENTI LOCALI "Incentivi" sul settore acquisizione - Risorse comunali												
	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" sul settore delle attività culturali												
IMPEGNI		216.500.000			700.000.000	1.400.000.000	800.000.000	300.000.000	300.000.000	250.000.000	450.000.000	301.710.230	1.879.216.410
PAGAMENTI		216.500.000			700.000.000	1.400.000.000	800.000.000	300.000.000	300.000.000	250.000.000	450.000.000		149.083.200
altre fonti													

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI							EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			DIPENDI	PAGAMENTI	altre fonti
					DIPENDI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	DIPENDI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E DOMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di ripartizione)	REGIONE LAZIO (Decreto di ripartizione)	ALTRI BENEFICIARI per "Interventi" nel settore delle attività culturali			
										20% e 60% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di Project bond e procedure negoziali	30% Impegno di spesa	Fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Interventi" nel settore dei Beni Culturali (Lazio)			
C 12 04/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale del Giardino del Casino, di Villa Versilia, della Serra	Comune di Roma	698.934.212	698.934.212	35.000.000		35.000.000		461.838.040										496.838.040	35.000.000	
C 12 04/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale del Giardino del Teatro	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000	50.000.000		50.000.000												50.000.000	50.000.000	
C 12 03	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini	Comune di Roma	699.384.000	699.384.000	22.400.000		22.400.000												22.400.000	22.400.000	
C 12 02	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma	3.000.000.000	3.000.000.000	150.000.000		150.000.000												150.000.000	150.000.000	
C 12 01	Villa Doria Pamphilj (Roma) Ristrutturazione della residenza e sistemazione a verde e recupero ambientale delle aree pertinenti la via Olimpica	Comune di Roma	4.600.000.000	4.600.000.000																	
C 12	Restauro del Parco di Villa Doria Pamphilj																				
C 11 23			600.000.000	600.000.000																	
C 11 22	Ristrutturazione S. Gregorio a Cappella Sistina	ITALOAS	170.000.000	170.000.000																	
C 11 21	Attività di formazione	Provincia di Roma	191.500.000	191.500.000					163.500.000		81.750.000								163.500.000	81.750.000	
C 11 20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	630.700.000	630.700.000																	
C 11 19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	53.300.000	53.300.000												53.300.000			53.300.000	53.300.000	
C 11 18	Chiesa di S. Maria in Domnica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	190.000.000	190.000.000												28.700.000			28.700.000	28.700.000	
C 11																					
C 12																					
C 13	Salvaguardia ambientale e promozione delle produzioni di Monte																				

| Codice | | |

D 04 01	D 04	D 03 01	D 3	D 02 01	D 2		C 20 01	C 19 02	C 19 01/b4	C 19 01/b3	C 19 01/b2	C 19 01/b1	C 19 01/a2
Codice													
Titolo dell'intervento		Tram Venezia - San Pietro Realizzazione della linea tramviaria.	Tram Termini/San Pietro	Linea tramviaria S.Pietro Aurelia	Tram San Pietro/Aurelia		Orto Botanico	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita	Opere di difesa del litorale di Ostia e Fiumee	Risanamento Fosso Papirina, Ripascimento litorale Tirrheno acque magra Foce e Ostia Litorale	Risanamento Fosso Papirina, Ripascimento litorale Tirrheno acque magra Foce e Ostia Litorale	Risanamento Fosso Papirina, Ripascimento litorale Tirrheno acque magra Foce e Ostia Litorale	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Quota parte adeguamento idraulica fiume Acque Marcesa.
Soggetto Beneficiario del finanziamento							Università La Sapienza	Provincia di Roma	Regione Lazio	Regione Lazio	Regione Lazio	Regione Lazio	Comune di Roma
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000							600.000.000	8.000.000.000	9.000.000.000	16.000.791.415	4.000.000.000	10.000.000.000	8.000.000.000
COSTO STIMATO							600.000.000	8.000.000.000	9.000.000.000	16.000.791.415	4.000.000.000	10.000.000.000	8.000.000.000
PROGETTAZIONE	IMPEGNI DI SPESA												
	Uffici Tecnici 1% Costo stimato												
	Privati 5% Costo stimato												
	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato												
REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPEGNI DI SPESA												
	ACCONTI	20% o 50% Impegno di spesa											
		30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi											
	ULTERIORI EROGAZIONI	30% Impegno di spesa											
		fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa											
	SALDO	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio											
	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI												
EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)												
	REGIONE LAZIO (somalati di cassa) "Incentivi" nel settore immobiliare + Risorse sociali												
	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali												
IMPEGNI		2.800.000.000		3.550.000.000	2.500.000.000								
PAGAMENTI		2.800.000.000		3.550.000.000	2.500.000.000								
altre fonti		-2.800.000.000		-3.550.000.000	-2.500.000.000								

| | | | | | | | | | | | | |

| Codice | | |

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI							EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non reperiti al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (Decreto di variazione)	ALTRI BENEFICIARI (per "Comuni" vedi numero delle relative schede)			
										50% o 30% impegno di spesa	50% o 30% impegno di spesa in caso di ricorso a procedure speciali	50% impegno di spesa	Fino alla concorrenza dell' 85% o 95% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		"Comuni" nel settore viaggiante - Risorse assegnate				
D 01 13	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS Tiburtina (Roma) (Variante/Varco) Parcheggio a raso ed autosilo per auto lungo la direttrice via Tiburtina e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	1.500.000.000	1.500.000.000	30.000.000		30.000.000		300.000.000	300.000.000				300.000.000				630.000.000	330.000.000	
D 12 01	Tratto viario Olimpica - Piazza Sembroni (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italico e via Piazza Sembroni	Comune di Roma																		
D 12	Realizzazione del tratto viario Olimpica/Piazza Sembroni																			
D 11 01	ORA tratto Piazza Annibaliano (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)	ANAS	45.950.000.000	45.950.000.000					45.946.860.256	8.465.572.050		10.888.857.880		3.619.000.000				49.565.860.256	22.973.429.930	
D 11	Adeguamento del Grande Raccordo Anulare nel tratto Tiburtina-Aurelia																			
D 10 01/b	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 3°)	ANAS	15.571.357.164	15.748.076.382																
D 10 01/a	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2°)	ANAS	65.773.623.930	69.867.134.712																
D 10 01	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2° e 3°)	ANAS																		
D 10	Terza corsia dell'Autostrada Roma-Fiumicino																			
D 09 01	Interventi relativi all'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	92.491.695.000	92.491.695.000	7.500.000.000		7.500.000.000											7.500.000.000	7.500.000.000	
D 09	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina																			
D 08 03	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	15.390.000.000	15.390.000.000																
D 08 02	Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	40.000.000.000	80.000.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000		24.000.000.000	24.000.000.000								28.000.000.000	28.000.000.000	40.000.000.000
D 08 01	Adeguamento Obelisco Principe Amedeo d'Aosta	Comune di Roma	56.050.000.000	56.050.000.000	3.400.000.000	680.000.000		2.720.000.000	55.648.760.000	11.129.752.000		16 694.628.000						59.048.760.800	31.224.380.000	
Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI							EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non reperiti al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (Decreto di variazione)	ALTRI BENEFICIARI (per "Comuni" vedi numero delle relative schede)			

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	ENTI LOCALI	ALTRI BENEFICIARI per "Interventi" nel settore delle attività culturali			
										20% a 50% Impegno di spesa 30% a 100% Impegno di spesa in caso di finanziamenti bancari e prestazioni servizi		10% Impegno di spesa	Pari alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		"Interventi" nel settore immobiliare - Risorse mutui				
D 14 01	Ammodernamento della viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree da																			
D 13 12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Marinese - via Valeria (Mentana/Guidonia/Roma)																			
D 13 11	S.P. Mentorella II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio della Tiburtina alla A24	Provincia di Roma		3.672.390.680																
D 13 10	S.P. Cisa Romana (Zagarolo, Cave/Roma) Ripristino della sicurezza per l'utenza al servizio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma		3.000.000.000																
D 13 09	Cisterna (Cisterna, Fregenti, Giordaniese, Marino/Roma) Adeguamento e potenziamento del Km 0+000 / Km 10+500, della SS Ostiense alla SS via dei Laghi	Provincia di Roma		1.978.634.954																
D 13 08	S.P. Nettuno due Santi (Nettuno/Roma) Allargamento a 7,5 m. da Km 0+000 a Km 3+900 della S.P. Appia alla S.S. 148 via dei Laghi	Provincia di Roma		4.000.000.000																
D 13 07	Parcheggio a raso a nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso della stazione ferroviaria FM5 Roma Ladispoli	Provincia di Roma		880.000.000	14.000.000	7.000.000			225.000.000					225.000.000				464.000.000	239.000.000	
D 13 06	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso della stazione ferroviaria FM5 Roma Civitavecchia	Provincia di Roma		1.200.000.000	60.000.000	12.000.000	48.000.000		780.960.000		390.480.000							840.960.000	450.480.000	
D 13 05	Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Orte/Roma - Tiburtina	Provincia di Roma		397.390.565	27.500.000	5.500.000	22.000.000		369.890.565		110.967.000	129.461.000						397.390.565	341.906.110	
D 13 04	Parcheggio di scambio (Cerveteri/Roma)	Comune di Cerveteri		1.380.000.000	40.000.000		40.000.000													650.000.000
D 13 03	Parcheggio di scambio (Zagarolo/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	Provincia di Roma		1.061.573.765	30.000.000	15.000.000		15.000.000	1.031.573.765		515.786.880							1.061.573.765	545.786.880	
D 13 02	Parcheggio a raso per nodo di scambio (Colleferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio del traffico locale nella linea FM6 Roma - Cassino	Provincia di Roma		1.171.016.811	30.000.000	15.000.000		15.000.000	1.141.016.811									1.547.016.811	406.000.000	
D 14 01	SP Ardeatina (Roma) Adeguamento e potenziamento del Km 9+000 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma		3.228.123.995																
				3.228.123.995																
				250.000.000																
				50.000.000																
				200.000.000																
				2.955.831.995																
				391.166.400																
				1.086.749.500																

| Codice | | |

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
					IMPEGNI DI SPESA	Utili Tariffe 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non reperiti al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	RICHIESTE LAVORI (Decreto di trasferimento)	ALTRI BENEFICIARI per "Accordo" nel settore delle attività culturali			
										20% o 50% impegno di spesa 30% o 50% impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi		50% impegno di spesa Fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa		10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio							
D 15 01/2	Potenziamento della linea Ciampino - Velletri con realizzazione nuova fermata S. Onofrio e nuovi posti di ricovero del Personale e Lavoro	Ferrovie dello Stato	13.341.000.000	13.341.000.000																
D 16	Riqualificazione e prolungamento del terminale turistico del porto di Civitavecchia																			
D 16 01	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (I° lotto)	Autorità portuale del porto di Civitavecchia	71.217.371.000	71.217.371.000	4.500.000.000		3.583.449.590		50.217.371.000	25.109.685.550								54.717.371.000	29.609.685.550	
D 16 02	Adeguamento funzionale (I Lotto)	Ente Porto Civitavecchia	11.000.000.000	11.000.000.000		916.550.410														
D 18	RIQUALIFICAZIONE e potenziamento delle linee A e B della metropolitana e delle																			
D 18 01/1	Potenziamento nodo Termini	Comune di Roma	9.640.000.000	9.640.000.000	2.004.500.000		2.004.500.000		9.368.858.810	1.873.771.700		2.810.657.550						11.373.358.510	6.688.929.250	
D 18 01/2	Adeguamento metro A	Comune di Roma			5.495.500.000		5.495.500.000											5.495.500.000	5.495.500.000	
D 18 01/2a	Adeguamento metro A 1° stralcio	Comune di Roma	25.363.381.733	25.363.381.733																
D 18 01/2b	Adeguamento metro A 2° stralcio	Comune di Roma	55.037.266.010	55.037.266.010					50.873.238.009	25.436.619.000								50.873.238.009	25.436.619.000	
D 18 02/1	Potenziamento Roma - Lido	Comune di Roma			508.800.000		508.800.000											508.800.000	508.800.000	
D 18 02/1a	Ferrovie concesse potenziamento linea Roma - Lido	Comune di Roma	6.381.330.834	6.381.330.834					5.872.530.835									5.872.530.835		
D 18 02/1b	Ferrovie concesse potenziamento linea Roma - Lido. Manutenzione	COTRAL	2.000.000.000	2.000.000.000																
D 18 02/2	Potenziamento Roma - Nord	Comune di Roma	20.000.000.000	20.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000											1.000.000.000	1.000.000.000	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI							EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN		IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO	ALTRI BENEFICIARI			
										20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di finanziamenti bancari o prestiti sociali	30% Impegno di spesa	Fino alla concorrenza dell' 85% e 95% dell'Impegno di spesa	15% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			Finanziati" nel settore Impegnato - Risorse settore	"Investiti" nel settore delle attività culturali			
D 18 03	Sistema stazione Termini	Grandi Stazioni SPA	10.000.000.000	10.000.000.000																
D 18 04	Ala Mazzoni - stazione Termini	Grandi Stazioni SPA	20.000.000.000	20.000.000.000																
D 19	Aree di parcheggio attinenti ai principali nodi di scambio per le merci																			
D 19 01	Nodi di scambio (Lotto) Ottimizzazione dei principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Tiburtina, Pietralata, Ardeatina	Comune di Roma																		
D 19 02	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Piemonte del Light"	Farnesina della Stato	10.000.000.000	10.000.000.000																
D 19 03	Parcheggio di scambio con strutture mobili	ATA	5.000.000.000	5.000.000.000	250.000.000		250.000.000											250.000.000	250.000.000	
D 19 04	Risalto funzionale nodo di scambio viale Aurelio con interazione tra via Aurelio Saffi e via A. Bino	Comune di Roma	4.099.249.946	4.099.249.946					4.099.250.846									4.099.250.846		
D 20	Controllo e gestione del traffico																			
D 20 01	Aggiornamento rete semaforica, regolazione e rete di monitoraggio per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roma)	ATA	20.650.000.000	20.650.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000											1.000.000.000	1.000.000.000	
D 20 02	Ristrutturazione e ammodernamento regolazione	ATA	17.000.000.000	17.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000											1.000.000.000	1.000.000.000	
D 20 03	Infrastrutture per una mobilità sostenibile a Roma	Ministero Ambiente	3.500.000.000	3.500.000.000																
D 21 01	Riqualificazione del nodo di scambio di largo di Torre Argentina ed interventi di riqualificazione ambientale	Comune di Roma	9.424.700.000	9.424.700.000																
D 21 01/1	Coordinamento delle progettazioni	Provveditorato OO.PP Lazio	950.000.000	950.000.000																

| Codice | Titolo dell'intervento | | |

| Codice | | |

| Codice | | |

| Codice | | |

| Codice | | |

| Codice | | |

| Codice | | |

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI							EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
					IMPEGNI DI SPESA	Utilizz Tecnici 1% Costo stimato	Prev ed 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non reperiti ed 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di trasferimento)	VERSIONE LAVORI (articolo di riferimento)	ALTRI BENEFICIARI (per "beneficiari" nel settore compilare i "Mezzo tecnici")			
										20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di Accordoo bonari e transazioni previsti	20% Impegno di spesa	Max alla concorrenza dell' 85% e 95% dell'impegno di spesa	10% all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio			"Beneficiari" nel settore compilare i "Mezzo tecnici"	ALTRI BENEFICIARI per "beneficiari" nel settore delle calamità naturali			
E 05 08	Adeguamento del porto-canale ed dalla direzione dell'Aeroporto e per le funzioni di accesso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	10.000.000.000	10.000.000.000	500.000.000		500.000.000												500.000.000	500.000.000	
E 05 09	Ampliam. 7 turni per Riconversione	Ministero Difesa	200.000.000	200.000.000																	
E 05 10	Acquisto 4 gruppi elettrogeni non insonori civile	Ministero Difesa																			
E 05 11	Adeguamento, potenziamento e riqualificazione infrastrutture destinate alloggio operatori, soldati e pellegrini soldati italiani ed esteri	Ministero Difesa	4.800.000.000	4.800.000.000																	
E 05 12	Potenziamento aeroporto logistico Cisterna "Falcone"	Ministero Difesa - Arma dei Carabinieri	1.995.000.000	1.995.000.000																	
E 05 13	Potenziamento aeroporto logistico Cisterna "Ter di Quadri"	Ministero Lavori Pubblici	26.500.000.000	26.500.000.000																	
E 05 14	Infrastrutture - Costruzione Cisterna sede del Gruppo Aeroporti di Pratolino	Ministero Difesa	19.000.000.000	19.000.000.000																	
E 05 15	Infrastrutture - Ristrutturazione Servizi Logistici Cisterna "Piave"	Ministero Difesa	697.000.000	697.000.000																	
E 05 16	Caserma della Polizia di Stato "Villa Tevere" sede del reparto mobile	Ministero Difesa	1.800.000.000	1.800.000.000																	
E 05 17	Caserma della Polizia di Stato "Maurizio Giglio" sede del reparto volanti	Ministero Difesa	2.997.000.000	2.997.000.000																	
E 05 18	Nuova compleme Polizia di Stato (Fonte Cedrata) Fiumicino	Ministero Difesa	4.046.000.000	4.046.000.000																	
E 05 19	Nuova compleme Polizia di Stato (Fonte Cedrata) Fiumicino	Ministero Difesa	11.000.000.000	11.000.000.000																	

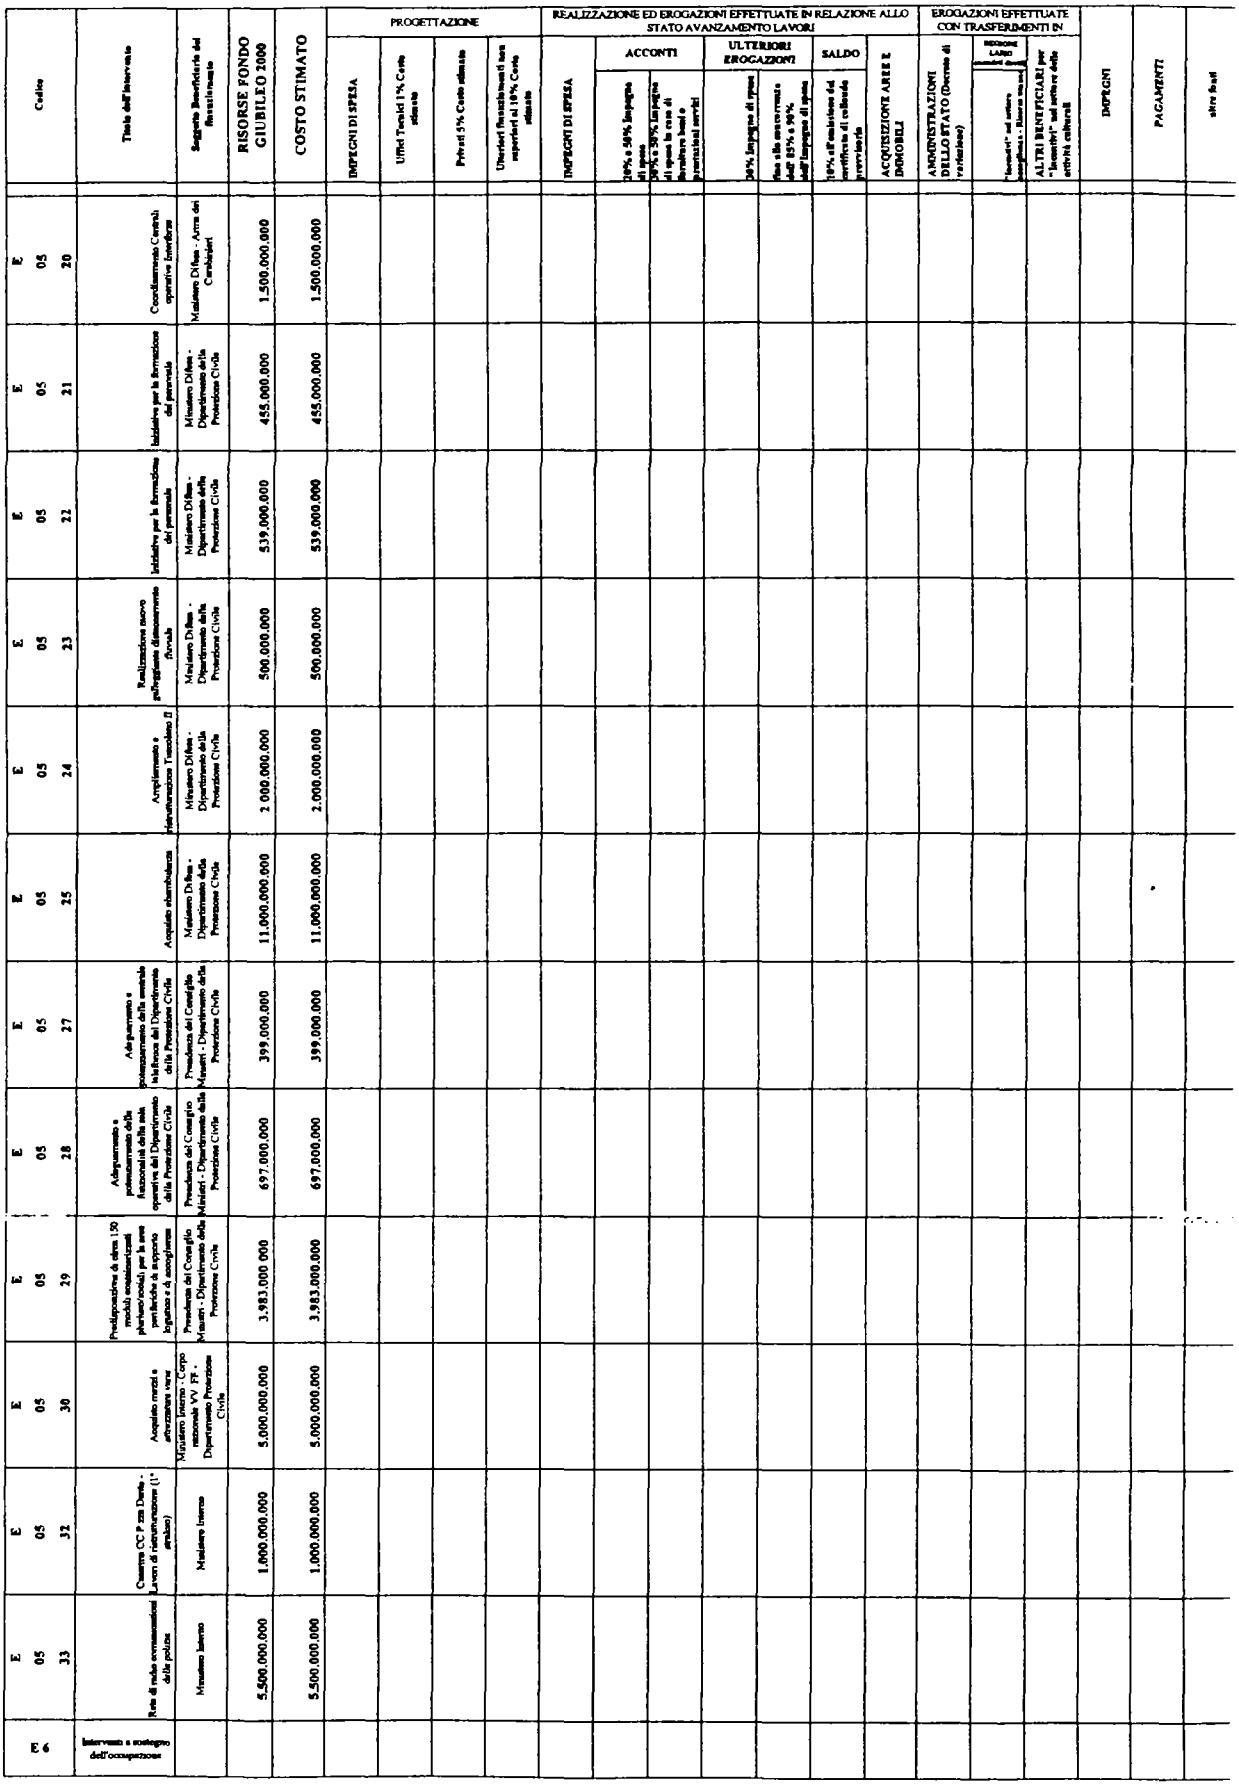

| E 6 | Intervento a sostegno dell'occupazione | | |

| Codice | | |

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI							EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			DMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
										ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO			REGIONE LAZIO (annobi diritti)				
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi	50% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	"Incentivi" nel settore energetico - Risparmio ener.	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali			
F 05 07	Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000.000	6.000.000.000					322.000.000										322.000.000	254.000.000	
F 05 06	Funzionamento della struttura del Commissario straordinario di Governo	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi	3.300.000.000	3.300.000.000							254.000.000										
F 05 05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	8.152.080.000	8.152.080.000	300.000.000		300.000.000		7.852.080.000	3.776.040.000		66.476.949.620	100.466.093.170	1.804.506.880	8.674.303.413	381.609.500.000	151.936.230.000		8.152.080.000	4.076.040.000	
F 05 04	Sistema informativo e di comunicazione. Realizzazione e gestione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	17.993.440.000	17.993.440.000	500.000.000		500.000.000		17.493.440.000	8.496.720.000									17.993.440.000	8.996.720.000	
F 05 03	Sistema unitario di prenotazione. Realizzazione e gestione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	7.612.000.000	7.612.000.000	150.000.000		150.000.000		7.462.000.000	3.656.000.000									7.612.000.000	3.806.000.000	
F 05 02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità. Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	5.000.000.000	5.000.000.000	250.000.000		250.000.000												250.000.000	250.000.000	
	TOTALE		180.359.442.550	180.359.442.550	13.915.000.000		14.701.841.261		67.968.696.783	39.123.891.270	254.000.000		502.714.790						81.883.696.783	54.583.447.321	
	TOTALE		3.487.260.774.371	3.652.415.053.264	95.568.267.588	3.869.653.137	84.829.607.741	8.363.322.971	1.383.872.064.544	466.150.963.080	105.392.175.270	66.476.949.620	100.466.093.170	1.804.506.880	8.674.303.413	381.609.500.000	151.936.230.000		2.021.660.365.545	#VALORE!	165.154.278.893

Impegni di spesa	**1.479.440.332.132**	Pagamenti	**997.963.805.282**
Variazioni di bilancio	381.609.500.000	Variazioni di bilancio	381.609.500.000
Totale risorse attivate	1.861.049.832.132	Totale risorse trasferite	1.379.573.305.282

Impegni di spesa - A	184.176.165.898	Pagamenti A	157.160.122.968
Impegni di spesa - B	125.488.521.687	Pagamenti B	57.954.434.675
Impegni di spesa - C	260.035.921.643	Pagamenti C	195.280.166.635
Impegni di spesa - D	709.555.487.357	Pagamenti D	452.234.134.763
Impegni di spesa - E	118.300.538.764	Pagamenti E	80.751.498.920
Impegni di spesa - F	81.883.696.783	Pagamenti F	54.583.447.321
TOTALI	**1.479.440.332.132**		**997.963.805.282**
